


ONF planning prévisionnel

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Tri 4, 2024 Oct | Nov | Déc | Tri 1, 2025 Jan | Fév | Mar | Tri 2, 2025 Avr | Mai | Jui | Tri 3, 2025 Jul | Aoû | Sep | Tri 4, 2025 Oct | Nov | Déc | Tri 1, 2026 Jan | Fév | Mar | Tri 2, 2026 Avr | Mai | Jui |
|----|--|----------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|
| 1 | Planning previsionnel pour Maison forestière d'Albertville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appel d'offre | 43 jours | Mar 15/10/24 | Lun 23/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | durée de l'appel d'offre | 20 jours | Mar 15/10/24 | Jeu 14/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ouverture des plis | 1 jour | Jeu 14/11/24 | Ven 15/11/24 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Analyse des offres | 10 jours | Ven 15/11/24 | Lun 02/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analyse | 10 jours | Ven 15/11/24 | Lun 02/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Notification aux non retenus + délai recours | 11 jours | Mar 03/12/24 | Jeu 19/12/24 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Notification aux retenus | 1 jour | Ven 20/12/24 | Lun 23/12/24 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DET-OPC (Chantier) | 20 jours | Lun 23/12/24 | Mer 22/01/25 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Réunion de lancement + période de préparation de chantier | 1 mois | Lun 23/12/24 | Mer 22/01/25 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lot 1-Façade isolation par l'extérieur | 47 jours | Jeu 23/01/25 | Mar 08/04/25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Installation de chantier | 1 jour | Jeu 23/01/25 | Ven 24/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sciage et dépose diverse | 3 jours | Ven 24/01/25 | Mer 29/01/25 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Echaffaudage | 5 jours | Mer 29/01/25 | Jeu 06/02/25 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Dépose bardage | 2 jours | Jeu 06/02/25 | Lun 10/02/25 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Préparation support | 3 jours | Lun 10/02/25 | Jeu 13/02/25 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ITE | 10 jours | Ven 14/02/25 | Lun 03/03/25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Enduit de la façade | 8 jours | Lun 03/03/25 | Ven 14/03/25 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Dépose lambris intérieur | 8 jours | Ven 14/03/25 | Jeu 27/03/25 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Isolation rampant | 4 jours | Jeu 27/03/25 | Jeu 03/04/25 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pose lambris intérieur | 3 jours | Jeu 03/04/25 | Mar 08/04/25 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Lot 2 - Menuiseries extérieures | 59 jours | Jeu 23/01/25 | Lun 28/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Prise de cotes + mise en fabrication | 35 jours | Jeu 23/01/25 | Mer 19/03/25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Dépose et pose nouvelles menuiseries | 12 jours | Jeu 20/03/25 | Mar 08/04/25 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Encadrement bois fenêtre | 5 jours | Mar 08/04/25 | Mer 16/04/25 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pose cache unité + signalétique | 1 jour | Mer 16/04/25 | Jeu 17/04/25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Repose garde corps existant | 1 jour | Jeu 17/04/25 | Ven 18/04/25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pose des volets bois | 5 jours | Ven 18/04/25 | Lun 28/04/25 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Lot 3 - Plomberie-Chauffage | 66 jours | Jeu 23/01/25 | Jeu 08/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Neutralisation cuve fioul | 5 jours | Jeu 23/01/25 | Jeu 30/01/25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Dépose des installations existantes | 8 jours | Jeu 30/01/25 | Mer 12/02/25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Installation PAC + ECS | 3 jours | Mer 12/02/25 | Mar 18/02/25 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Raccordement et mise en fonctionnement | 4 jours | Mar 18/02/25 | Lun 24/02/25 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Nettoyage de chantier | 4 jours | Lun 28/04/25 | Ven 02/05/25 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Réception de chantier | 3 jours | Lun 05/05/25 | Jeu 08/05/25 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

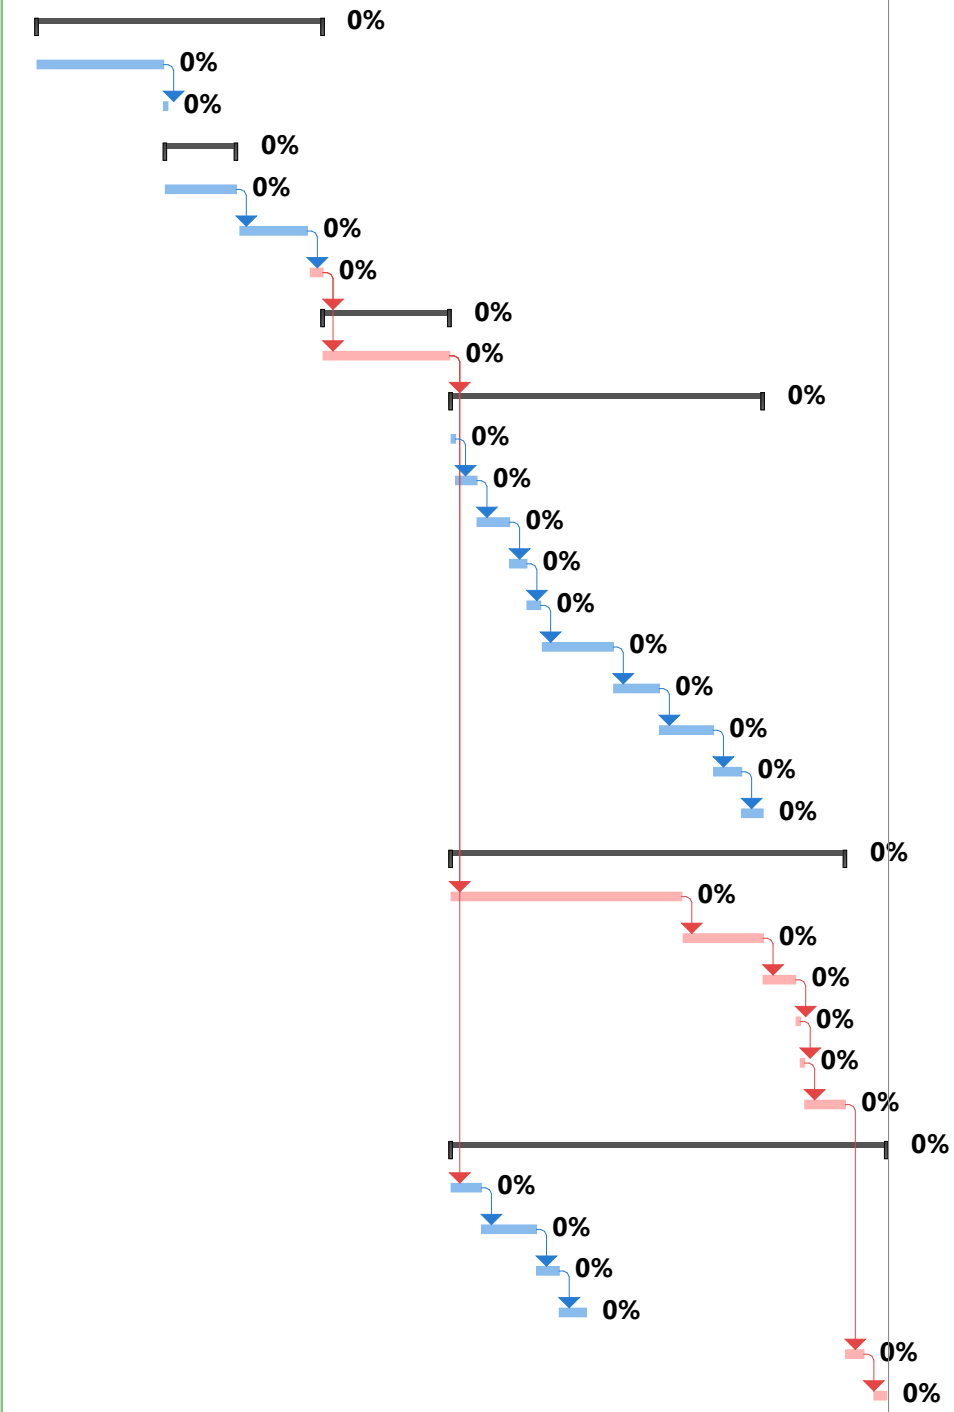

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Critique | <div></div> | Fractionnement | <div></div> | Fin uniquement | <div></div> | Jalon de référence | <div></div> | Récapitulatif manuel | <div></div> | Tâche inactive | <div></div> |
| Fractionnement critique | <div></div> | Avancement de la tâche | <div></div> | Durée uniquement | <div></div> | Jalon | <div></div> | Récapitulatif du projet | <div></div> | Jalon inactif | <div></div> |
| Avancement de la tâche critique | <div></div> | Tâche manuelle | <div></div> | Planning de référence | <div></div> | Récapitulation de l'avancement | <div></div> | Tâches externes | <div></div> | Récapitulatif inactif | <div></div> |
| Tâche | <div></div> | Début uniquement | <div></div> | Fractionnement de référence | <div></div> | Récapitulative | <div></div> | Jalons externes | <div></div> | Échéance | <div></div> |
