

Chef de projet	
Dates du projet	22 oct. 2024 - 17 avr. 2025
Avancée	0%
Tâches	15
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Consultation des entreprises	22/10/2024	20/11/2024
Analyse des offres	21/11/2024	27/11/2024
Notification	28/11/2024	13/12/2024
Période de préparation	16/12/2024	24/01/2025
Installation de chantier Lot VRD	20/01/2025	24/01/2025
Préparation des platesformes	27/01/2025	30/01/2025
Réalisation des réseaux primaires	31/01/2025	11/02/2025
Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac	03/03/2025	07/03/2025
Mise en place des corners	10/03/2025	12/03/2025
Travaux intérieurs des éléments modulaires	13/03/2025	26/03/2025
Raccordement éléments modulaires	13/03/2025	19/03/2025
Aménagement des extérieurs	20/03/2025	28/03/2025
Intervention des lots à bon de commande	20/03/2025	26/03/2025
Finalisation des lots à bon de commande	27/03/2025	02/04/2025
Essais et mise en service	03/04/2025	16/04/2025

Diagramme de Gantt

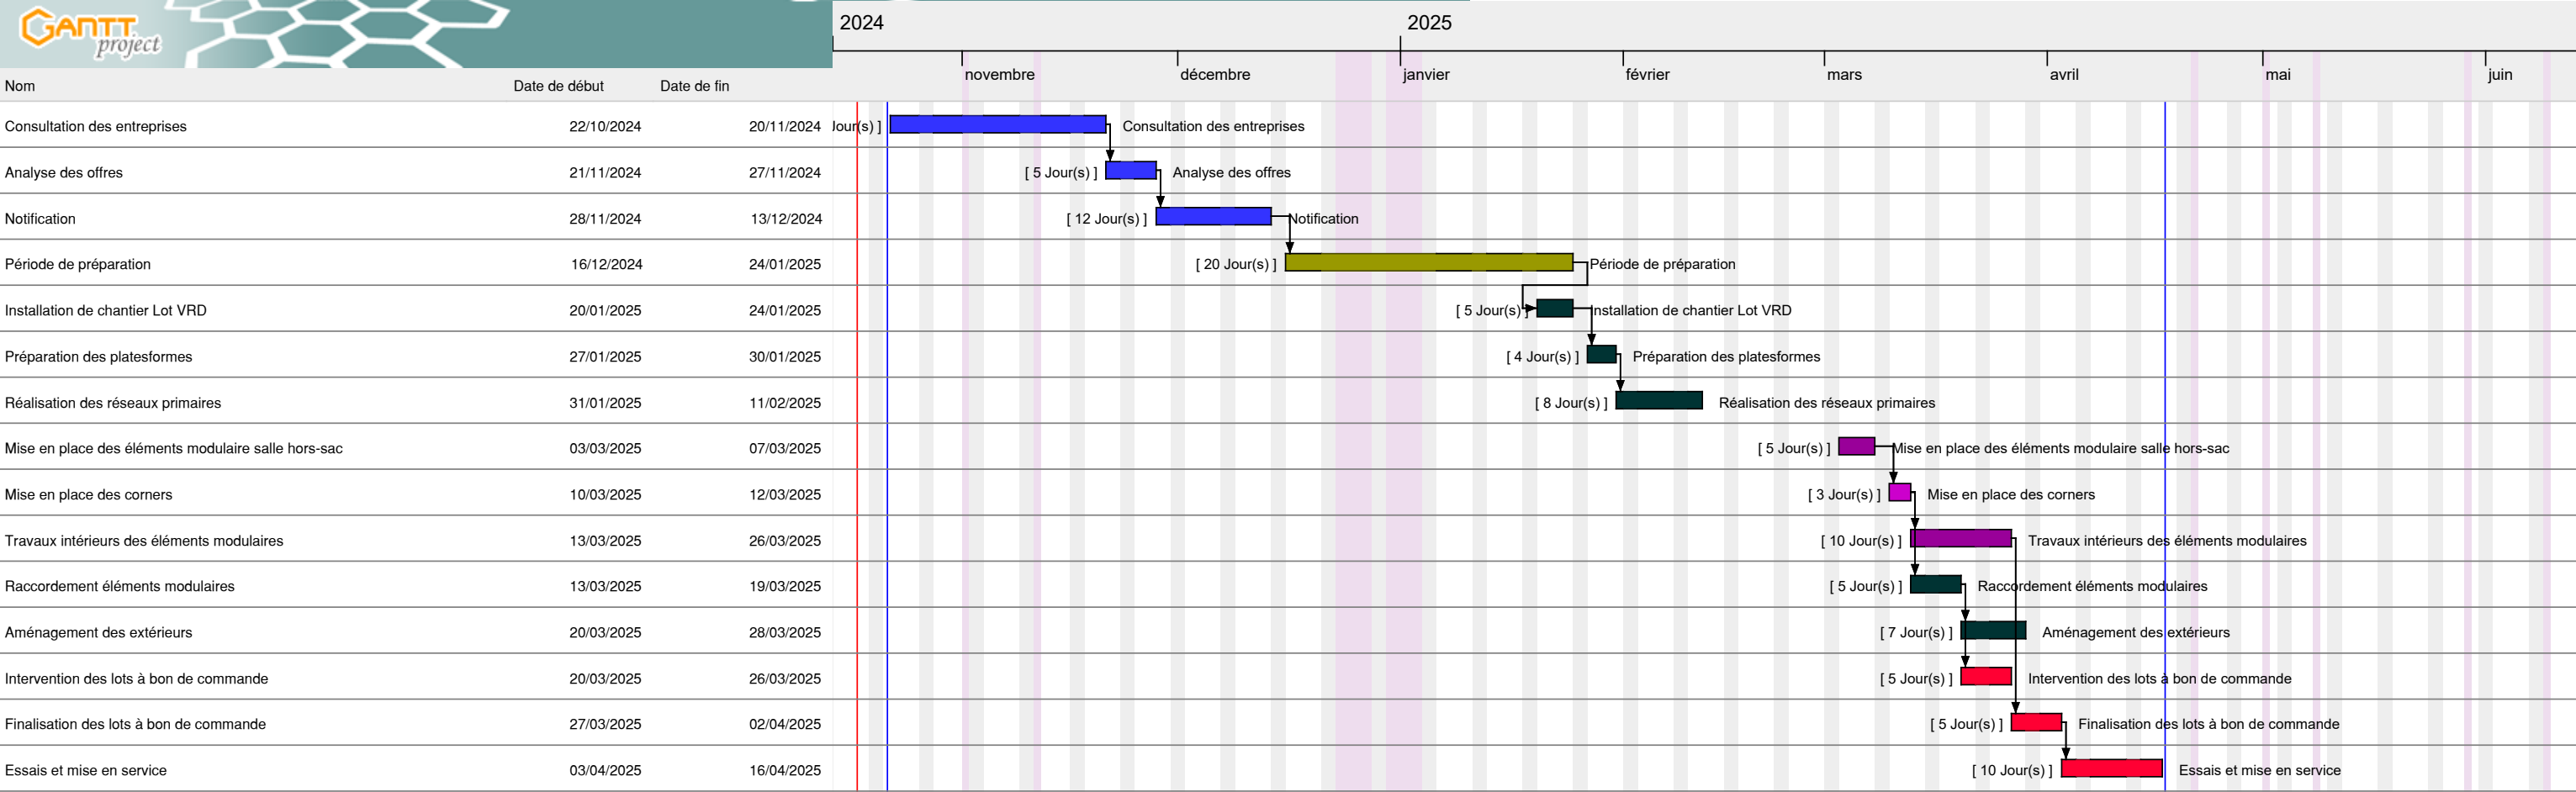


Diagramme des Ressources

