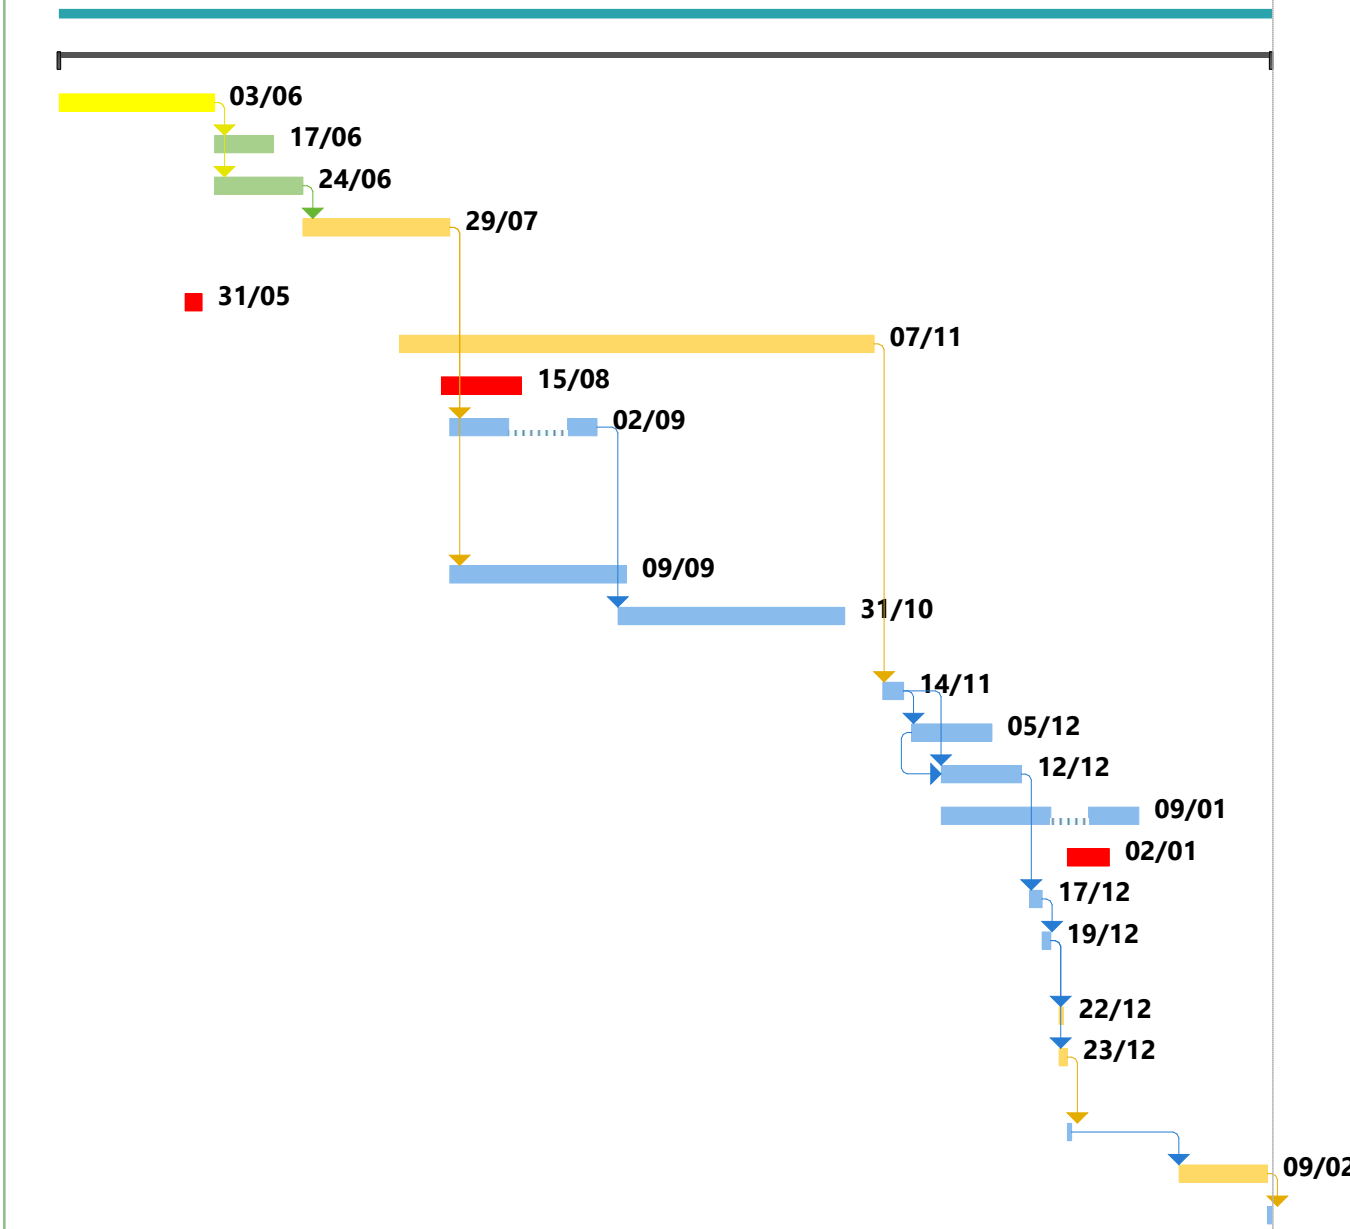


CEA LETI Bâtiment 41- REMPLACEMENT CTA 2																
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Pré											
						2026										
						2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre	
						Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
1	CEA LETI - Bâtiment 41															
2	REEMPLACEMENT CTA 2 (lot unique : Hydraulique, élec CFO, régulation)	206,5 jrs	28/04/25 09:00	10/02/26 14:30												
3	Consultation Entreprises	27 jrs	28/04/25 09:00	03/06/25 18:00												
4	Analyse des offres, des candidatures	10 jrs	04/06/25 09:00	17/06/25 18:00	3											
5	Délai d'attribution, notification marché	15 jrs	04/06/25 09:00	24/06/25 18:00	3											
6	Etudes EXE (hydraulique, aéraulique, élec/régulation) / Visas / Préparation chantier	25 jrs	25/06/25 09:00	29/07/25 18:00	5											
7	Arrêt Technique LETI	3 jrs	28/05/25 09:00	31/05/25 18:00												
8	Approvisionnements longs (CTA 2, armoire électrique)	81 jrs	18/07/25 09:00	07/11/25 18:00												
9	Période de congés (site CEA LETI accessible tout l'été)	15 jrs	28/07/25 09:00	15/08/25 18:00												
10	Arrêt CTA 2 en place, travaux de dépose en combles technique Bât 4107 (CTA 2 existante, câblages électriques, armoire électrique HVAC CTA 2, panoplies et liaisons EC/EG, tubes vapeur, alimentations EDI & EA)	15 jrs	30/07/25 09:00	02/09/25 18:00	6											
11	Préfabrifications (panoplies hydrauliques, armoire électrique)	30 jrs	30/07/25 09:00	09/09/25 18:00	6											
12	Travaux préparatoires en combles technique Bât 4107 (câblages électriques HVAC CTA 2, panoplies et liaisons EC/EG, alimentations EDI & EA)	40 jrs	08/09/25 09:00	31/10/25 18:00	10											
13	Livraison, manutention, montage de la CTA 2 livrée en blocs	5 jrs	10/11/25 09:00	14/11/25 18:00	8											
14	Travaux d'installation (liaisons terminales hydraul. & aéraul., supportages)	15 jrs	17/11/25 09:00	05/12/25 18:00	13											
15	Travaux d'installation (électricité, régulation)	15 jrs	24/11/25 09:00	12/12/25 18:00	13											
16	Travaux de calorifuge	30 jrs	24/11/25 09:00	09/01/26 18:00												
17	Fermeture Site CEA LETI	8 jrs	24/12/25 09:00	02/01/26 18:00												
18	Mise en service (CTA 2 et panoples, laveur CTA 2)	3 jrs	15/12/25 09:00	17/12/25 18:00	15											
19	Mise au point des automatismes, suivi 1ères heures de fonctionnement (parallèles CTA 1, 2, 3, PC41)	2 jrs	18/12/25 09:00	19/12/25 18:00	18											
20	Mise à blanc CTA 2, montages filtres terminaux	1 jr	22/12/25 09:00	22/12/25 18:00	19											
21	Raccordement aéraulique de la CTA 2 au réseau de soufflage de la SB 4101	2 jrs	22/12/25 09:00	23/12/25 18:00	19											
22	Préréception	1 jr	24/12/25 09:00	24/12/25 18:00	21											
23	Levée des réserves	15 jrs	19/01/26 14:30	09/02/26 14:00	22											
24	Réception	1 jr	09/02/26 14:30	10/02/26 14:00	23											
																

PRO-PLG-24210-245-001-A - Mis à jour

15/04/25 15:59
