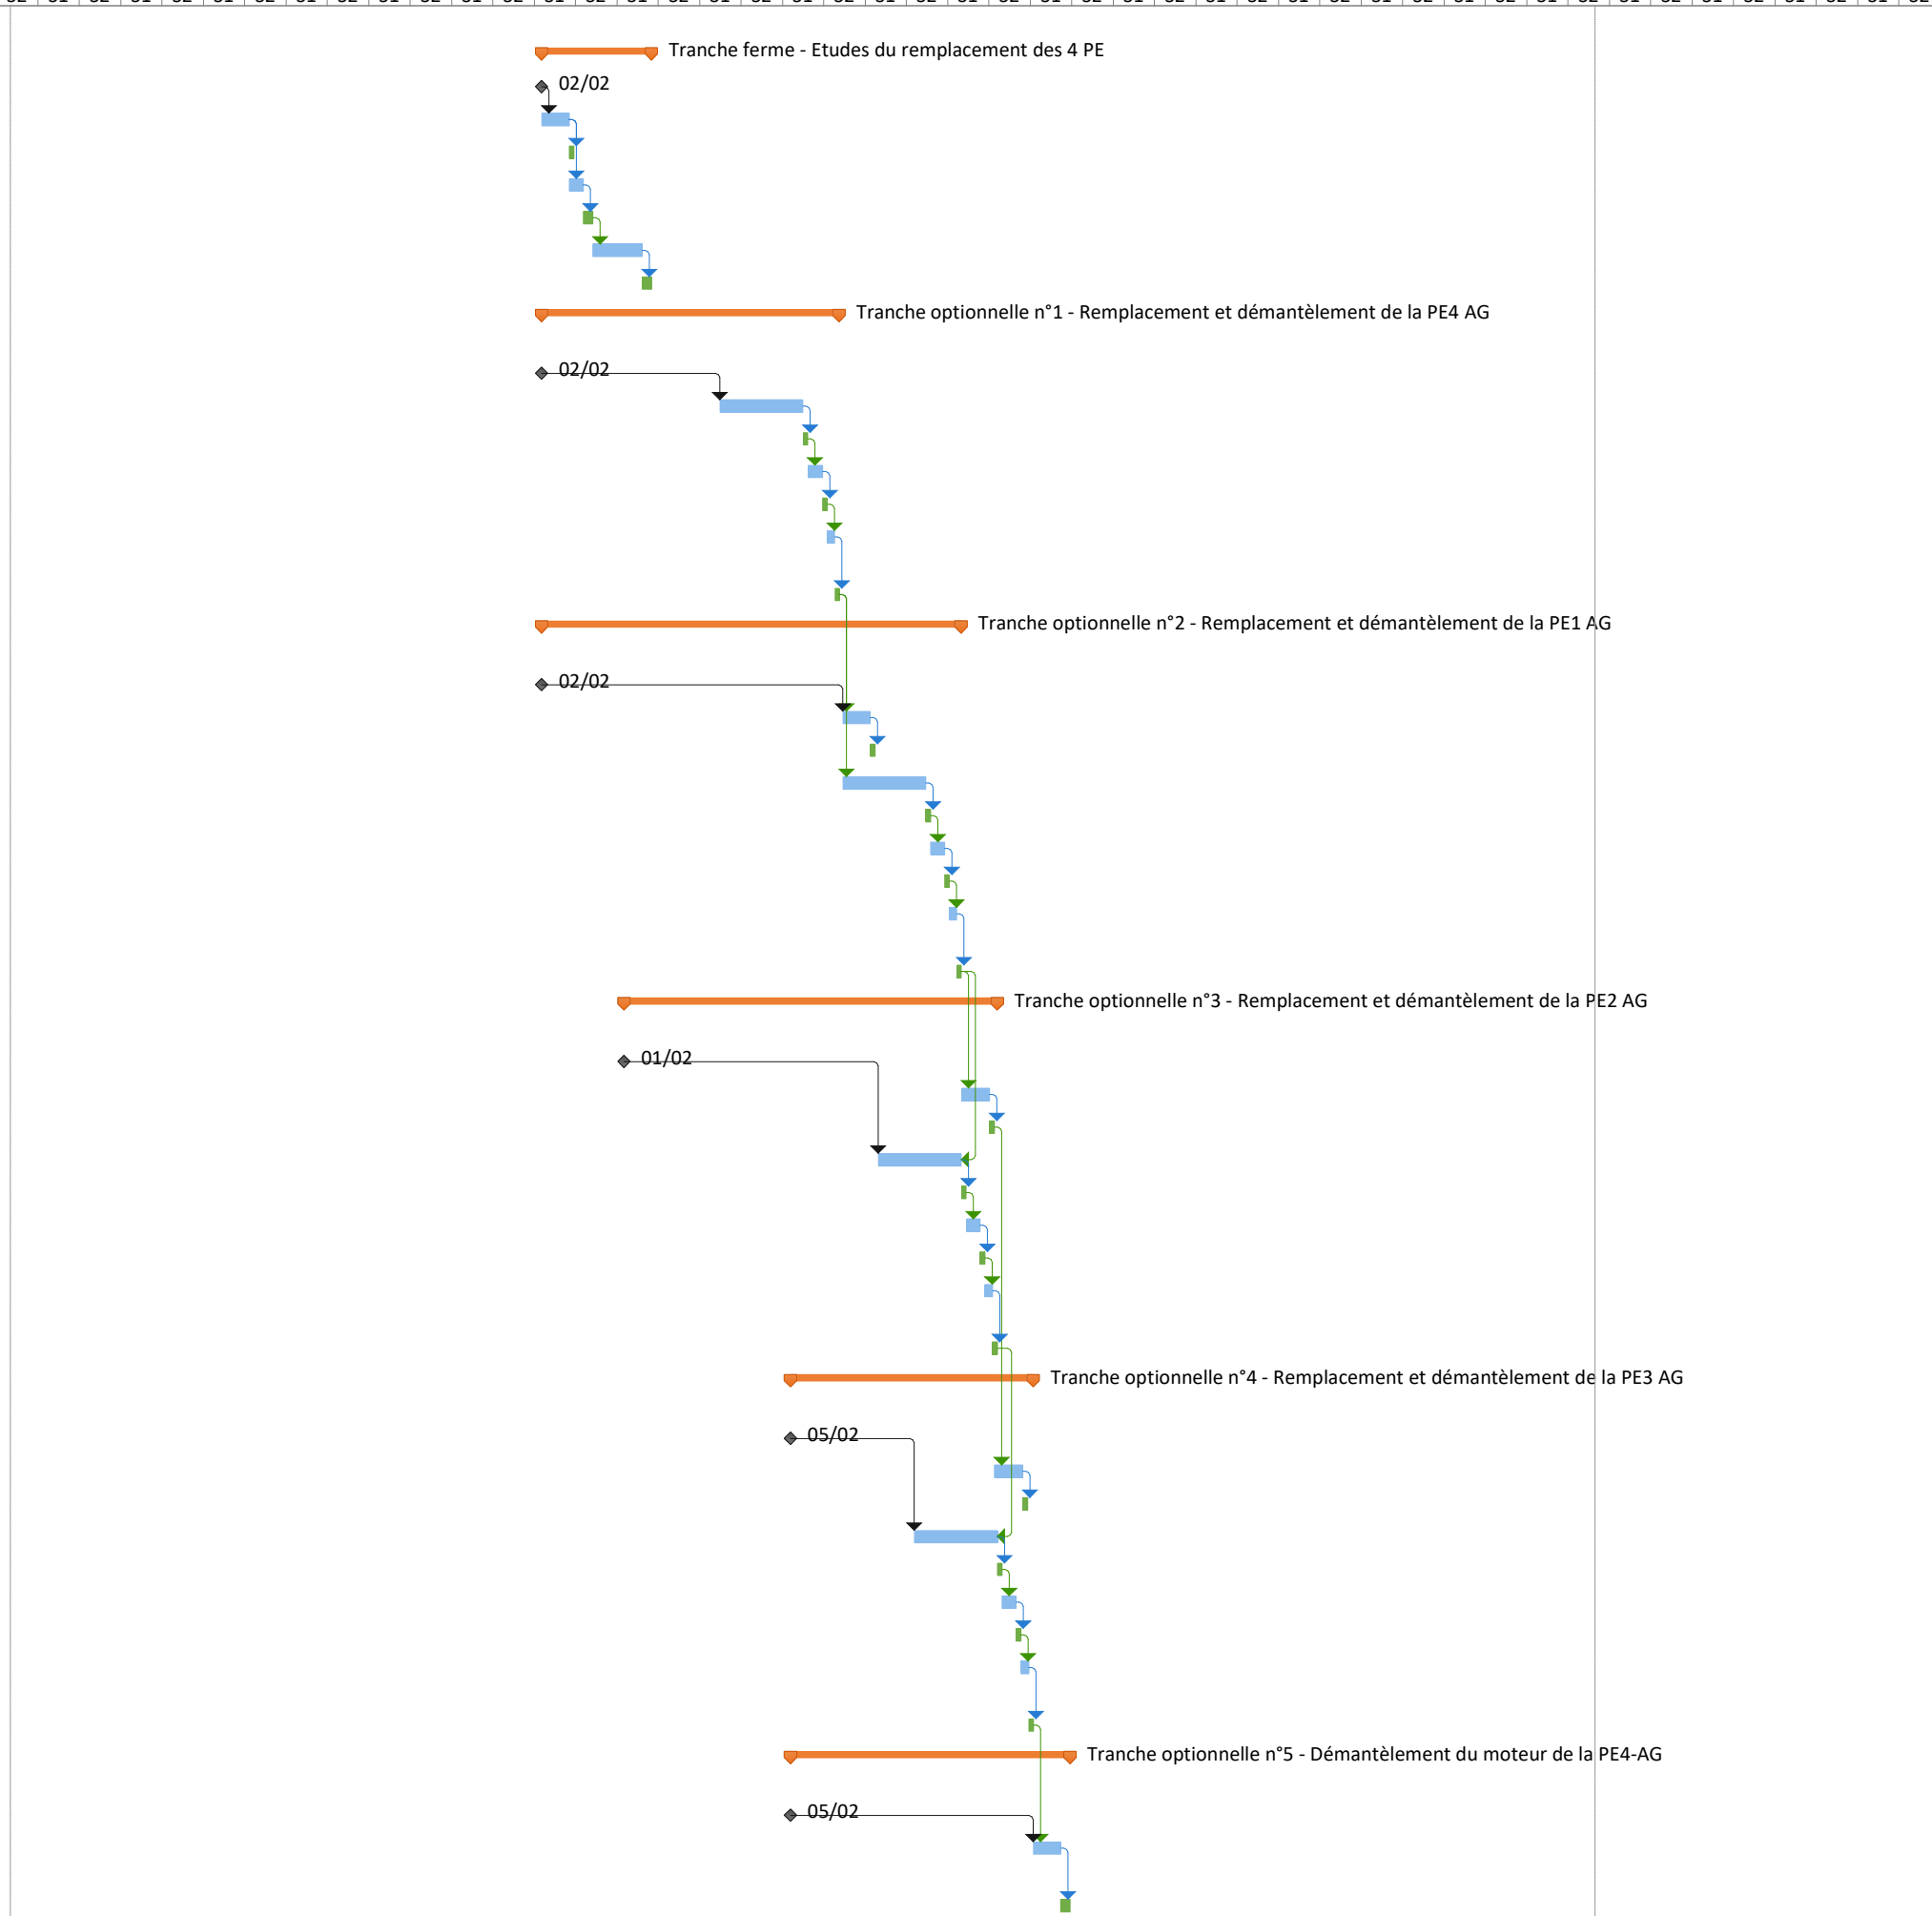


ASB - Marché conception réalisation mur anti-inondation																																
Planning																																
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	19 S2	2020 S1 S2	2021 S1 S2	2022 S1 S2	2023 S1 S2	2024 S1 S2	2025 S1 S2	2026 S1 S2	2027 S1 S2	2028 S1 S2	2029 S1 S2	2030 S1 S2	2031 S1 S2	2032 S1 S2	2033 S1 S2	2034 S1 S2	2035 S1 S2	2036 S1 S2	2037 S1 S2	2038 S1 S2	2039 S1 S2	2040 S1 S2	2041 S1 S2	2042 S1 S2				
1	Exécution marché	3344 jours	Lun 05/01/26	Jeu 28/10/38																												
2	Tranche ferme - Etudes du remplacement des 4 PE	347 jours	Lun 02/02/26	Mar 01/06/27																												
3	Affermissement 1 - Tranche ferme	0 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26																												
4	PT1 - Dépose, transport et valorisation de la PE4 AG	87 jours	Lun 02/02/26	Mar 02/06/26																												
5	Vérification MOA	15 jours	Mer 03/06/26	Mar 23/06/26																												
6	PT2 - Expertise initiale de la PE4	44 jours	Mer 03/06/26	Lun 03/08/26																												
7	Vérification MOA	30 jours	Mar 04/08/26	Lun 14/09/26																												
8	PT3 - Etudes et conceptions des 4 PE	156 jours	Mar 15/09/26	Mar 20/04/27																												
9	Vérification MOA	30 jours	Mer 21/04/27	Mar 01/06/27																												
10	Tranche optionnelle n°1 - Remplacement et démantèlement de la PE4 AG	940 jours	Lun 02/02/26	Ven 07/09/29																												
11	Affermissement 1 - Tranche optionnelle n°1	0 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26																												
12	PT1 - Fabrication, contrôle et essais usine de la PE4	262 jours	Jeu 30/03/28	Ven 30/03/29																												
13	Vérification MOA	15 jours	Lun 02/04/29	Ven 20/04/29																												
14	PT2 - Transport et installation de la PE4	46 jours	Lun 23/04/29	Lun 25/06/29																												
15	Vérification MOA	15 jours	Mar 26/06/29	Lun 16/07/29																												
16	PT3 - Essais de qualification sur site et mise en service, formations, remise du DOE de la PE4	24 jours	Mar 17/07/29	Ven 17/08/29																												
17	Vérification MOA	15 jours	Lun 20/08/29	Ven 07/09/29																												
18	Tranche optionnelle n°2 - Remplacement et démantèlement de la PE1 AG	1325 jours	Lun 02/02/26	Ven 28/02/31																												
19	Affermissement 1 - Tranche optionnelle n°2	0 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26																												
20	PT1 - Dépose, transport et valorisation de la PE1 AG	87 jours	Lun 24/09/29	Mar 22/01/30																												
21	Vérification MOA	15 jours	Mer 23/01/30	Mar 12/02/30																												
22	PT2 - Fabrication, contrôle et essais usine de la PE1	262 jours	Lun 24/09/29	Mar 24/09/30																												
23	Vérification MOA	15 jours	Mer 25/09/30	Mar 15/10/30																												
24	PT3 - Transport et installation de la PE1	44 jours	Mer 16/10/30	Lun 16/12/30																												
25	Vérification MOA	15 jours	Mar 17/12/30	Lun 06/01/31																												
26	PT4 - Essais de qualification sur site et mise en service, formations, remise du DOE de la PE1	24 jours	Mar 07/01/31	Ven 07/02/31																												
27	Vérification MOA	15 jours	Lun 10/02/31	Ven 28/02/31																												
28	Tranche optionnelle n°3 - Remplacement et démantèlement de la PE2 AG	1178 jours	Lun 01/02/27	Mer 06/08/31																												
29	Affermissement 2 - Tranche optionnelle n°3	0 jour	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27																												
30	PT1 - Dépose, transport et valorisation de la PE2 AG	89 jours	Lun 03/03/31	Jeu 03/07/31																												
31	Vérification MOA	15 jours	Ven 04/07/31	Jeu 24/07/31																												
32	PT2 - Fabrication, contrôle et essais usine de la PE2	263 jours	Mer 27/02/30	Ven 28/02/31																												
33	Vérification MOA	15 jours	Lun 03/03/31	Ven 21/03/31																												
34	PT3 - Transport et installation de la PE2	44 jours	Lun 24/03/31	Jeu 22/05/31																												
35	Vérification MOA	15 jours	Ven 23/05/31	Jeu 12/06/31																												
36	PT4 - Essais de qualification sur site et mise en service, formations, remise du DOE de la PE2	24 jours	Ven 13/06/31	Mer 16/07/31																												
37	Vérification MOA	15 jours	Jeu 17/07/31	Mer 06/08/31																												
38	Tranche optionnelle n°4 - Remplacement et démantèlement de la PE3 AG	766 jours	Lun 05/02/29	Lun 12/01/32																												
39	Affermissement 3 - Tranche optionnelle n°4	0 jour	Lun 05/02/29	Lun 05/02/29																												
40	PT1 - Dépose, transport et valorisation de la PE3 AG	89 jours	Ven 25/07/31	Mer 26/11/31																												
41	Vérification MOA	15 jours	Jeu 27/11/31	Mer 17/12/31																												
42	PT2 - Fabrication, contrôle et essais usine de la PE3	263 jours	Lun 05/08/30	Mer 06/08/31																												
43	Vérification MOA	15 jours	Jeu 07/08/31	Mer 27/08/31																												
44	PT3 - Transport et installation de la PE3	44 jours	Jeu 28/08/31	Mar 28/10/31																												
45	Vérification MOA	15 jours	Mer 29/10/31	Mar 18/11/31																												
46	PT4 - Essais de qualification sur site et mise en service, formations, remise du DOE de la PE3	24 jours	Mer 19/11/31	Lun 22/12/31																												
47	Vérification MOA	15 jours	Mar 23/12/31	Lun 12/01/32																												
48	Tranche optionnelle n°5 - Démantèlement du moteur de la PE4-AG	883 jours	Lun 05/02/29	Mer 23/06/32																												
49	Affermissement 3 - Tranche optionnelle n°4	0 jour	Lun 05/02/29	Lun 05/02/29																												
50	PT1 - Dépose, transport et valorisation du moteur de la PE4-AG	87 jours	Mar 13/01/32	Mer 12/05/32																												
51	Vérification MOA	30 jours	Jeu 13/05/32	Mer 23/06/32																												
