



Phase chantier : 1
Période : du 04/01/27 au 29/01/2
Piste : ouverte

Sous phase : 1.01
Action :


**Matérialisation de la limite à ne pas dépasser
10m à l'arrière des antennes**



Phase chantier : 1
Période : du 04/01/27 au 29/01/2
Piste : ouverte


Sous phase : 1.02
Action :

sciage et déconstruction dalle « perdue » 28mx4m
et déconstruction d'une partie de la voie de service

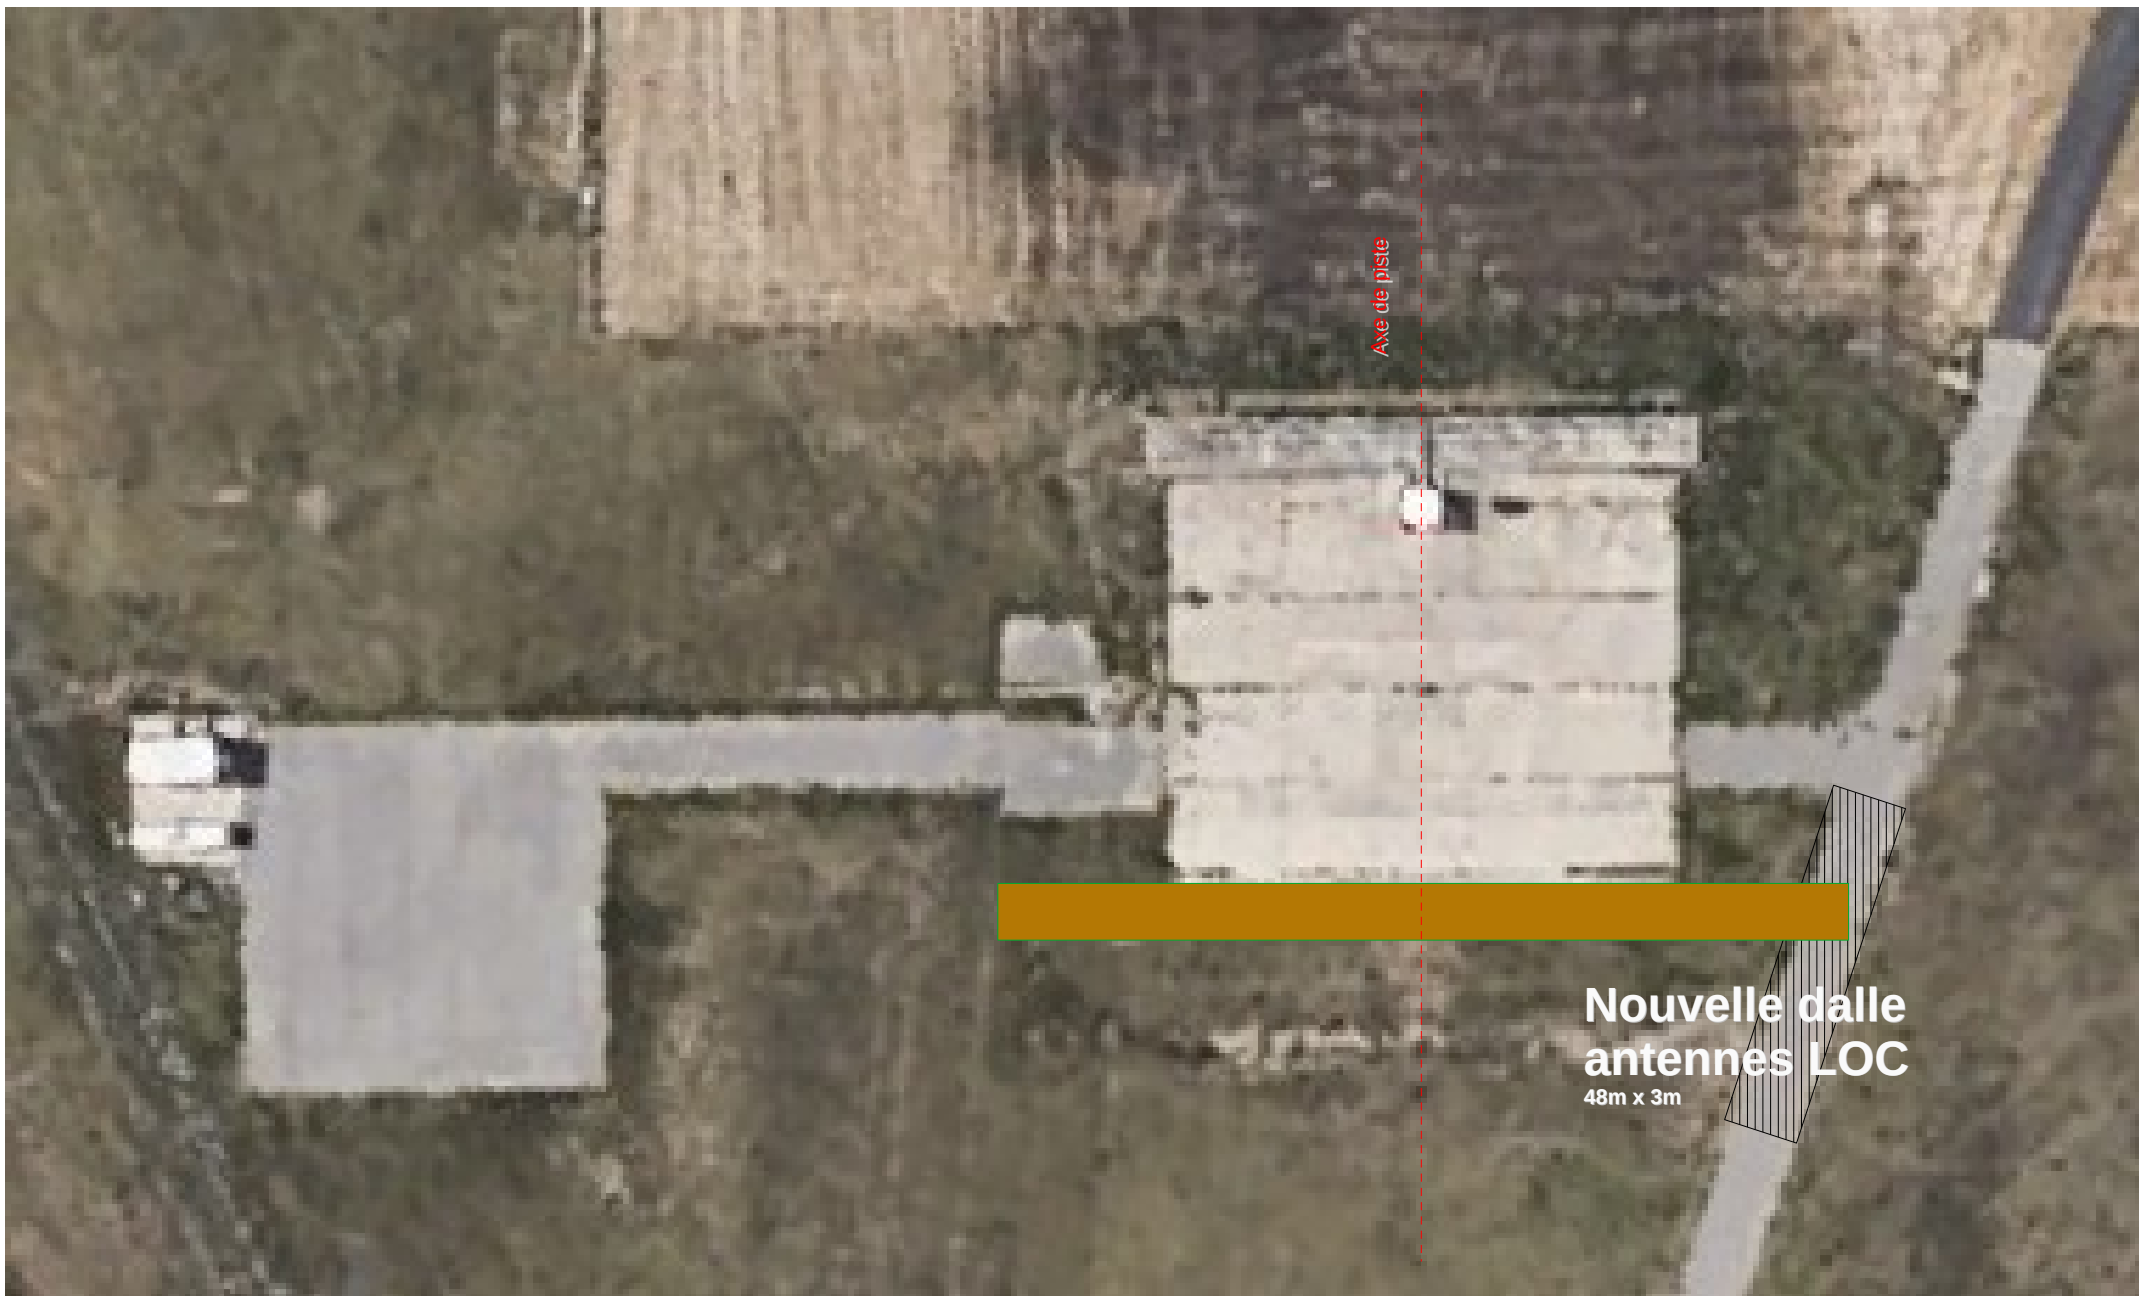

Phase chantier : 1
Période : du 04/01/27 au 29/01/2
Piste : ouverte

Sous phase : 1.03
Action :
terrassement nouvelle dalle antennes LOC

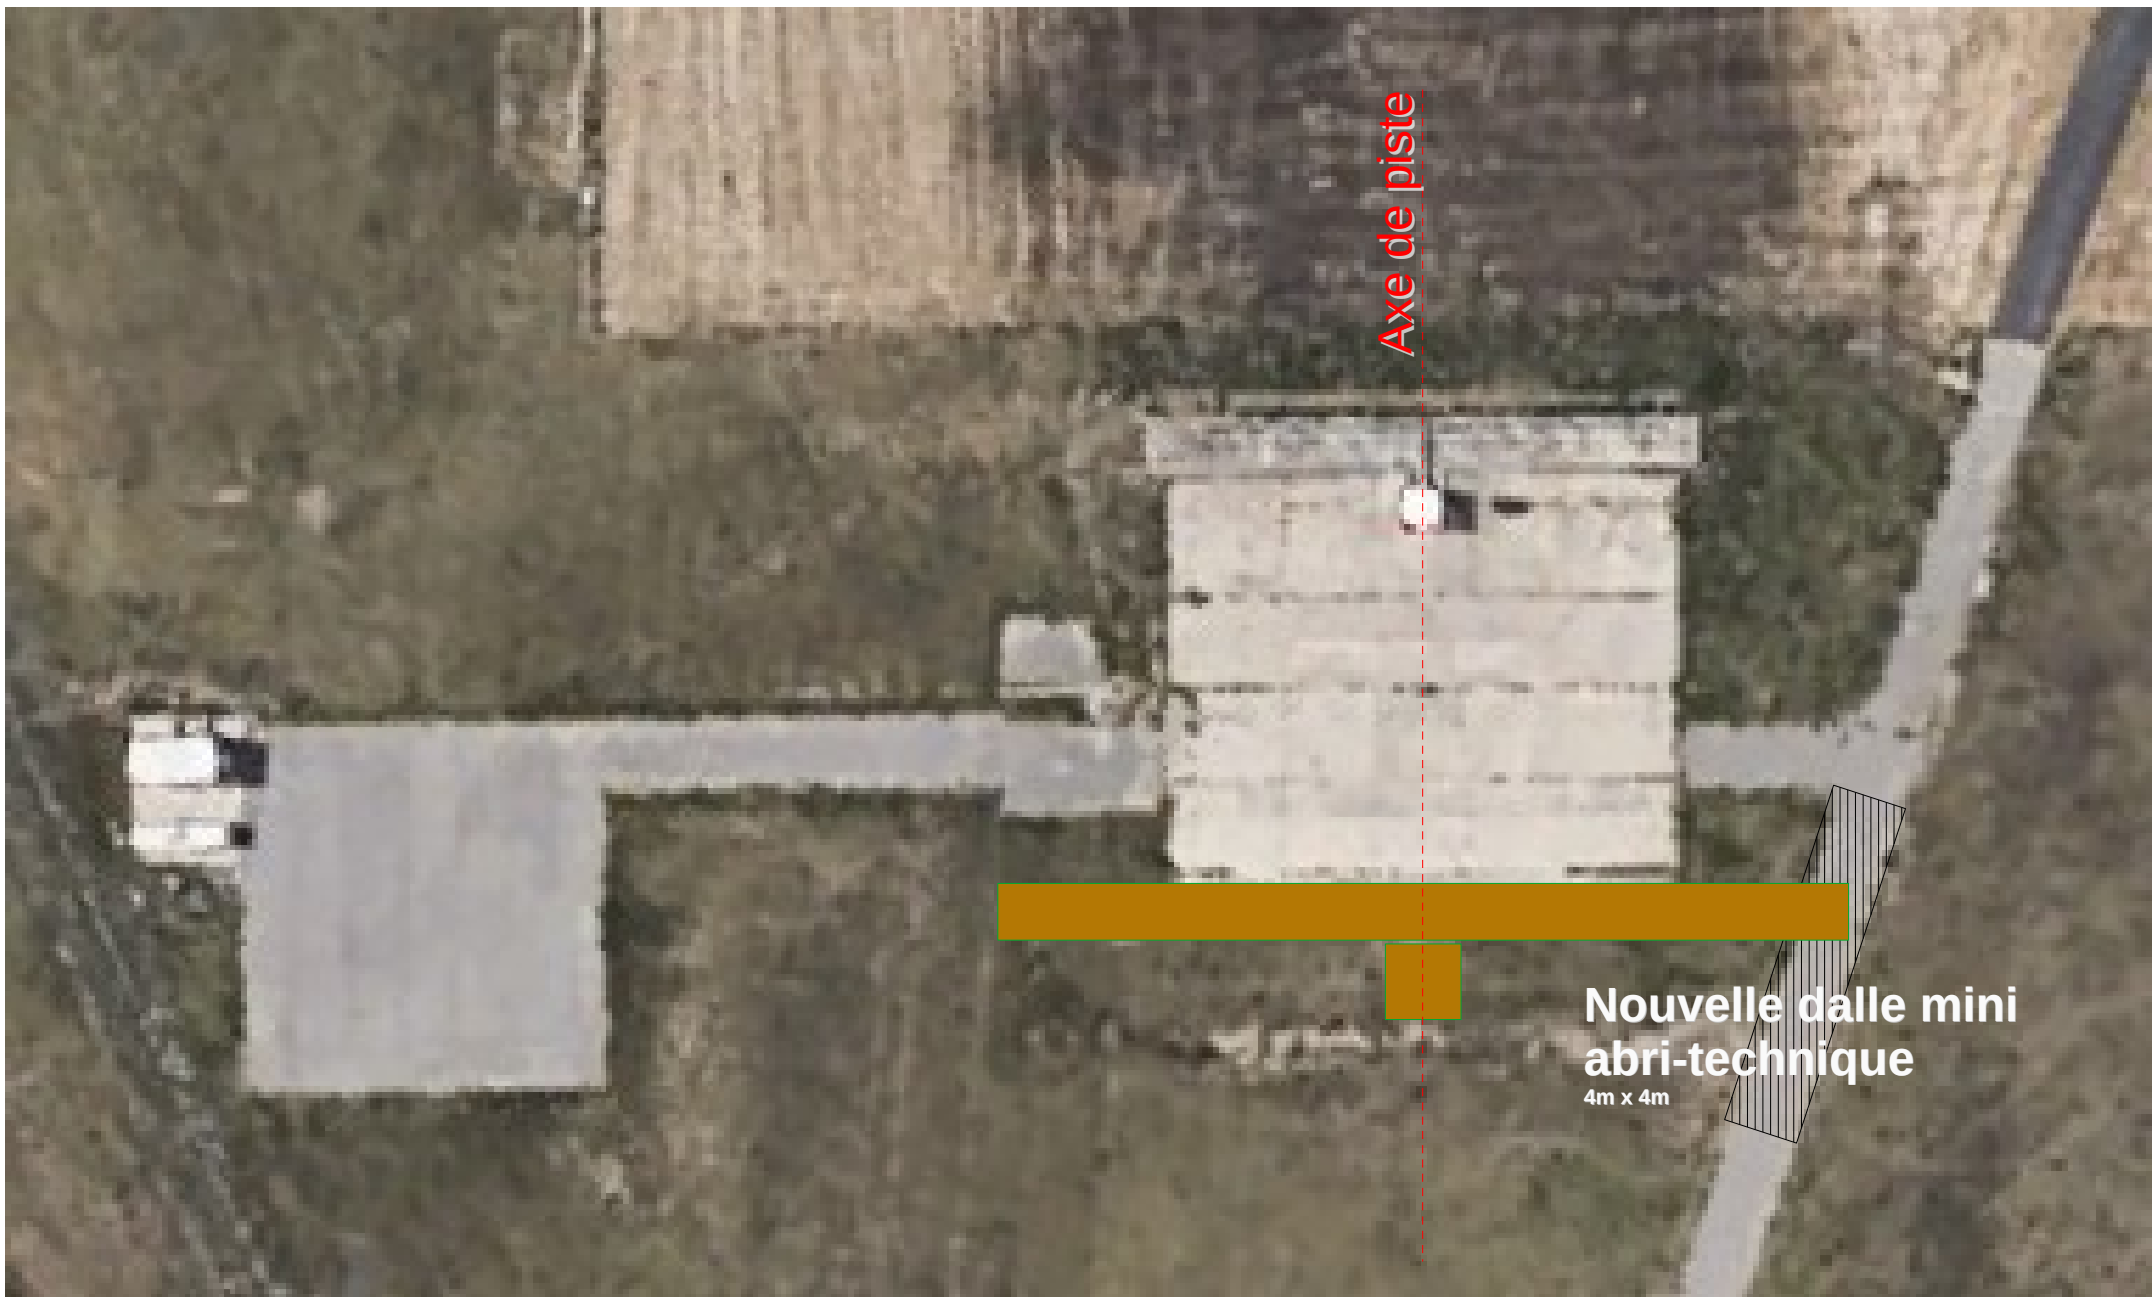

Phase chantier : 1

Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.04

Action :

Terrassement nouvelle dalle miniabri technique
LOC



Phase chantier : 1


Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.05


Action :

Terrassement nouvelle dalle abri technique LOC

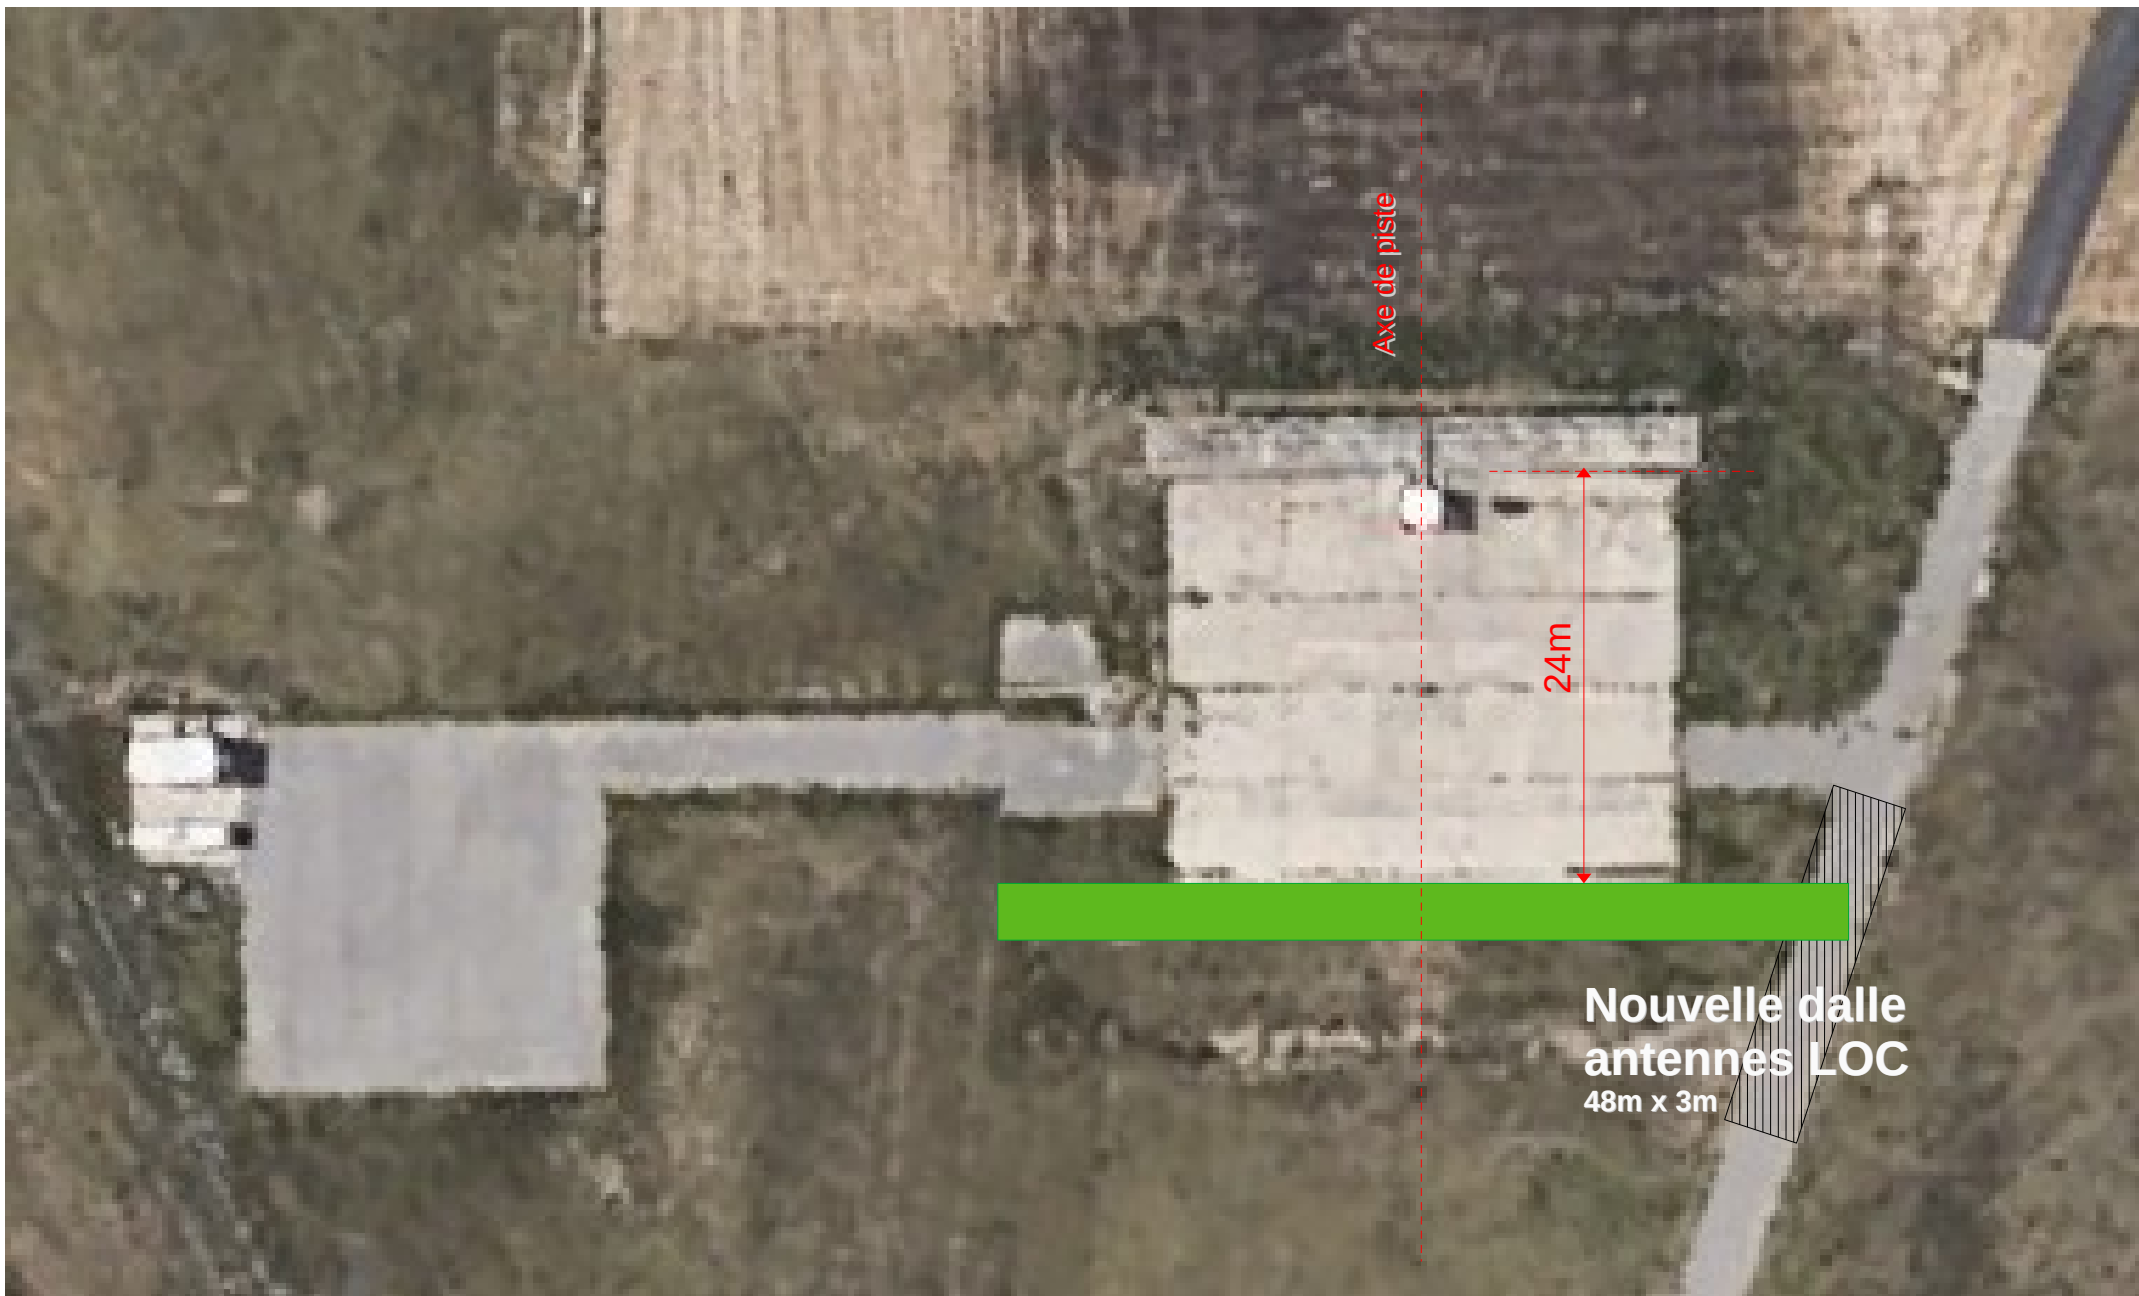

Phase chantier : 1
Période : du 04/01/27 au 29/01/2
Piste : ouverte

Sous phase : 1.06
Action :
Création de la nouvelle dalle antennes LOC
48m x 3m x 0,4m

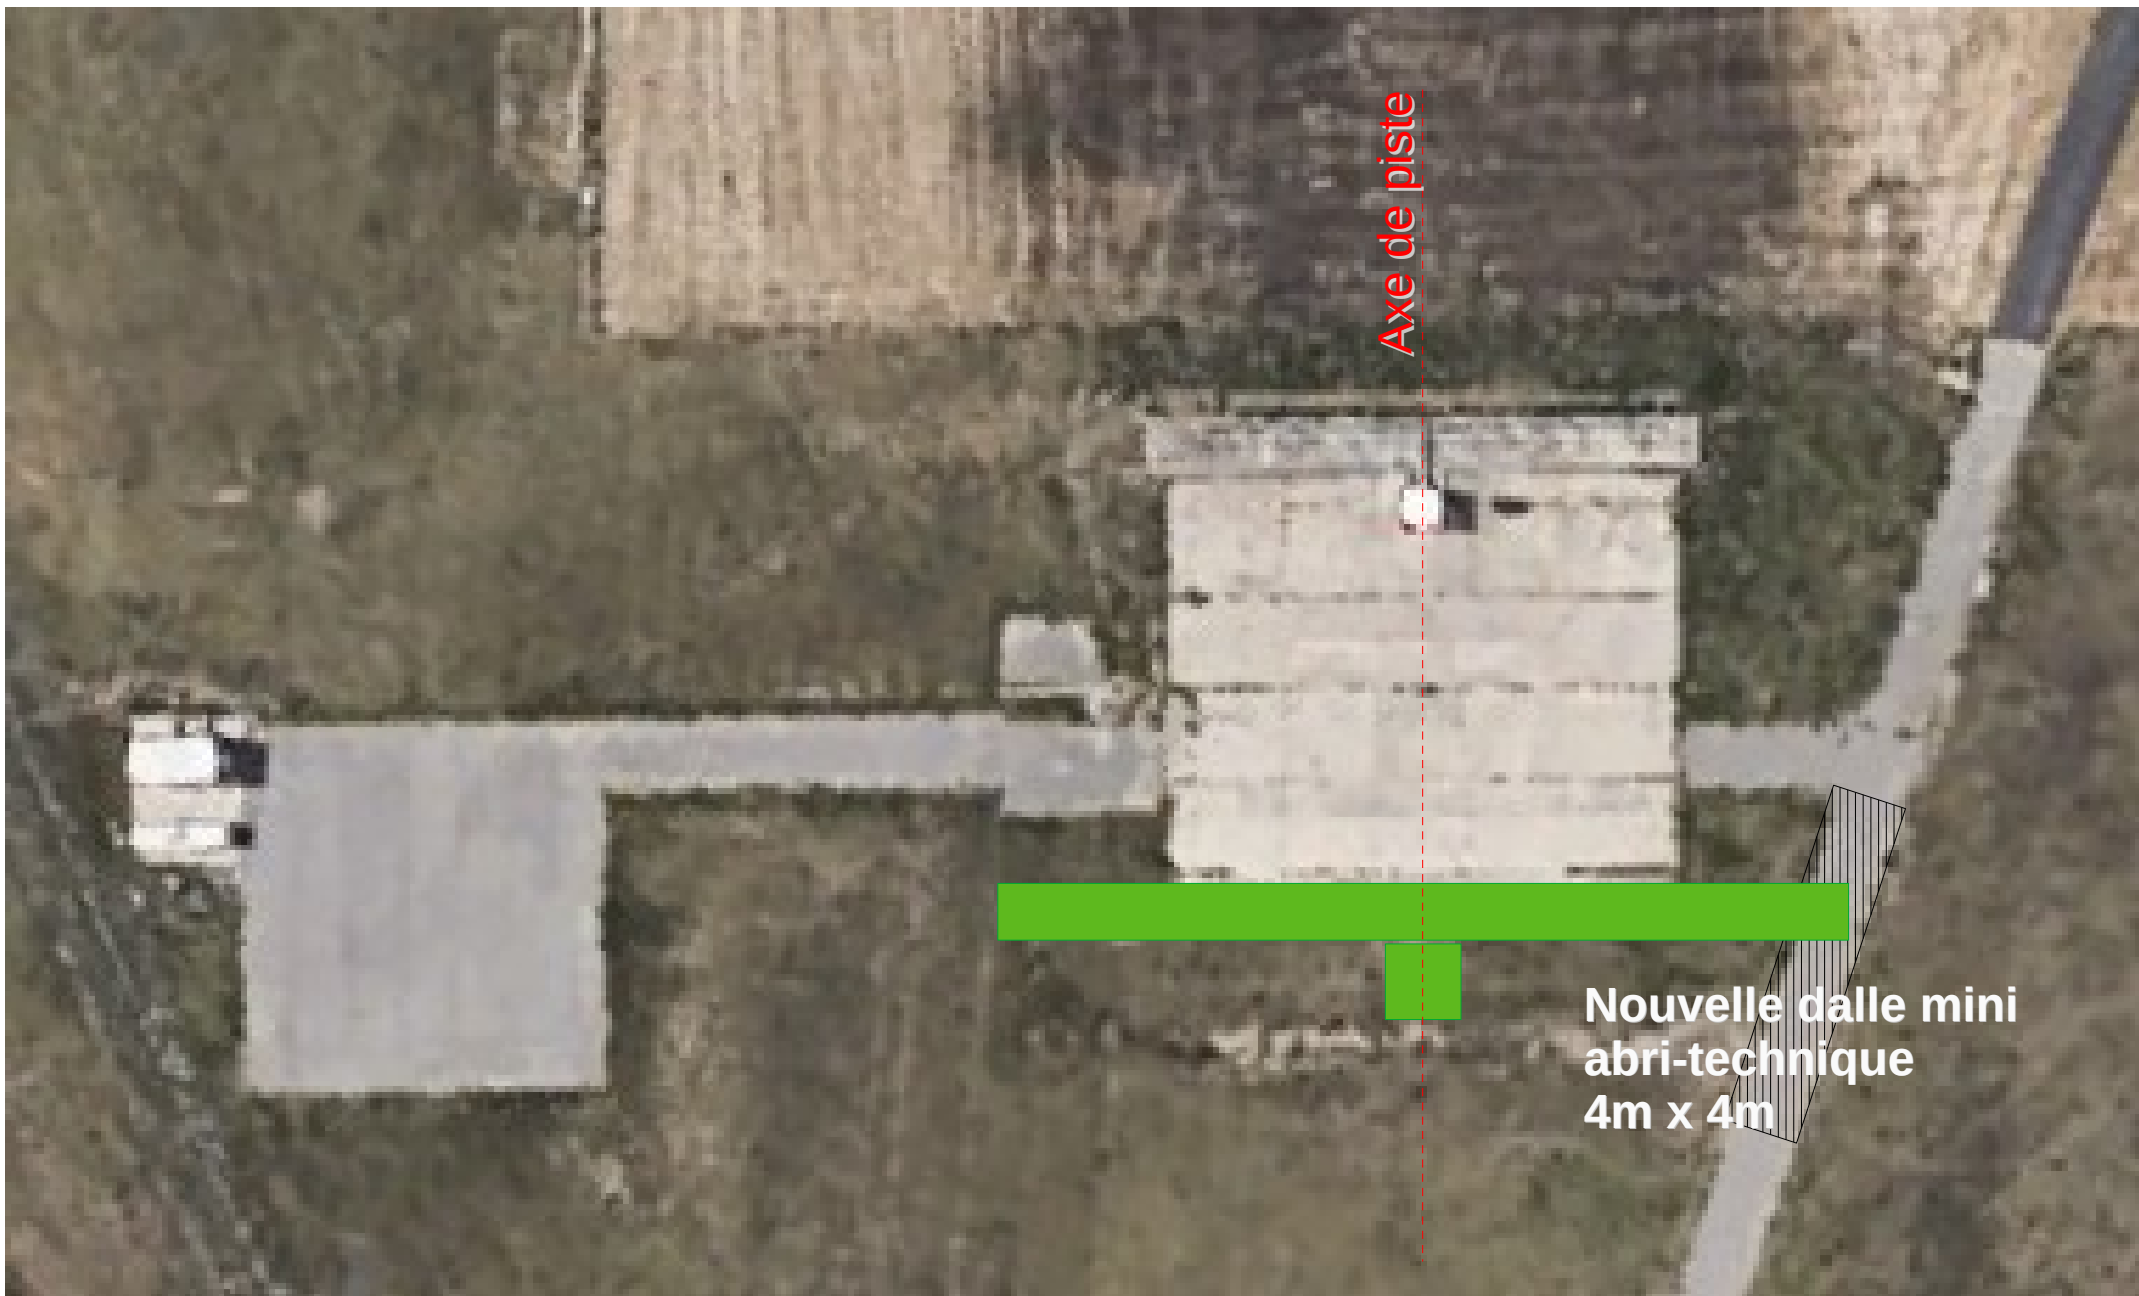

Phase chantier : 1

Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.07

Action :

Création de la nouvelle dalle miniabri technique
LOC 4m x 4m x 0,2m



Phase chantier : 1


Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.08

Action :

Création de la nouvelle dalle abri technique LOC
8m x 4m x 0,2m

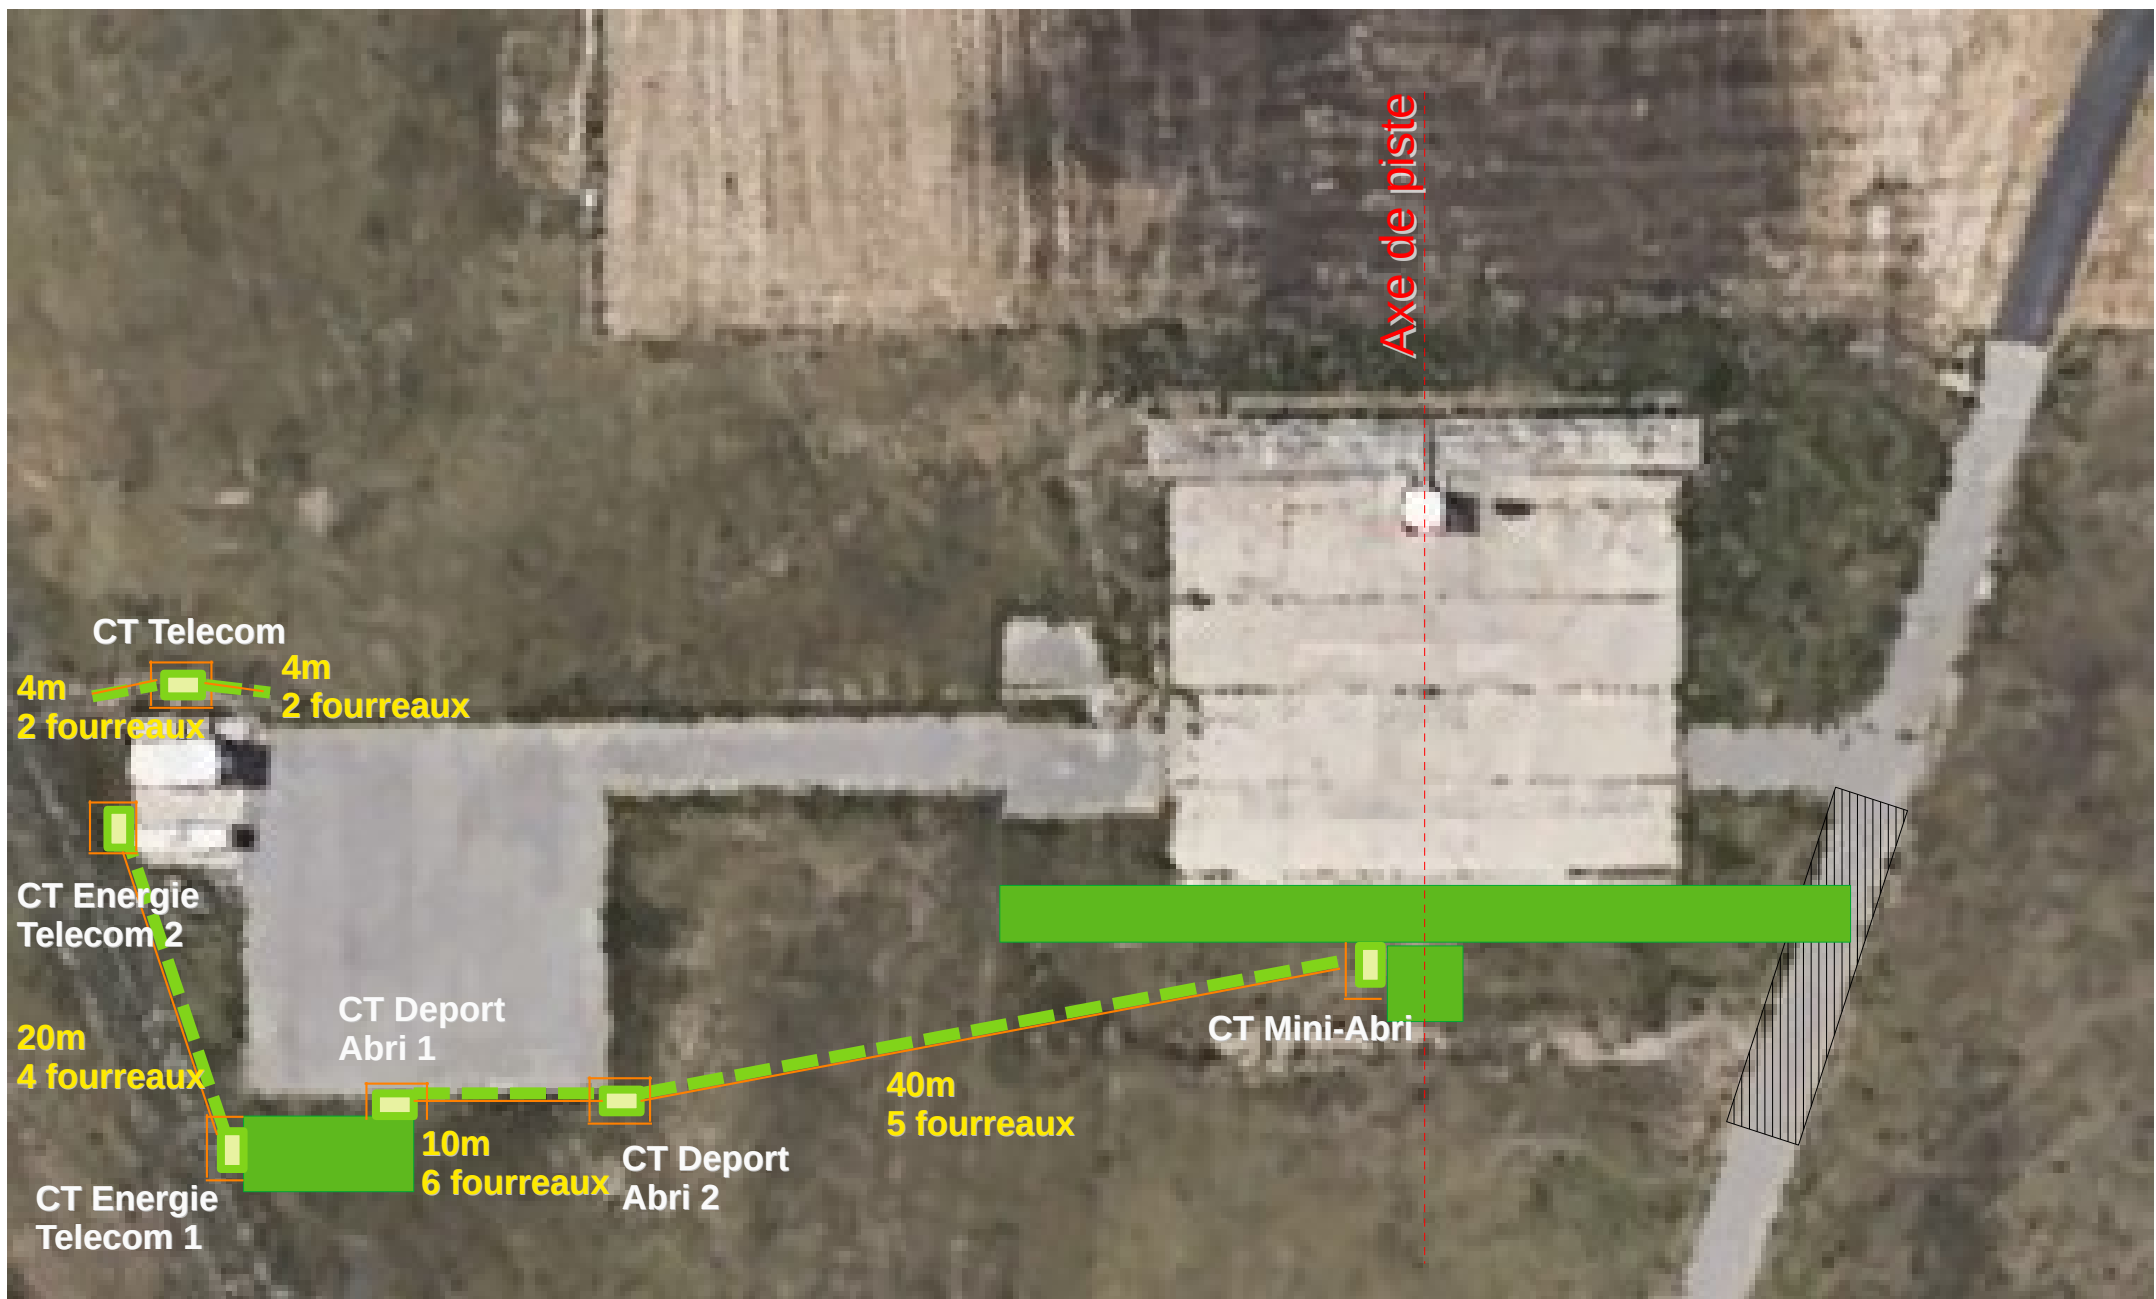

Phase chantier : 1

Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.09

Action :

Tranchées, fourreaux, regards, chambres de tirage, protection foudre



Phase chantier : 1


Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.10

Action :

Terrassement et pose protection foudre

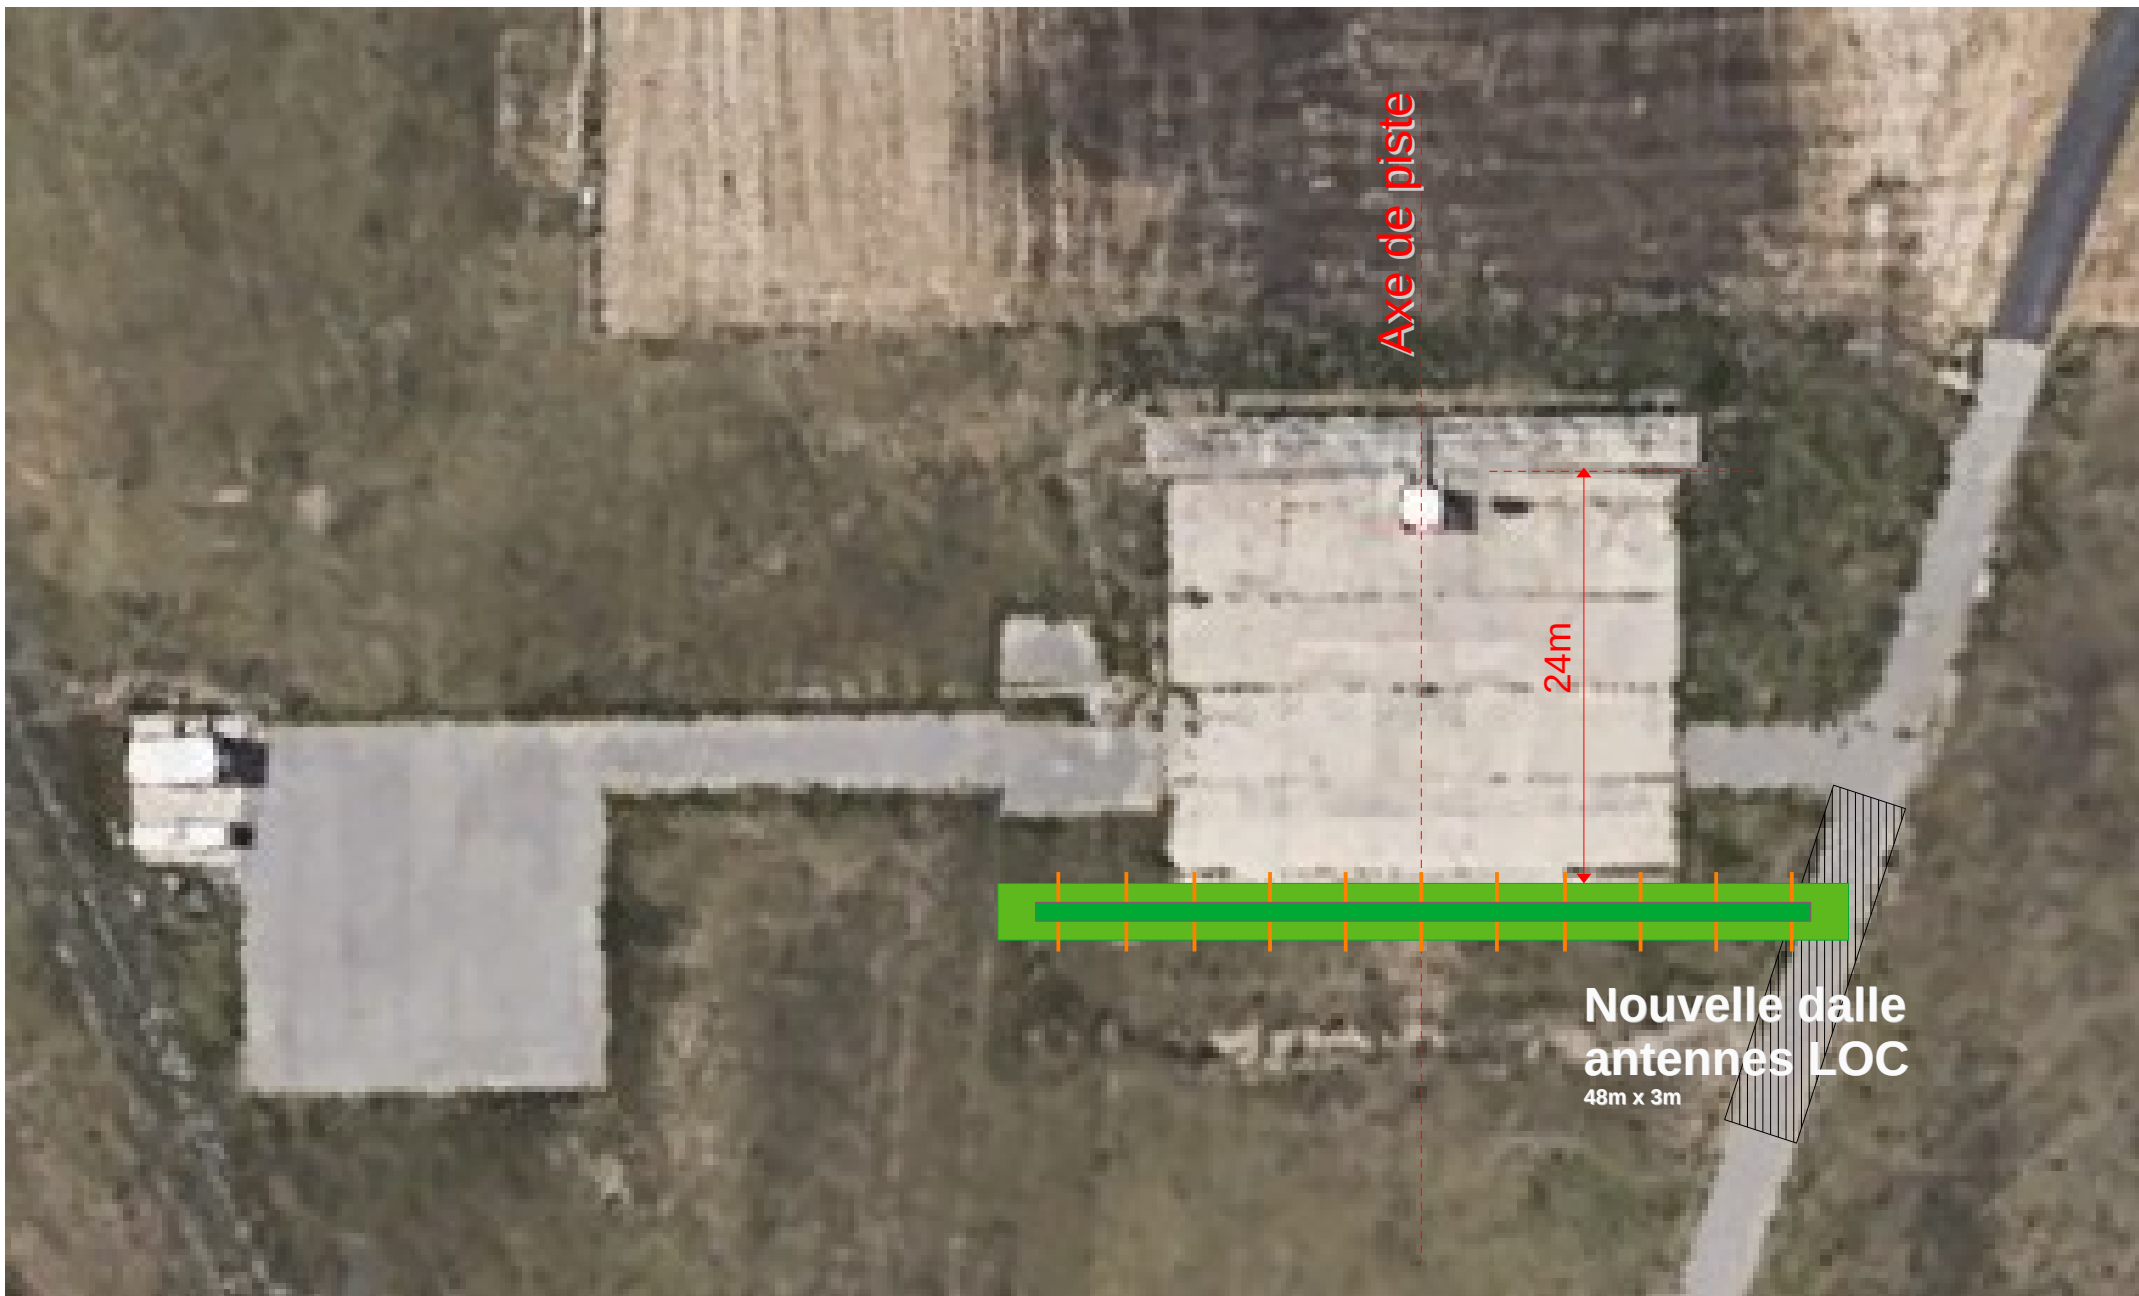

Phase chantier : 1
Période : du 04/01/27 au 29/01/2
Piste : ouverte

Sous phase : 1.11
Action :

Pose/attentes protection foudre pour les futures antennes



Phase chantier : 1

Période : du 04/01/27 au 29/01/2

Piste : ouverte

Sous phase : 1.12

Action :

Mise en œuvre de grave compacté



**Chemin d'accès
3.5m de large**

Nouveau chemin d'accès



Phase chantier : 4
Période : du 30/03/27 au 28/04/27
Piste : fermée

Sous phase : 4.01
Action :
Évacuation des anciens équipements LOC + abri technique Glide



Phase chantier : 4

Période : du 30/03/27 au 28/04/27

Piste : fermée

Sous phase : 4.02

Action :

Destruction et sciage ancienne dalle abri technique



Phase chantier : 4
Période : du 30/03/27 au 28/04/27
Piste : fermée

Sous phase : 4.03
Action :

Tranchées, fourreaux, regards, chambres de tirage, protection foudre




Phase chantier : 4

Période : du 30/03/27 au 28/04/27

Piste : fermée

Sous phase : 4.04

Action : terrassement dalle antennes champ proche

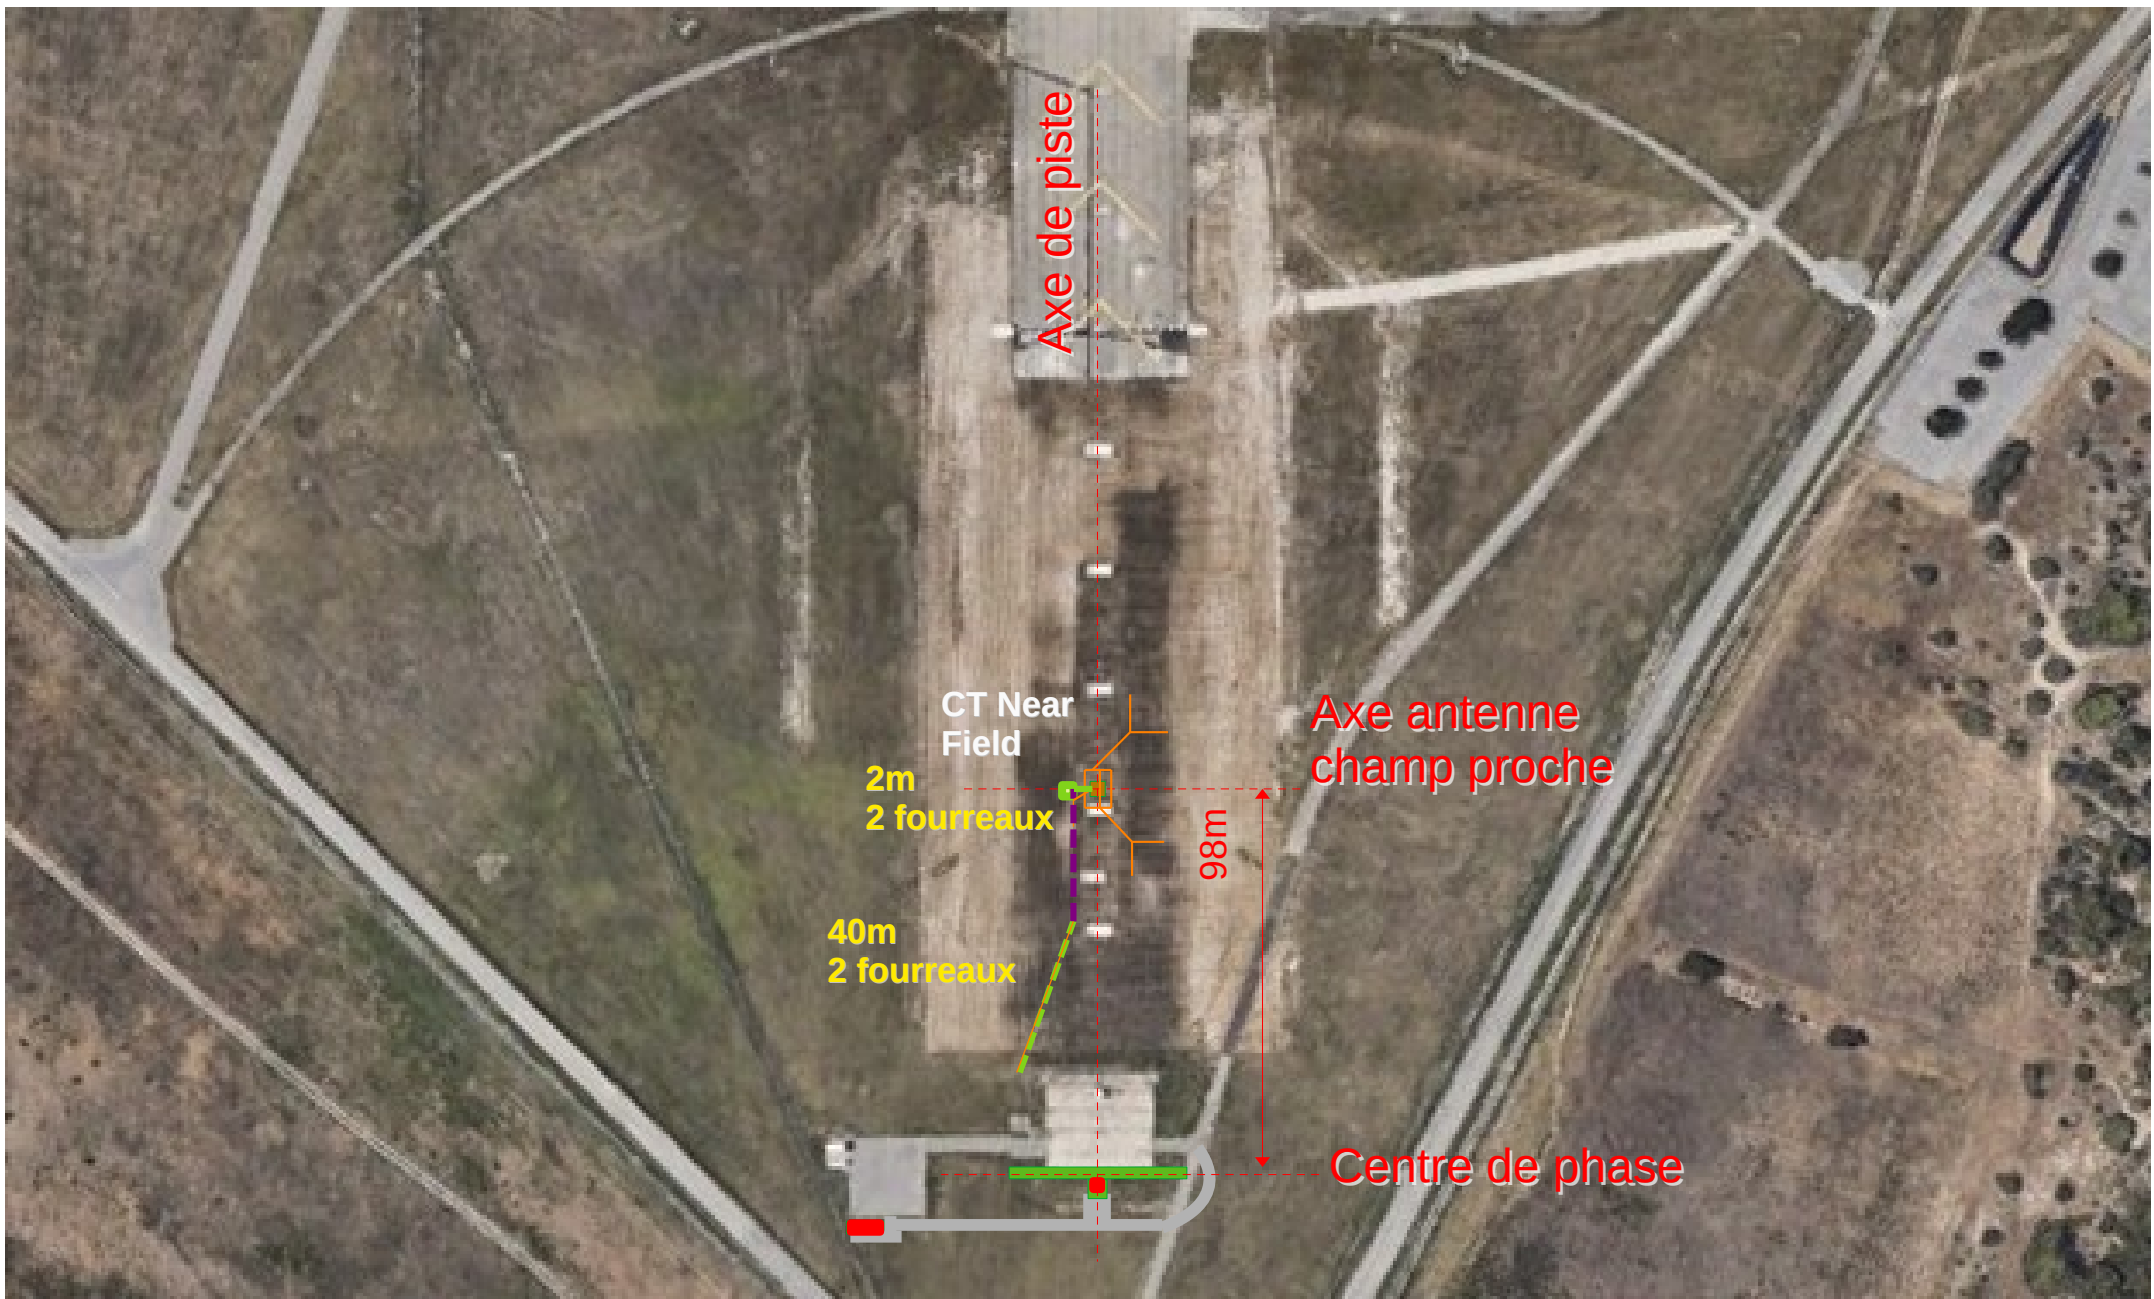

Phase chantier : 4

Période : du 30/03/27 au 28/04/27

Piste : fermée

Sous phase : 4.05

Action : terrassement et pose protection foudre antenne champ proche. Création chambre K1C au droit des fourreaux existants. Tranchées, fourreaux, protection foudre entre chambres existantes




Phase chantier : 4

Période : du 30/03/27 au 28/04/27

Piste : fermée

Sous phase : 4.06

Action : Création de la nouvelle dalle antenne champ proche 1m x 1m x 0,2m

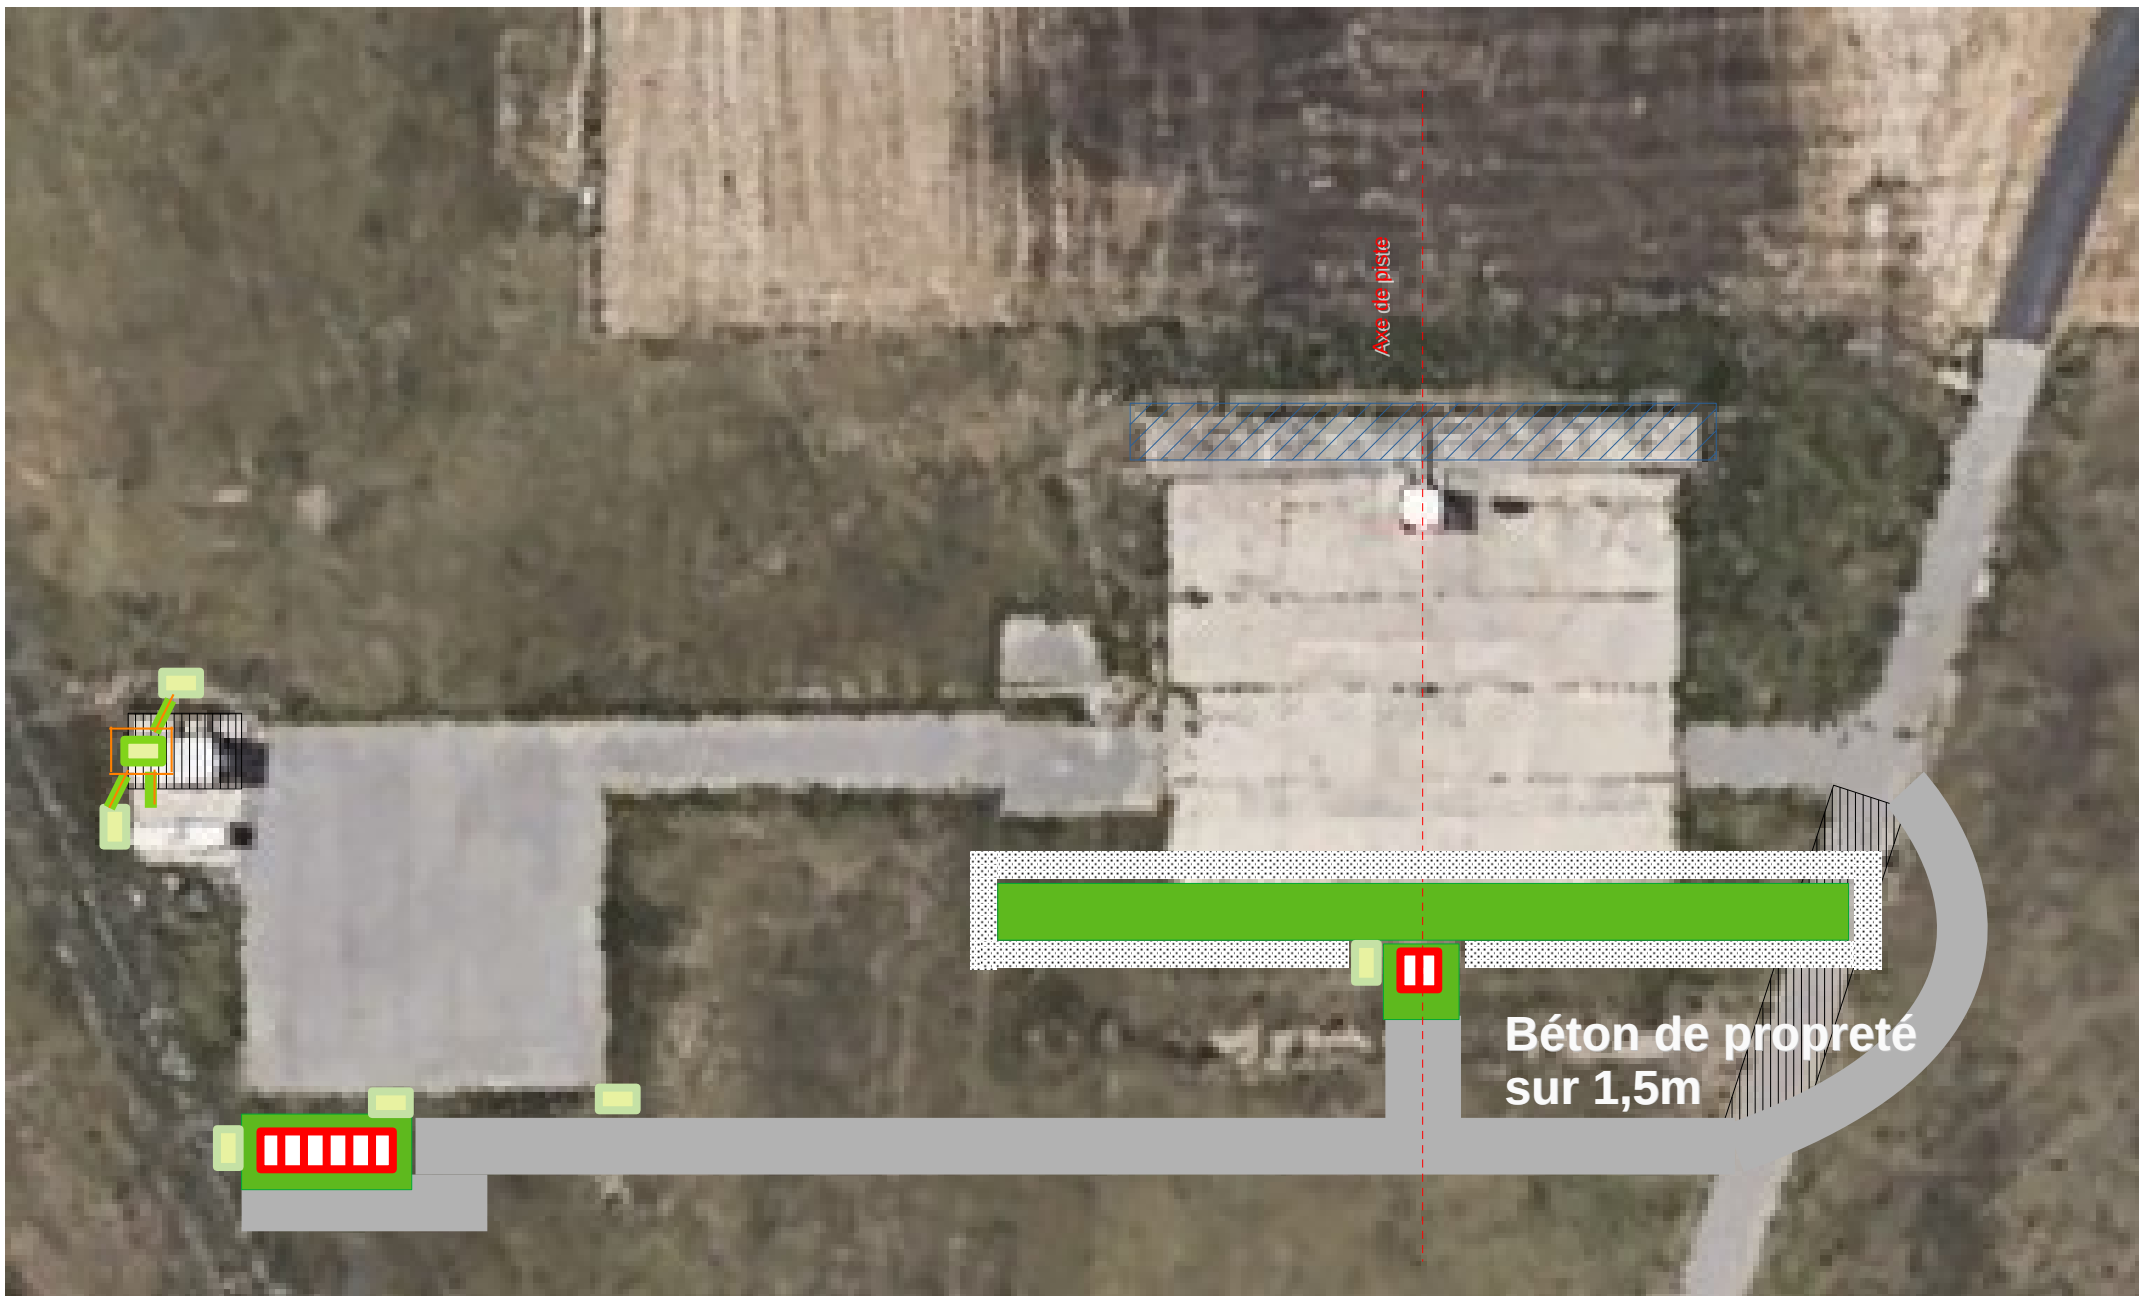

Phase chantier : 4
Période : du 30/03/27 au 28/04/27
Piste : fermée

Sous phase : 4.07
Action :
Béton de propreté



Phase chantier : 4

Période : du 30/03/27 au 28/04/27

Piste : fermée

Sous phase : 4.08

Action :

Destruction dalle existante Antennes LOC,



Phase chantier : 4
Période : du 30/03/27 au 28/04/27
Piste : fermée

Sous phase : 4.09

Action : Rénovation de la rose de mesure du IOC 13L et du LOC 31R
