


PRÉSENTATION DU PHASAGE

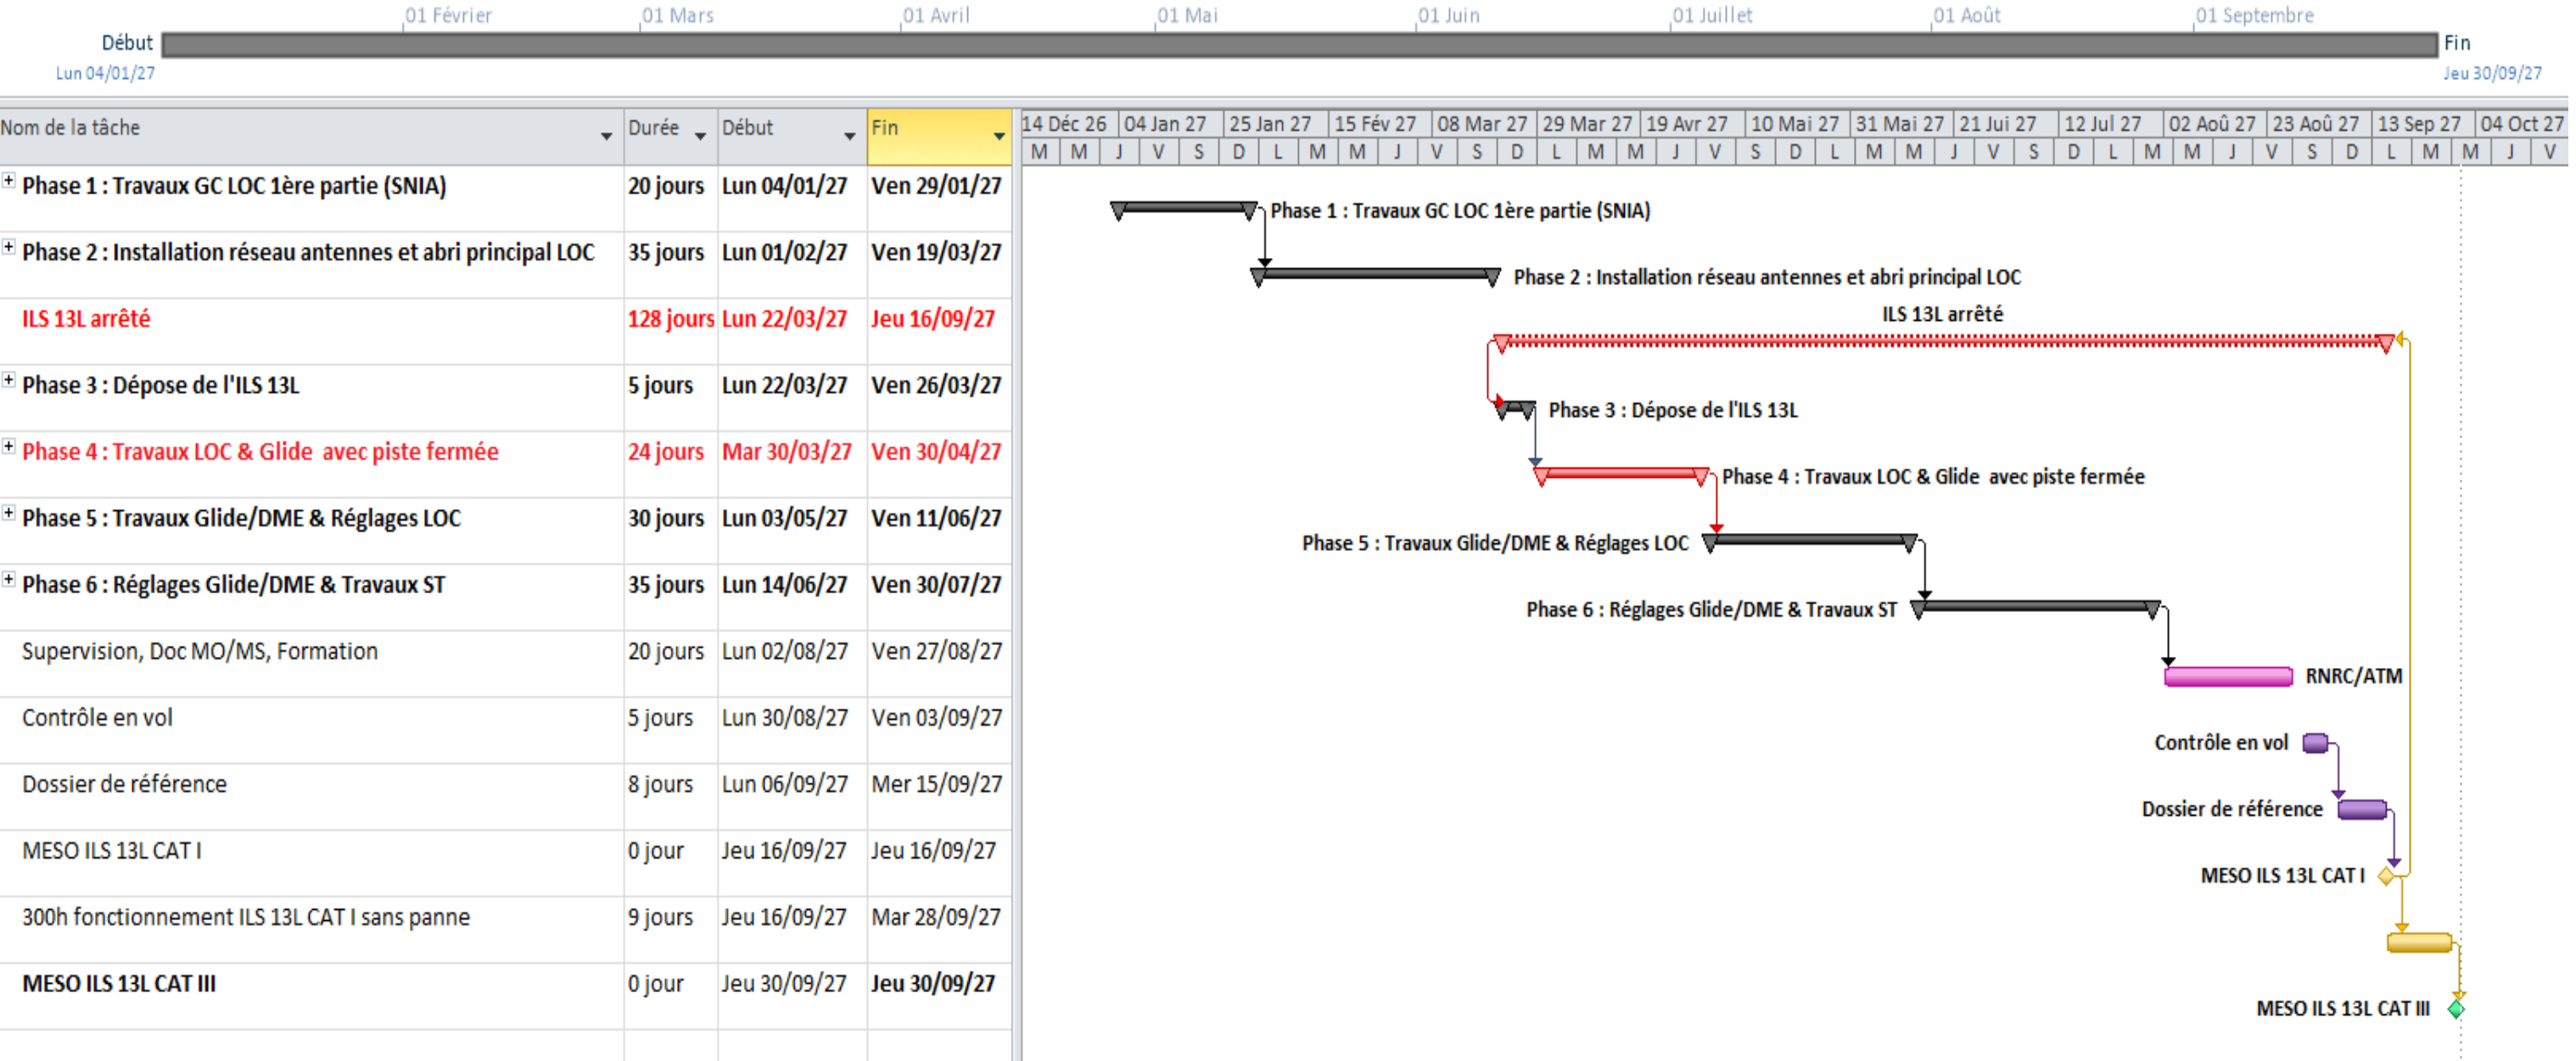


LÉGENDE :

- Travaux au LOC 13L
- Travaux au Glide/DME 13L
- Travaux multisites
- Travaux au LOC 31R
- Travaux au bloc technique


Les travaux avec camion grue ou nacelle automotrice sont indiqués en orange

PHASES 1 ET 2 : TRAVAUX AU LOC 13L, AVANT ARRÊT DE L'ILS 13L

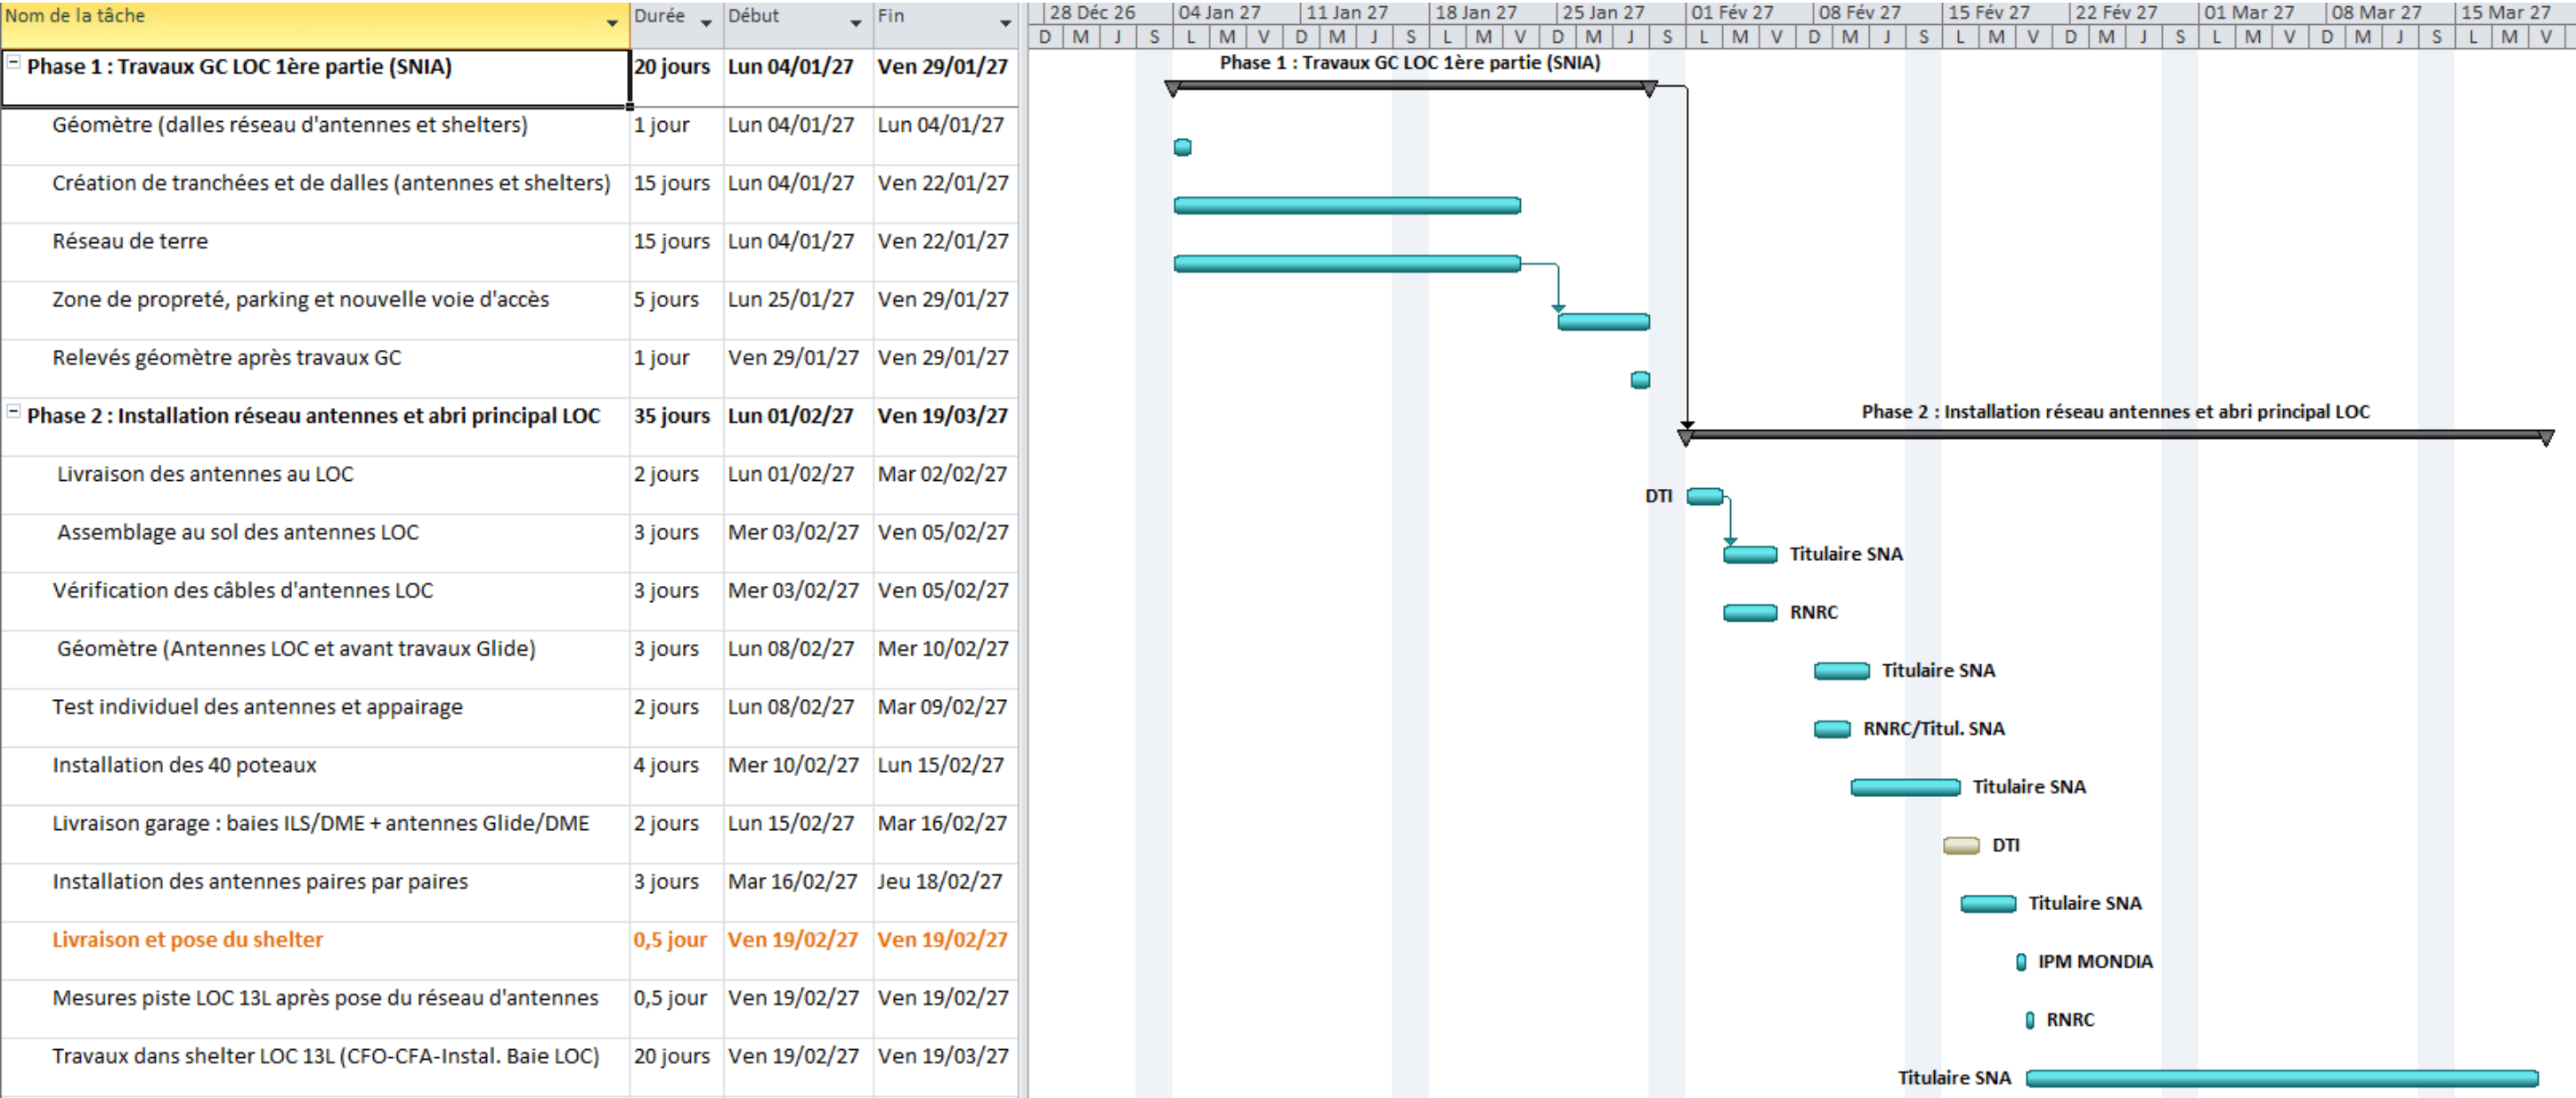

PHASE 3 : TRAVAUX AU LOC 13L ET AU GLIDE 13L, APRÈS ARRÊT DE L'ILS 13L


Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	1ar 27							22 Mar 27							29 Mar 27		
				M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
ILS 13L arrêté	128 jours	Lun 22/03/27	Jeu 16/09/27																	
Phase 3 : Dépose de l'ILS 13L	5 jours	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27																	
Raccordement fibre optique LOC (provisoire)	1 jour	Lun 22/03/27	Lun 22/03/27																	
Dépose des équipements du shelter LOC	1 jour	Lun 22/03/27	Lun 22/03/27																	
Récupération des climatiseurs Glide	1 jour	Lun 22/03/27	Lun 22/03/27																	
Raccordement fibre optique Glide (provisoire)	1 jour	Mar 23/03/27	Mar 23/03/27																	
Récupération des climatiseurs LOC	1 jour	Mar 23/03/27	Mar 23/03/27																	
Dépose des équipements du shelter et du mât Glide	2 jours	Mar 23/03/27	Mer 24/03/27																	
Piquetage pipeline + Réunion DICT Glide	1 jour	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27																	
Dépose du moniteur lointain	0,5 jour	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27																	
Dépose des batteries LOC, Glide, DME et ML	1 jour	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27																	
Dépose des équipements du mini abri LOC	0,5 jour	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27																	
Consignation LOC 13L et Glide 13L	0,5 jour	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27																	
Préparation enlèvement des shelters LOC et Glide	1 jour	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27																	
Phase 4 : Travaux LOC & Glide avec piste fermée	24 jours	Mar 30/03/27	Ven 30/04/27																	

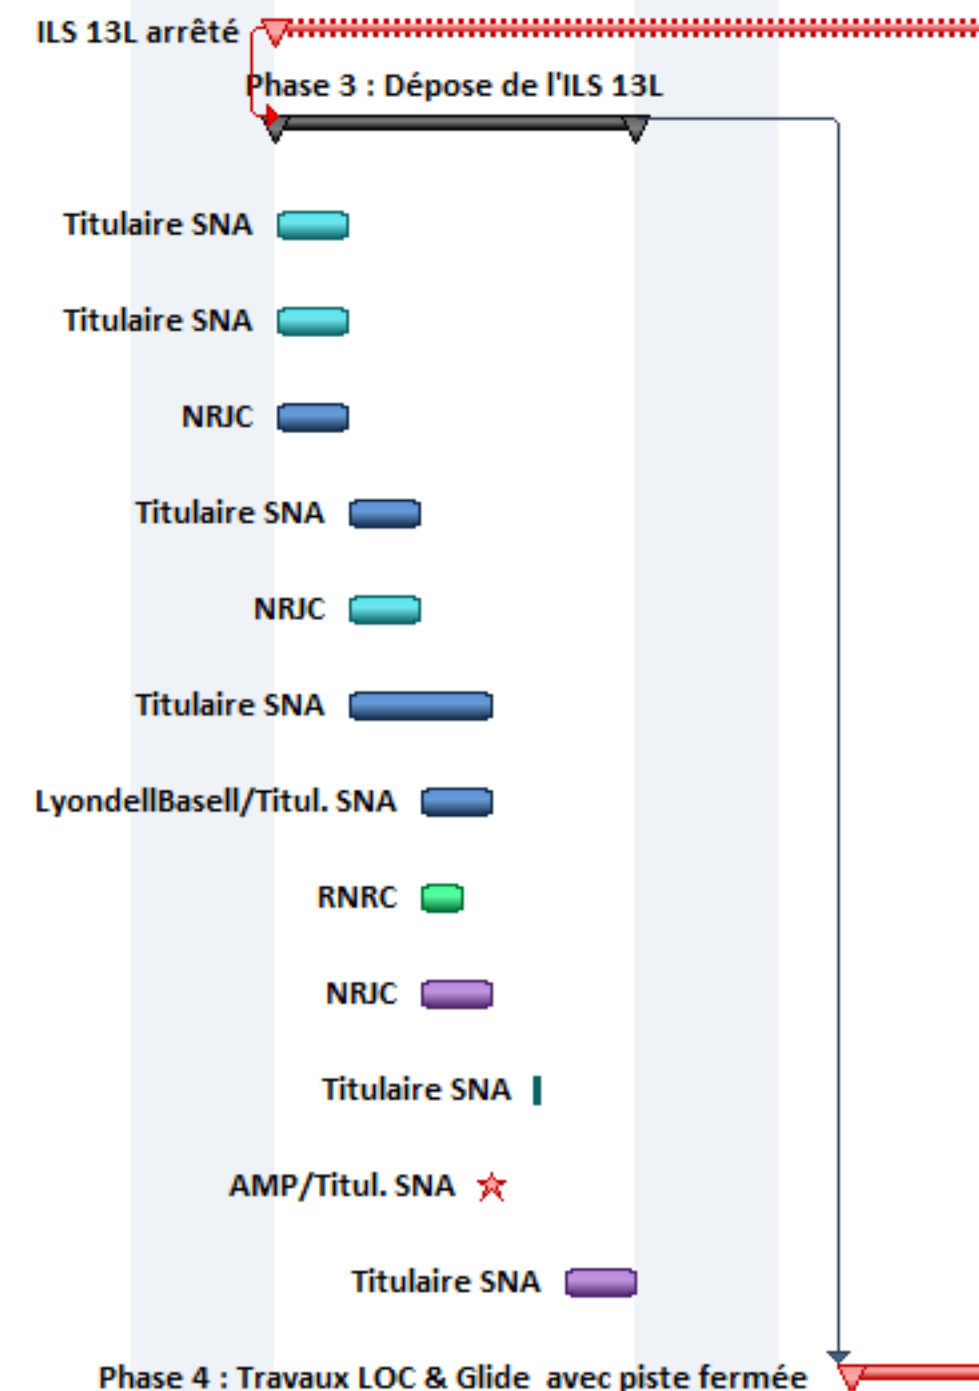

REPLACEMENT DE L'ILS 13L (CAT III) À MARSEILLE : DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX


09/12/2025

PHASE 4 : TRAVAUX AU LOC 13L ET AU GLIDE 13L, APRÈS ARRÊT DE L'ILS 13L ET AVEC PISTE 13L/31R FERMÉE

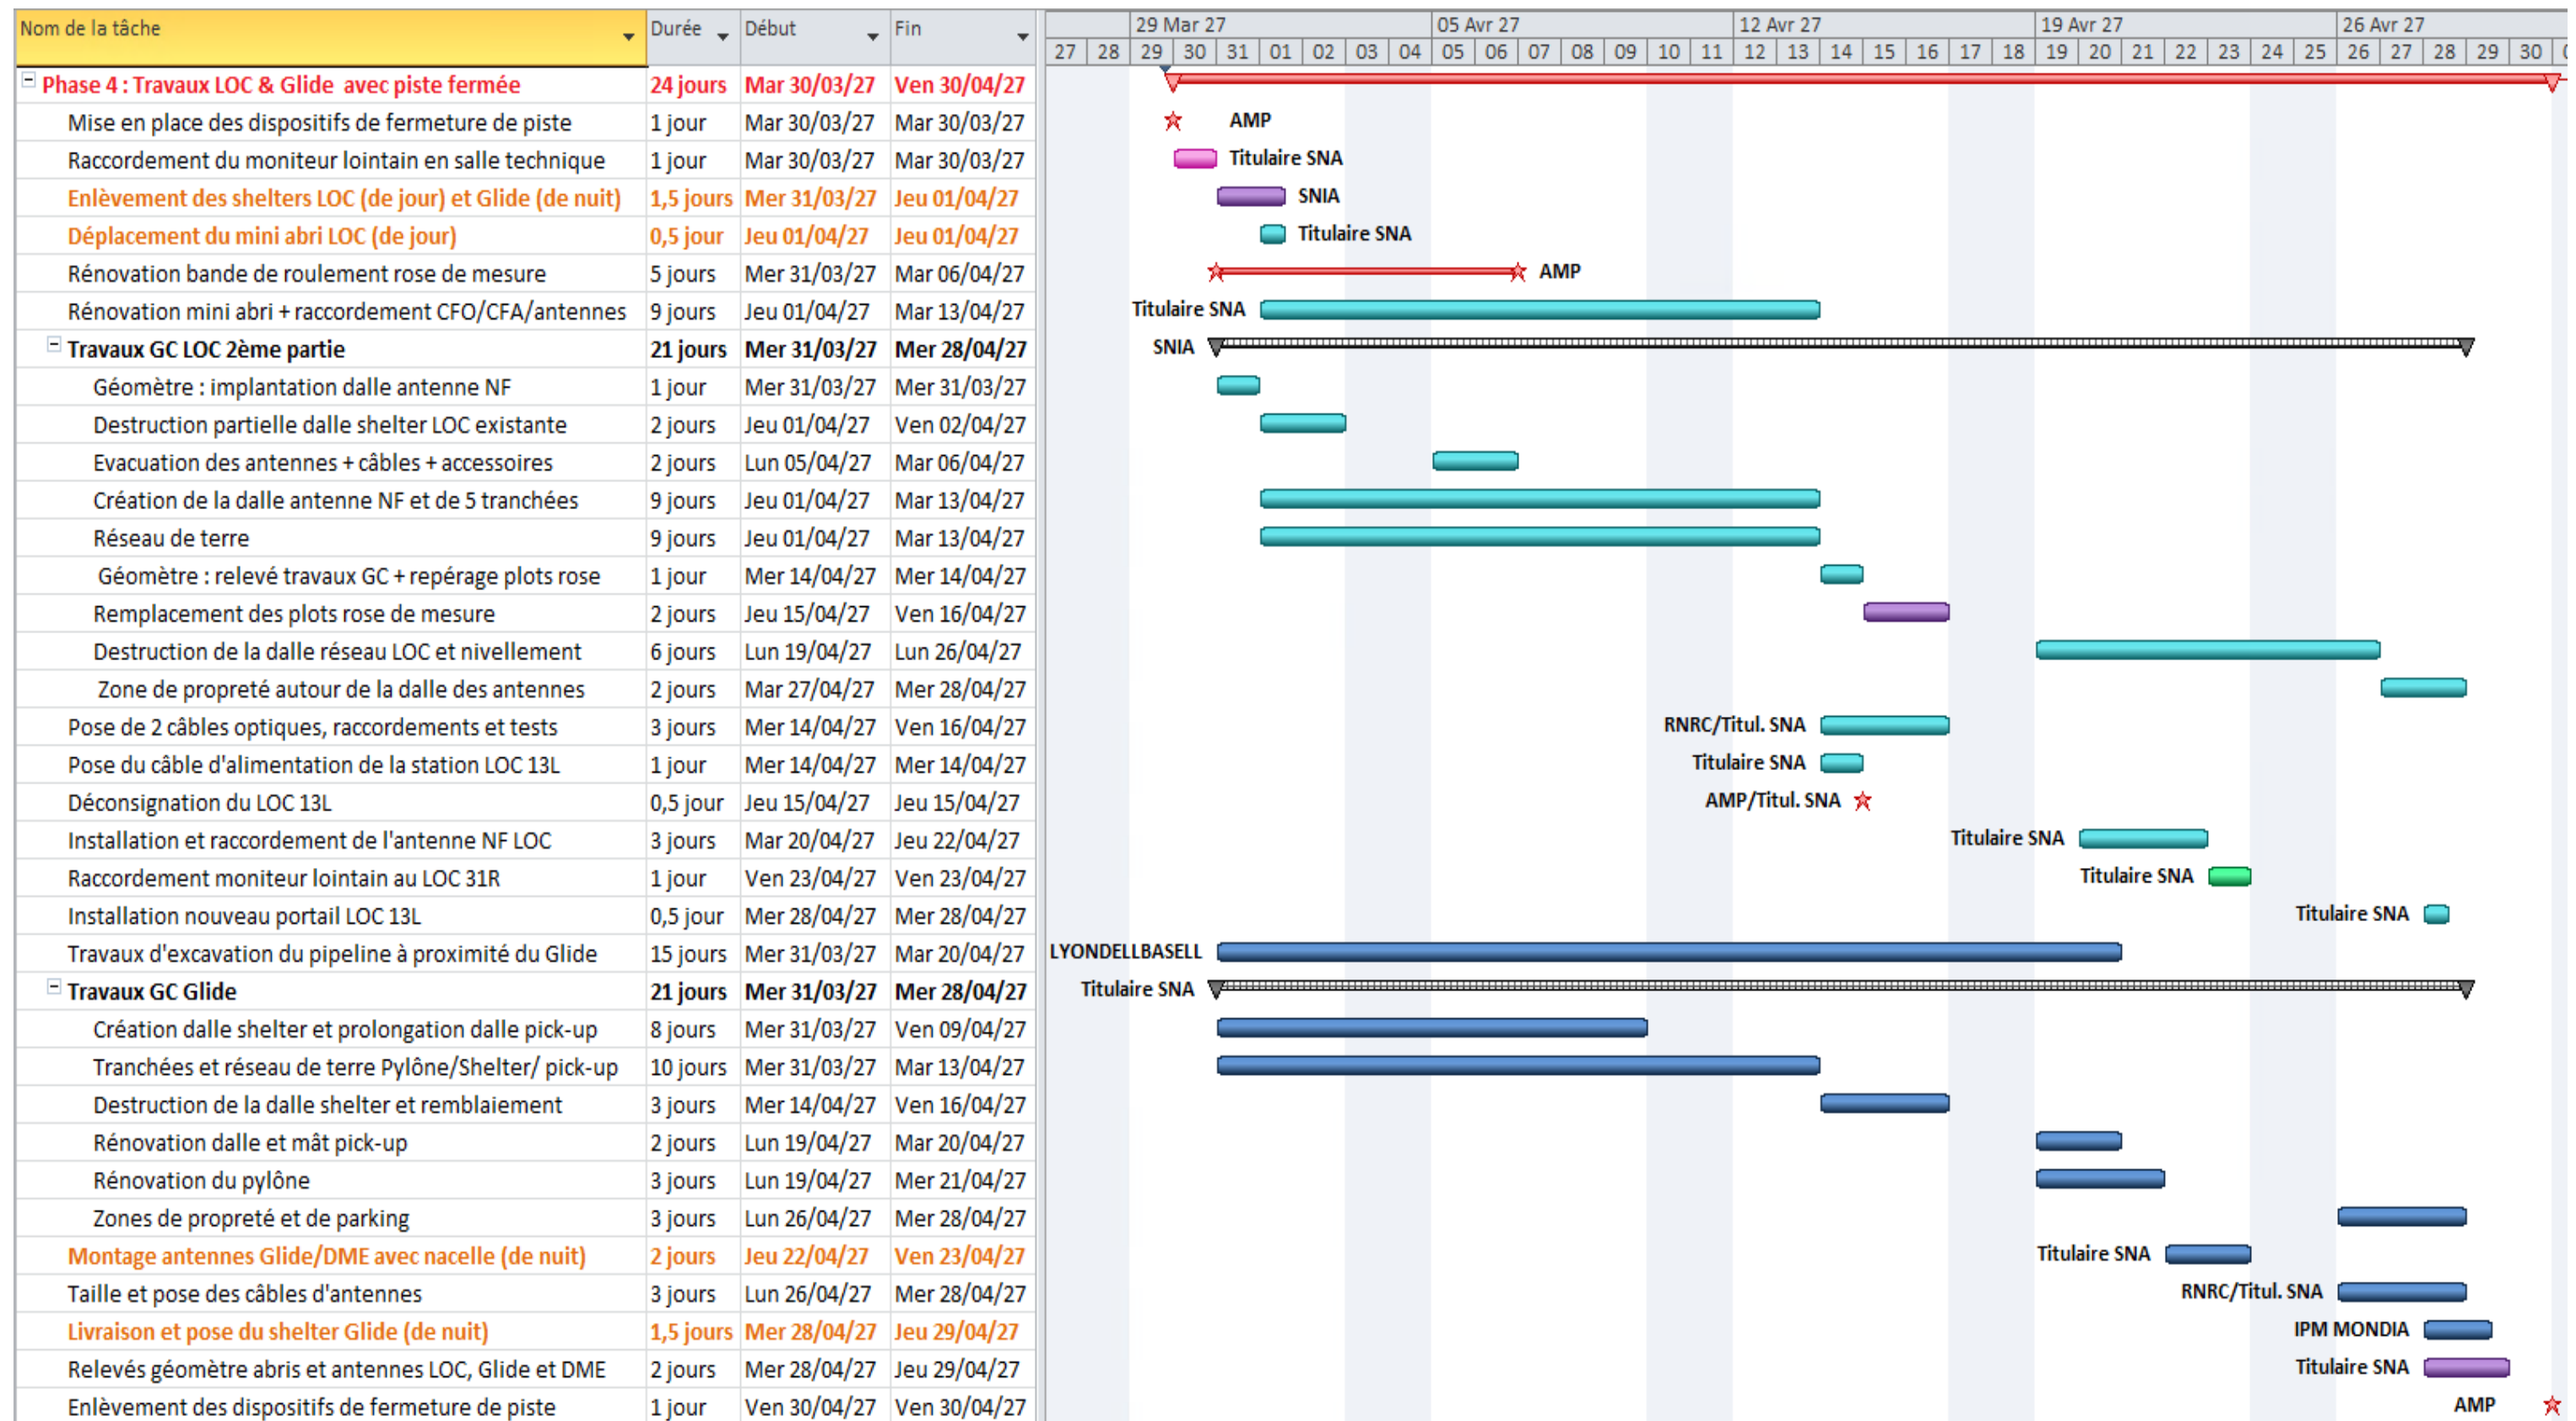

PHASE 5 : TRAVAUX GLIDE/DME 13L ET RÉGLAGES LOC

Phase 4 : Travaux LOC & Glide avec piste fermée	24 jours	Mar 30/03/27	Ven 30/04/27
Phase 5 : Travaux Glide/DME & Réglages LOC	30 jours	Lun 03/05/27	Ven 11/06/27
Installation des équipements CFO Glide/DME	3 jours	Lun 03/05/27	Mer 05/05/27
Raccordement alimentation du nouveau shelter Glide	1 jour	Lun 10/05/27	Lun 10/05/27
Déconsignation Glide 13L	0,5 jour	Mar 11/05/27	Mar 11/05/27
Raccordements CFO Glide/DME	7 jours	Lun 10/05/27	Mar 18/05/27
Installation et mise en service des climatiseurs LOC	2 jours	Lun 10/05/27	Mar 11/05/27
Installation et mise en service des climatiseurs Glide	2 jours	Mer 12/05/27	Jeu 13/05/27
Raccordement des antennes Glide/DME et mesures	2 jours	Mer 19/05/27	Jeu 20/05/27
Contrôle APAVE LOC et Glide	1 jour	Jeu 20/05/27	Jeu 20/05/27
Réglages LOC	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27
Raccordements CFA Glide/DME	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27
Prolongation et raccordement fibre optique Glide	2 jours	Mar 25/05/27	Mer 26/05/27
Phase 6 : Réglages Glide/DME & Travaux ST	35 jours	Lun 14/06/27	Ven 30/07/27

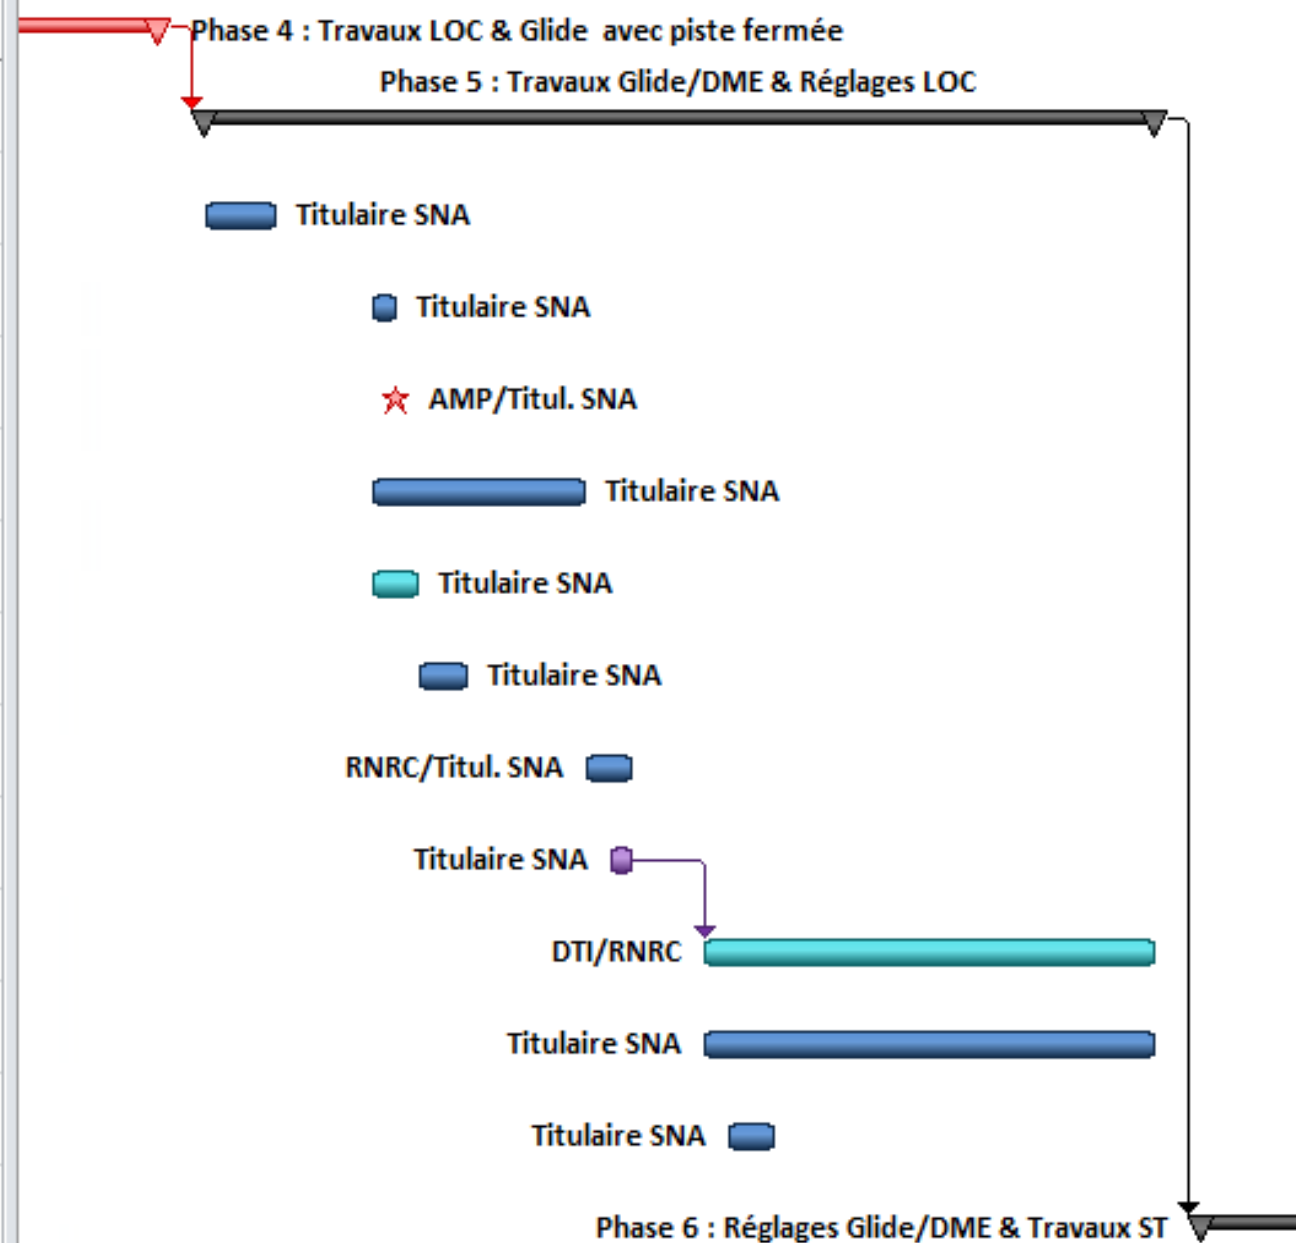

PHASE 6 : RÉGLAGES GLIDE/DME ET TRAVAUX EN SALLE TECHNIQUE

<div><div></div><div>Phase 5 : Travaux Glide/DME & Réglages LOC</div></div>	30 jours	Lun 03/05/27	Ven 11/06/27
<div><div></div><div>Phase 6 : Réglages Glide/DME & Travaux ST</div></div>	35 jours	Lun 14/06/27	Ven 30/07/27
Réglages Glide/DME	10 jours	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27
Travaux d'installation en salle technique	10 jours	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27
Programmation des automates	5 jours	Lun 28/06/27	Ven 02/07/27
Mise à jour du panneau d'état	15 jours	Lun 05/07/27	Ven 23/07/27
Mise à jour de la supervision	5 jours	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27

