



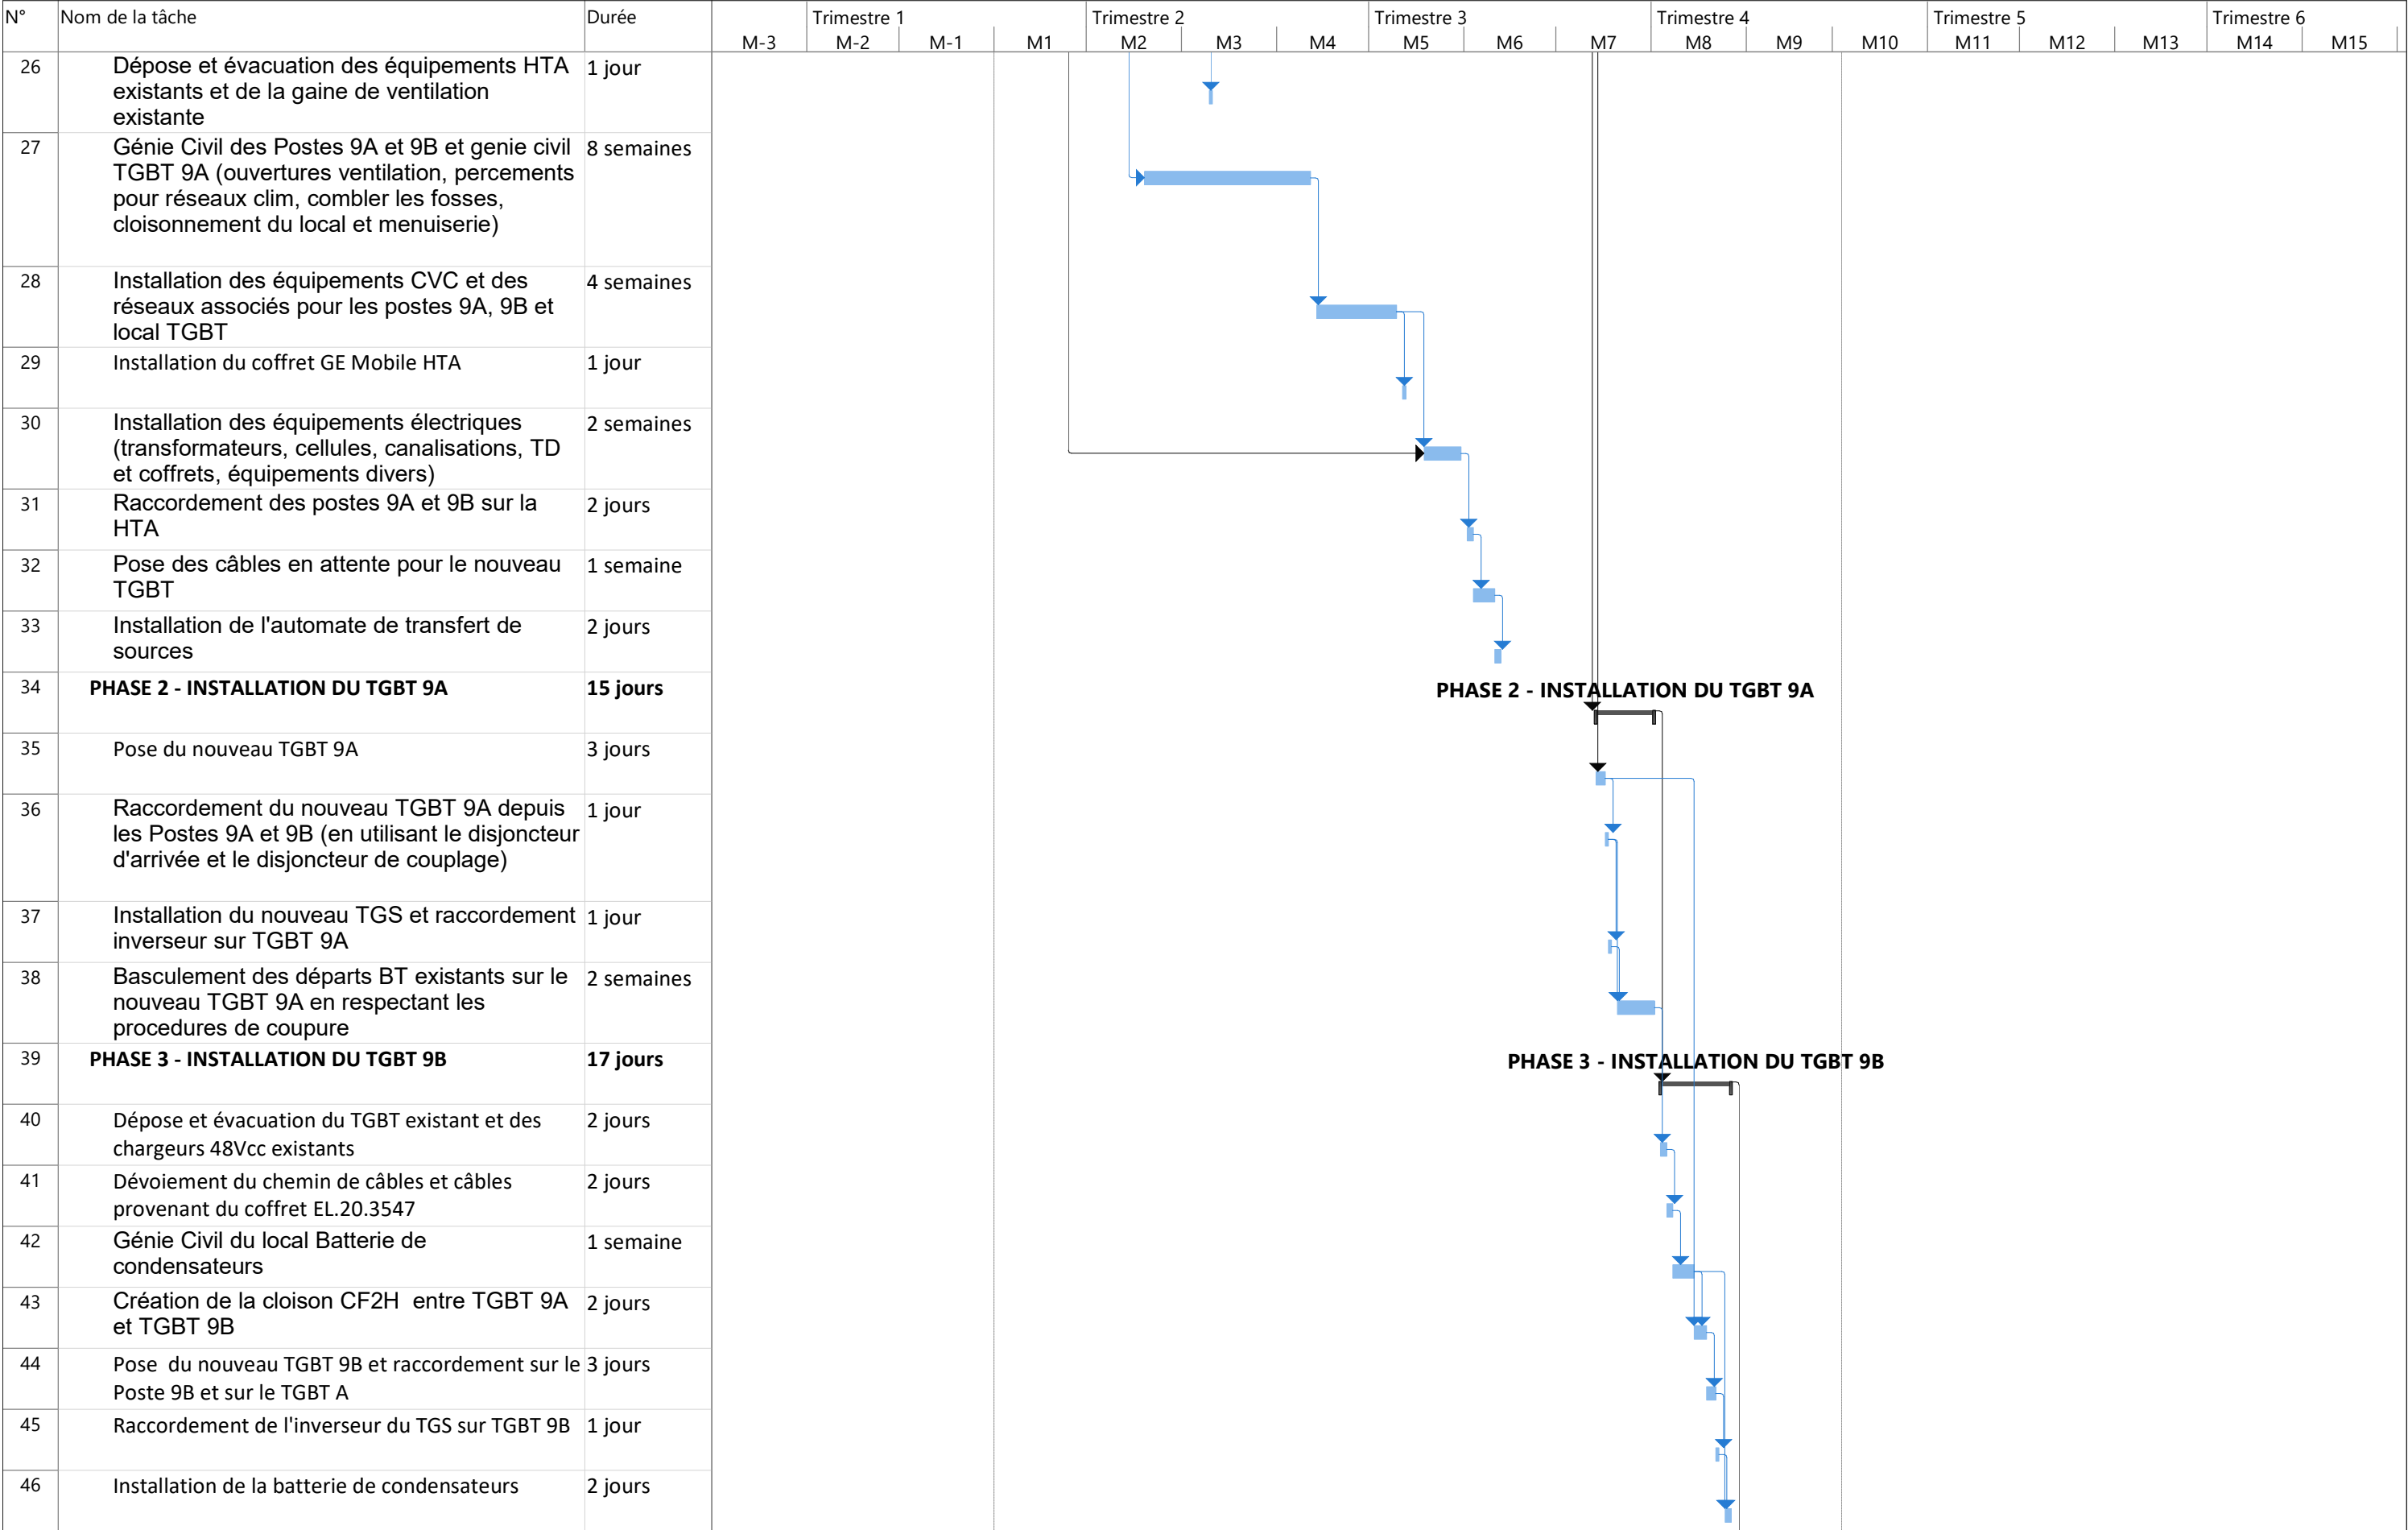



N°	Nom de la tâche	Durée	M-3	Trimestre 1 M-2	M-1	M1	Trimestre 2 M2	M3	M4	Trimestre 3 M5	M6	M7	Trimestre 4 M8	M9	M10	Trimestre 5 M11	M12	M13	Trimestre 6 M14	M15
47	PHASE 4 - GTC-CFA-TD AUX POSTES - EXTINCTION INCENDIE - ESSAIS ET MISE EN SERVICE	26 jours	PHASE 4 - GTC-CFA-TD AUX POSTES - EXTINCTION INCENDIE - ESSAIS ET MISE EN SERVICE																	
48	Installation de la GTC	1 semaine																		
49	Installation du TD auxiliaires postes	1 semaine																		
50	Installation éclairage, prises de courant, téléphone local TGBT	2 jours																		
51	Adaptation et remplacement des armoires divisionnaires en aval du TGBT	2 semaines																		
52	Installation de l'extinction incendie	2 semaines																		
53	Essais et mise en service	2 semaines																		
54	Reception	1 jour																		
