

N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée	2027				2028				2029				2030				2031											
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4
177		TRAVAUX CNAC	1265 j	TRAVAUX CNAC																											
179		TRAVAUX PREALABLES	177 j	TRAVAUX PREALABLES																											
180		LOT 00 - ETUDES ET TRAVAUX	145 j	LOT 00 - ETUDES ET TRAVAUX																											
195		TP : ETUDES ET TRAVAUX IRCAM ET CONTINUE DE SERVICE (Locaux sous Piazza et BRANCUSI)	174 j	TP : ETUDES ET TRAVAUX IRCAM ET CONTINUE DE SERVICE (Locaux sous Piazza et BRANCUSI)																											
218		TRAVAUX ANTICIPES VT	1038 j	TRAVAUX ANTICIPES VT																											
220		ETUDES ET TRAVAUX ECHAFAUDAGES / MONTE-CHARGES / LIFTS	1038 j	ETUDES ET TRAVAUX ECHAFAUDAGES / MONTE-CHARGES / LIFTS																											
240		ETUDES ET TRAVAUX DESAMIANTEGE / DEPLOMBAGE / CURAGE	806 j	ETUDES ET TRAVAUX DESAMIANTEGE / DEPLOMBAGE / CURAGE																											
407		PREPARATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER VT-VC	40 j	PREPARATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER VT-VC																											
408	MOA	Jalon: OS de démarrage Période de Préparation, Etudes EXE et Travaux VT + VC	0 j	N° 408 ♦ Jalon: OS de démarrage Période de Préparation, Etudes EXE et Travaux VT + VC																											
409		PREPARATION DE CHANTIER	40 j	N° 410 ▬ PREPARATION DE CHANTIER																											
410	TCE	Période de préparation de chantier	40 j	N° 410 ▬ Période de préparation de chantier																											
411	TCE	Liste prévisionnelle des documents	15 j	N° 411 ▬ Liste prévisionnelle des documents																											
412	TCE	Diffusion de planning détaillé des études, aprovisionnementnements et travaux exe	20 j	N° 412 ▬ Diffusion de planning détaillé des études, aprovisionnementnements et travaux exe																											
413	TCE	Remise du programme d'exécution et ses annexes	20 j	N° 413 ▬ Remise du programme d'exécution et ses annexes																											
414	TCE	Diffusion programme des installations de chantier	20 j	N° 414 ▬ Diffusion programme des installations de chantier																											
415	TCE	Diffusion du schéma d'organisation et de gestion des déchets	15 j	N° 415 ▬ Diffusion du schéma d'organisation et de gestion des déchets																											
416	TCE	Liste des sous-traitants et dossiers d'agréments	25 j	N° 416 ▬ Liste des sous-traitants et dossiers d'agréments																											
417	TCE	Remise des PSPS et Visites d'inspection commune	30 j	N° 417 ▬ Remise des PSPS et Visites d'inspection commune																											
418	TCE	Visas et mises à jour	25 j	N° 418 ▬ Visas et mises à jour																											
419		JALONS PRINCIPAUX	708 j	JALONS PRINCIPAUX																											
420	TCE	DP 1 : Fin des études de synthèse technique	0 j	N° 420 ♦ DP 1 : Fin des études de synthèse technique																											
421	TCE	DP 2 : Fin des études de synthèse architecturales	0 j	N° 421 ♦ DP 2 : Fin des études de synthèse architecturales																											
422	FAC	DP 3 : Fin des fabrications des façades	0 j	N° 422 ♦ DP 3 : Fin des fabrications des façades																											
423	FAC	DP 4 : Fin des poses des façades	0 j	N° 423 ♦ DP 4 : Fin des poses des façades																											
424	CVC	DP 5 : Fin des commandes des équipements	0 j	N° 424 ♦ DP 5 : Fin des commandes des équipements																											
425	CVC	DP 6 : Fin des approvisionnementnements des équipements en toiture	0 j	N° 425 ♦ DP 6 : Fin des approvisionnementnements des équipements en toiture																											
426	CVC	DP 7 : Fin des approvisionnementnements des équipements en infrastructure	0 j	N° 426 ♦ DP 7 : Fin des approvisionnementnements des équipements en infrastructure																											
427	CVC	DP 8 : Fin de pose des équipements	0 j	N° 427 ♦ DP 8 : Fin de pose des équipements																											
428	CVC	DP 9 : Mise à disposition des énergies définitives	0 j	N° 428 ♦ DP 9 : Mise à disposition des énergies définitives																											
429	CFO	DP 10 : Fin des commandes des équipements	0 j	N° 429 ♦ DP 10 : Fin des commandes des équipements																											
430	CFO	DP 11 : Fin des approvisionnementnements des équipements en toiture	0 j	N° 430 ♦ DP 11 : Fin des approvisionnementnements des équipements en toiture																											
431	CFO	DP 12 : Fin des continuités des chemins de câbles	0 j	N° 431 ♦ DP 12 : Fin des continuités des chemins de câbles																											
432	CFO	DP 13 : Fin tirages des câbles	0 j	N° 432 ♦ DP 13 : Fin tirages des câbles																											
433	CFO	DP 14 : Fin de pose des équipements	0 j	N° 433 ♦ DP 14 : Fin de pose des équipements																											
434	CFO	DP 15 : Mise à disposition des énergies définitives	0 j	N° 434 ♦ DP 15 : Mise à disposition des énergies définitives																											
435	CFA	DP 16 : Fin des commandes des équipements	0 j	N° 435 ♦ DP 16 : Fin des commandes des équipements																											
436	CFA	DP 17 : Fin des approvisionnementnements des équipements	0 j	N° 436 ♦ DP 17 : Fin des approvisionnementnements des équipements																											
437	CFA	DP 18 : Fin des continuités des chemins de câbles	0 j	N° 437 ♦ DP 18 : Fin des continuités des chemins de câbles																											
438	CFA	DP 19 : Fin tirages des câbles	0 j	N° 438 ♦ DP 19 : Fin tirages des câbles																											
439	CFA	DP 20 : Fin de pose des équipements	0 j	N° 439 ♦ DP 20 : Fin de pose des équipements																											
440	ASC	DP 21 : Fin des approvisionnementnements des équipements	0 j	N° 440 ♦ DP 21 : Fin des approvisionnementnements des équipements																											
441	ASC	DP 22 : Fin de pose des équipements (hors appareils utilisés par le chantier)	0 j	N° 441 ♦ DP 22 : Fin de pose des équipements (hors appareils utilisés par le chantier)																											
442	ASC	DP 23 : Fin des essais (hors appareils utilisés par le chantier)	0 j	N° 442 ♦ DP 23 : Fin des essais (hors appareils utilisés par le chantier)																											
443	MEN	DP 24 : Fin de pose des portes et équipements asservis	0 j	N° 443 ♦ DP 24 : Fin de pose des portes et équipements asservis																											
444	TCE	DP 25 : Fin des essais coordonnés par toutes les entreprises concernées	0 j	N° 444 ♦ DP 25 : Fin des essais coordonnés par toutes les entreprises concernées																											
445	TCE	Réception TCE	0 j	N° 445 ♦ Réception TCE																											
446		ETUDES DE SYN / D'EXE VT-VC	508 j	ETUDES DE SYN / D'EXE VT-VC																											
447	TCE	Etudes d'exécution nécessaires pour le début des études de synthèse	20 j	N° 447 ▬ Etudes d'exécution nécessaires pour le début des études de synthèse																											
448	MOE	Visas	10 j	N° 448 ▬ Visas																											
449	TCE	Reprises	5 j	N° 449 ▬ Reprises																											
450	TCE	Remise des fiches techniques des échantillons	15 j	N° 450 ▬ Remise des fiches techniques des échantillons																											
453		ETUDES D'EXECUTION ET COMMANDES	508 j	ETUDES D'EXECUTION ET COMMANDES																											
454	GOE	Etudes gros-oeuvre : démolitions, structures, abords	260 j	N° 454 ▬ Etudes gros-oeuvre : démolitions, structures, abords																											
455	GOE	1er BPE	0 j	N° 455 ♦ 1er BPE																											
456	GOE	Approvisionnement	30 j	N° 456 ▬ Approvisionnement																											
457	GOE	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j	N° 457 ▬ Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse																											
458	GOE	Jalon fin d'études gros-oeuvre et structure	0 j	N° 458 ♦ Jalon fin d'études gros-oeuvre et structure																											
459	ETANC	Etudes couverture et étanchéité	90 j	N° 459 ▬ Etudes couverture et étanchéité																											
460	ETANC	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	20 j	N° 460 ▬ Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse																											
461	ETANC	Jalon fin d'études couverture et étanchéité	0 j	N° 461 ♦ Jalon fin d'études couverture et étanchéité																											
462	META	Etudes serrurerie, métallerie, cloisons vitrées	200 j	N° 462 ▬ Etudes serrurerie, métallerie, cloisons vitrées																											
463	META	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	30 j	N° 463 ▬ Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse																											
464	META	Jalon fin d'études serrurerie, métallerie, cloisons vitrées	0 j	N° 464 ♦ Jalon fin d'études serrurerie, métallerie, cloisons vitrées																											
465	META	Fabrication / approvisionnement	155 j	N° 465 ▬ Fabrication / approvisionnement																											
466	META	Approvisionnement boîtes et colonnes pour équipements technique	0 j	N° 466 ♦ Approvisionnement boîtes et colonnes pour équipements technique																											
467	MEN	Etudes menuiseries intérieures, parquet	200 j	N° 467 ▬ Etudes menuiseries intérieures, parquet																											
468	MEN	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j	N° 468 ▬ Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse																											
469	MEN	Jalon fin d'études menuiseries intérieures, parquet	0 j	N° 469 ♦ Jalon fin d'études menuiseries intérieures, parquet																											
470	MEN	Fabrication / approvisionnement	110 j	N° 470 ▬ Fabrication / approvisionnement																											
471	CLS	Etudes cloisons, faux-plafonds	180 j	N° 471 ▬ Etudes cloisons, faux-plafonds																											

N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée	2027				2028				2029				2030				2031									
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2
472	CLS	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
473	CLS	Jalon fin d'études cloisons, faux-plafonds	0 j																										
474	CLS	Premiers approvisionnements	0 j																										
475	SS/PEI	Etudes revêtement de sols souples, peinture, signalétique	90 j																										
476	SS/PEI	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	30 j																										
477	SS/PEI	Jalon fin d'études revêtement de sols souples, peinture, signalétique	0 j																										
478	SD	Etudes revêtement de sols durs	180 j																										
479	SD	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
480	SD	Jalon fin d'études revêtement de sols durs	0 j																										
481	SD	Apprivoisonnements planchers techniques	0 j																										
482	CVC	Etudes fluides (CVC/désenfumage mécanique/plomberie, etc.)	260 j																										
483	CVC	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
484	CVC	Jalon fin d'études fluides (CVC/désenfumage mécanique/plomberie, etc.)	0 j																										
485	CVC	Fabrication / approvisionnement	265 j																										
486	CVC	Livraison CTA toiture	0 j																										
487	CVC	Livraison CTA infra	0 j																										
488	CFO	Etudes CFO	260 j																										
489	CFO	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
490	CFO	Jalon fin d'études CFO	0 j																										
491	CFO	Jalon commande équipements postes HTA, postes transfo, TGBT, TGS	0 j																										
492	CFO	Fabrication / approvisionnement	150 j																										
493	CFO	Approvisionnement des premiers équipements principaux	0 j																										
494	CFO	Jalon commande armoires secondaires, TD	0 j																										
495	CFO	Fabrication / approvisionnement	80 j																										
496	CFO	Approvisionnement des premiers équipements secondaires	0 j																										
497	CFA	Etudes CFA	260 j																										
498	CFA	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
499	CFA	Jalon fin d'études CFA	0 j																										
500	CFA	Jalon commande équipements	0 j																										
501	CFA	Fabrication / approvisionnement	80 j																										
502	CFA	Livraison premiers équipements	0 j																										
503	ASC	Etudes équipements transport vertical	160 j																										
504	ASC	Jalon fin d'études équipements transport vertical	0 j																										
505	ASC	Jalon commande équipements transport vertical	0 j																										
506	ASC	Fabrication / approvisionnement	220 j																										
507	ASC	Livraison des premiers ascenseurs	0 j																										
508	MOB	Etudes équipements mobiliers	200 j																										
509	MOB	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
510	MOB	Jalon fin d'études équipements mobiliers	0 j																										
511	MOB	Fabrication / restauration des équipements mobiliers	200 j																										
512	MAC SCE	Etudes serrurerie, machinerie scénique	200 j																										
513	MAC SCE	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
514	MAC SCE	Jalon fin d'études serrurerie, machinerie scénique	0 j																										
515	MAC SCE	Jalon commande machinerie scénique	0 j																										
516	MAC SCE	Fabrication / approvisionnement	120 j																										
517	ELEC SCE	Etudes réseaux et équipements CFO & Cfa Scéniques	200 j																										
518	ELEC SCE	Solde mise à jour études d'exécution suivant synthèse	40 j																										
519	ELEC SCE	Jalon fin d'études réseaux et équipements CFO & Cfa Scéniques	0 j																										
520		ETUDES DE SYNTHESE	255 j																										
521	TCE	Mise en place cellule synthèse	20 j																										
522	TCE	Synthèse CET N7	80 j																										
523	SYN	Présynthèse architecturale N7	20 j																										
524	TCE	Synthèse CEA N7	70 j																										
526	TCE	Synthèse CET N6	80 j																										
527	SYN	Présynthèse architecturale N6	20 j																										
528	TCE	Synthèse CEA N6	80 j																										
530	TCE	Synthèse CET N5	80 j																										
531	SYN	Présynthèse architecturale N5	20 j																										
532	TCE	Synthèse CEA N5	80 j																										
534	TCE	Synthèse CET N4	80 j																										
535	SYN	Présynthèse architecturale N4	20 j																										
536	TCE	Synthèse CEA N4	80 j																										
538	TCE	Synthèse CET N3	80 j																										
539	SYN	Présynthèse architecturale N3	20 j																										
540	TCE	Synthèse CEA N3	80 j																										
542	TCE	Synthèse CET N2	80 j																										
543	SYN	Présynthèse architecturale N2	20 j																										
544	TCE	Synthèse CEA N2	80 j																										
546	TCE	Synthèse CET N1	80 j																										
547	SYN	Présynthèse architecturale N1	20 j																										

CNAC - PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - TRAVAUX PRINCIPAUX VOLET CULTUREL ET VOLET TECHNIQUE																															
Oppic		setec openry																													
N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée	2027				2028				2029				2030				2031											
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4
548	TCE	Synthèse CEA N1	80 j						N° 548																						
550	TCE	Synthèse CET N0	115 j						N° 550																						
551	SYN	Présynthèse architecturale N0	20 j						N° 551																						
552	TCE	Synthèse CEA N0	105 j						N° 552																						
554	TCE	Jalon fin de synthèse Superstructure	0 j																												
555	TCE	Synthèse CET SS1	125 j						N° 555																						
556	SYN	Présynthèse architecturale SS1	20 j						N° 556																						
557	TCE	Synthèse CEA SS1	110 j						N° 557																						
559	TCE	Synthèse CET ES	90 j						N° 559																						
560	SYN	Présynthèse architecturale ES	20 j						N° 560																						
561	TCE	Synthèse CEA ES	90 j						N° 561																						
563	TCE	Synthèse CET SS2	120 j						N° 563																						
564	SYN	Présynthèse architecturale SS2	20 j						N° 564																						
565	TCE	Synthèse CEA SS2	120 j						N° 565																						
567	TCE	Synthèse CET SS3	70 j						N° 567																						
568	SYN	Présynthèse architecturale SS3	20 j						N° 568																						
569	TCE	Synthèse CEA SS3	70 j						N° 569																						
571	TCE	Jalon fin de synthèse Infrastructure	0 j																												
572	TCE	Fin des études de synthèse technique	0 j																												
573	TCE	Fin des études de synthèse architecturale	0 j																												
574		PROTOTYPES (hors façades)	177 j						N° 465																						
575	TCE	Présentation des fiches produit	30 j						N° 575																						
576	TCE	Visas	20 j						N° 576																						
577	TCE	Présentation échantillons	40 j						N° 577																						
578	TCE	Choix des produits	30 j						N° 578																						
579	TCE	Commande et appro pour témoins	50 j						N° 579																						
580	TCE	Réalisation des témoins	40 j						N° 580																						
581	TCE	Validations	20 j						N° 581																						
582	TCE	Lancements en fabrication	0 j						N° 582																						
583		ETUDES FACADES	381 j																												
584	FAC	Prototypes de façade	15 j						N° 584																						
585	FAC	Présentation prototypes de façade	0 j						N° 585																						
586	FAC	Observations MOE et reprise prototypes	20 j						N° 586																						
587	MOE	Validation prototypes de façade	5 j						N° 587																						
588	FAC	Etudes d'exe façades	135 j						N° 588																						
589	MOE/FAC	Validation finale	10 j						N° 589																						
590	FAC	Fabrication des premières façades	120 j						N° 590																						
591	FAC	Etudes d'exe façades feu	135 j						N° 591																						
592	FAC	Témoin de façade sur bâtiment	15 j						N° 592																						
593	FAC	Présentation témoin de façade	0 j						N° 593																						
594	FAC	Observations MOE et reprise du témoin	20 j						N° 594																						
595	MOE	Validation témoin de façade	5 j						N° 595																						
596	FAC	Fabrication prototype feu	20 j						N° 596																						
597	FAC	Avis de chantier, éventuels essais feu	126 j						N° 597																						
598	FAC	Avis de chantier clapets coupe-feu façade Renard	50 j						N° 598																						
599	FAC	Obtention des avis de chantier pour mise en fabrication façade CF	0 j						N° 599																						
600	FAC	Fabrication façades CF 2h	100 j						N° 600																						
601	FAC	BPE façade	0 j						N° 601																						
602	FAC	Fin de fabrication des façades	0 j																												
603		TRAVAUX VT-VC	842 j																												

CNAC - PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - TRAVAUX PRINCIPAUX VOLET CULTUREL ET VOLET TECHNIQUE																														
Oppic		setec opency																												
N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée					2027				2028				2029				2030				2031						
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3
623	GOE	Reprise des peintures structure	40 j																											
624	FAC	Remplacement Façade Est-Nord	50 j																											
625	FAC	Pose façades CF 2F	25 j																											
626	CET	Distributions et terminaux façade Est-Nord	15 j																											
627	TCE	Fin pose de la façade Est	0 j																											
628	TCE	OPR, Constat d'achèvement, levées de réserves	65 j																											
629		FAÇADE SUD (St Merri)	175 j																											
630	GOE	Vérification en nez de dalle et reprise éventuelle à l'avancement de la dépose de façade	40 j																											
631	GOE	Reprise des peintures structure, charpente secondaire	30 j																											
632	FAC	Remplacement Façade Sud	44 j																											
633	CET	Distributions et terminaux façade Sud	15 j																											
634	TCE	OPR, Constat d'achèvement, levées de réserves	50 j																											
635	TCE	Fin pose de la façade Sud	0 j																											
636	lot 02	Début Repli des Echafaudages Façade Sud (possible)	0 j																											
637		FAÇADE OUEST-SUD (Piazza)	190 j																											
638	GOE	Vérification en nez de dalle et reprise éventuelle à l'avancement de la dépose de façade	40 j																											
639	GOE	Reprise des peintures structure, charpente	40 j																											
640	GOE	Reprise des peintures éléments de charpente secondaire	40 j																											
641	FAC	Remplacement Façade Ouest-Sud	50 j																											
642	FAC	Pose façades CF 2F	20 j																											
643	CET	Distributions et terminaux façade Ouest-Sud	15 j																											
644	TCE	OPR, Constat d'achèvement, levées de réserves	65 j																											
645	lot 02	Début Repli des Echafaudages de la Façade Ouest (possible)	0 j																											
646		FAÇADE OUEST-NORD (Piazza)	185 j																											
647	GOE	Vérification en nez de dalle et reprise éventuelle à l'avancement de la dépose de façade	40 j																											
648	GOE	Reprise des peintures structure, charpente	40 j																											
649	GOE	Reprise des peintures éléments de charpente secondaire	40 j																											
650	FAC	Remplacement Façade Ouest-Nord	50 j																											
651	FAC	Pose façades CF 2F	20 j																											
652	CET	Distributions et terminaux façade Ouest-Nord	15 j																											
653	TCE	OPR, Constat d'achèvement, levées de réserves	65 j																											
654	TCE	Fin pose de la façade Ouest	0 j																											
655	lot 02	Début Repli des Echafaudages Façade Ouest-Nord (possible)	0 j																											
656		FAÇADE NORD (Rambuteau)	160 j																											
657	GOE	Vérification en nez de dalle et reprise éventuelle à l'avancement de la dépose de façade	40 j																											
658	GOE	Reprise des peintures structure, charpente secondaire	30 j																											
659	FAC	Remplacement Façade Nord	50 j																											
660	CET	Distributions et terminaux façade Nord	15 j																											
661	TCE	Fin pose de la façade Nord	0 j																											
662	TCE	OPR, Constat d'achèvement, levées de réserves	50 j																											
663	lot 02	Début Repli des Echafaudages Façade Nord	0 j																											
664		FACADE TECHNIQUE EST N1 À N7 (RUE DU RENARD - RUE BEAUBOURG)	395 j																											
665		Début peinture et remplacement façade Est-Sud file 0 à 8	0 j																											
666		Début peinture et remplacement façade Est-Nord file 8 à 14	0 j																											
667	GOE	Réparation charpente secondaire et adaptation/reprise des supports Est-Sud	50 j																											
668	GOE	Reprise des peintures éléments de charpente secondaire Est-Sud	40 j																											
669	META	Approvisionnement et pose des colonnes montantes	20 j																											
670	CET	Pose des nouveaux réseaux techniques verticaux Est-Sud	60 j																											
671	GOE	Réparation charpente secondaire et adaptation/reprise des supports Est-Nord	50 j																											
672	GOE	Reprise des peintures éléments de charpente secondaire Est-Nord	40 j																											
673	META	Approvisionnement et pose des colonnes montantes	20 j																											
674	CET	Pose des nouveaux réseaux techniques verticaux Est-Nord	60 j																											

N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée	2027				2028				2029				2030				2031					
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4
691	GOE/META	Solde travaux de serrurerie	45 j												N° 691										
692	TCE	Constat contradictoire fin de travaux et levée des observations	35 j												N° 692										
693	lot 02	Début Dépose des échafaudages de la façade Est-Nord	0 j												N° 693										
694	lot 02	Fin dépose des échafaudages Est-Nord	0 j												N° 694										
695	CET	Fin des équipements techniques et terminaux façade technique Renard	0 j												N° 695										
696		SUPERSTRUCTURE	764 j																						
697		TOITURE N+7 ET BLOC 10- REPRISE ETANCHEITES, POSE EQUIPEMENTS, RESEAUX, RACCORDEMENTS ET SERRURERIE	420 j																						
698	lot 03	Fin Désamiantage, déplombage et curage toiture-terrasse N7	0 j												N° 698										
699	ETANC	Reprise des étanchéités et des EEP	40 j												N° 699										
700	GOE	Pose plateformes équipements et supportages	50 j												N° 700										
701	META	Réalisation des boîtes	30 j												N° 701										
702	GOE	Prolongement du triplex H-J-K (façade ouest)	20 j												N° 702										
703	GOE	Prolongement du MC S	20 j												N° 703										
704	GOE	Prolongement escalier files 9-10 façade ouest du N6 au N7	30 j												N° 704										
705	GOE	Réalisation escalier métallique entre N6 et N7	20 j												N° 705										
706	CET	Pose des Equipements techniques	60 j												N° 706										
707	CET	Pose des réseaux et raccordements	120 j												N° 707										
708	CET	Fin pose et raccordement des équipements techniques au N7	0 j												N° 708										
709	META	Création et modification des sauts de loup	40 j												N° 709										
710	META	Restauration boîtes rouges et serrurerie	40 j												N° 710										
711	META/GOE	Solde travaux de serrurerie	40 j												N° 711										
712	META	Ecrans acoustiques	25 j												N° 712										
713	GOE	Surélévation de la terrasse entre files 8 et 13 façade ouest (yc étanchéité / plots / platelage)	40 j												N° 713										
714	GOE	Surélévation de la terrasse entre files 4 et 5 façade ouest (yc étanchéité / plots / platelage)	20 j												N° 714										
715	META	Solde travaux de serrurerie	40 j												N° 715										
716	TCE	Création d'un bloc sanitaire	60 j												N° 716										
717	CET	Mise en lumière des terrasses	30 j												N° 717										
718	TCE	Fin des travaux au N7	0 j												N° 718										
721		TERRASSES INTERMEDIAIRES - N6 ET N5	120 j																						
722	META	Travaux de serrurerie	35 j												N° 722										
723	lot 02	Fin allègement échafaudage Piazza Sud	0 j												N° 723										
724	ETANC	Reprise Etanchéité Terrasses Niveau N6	30 j												N° 724										
725	ETANC	Reprise Etanchéité Terrasses Niveau N5 (hors terrasses N5 coté Rambuteau)	40 j												N° 725										
726	lot 02	Fin repli des échafaudages façade Nord	0 j												N° 726										
727	ETANC	Reprise Etanchéité Terrasses Niveau N5 coté Rambuteau	15 j												N° 727										
728	ETANC	Jalon Mise Hors d'eau	0 j												N° 728										
729	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 6	0 j												N° 729										
730	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 5	0 j												N° 730										
731	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 4	0 j												N° 731										
732	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 3	0 j												N° 732										
733	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 2	0 j												N° 733										
734	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 1	0 j												N° 734										
735	lot 03	Fin curage / désamiantage niveau 0	0 j												N° 735										
736		TRAVAUX DE REPARATION	120 j																						
737	GOE	Travaux réparation intérieur et traitement pathologies avant pose réseaux (traitement fissures, réfection du flocage, etc.)	120 j												N° 737										
738		BLOC 4 (DÉMOLITION ET RESTRUCTURATION PH N0 À PH N2)	175 j																						
739	GOE	Restructuration local postes de livraison N0, cis enduits	20 j												N° 739										
740	SD	Plancher technique LT	10 j												N° 740										
741	GOE	Démolition PH Niveau 2 (démol planchers pour fermeture trémie, création ASC/ trémie escalier file 11-12)	20 j												N° 741										
742	GOE	Travaux structures PH N2 yc séchage (fermeture trémie et création ASC/ Trémie escalier à prévoir file 11-12)	30 j												N° 742										
743	GOE	Démolition PH Niveau 1 (démolition pour fermeture trémie, création gaine ASC et trémies escalier file 11-12)	15 j												N° 743										
744	GOE	Travaux structures PH N1 yc séchage (fermeture trémie, création ASC et trémie escalier file 11-12)	30 j												N° 744										
745	GOE	Démolition PH N1 pour trémies escaliers N1 à N2	10 j												N° 745										
746	GOE	Créations trémies escaliers N1 à N2 (yc séchage)	30 j												N° 746										
747	GOE	Création gaine ASC N3	10 j												N° 747										
748	GOE	Démolition planchers N1/PH N0 pour création trémie et renforts /vide sous gradins	10 j												N° 748										
749	GOE	Création trémie et renforts /vide sous gradins yc séchage	40 j												N° 749										
750		BLOC 2 / BLOC 3 (DÉMOLITION ET RESTRUCTURATION)	55 j																						
751	GOE	Démolition PH Niveau 0 (plancher à reconstruire, mezzanines, etc.)	15 j												N° 751										
752	GOE	Travaux structures PH N0 yc séchage, création des mezzanines	40 j												N° 752										
753	GOE	Fin travaux de structure N0 à N6	0 j												N° 753										
762		NIVEAU N6	385 j																						
763	CLS	Cloisonnements grande hauteur	30 j												N° 763										
764	CET	Distribution principale et secondaire	80 j												N° 764										
765	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	30 j												N° 765										
766	CET	Pose des terminaux hauts	30 j												N° 766										



CNAC - PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - TRAVAUX PRINCIPAUX VOLET CULTUREL ET VOLET TECHNIQUE



Intervenant	Nom de la tâche	Durée					2027				2028				2029				2030				2031						
			T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3
767	CLS	Cloisons	20 j																										
768	SD	Chapes	10 j																										
769	CET	Distribution et attentes plenums FP	5 j																										
770	CLS	Faux-plafonds LT	5 j																										
771	SS/PEI	Peinture LT	10 j																										
772	CES	Revêtement sol LT	10 j																										
773	CET	Pose des équipements et réseaux LT	20 j																										
774	CET	Fin des locaux techniques N6	0 j																										
775	CLS	Faux-plafonds	20 j																										
776	CET	Distribution au sol	30 j																										
777	SD	Plancher technique	10 j																										
778	CES	Revêtements de sols	40 j																										
779	MEN	Blocs-portes	15 j																										
780	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																										
781	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																										
782	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	15 j																										
783	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	20 j																										
784	CES	Finitions	40 j																										
785	GOE	Prolongements escalier entre N6 et N7	20 j																										
786	META	Travaux de serrurerie	25 j																										
787	SD	Plancher technique de rive en liaison avec façades	20 j																										
788	TCE	Repli installations provisoires	10 j																										
789	TCE	Nettoyage	20 j																										
790	CET	Fin des distributions N6	0 j																										
791	CET	Fin des terminaux et raccordements N6	0 j																										
792	TCE	Achèvement des travaux Bloc 9 & Bloc 2 Niveau 6	0 j																										
802	NIVEAU N5		488 j																										
803	CLS	Cloisonnements grande hauteur	40 j																										
804	CLS	Cassettes métal en PH	5 j																										
805	CET	Distribution principale et secondaire	80 j																										
806	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	30 j																										
807	CET	Pose des terminaux hauts	30 j																										
808	CLS	Cloisons	20 j																										
809	META	Cloisons vitrées	15 j																										
810	SD	Chapes	10 j																										
811	CET	Distribution et attentes plenums FP	5 j																										
812	CLS	Faux-plafonds LT	5 j																										
813	SS/PEI	Peinture LT	10 j																										
814	CES	Revêtement sol LT	10 j																										
815	CET	Pose des équipements et réseaux LT	20 j																										
816	CET	Fin des locaux techniques N5	0 j																										
817	CLS	Faux-plafonds	20 j																										
818	CET	Distribution au sol	30 j																										
819	SD	Plancher technique	50 j																										
820	CES	Revêtements de sols	20 j																										
821	MEN	Blocs-portes	15 j																										
822	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																										
823	META	Travaux de serrurerie	25 j																										
824	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																										
825	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	15 j																										
826	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	20 j																										
827	SD	Plancher technique de rive en liaison avec façades	20 j																										
828	CES	Finitions	40 j																										
829	TCE	Repli installations provisoires	10 j																										
830	TCE	Nettoyage	20 j																										
831	CET	Fin des distributions N5	0 j																										
832	CET	Fin des terminaux et raccordements N5	0 j																										
833	TCE	Achèvement des travaux Bloc 9 Niveau 5	0 j																										
841	NIVEAU N4		425 j																										
842	CLS	Cloisonnements grande hauteur	40 j																										
843	CET	Distribution principale et secondaire	80 j																										




	Intervenant	Nom de la tâche	Durée					2027				2028				2029				2030				2031						
				T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3
853	CET	Fin des locaux techniques N4	0 j																											
854	CLS	Faux-plafonds	20 j																											
855	CET	Distribution au sol	30 j																											
856	SD	Plancher technique	50 j																											
857	SD	Plancher technique de rive en liaison avec façades	20 j																											
858	CES	Revêtements de sols	20 j																											
859	MEN	Blocs-portes	15 j																											
860	META	Travaux de serrurerie	25 j																											
861	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																											
862	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																											
863	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	15 j																											
864	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	20 j																											
865	CES	Finitions	40 j																											
866	TCE	Repli installations provisoires	10 j																											
867	TCE	Nettoyage	20 j																											
868	CET	Fin des distributions N4	0 j																											
869	CET	Fin des terminaux et raccordements N4	0 j																											
870	TCE	Achèvement des travaux Bloc 9 Niveau 4	0 j																											
876	NIVEAU N3		505 j																											
877	CLS	Cloisonnements grande hauteur	50 j																											
878	CLS	Cassettes métal en PH	5 j																											
879	CET	Distribution principale et secondaire	80 j																											
880	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	40 j																											
881	META	Murs rideaux	30 j																											
882	CET	Pose des terminaux hauts	30 j																											
883	CLS	Cloisons	25 j																											
884	META	Cloisons vitrées	25 j																											
885	SD	Chapes	10 j																											
886	CET	Distribution et attentes plenums FP	5 j																											
887	CLS	Faux-plafonds LT	5 j																											
888	SS/PEI	Peinture LT	10 j																											
889	CES	Revêtement sol LT	10 j																											
890	CET	Pose des équipements et réseaux LT	20 j																											
891	CET	Fin des locaux techniques N3	0 j																											
892	CLS	Faux-plafonds	20 j																											
893	CET	Distribution au sol	30 j																											
894	SD	Plancher technique	30 j																											
895	SD	Plancher technique de rive en liaison avec façades	20 j																											
896	META	Travaux de serrurerie	30 j																											
897	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																											
898	CES	Revêtements de sols	20 j																											
899	MEN	Blocs-portes	15 j																											
900	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																											
901	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	15 j																											
902	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	30 j																											
903	MOB	Equipements mobiliers	40 j																											
904	CES	Finitions	40 j																											
905	TCE	Repli installations provisoires	10 j																											
906	TCE	Nettoyage	20 j																											
907	CET	Fin des distributions N3	0 j																											
908	CET	Fin des terminaux et raccordements N3	0 j																											
909	TCE	Achèvement des travaux Bloc 4 Niveau 3	0 j																											
914	NIVEAU N2		500 j																											
915	CLS	Cloisonnements grande hauteur	40 j																											
916	CLS	Cassettes métal en PH	5 j																											
917	CET	Distribution principale et secondaire	80 j																											
918	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	30 j																											
919	META	Murs rideaux	30 j																											
920	CET	Pose des terminaux hauts	30 j																											
921	CLS	Cloisons	20 j																											



Intervenant	Nom de la tâche	Durée					2027				2028				2029				2030				2031							
			T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4	S1	T1	T2	S2	T3	T4
932	SD	Plancher technique et chapes	35 j																											
933	SD	Plancher technique de rive en liaison avec façades	20 j																											
934	META	Travaux de serrurerie et cloisons vitrées	35 j																											
935	CES	Revêtements de sols	20 j																											
936	MEN	Blocs-portes	10 j																											
937	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																											
938	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																											
939	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	10 j																											
940	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	40 j																											
941	MOB	Equipements mobiliers	40 j																											
942	CES	Finitions	40 j																											
943	TCE	Repli installations provisoires	10 j																											
944	TCE	Nettoyage	20 j																											
945	CET	Fin des distributions N2	0 j																											
946	CET	Fin des terminaux et raccordements N2	0 j																											
947	TCE	Achèvement des travaux Bloc 4 Niveau 2	0 j																											
953		NIVEAU N1	435 j																											
954	CLS	Cloisonnements grande hauteur	30 j																											
955	CLS	Cassettes métal en PH	10 j																											
956	CET	Distribution principale et secondaire	60 j																											
957	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	30 j																											
958	META	Murs rideaux	30 j																											
959	CET	Pose des terminaux hauts	30 j																											
960	CLS	Cloisons	20 j																											
961	META	Cloisons vitrées	15 j																											
962	SD	Chapes	10 j																											
963	CET	Distribution et attentes plenums FP	5 j																											
964	CLS	Faux-plafonds LT	5 j																											
965	SS/PEI	Peinture LT	10 j																											
966	CES	Revêtement sol LT	10 j																											
967	CET	Pose des équipements et réseaux LT	20 j																											
968	CET	Fin des locaux techniques N1	0 j																											
969	CLS	Faux-plafonds	15 j																											
970	GOE	Chape	10 j																											
971	CET	Distribution au sol	30 j																											
972	SD	Plancher technique et chapes	35 j																											
973	META	Travaux de serrurerie	30 j																											
974	CES	Revêtements de sols	20 j																											
975	MEN	Blocs-portes	10 j																											
976	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	30 j																											
977	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	20 j																											
978	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	10 j																											
979	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	20 j																											
980	MOB	Equipements mobiliers	35 j																											
981	CES	Finitions	35 j																											
982	TCE	Repli installations provisoires	10 j																											
983	TCE	Nettoyage	20 j																											
984	CET	Fin des distributions N1	0 j																											
985	CET	Fin des terminaux et raccordements N1	0 j																											
986	TCE	Achèvement des travaux Bloc 3 & Bloc 2 Niveau 1	0 j																											
993		NIVEAU N0	509 j																											
994	CLS	Cloisonnements grande hauteur	20 j																											
995	SS/PEI	Revêtements cloisons grande hauteur	30 j																											
996	META	Murs rideaux	30 j																											
997	CET	Pose des terminaux hauts	15 j																											
998	CLS	Cloisonnements	40 j																											
999	SD	Chapes	10 j																											

N°	Intervenant	Nom de la tâche	Durée
1013	CES	Revêtements de sols	45 j
1014	MEN	Blocs-portes	20 j
1015	CES	Revêtements muraux et revêtements acoustiques	35 j
1016	CFO/CFA	Solde câblage et terminaux, cis au sol	30 j
1017	MEN	Quincaillerie de portes en coordination avec contrôle d'accès	15 j
1018	MEN	Travaux de menuiserie (plinthes, révisions portes, gaines, etc.)	45 j
1019	MOB	Equipements mobiliers	30 j
1020	CES	Finitions	30 j
1021	TCE	Repli installations provisoires	10 j
1022	TCE	Nettoyage	10 j
1023	CET	Fin des distributions N0	0 j
1024	CET	Fin des terminaux et raccordements N0	0 j
1025	TCE	Achèvement des travaux Bloc 6, Bloc 3, Bloc 1 & Bloc 2 Niveau 0	0 j
1042	SCE	Travaux des lots scénographie	110 j
1043		INFRASTRUCTURES ET LOCAUX TECHNIQUES	770 j
1044	lot 03	Fin curage / désamiantage S3	0 j
1045	lot 03	Fin curage / désamiantage S2	0 j
1046	lot 03	Fin curage / désamiantage ES	0 j
1047	lot 03	Fin curage / désamiantage S1	0 j
1048	lot 03	Fin curage / désamiantage Infrastructure	0 j
1049	lot 03	Fin curage / désamiantage N0	0 j
1054		TRAVAUX DE STRUCTURE	250 j
1055		STRUCTURE BLOC 1 : Elargissement trémie centrale du forum au N0	75 j
1056	GOE	Démolition du plancher et des poutres PH S1 entre les files 6 à 9, cis renforts	15 j
1057	GOE	Création de dalles PH S1 sur la périphérie de cette trémie yc séchage	40 j
1058	GOE	Création de l'escalier / gradins N0 au S1, avec renforts ES	20 j
1059		STRUCTURE S1 et PH S1	165 j
1060	GOE	Dépose des gradins en réemploi	10 j
1061	GOE	Démolitions zone sous piazza	15 j
1062	GOE	Traitement des pathologies et réparations	30 j
1063	GOE	Restructuration local postes de livraison : démolition escalier existant, création nouvel escalier	20 j
1064	GOE	Démolitions PH S1, hors zone centrale	10 j
1065	GOE	Structure S1 / PH S1, hors zone centrale	20 j
1066	GOE	Maçonneries	30 j
1067		STRUCTURE BLOC 1 : Suppression de poteaux	90 j
1068	GOE	Renforts de structure et fondations pour suppression poteaux	30 j
1069	GOE	Renfort poutres PH S1 file C et poteaux restants pour suppression de poteaux	50 j
1070	GOE	Suppression de poteaux poutres	10 j
1071		STRUCTURE BLOC 1 : Zone cinéma 1	90 j
1072	GOE	Démolition planchers ES (cinéma 1)	10 j
1073	GOE	Création trémie et renforts yc séchage (double hauteur cinéma 1) du SS2 à l'ES, cis renforts de fondations	40 j
1074	GOE	Démolition pour création escaliers IS (cinéma 1)	15 j
1075	GOE	Création escaliers IS (cinéma 1) ES au N0	60 j
1076	GOE	Structure ES / S1 et maçonneries	30 j
1077	GOE	Chape PB ES	10 j
1078		STRUCTURE ES	160 j
1079	GOE	Restructuration local postes de livraison : démolition escalier existant, création nouvel escalier	20 j
1080	GOE	Travaux de démolition et structure ES, cis renforts béton projeté PH	20 j
1081	GOE	Traitement des pathologies et réparations	20 j
1082	GOE	Cinéma 2 : maçonneries, plancher régie, chape, plots bétons	20 j
1083	GOE	Petite salle : maçonneries, plancher régie, chape, plots bétons	20 j
1084	GOE	Structure gradins	10 j
1085		STRUCTURE S2	110 j
1086	GOE	Curage et pompage réseaux existants	15 j
1087	GOE	Travaux de démolition et structure SS2, cis renforts béton projeté PH	25 j
1088	GOE	Traitement des pathologies et réparations	40 j
1089	GOE	Reprise réseaux sous dallage	20 j
1090	GOE	Maçonneries	50 j
1091		STRUCTURE S3	75 j
1092	GOE	Démolitions	15 j
1093	GOE	Travaux de structure, renforts et création carnaeux	40 j
1094	GOE	Traitement des pathologies et réparations	30 j
1095	GOE	Cuvelage	20 j
1096	GOE	Fin des travaux de structure et maçonneries S1	0 j
1097	GOE	Fin des travaux de structure et maçonneries ES	0 j
1098	GOE	Fin des travaux de structure et maçonneries S2	0 j
1099	GOE	Fin des travaux de structure et maçonneries S3	0 j
1100		TRAVAUX CET ET D'AMENAGEMENT	545 j

57484-CNAC-PLA-008-IndB-2026-02-25_Planning directeur études et travaux VC VT Page 10 sur 12 VGO / ION

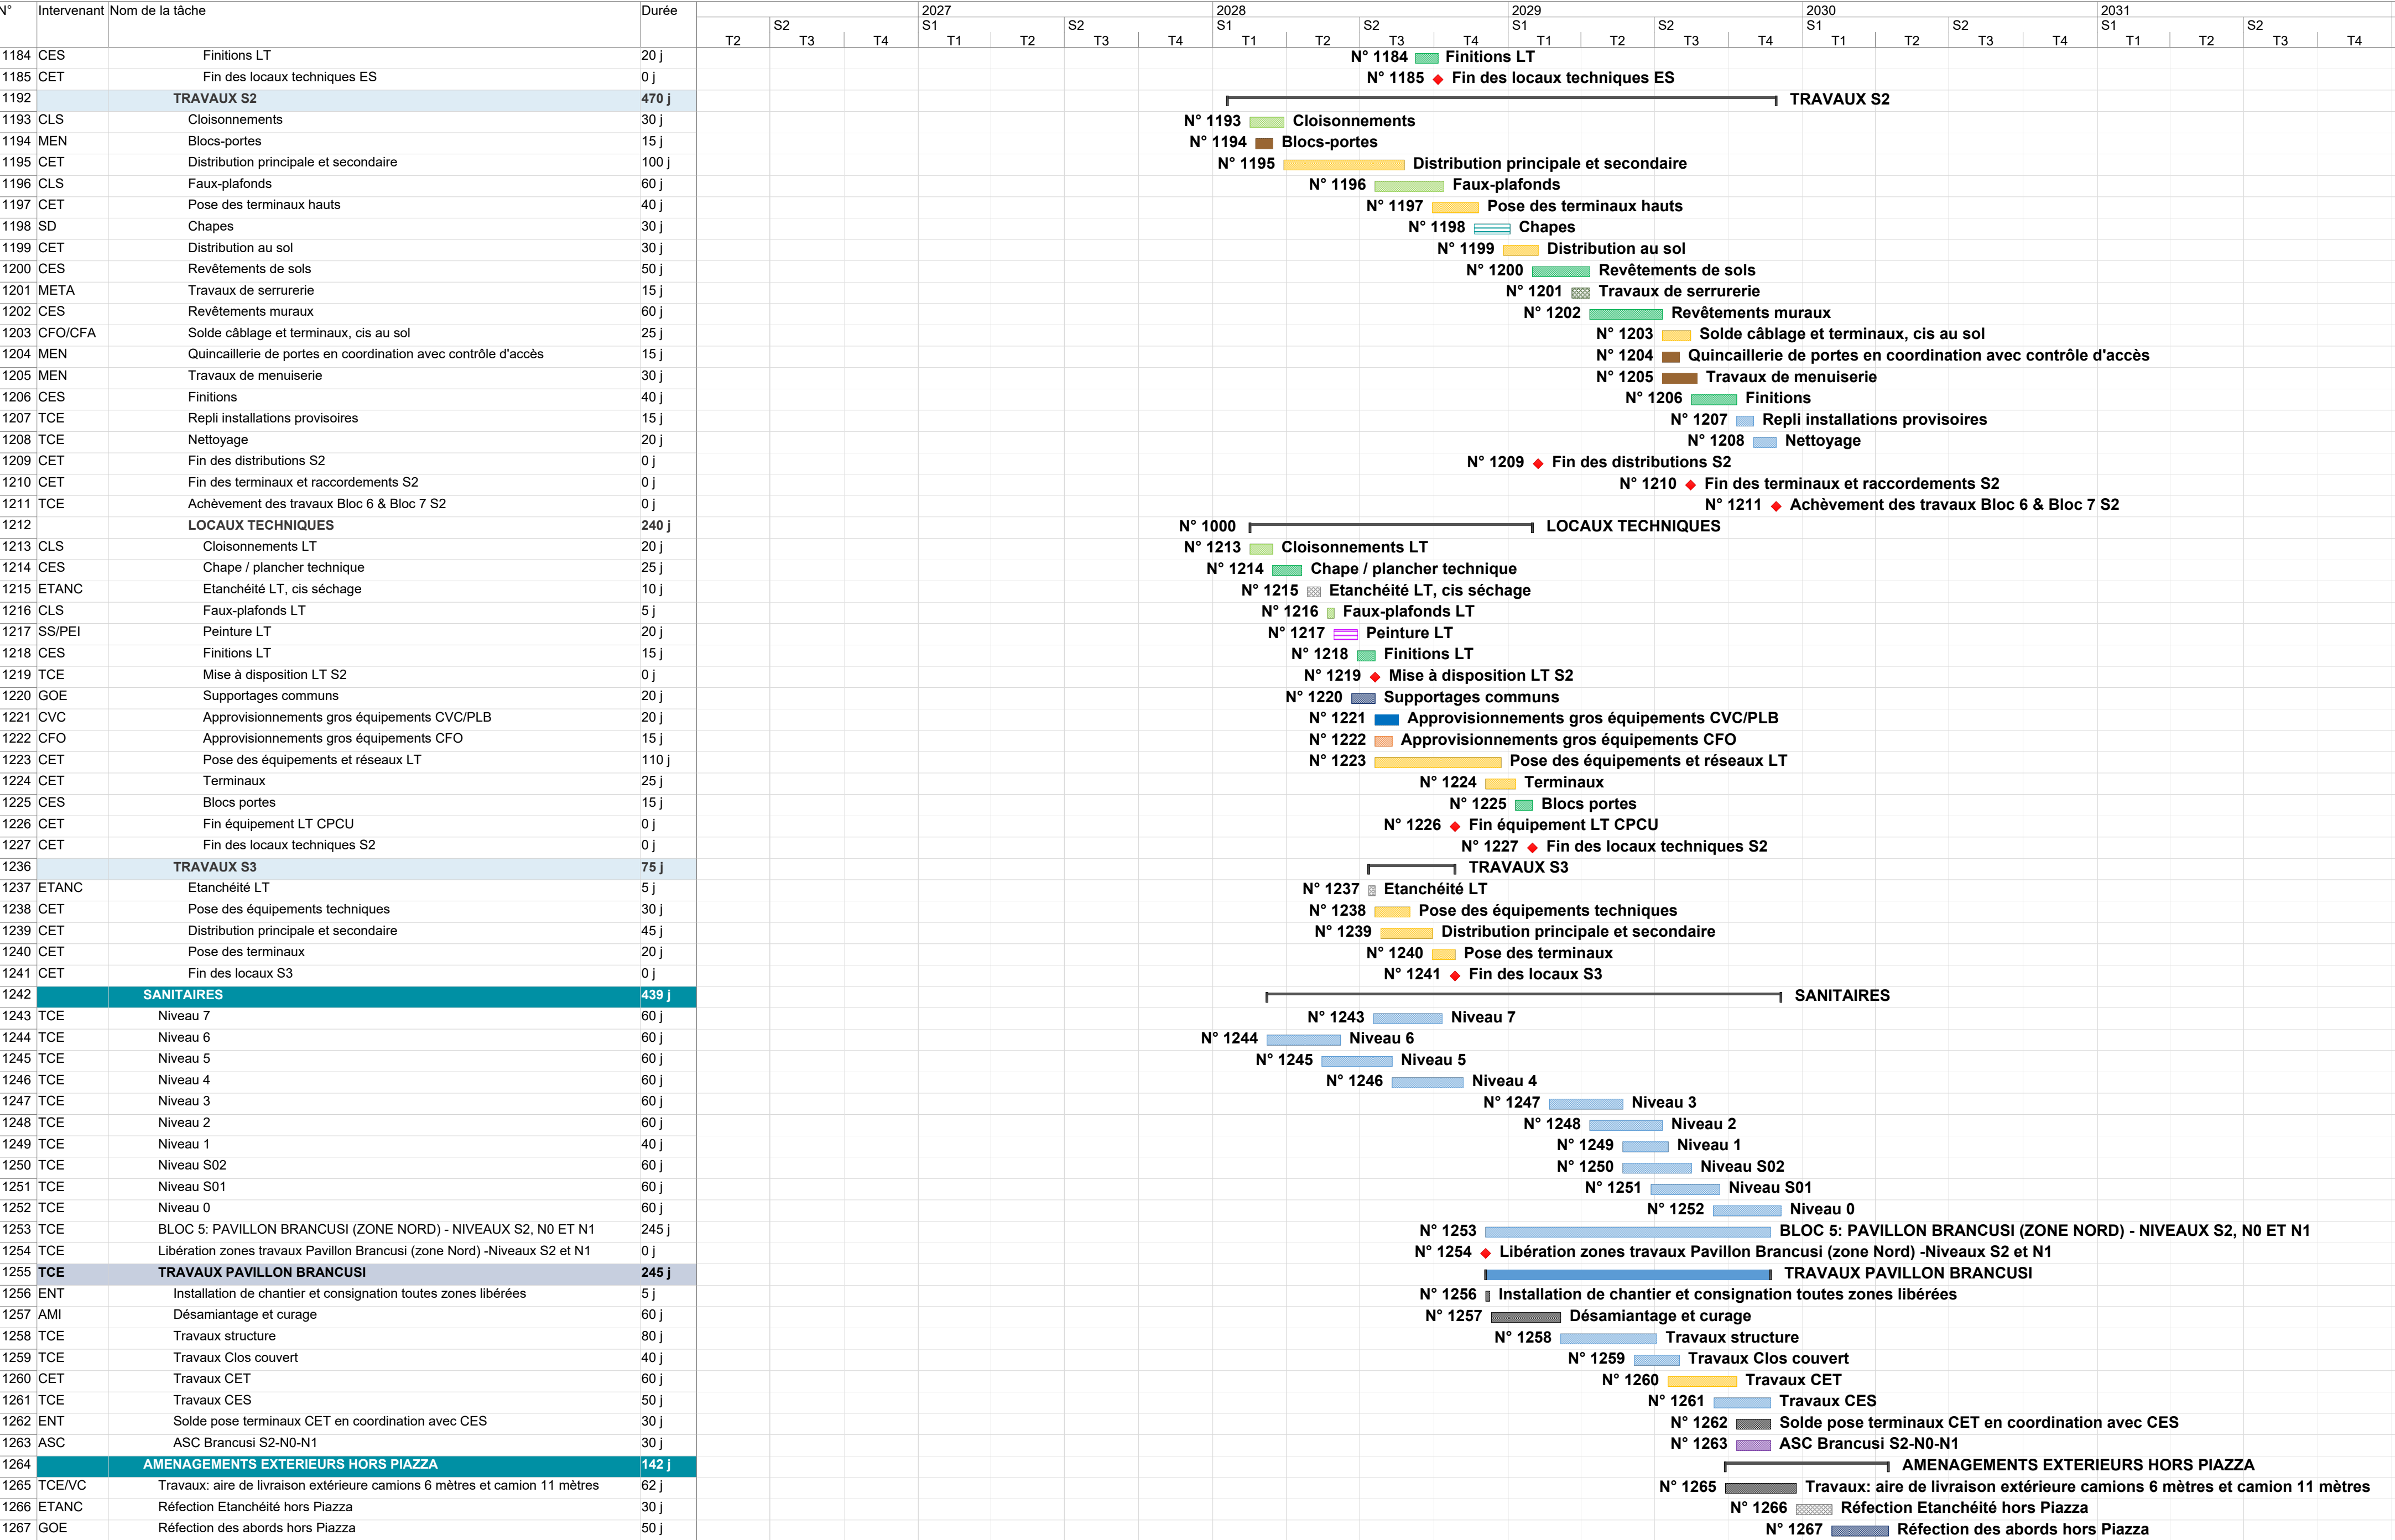

57484-CNAC-PLA-008-IndB-2026-02-25_Planning directeur études et travaux VC VT Page 12 sur 12 VGO / ION
