



Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES

Hôpital de la Femme, de la Mère et de l'Enfant

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF
DE RADIOLOGIE EN IMAGERIE PAR
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)
RESTRUCTURATION PARTIELLE DU
SERVICE SENOLOGIE EXISTANT

DCE

CARNET DE CALENDRIER & PHASAGE

Calendrier DCE_06/2026 - Ind 00


Calendrier ZOOM REHA_06/2026 - Ind 00

Zonage Restructuration V01 – Fond de plan existant

Zonage Restructuration V01 – Fond de plan projet

JUIN 2026



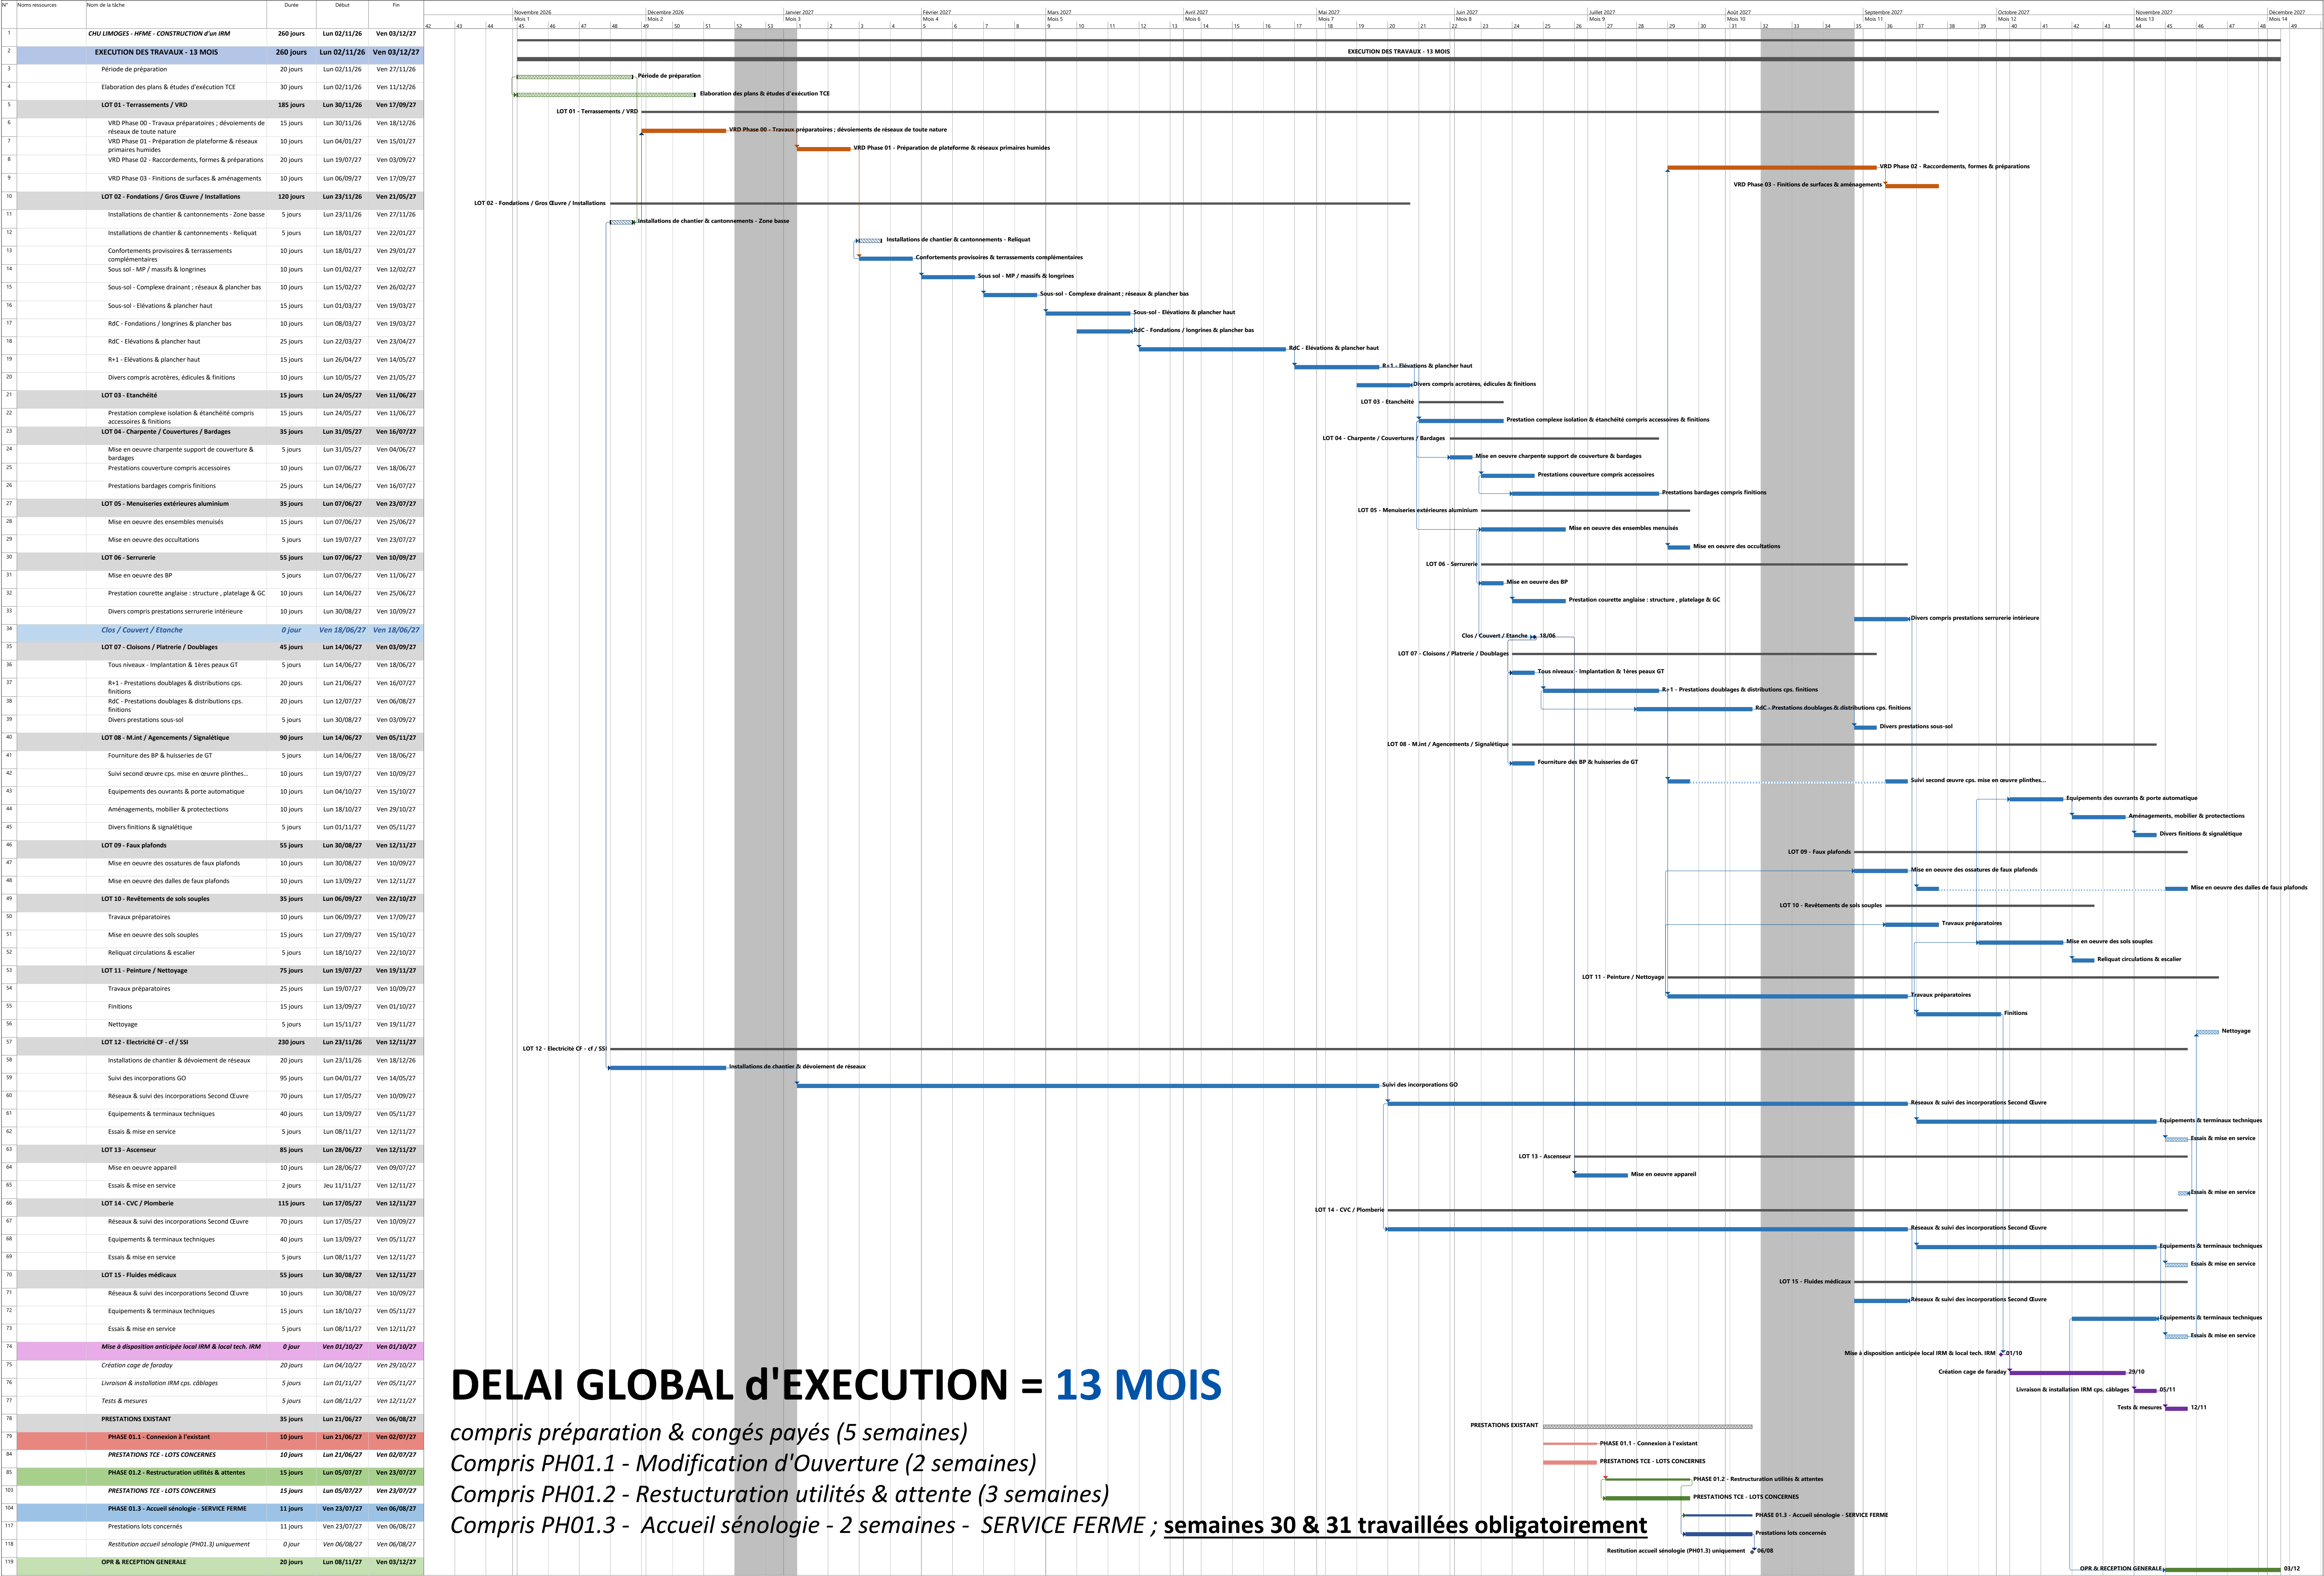

CHU de Limoges

Construction d'un bâtiment neuf de radiologie en imagerie par IRM- HFME

Calendrier Travaux - DCE - JUIN 2026 ind00

ZOOM PRESTATIONS REHABILITATION / CONNEXION à l'EXISTANT

Atelier

ARQUANTES

N°	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		CHU LIMOGES - HFME - CONSTRUCTION d'un IRM	260 jours	Lun 02/11/26	Ven 03/12/27
2		EXECUTION DES TRAVAUX - 13 MOIS	250 jours	Lun 02/11/26	Ven 19/11/27
78		PRESTATIONS EXISTANT	35 jours	Lun 21/06/27	Ven 06/08/27
79		PHASE 01.1 - Connexion à l'existant - 2 SEMAINES	10 jours	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27
80	LOT 02	SAS d'isolement / cloisonnement provisoire	2 jours	Lun 21/06/27	Mar 22/06/27
81	LOT 12	Neutralisations & consignations	1 jour	Mar 22/06/27	Mar 22/06/27
82	LOT 02	Modification d'ouverture	6 jours	Mer 23/06/27	Mer 30/06/27
83	LOT 07	Fermeture provisoire compris porte d'accès	2 jours	Jeu 01/07/27	Ven 02/07/27
84		PHASE 01.2 - Restructuration utilités & attentes - 3 SEMAINES	15 jours	Lun 05/07/27	Ven 23/07/27
85	LOT 07	SAS d'isolement / cloisonnements provisoires & extracteur	2 jours	Lun 05/07/27	Mar 06/07/27
86	LOT 09	Modification des faux plafonds pour cloisons provisoires	1 jour	Lun 05/07/27	Lun 05/07/27
87	LOT 12 & 14	Neutralisations & consignations	1 jour	Lun 05/07/27	Lun 05/07/27
88	LOT 07	Démolitions & évacuations	1 jour	Mer 07/07/27	Mer 07/07/27
89	LOT 10	Démolitions & évacuations	1 jour	Mer 07/07/27	Mer 07/07/27
90	LOT 07	Implantation / 1eres peaux & pose BP	2 jours	Jeu 08/07/27	Ven 09/07/27
91	LOTS 12 & 14	Incorporations techniques	1 jour	Lun 12/07/27	Lun 12/07/27
92	LOT 07	Plaquisterie compris finitions	3 jours	Lun 12/07/27	Mer 14/07/27
93	LOT 11	Travaux préparatoires peinture & revêtements	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27
94	LOT 10	Travaux préparatoires revêtements de sols souples	1 jour	Ven 16/07/27	Ven 16/07/27
95	LOT 09	Mise en œuvre ossatures de faux plafonds	1 jour	Lun 19/07/27	Lun 19/07/27
96	LOT 11	Finitions peinture & revêtements	2 jours	Lun 19/07/27	Mar 20/07/27
97	LOT 10	Mise en oeuvre sols souples	2 jours	Mer 21/07/27	Jeu 22/07/27
98	LOTS 12 & 14	Terminaux techniques	2 jours	Jeu 22/07/27	Ven 23/07/27
99	LOT 08	Equipement des BP & agencements / mobilier	1 jour	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27
100	LOT 09	Blanchiment des faux plafonds	1 jour	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27
101	LOT 10	Protection provisoire des sols	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
102		PHASE 01.3 - Accueil sénologie - SERVICE FERME - 2 SEMAINES (30 & 31)	11 jours	Ven 23/07/27	Ven 06/08/27
103	LOT 07	Mise en oeuvre des protections ; cantonnements provisoires & extracteur	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
104	LOT 08	Mise en oeuvre des calfeutrements provisoires	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
105	LOTS 12 & 14	Neutralisations & consignations	1 jour	Lun 26/07/27	Lun 26/07/27
106	LOTS 07 / 08 / 09 /10	Démolitions & évacuations	2 jours	Lun 26/07/27	Mar 27/07/27
107	LOT 07	Plaquisterie compris finitions	2 jours	Mer 28/07/27	Jeu 29/07/27
108	LOT 10	Travaux préparatoires revêtements de sols souples	1 jour	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27
109	LOT 11	Prestations peinture ; préparation & finitions	2 jours	Lun 02/08/27	Mar 03/08/27
110	LOT 10	Mise en oeuvre sols souples	2 jours	Mar 03/08/27	Mer 04/08/27
111	LOT 09	Prestations plâfisterie	2 jours	Mer 04/08/27	Jeu 05/08/27
112	LOT 08	Mise en place mobilier	2 jours	Mer 04/08/27	Jeu 05/08/27
113	LOTS 12 & 14	Mise en œuvre terminaux	3 jours	Mer 04/08/27	Ven 06/08/27
114	LOT 11	Nettoyage de restitution	1 jour	Ven 06/08/27	Ven 06/08/27
115		Restitution accueil sénologie (PH01.3) uniquement	0 jour	Ven 06/08/27	Ven 06/08/27
116		OPR & RECEPTION GENERALE	20 jours	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27

PH01.1 - Modification d'Ouverture
2 semaines

PH01.2 - Restucturation utilités & attente
3 semaines

PH01.3 - Accueil sénologie
2 semaines
SERVICE FERME
semaines 30 & 31 travaillées obligatoirement

PRESTATIONS EXISTANT

EXECUTION DES TRAVAUX - 13 MOIS

PHASE 01.1 - Connexion à l'existant - 2 SEMAINES

PHASE 01.2 - Restructuration utilités & attentes - 3 SEMAINES

PHASE 01.3 - Accueil sénologie - SERVICE FERME - 2 SEMAINES (30 & 31)

LOT 02

LOT 12

LOT 02

LOT 07

LOT 07

LOT 07

LOT 09

LOT 12 & 14

LOT 07

LOT 10

LOT 07

LOTS 12 & 14

LOT 07

LOT 11

LOT 10

LOT 09

LOT 11

LOT 10

LOTS 12 & 14

LOT 08

LOT 09

LOT 10

LOT 07

LOT 08

LOTS 12 & 14

LOTS 07 / 08 / 09 /10

LOT 07

LOT 10

LOT 11

LOT 10

LOT 09

LOT 08

LOTS 12 & 14

LOT 11

Restitution accueil sénologie (PH01.3) uniquement

