

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	66731-138980 A
Propriétaire	Hôpital de Guérande
Donneur d'ordre	Hôpital de Guérande
Adresse de l'immeuble	28 Avenue Pierre de la Bouexière
	44350 GUERANDE
Type de bien	Bâtiment G
Date de la commande	29/03/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	24/07/2023
Date d'émission du rapport de repérage	31/08/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Pas de programme travaux

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO  
Tél. : 33 (0)2 14 74 64 40  
centreouest@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00098

Opérateur de repérage :

**BOUCHET Olivier**  
Apave Diagnostics  
Le 31/08/2023

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

## **Commentaires :**

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux.

Il faut donc entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels et sans sondages destructifs.

Le présent pré-rapport énumère dans une liste non-exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever l'ensemble de ces réserves afin de rendre un rapport définitif.

Ainsi, un prélèvement P019 revenu positif concerne des enduits et ciment de type granulaire constituant des murs en moellons : ces murs ne peuvent pas être repérés précisément sans sondages destructifs. Il conviendra de les réaliser après libération des locaux.

De même, 3 prélèvements P014, P052 et P013 revenus positifs et prélevés dans la zone dite "linge sale" témoigne de la présence d'enduits amiantés (plinthes en bois et plaques de plâtre). Une stratégie de prélèvements pourra être mise en place afin de confirmer ou non le repérage effectué sur le croquis n° 6.

Par conséquent, les croquis de repérage des produits et matériaux amiantés présents dans ce rapport sont donc provisoires et pourront être modifiés.

Afin de respecter les consignes sanitaires inhérentes à la partie cuisine, aucun sondage destructif n'a été effectué. Les zones cachées derrière les panneaux de chambre froide devront aussi être investiguées après libération des locaux.

Au cas où les travaux s'appliqueraient sur les gaines techniques d'ascenseur et les cabines d'ascenseur, ils devront faire l'objet d'un diagnostic amiante : la présence d'un technicien spécialisé sera donc nécessaire (mise hors-tension de l'ouvrage, accès à la gaine...etc.).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Local poubelles	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Linge sale	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014
		Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse (P017)	Z017
Machinerie d'ascenseur 1	RDC	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019
Local électrique	RDC	Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Dégagement 1	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Machinerie d'ascenseur 2	RDC	Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P024)	Z024
Dépôt linge	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Dégagement 2	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
RIA	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Sanitaires	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019
Vestiaires 1	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreeouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreeouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

3/247

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
<b>Machinerie d'ascenseur 3</b>	RDC	Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	<b>Z024</b>
<b>Vestiaires 2</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
<b>Chambre funéraire</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
<b>Présentation des corps</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
<b>Lingerie</b>	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
<b>Stockage matériel</b>	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z013</b>
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z019</b>
		Evier	Matériau noir	Résultat d'analyse (P035)	<b>Z035</b>
<b>Pause</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
<b>Pièce 1</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		2 Conduits de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	<b>Z024</b>
		1 Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	<b>Z024</b>
<b>Salle préparation 1</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
<b>Salle préparation 2</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
<b>Pièce 2</b>	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
<b>Dégagement 3</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
<b>Dégagement 4</b>	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
<b>Local</b>	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z013</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
<b>Palier</b>	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z013</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
<b>Dégagement 5</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>
<b>Vestiaires 3</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	<b>Z017</b>
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z052</b>

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

4/247



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Vestiaires 4	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
Laverie	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
Dégagement cuisine 1	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
Dégagement cuisine 2	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
Wc	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
Vestiaires cuisine	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052
Couloir	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052

➤ Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Salle personnel	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Chambre froide 3	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Bureau	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Chaîne plateaux	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Frigo Régé-départ	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Cuisson	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Conditionnement	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction
Frigo Régévide	RDC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux	Tout élément de construction

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies. « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :  
- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.  
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

➤ Liste des éléments non inspectés :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Local poubelles	RDC	Coffrage et habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Linge sale	RDC	Coffrages	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Machinerie d'ascenseur 1	RDC	Habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Vestiaires 2	RDC	Coffrage et habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Présentation des corps	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Stockage matériel	RDC	Conduit plâtré en plénum	Matériaux et produits potentiellement amianté	Accès impossible sans sondage destructif	A réaliser après libération des locaux
Vestiaires 3	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Laverie	RDC	Sol	Colle de carrelage gris (15X15)	Prélèvement impossible (risques sanitaires) et personnel en service	Prélèvement à réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Dégagement cuisine 2	RDC	Sol n°2	Colle de carrelage gris (20X20)	Prélèvement impossible (risques sanitaires) et personnel en service	Prélèvement à réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide n°2	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Couloir	RDC	Sol	Colle de carrelage dans rigole d'évacuation d'eau	Carrelage bleu : impossibilité de prélever	A réaliser après libération des locaux
		Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Dépose des plaques de faux-plafond impossible (risque sanitaire, plaques émissives de poussières) et personnel en service	A réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Chambre froide 1	RDC	Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux
		Sol PVC	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Matériaux et produits présents sous le sol PVC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux
Chambre froide 2	RDC	Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :  
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>9</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	9
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	9
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	9
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	9
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>9</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	10
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>12</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	12
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	12
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	12
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	13
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>13</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	13
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	17
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	28
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>84</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>92</b>
<b>ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....</b>	<b>119</b>
<b>ANNEXE : ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....</b>	<b>244</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>245</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>246</b>

**1 Description de la mission****1.1 Objet de la mission :**

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **66731-138980**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment G**

**1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :**

Propriétaire de l'immeuble : **Hôpital de Guérande**

Adresse du propriétaire : **Hôpital de Guérande**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **Hôpital de Guérande**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur BOUCHET Olivier**

N° de certification de l'opérateur : **20-1154**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

**1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :**

Dénomination :

Adresse complète : **28 Avenue Pierre de la Bouexière  
- 44350 GUERANDE**

Référence Cadastre : **Sans objet**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment :

Etage : **RDC**

Escalier : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Hôpital**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

**1.4 Identification du laboratoire d'analyse :**

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

**2 Programme de Travaux**

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

**Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :**

Pas de programme travaux transmis

## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder		
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)		Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Plaques en matériaux bitumineux		Peintures décoratives
	Revêtements anti-condensation sous bac acier	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Ardoises en fibro ciment		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Conduits d'eaux pluviales		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Garnissage des joints de dilatation		Enduits de ragréage, débouillage, lissage
	Joints de dilatation		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Couvre-joints		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Tresses d'étanchéité à l'air	Poteaux	Flocages
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Jonctions bitumineuses		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Solins en fibre ciment		Joints de dilatation, d'assemblage avec pourtravaux
	Colle des solins en fibre ciment		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Isolants fibreux en sous toiture		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages, enduits projetés		Flocages
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur		Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)		Bandes calicot
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
Fenêtres de toit, lanternes, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)		Sous couches des tissus muraux
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>		Gaines et coffres verticaux	Flocages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Ardoises composites hors fibro ciment		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Ardoises en fibro ciment		Bandes calicot
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)		Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Peintures des bardages métalliques		Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculux, et sur serrurerie)
Façades lourdes y compris poteaux	Carton-amiante		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs		Isolants intérieurs des portes
	Revêtements plastiques épais (RPE)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Peintures sur béton		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Enduits pelliculaires de lissage/débouillage		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire		Revêtements bitumineux
	Garnissage des joints de dilatation		Peintures intumescentes
	Joints de dilatation	<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
	Couvre-joints	Plafonds	Flocages
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Panneaux collés vissés ou cloués
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		



	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettées avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage

	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

### 4.3 Analyse Documentaire :

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreuwest@apave-diagnostics.com](mailto:centreuwest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

12/247

Titre	Commentaire
Programme de travaux	Pas de programme travaux communiqué. La zone concernée par les travaux a été délimitée par Monsieur Héno. Les croquis ont été transmis par le client.

#### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
Apave	Rapport n° 21373606-2	28/10/2022	Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de ce pré-rapport, il a été repéré à ce stade des matériaux et produits contenant de l'amiante

### 5 Résultats détaillés du repérage

#### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local poubelles	RDC
Linge sale	RDC
Machinerie d'ascenseur 1	RDC
Local électrique	RDC
Dégagement 1	RDC
Machinerie d'ascenseur 2	RDC
Dépôt linge	RDC
Dégagement 2	RDC
RIA	RDC
Sanitaires	RDC
Vestiaires 1	RDC
Machinerie d'ascenseur 3	RDC
Vestiaires 2	RDC
Chambre funéraire	RDC
Présentation des corps	RDC
Lingerie	RDC
Stockage matériel	RDC
Compresseur froid	RDC
Local stockage	RDC
Pause	RDC
Pièce 1	RDC
Salle préparation 1	RDC
Salle préparation 2	RDC
Pièce 2	RDC
Dégagement 3	RDC

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

13/247

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Dégagement 4	RDC
Local	RDC
Palier	RDC
Dégagement 5	RDC
Vestiaires 3	RDC
Vestiaires 4	RDC
Laverie	RDC
Dégagement cuisine 1	RDC
Dégagement cuisine 2	RDC
Wc	RDC
Vestiaires cuisine	RDC
Couloir	RDC
Chambre froide 1	RDC
Chambre froide 2	RDC

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Salle personnel	RDC	Tout élément de construction
Chambre froide 3	RDC	Tout élément de construction
Bureau	RDC	Tout élément de construction
Chaîne plateaux	RDC	Tout élément de construction
Frigo Regé-départ	RDC	Tout élément de construction
Cuisson	RDC	Tout élément de construction
Conditionnement	RDC	Tout élément de construction
Frigo Regévide	RDC	Tout élément de construction

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Local poubelles	RDC	Coffrage et habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Linge sale	RDC	Coffrages	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Machinerie d'ascenseur 1	RDC	Habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Vestiaires 2	RDC	Coffrage et habillage plaques de plâtre	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Présentation des corps	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Stockage matériel	RDC	Conduit plâtré en plénum	Matériaux et produits potentiellement amianté	Accès impossible sans sondage destructif	A réaliser après libération des locaux
Vestiaires 3	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Laverie	RDC	Sol	Colle de carrelage gris (15X15)	Prélèvement impossible (risques sanitaires) et personnel en service	Prélèvement à réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Dégagement cuisine 2	RDC	Sol n°2	Colle de carrelage gris (20X20)	Prélèvement impossible (risques sanitaires) et personnel en service	Prélèvement à réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide n°2	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux
Couloir	RDC	Sol	Colle de carrelage dans rigole d'évacuation d'eau	Carrelage bleu : impossibilité de prélever	A réaliser après libération des locaux
		Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Dépose des plaques de faux-plafond impossible (risque sanitaire, plaques émissives de poussières) et personnel en service	A réaliser après libération des locaux
		Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Chambre froide 1	RDC	Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux
		Sol PVC	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Matériaux et produits présents sous le sol PVC	Sondages destructifs à réaliser après libération des locaux
Chambre froide 2	RDC	Panneaux chambre froide	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Sondages destructifs impossibles	A réaliser après libération des locaux



## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Local poubelles	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plinthes 2	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Plinthes 1	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Mur	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Mur en bloc de béton creux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Poutre/Poteau	Enduit + béton - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Murs porteurs	Enduits - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plaque de plâtre en habillage	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Plaque anti-choc	PVC + plâtre	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Document consulté		Non	
Linge sale	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Isolation	Laine	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse (P016)	Z016	<b>Non</b>	
<b>Machinerie d'ascenseur 1</b>	RDC	Sol	Enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P018)	Z018	<b>Non</b>	
		Murs (plaque de plâtre collée)	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	<b>Non</b>	
<b>Local électrique</b>	RDC	Murs (plaque de plâtre collée)	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z021	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse	Z012	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + béton - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	<b>Non</b>	
<b>Dégagement 1</b>	RDC	Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		<b>Non</b>	
		Murs	Enduit + calicot	Résultat d'analyse (P050)	Z050	<b>Non</b>	
		Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	<b>Non</b>	
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse	Z012	<b>Non</b>	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse (P023)	Z023	<b>Non</b>	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		<b>Non</b>	
<b>Machinerie d'ascenseur 2</b>	RDC	Mur en bloc de béton creux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Sol	Enduit ciment + béton	Résultat d'analyse	Z018	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Oui	Voir rapport GDD
Dépôt linge	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Mur entrée gauche	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
Dégagement t 2	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
RIA	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Sanitaires	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
Vestiaires 1	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Machinerie d'ascenseur 3	RDC	Mur en bloc de béton creux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024	Oui	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Sol	Enduit ciment + béton	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreuwest@apave-diagnostics.com](mailto:centreuwest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

20/247

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Vestiaires 2	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Plinthes	Colle de plinthes	Document consulté		Non	
		Murs	Enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Murs	Enduit plâtreux + ciment - Peinture	Document consulté		Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
Chambre funéraire	RDC	Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Présentation des corps	RDC	Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z025	Non	

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreuwest@apave-diagnostics.com](mailto:centreuwest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

21/247

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse	Z026	<b>Non</b>	
<b>Lingerie</b>	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z029	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P031)	Z031	<b>Non</b>	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Résultat d'analyse (P030)	Z030	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Document consulté	Z032	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	<b>Non</b>	
<b>Stockage matériel</b>	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Document consulté	Z032	<b>Non</b>	
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse (P034)	Z034	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z029	<b>Non</b>	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	<b>Non</b>	
		Evier	Matériau noir	Résultat d'analyse (P035)	Z035	<b>Oui</b>	Voir rapport GDD
<b>Compresseur froid</b>	RDC	Sol	Béton	Résultat d'analyse (P037)	Z037	<b>Non</b>	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z038	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P039)	Z039	<b>Non</b>	
<b>Local stockage</b>	RDC	Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		<b>Non</b>	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		<b>Non</b>	
<b>Pause</b>	RDC	Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		<b>Non</b>	

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreuwest@apave-diagnostics.com](mailto:centreuwest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

22/247



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
Pièce 1	RDC	Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		2 Conduits de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024	Oui	Voir rapport GDD
		1 Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z024	Oui	Voir rapport GDD
Salle préparation 1	RDC	Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Mur	Colle de faïence	Document consulté		Non	
		Mur	Colle de faïence	Document consulté		Non	
Salle préparation 2	RDC	Mur	Colle de faïence	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Mur	Colle de faïence	Document consulté		Non	
Pièce 2	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur	Calicot + enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Mur	Matériaux et produits potentiellement amiantés			Non	
Dégagement t 3	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
Dégagement t 4	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Conduit de ventilation	Matériau noir souple	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
Local	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Mur	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
Palier	RDC	Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Mur entrée et droite	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Sol	Colle sur PVC + ragréage + chappe	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Mur de gauche	Enduit + calicot	Résultat d'analyse	Z044	Non	
Dégagement t 5	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Vestiaires 3	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plinthes	Colle de plinthes	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Murs	Enduit plâtreux + ciment - Peinture	Document consulté		Non	
Vestiaires 4	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plinthes	Colle de plinthes	Document consulté		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Murs	Calicot + enduit - Peinture	Document consulté		Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Murs	Enduit plâtreux + ciment - Peinture	Document consulté		Non	
Laverie	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Plinthes	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Dégagement cuisine 1	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Matériau noir souple	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes grises	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Colle de plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Dégagement cuisine 2	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol n°1	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Document consulté	Z032	Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes grises	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
Wc	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Document consulté	Z032	Non	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes grises	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Murs	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
Vestiaires cuisine	RDC	Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Document consulté	Z032	Non	
		Plancher haut	Béton + enduit	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plinthes en bois clouées	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z013	Oui	Voir rapport GDD
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Couloir	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir rapport GDD
		Murs	Enduit + calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Oui	Voir rapport GDD
		Plinthes	Colle de carrelage	Document consulté		Non	
		Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté		Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Mur	Enduit ciment + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Chambre froide 2	RDC	Sol	Colle de carrelage + chappe	Document consulté		Non	
		Plinthes	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

**Commentaires :**

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux.

Il faut donc entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels et sans sondages destructifs.

Le présent pré-rapport énumère dans une liste non-exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever l'ensemble de ces réserves afin de rendre un rapport définitif.

Ainsi, un prélèvement P019 revenu positif concerne des enduits et ciment de type granulaire constituant des murs en moellons : ces murs ne peuvent pas être repérés précisément sans sondages destructifs. Il conviendra de les réaliser après libération des locaux.

De même, 3 prélèvements P014, P052 et P013 revenus positifs et prélevés dans la zone dite "linge sale" témoigne de la présence d'enduits amiantés (plinthes en bois et plaques de plâtre). Une stratégie de prélèvements pourra être mise en place afin de confirmer ou non le repérage effectué sur le croquis n° 6.

Par conséquent, les croquis de repérage des produits et matériaux amiantés présents dans ce rapport sont donc provisoires et pourront être modifiés.

Afin de respecter les consignes sanitaires inhérentes à la partie cuisine, aucun sondage destructif n'a été effectué. Les zones cachées derrière les panneaux de chambre froide devront aussi être investiguées après libération des locaux.

Au cas où les travaux s'appliqueraient sur les gaines techniques d'ascenseur et les cabines d'ascenseur, ils devront faire l'objet d'un diagnostic amiante : la présence d'un technicien spécialisé sera donc nécessaire (mise hors-tension de l'ouvrage, accès à la gaine...etc.).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés.

**5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage**

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.





ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : 1 Conduit de ventilation		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pièce 1 - 1 Conduit de ventilation - Dans coffrage
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		

ELEMENT : 2 Conduits de ventilation		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pièce 1 - 2 Conduits de ventilation - Plénum
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		

ELEMENT : Conduit de ventilation		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 3 - Conduit de ventilation - Dans l'angle à gauche
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		


ELEMENT : Conduit de ventilation		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Conduit de ventilation - Entrée gauche
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		

ELEMENT : Conduit de ventilation		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Conduit de ventilation - Dans coffrage
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		

ELEMENT : Plafond		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>		
<b>Commentaires</b>		
Fabrication > à 1997		

## PRELEVEMENT : P001

## Emplacement :

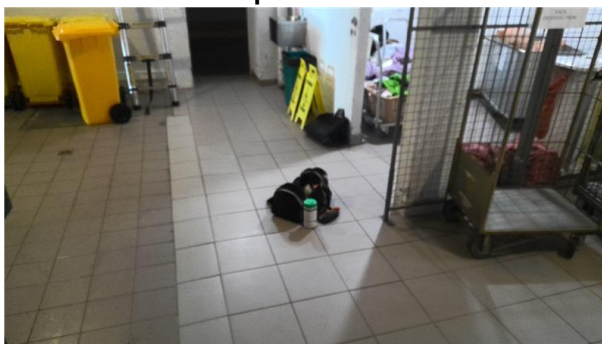

<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Sol - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage + chappe

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Colle de carrelage + chappe

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P002

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plinthes 1 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Colle de carrelage

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Mur - Toutes zones
---	---	---


<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage
--	--	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**  
Colle de carrelage

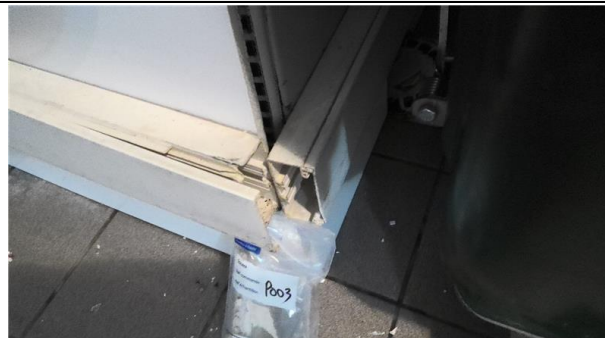

**Planche de croquis n° :**



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P004			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Mur en bloc de béton creux - Toutes zones cloison	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées







## PRELEVEMENT : P005

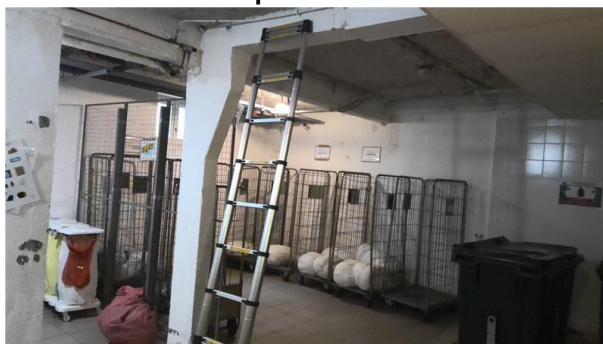

## Emplacement :

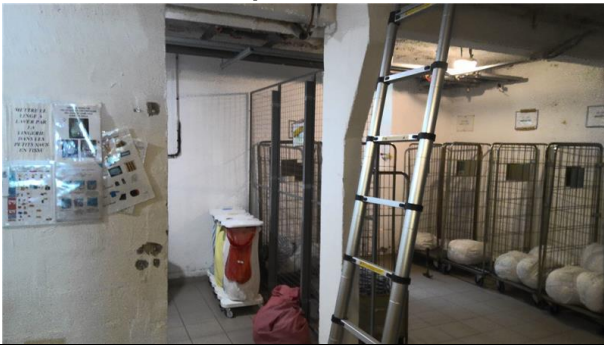



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Poutre/Poteau - Toutes zones cloison	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P006			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Murs porteurs - Toutes zones cloison	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduits - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduits / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P007			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plaque de plâtre en habillage - Toutes zones cloison	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + calicot / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plafond - Toutes zones cloison	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Plaque de faux-plafond  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P009			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plancher haut - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Flocage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Flocage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées



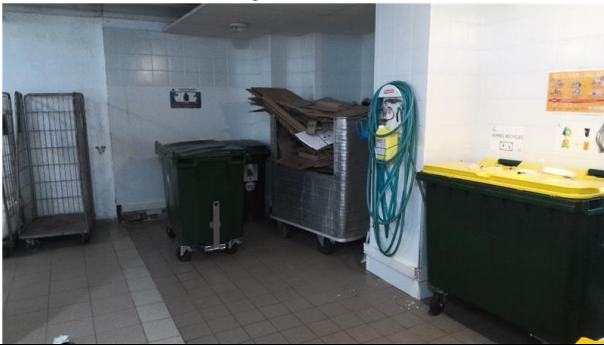

PRELEVEMENT : P010			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plinthes 2 - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local poubelles - Plaque anti-choc - Toutes zones en partie basse	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> PVC + plâtre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> PVC + plâtre  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau souple (blanc)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P012			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle sur PVC + ragréage + chappe	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle sur PVC + ragréage + chappe  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Plinthes en bois clouées - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Bois / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P014

## Emplacement :

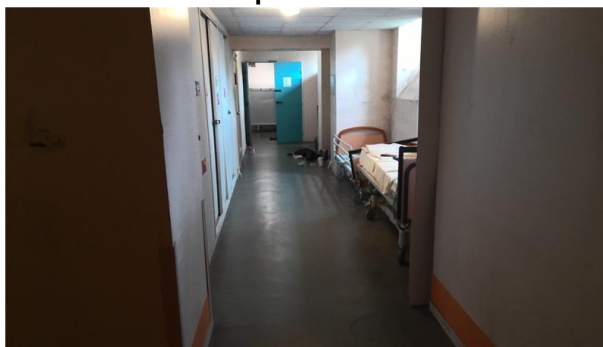

<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



**Objet :**  
Enduit + calicot / Peinture


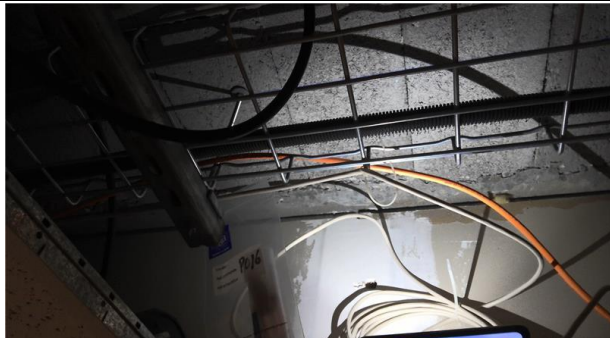
**Planche de croquis n° :**





## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type plaque métallique (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Isolation - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Laine	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Laine  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Plancher haut - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Béton + enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton + enduit  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Conduit de ventilation - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Badigeon	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>Commentaires</b> Voir le rapport gestion de déchets correspondant			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Badigeon  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau souple de type mastic (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P018			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment + béton	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment + béton  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P019

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit beige et matériau granulaire marron - Peinture

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Enduit / Peinture

## Planche de croquis n° :




## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P020			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P021

## Emplacement :

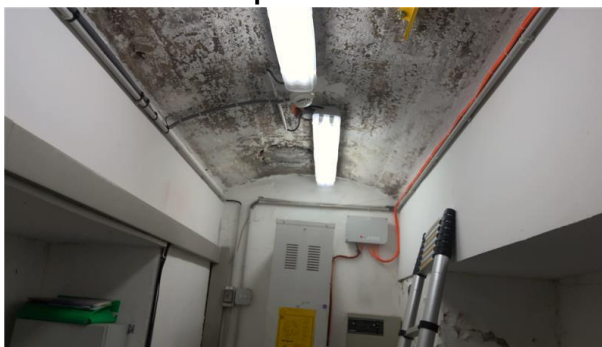

<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Murs (plaque de plâtre collée) - Toutes zones en hauteur gauche/droite
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Enduit + colle / Peinture

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P022			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local électrique - Plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P023



## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 1 - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de plaques de plâtre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de plaques de plâtre  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Machinerie d'ascenseur 2 - Conduit de ventilation - Dans l'angle	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Ciment  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P025			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dépôt linge - Mur entrée gauche - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P026


## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - RIA - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage + chape	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P027

## Emplacement :

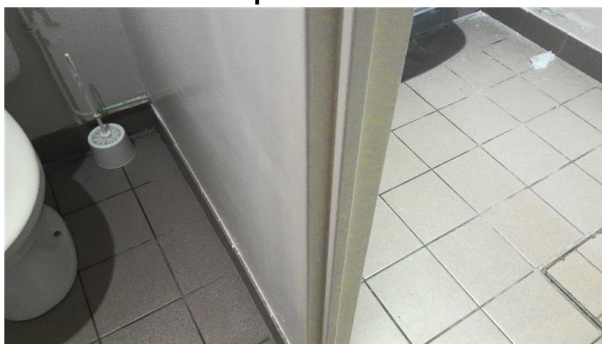

<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sanitaires - Plinthes - Toutes zones
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Colle de carrelage



## Planche de croquis n° :





## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sanitaires - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires 2 - Plancher haut - Toutes zones vestiaires	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Lingerie - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage + chappe	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage + chappe  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P031

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Lingerie - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**  
Colle de carrelage

**Planche de croquis n° :**



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P032

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Lingerie - Murs - Toutes zones
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## Commentaires


Voir P11

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit + calicot / Peinture

## Planche de croquis n° :

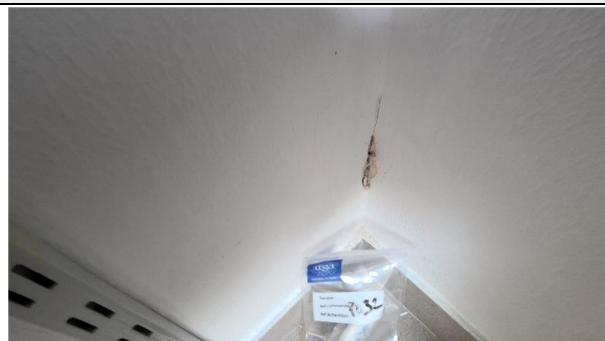


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P033

## Emplacement :

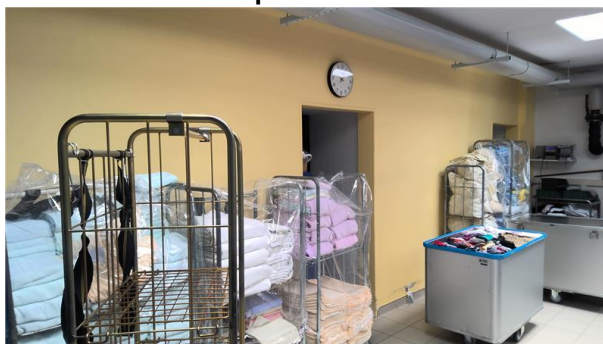



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Lingerie - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P034			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Stockage matériel - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle sur PVC + ragréage + chappe	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle sur PVC + ragréage + chappe  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P035
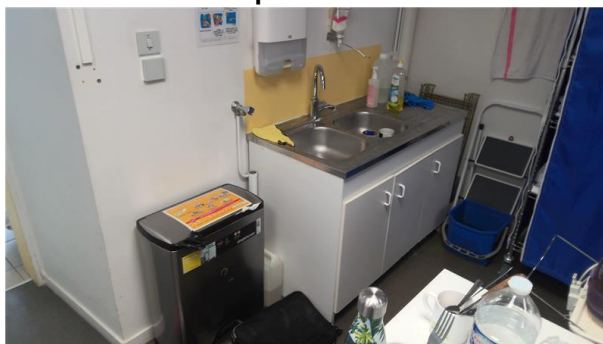
## Emplacement :




<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Stockage matériel - Evier - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Matériau noir	
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Matériau noir  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Stockage matériel - Conduit plâtré en plénum - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Matériaux et produits potentiellement amianté	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Plâtre  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P037

## Emplacement :

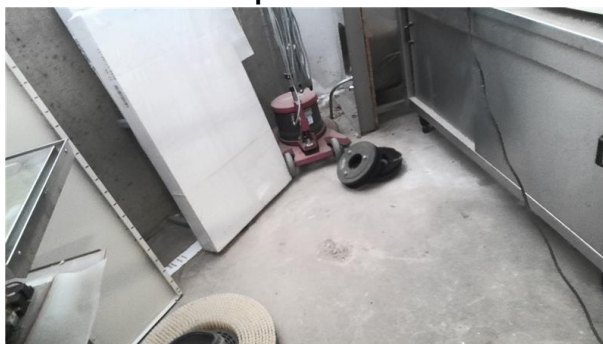

Nom du client Hôpital de Guérande	Numéro de dossier 66731-138980	Pièce ou local – Composant RDC - Compresseur froid - Sol - Toutes zones
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 24/07/2023	Partie de composant Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton



Planche de croquis n° :





## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P038			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Compresseur froid - Mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Compresseur froid - Plancher haut - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P040


## Emplacement :

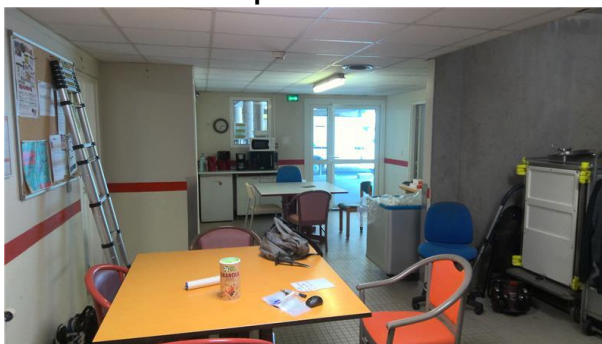

<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pause - Mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment + plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P041

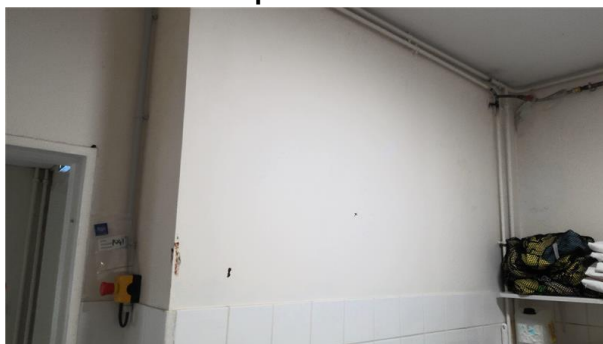

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pièce 2 - Mur - Toutes zones
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Calicot + enduit - Peinture
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> Calicot + enduit / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>		


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> <b>Hôpital de Guérande</b>	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 3 - Plinthes - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P043

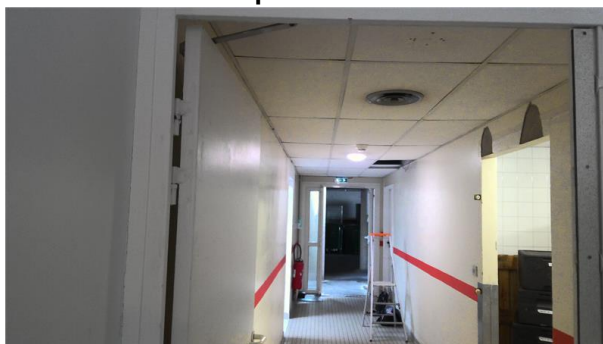

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 4 - Conduit de ventilation - Pénétration murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Matériau noir souple	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Matériau noir souple  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

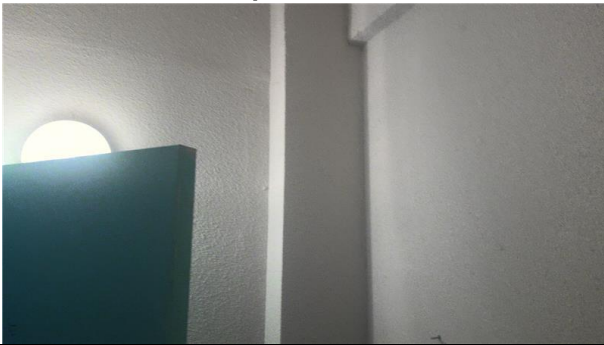

PRELEVEMENT : P044			
<b>Emplacement :</b>			
			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local - Mur - Toutes zones	
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350		
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + calicot / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local - Plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit Cciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P046

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 5 - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Colle de carrelage

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P047****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Laverie - Mur - Toutes zones
---	---	---

<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de faïence
--	--	--

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**

Colle de carrelage


**Planche de croquis n° :****DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P048



## Emplacement :





<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement cuisine 1 - Plinthes grises - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049					
<b>Emplacement :</b> 					
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Wc - Murs - Douches et lavabo			
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage			
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante					
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>					
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>					
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées		
CUST 01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées		



PRELEVEMENT : P050			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 1 - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + calicot  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 5 - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + calicot / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P052


## Emplacement :




<b>Nom du client</b> Hôpital de Guérande	<b>Numéro de dossier</b> 66731-138980  28 Avenue Pierre de la Bouexière  44350	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 24/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + calicot - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit + calicot / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**ANNEXE : Plans / Croquis**

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire : Repérage des prélèvements effectués		Localisation : Bât G	Lieu / Zone : RDC

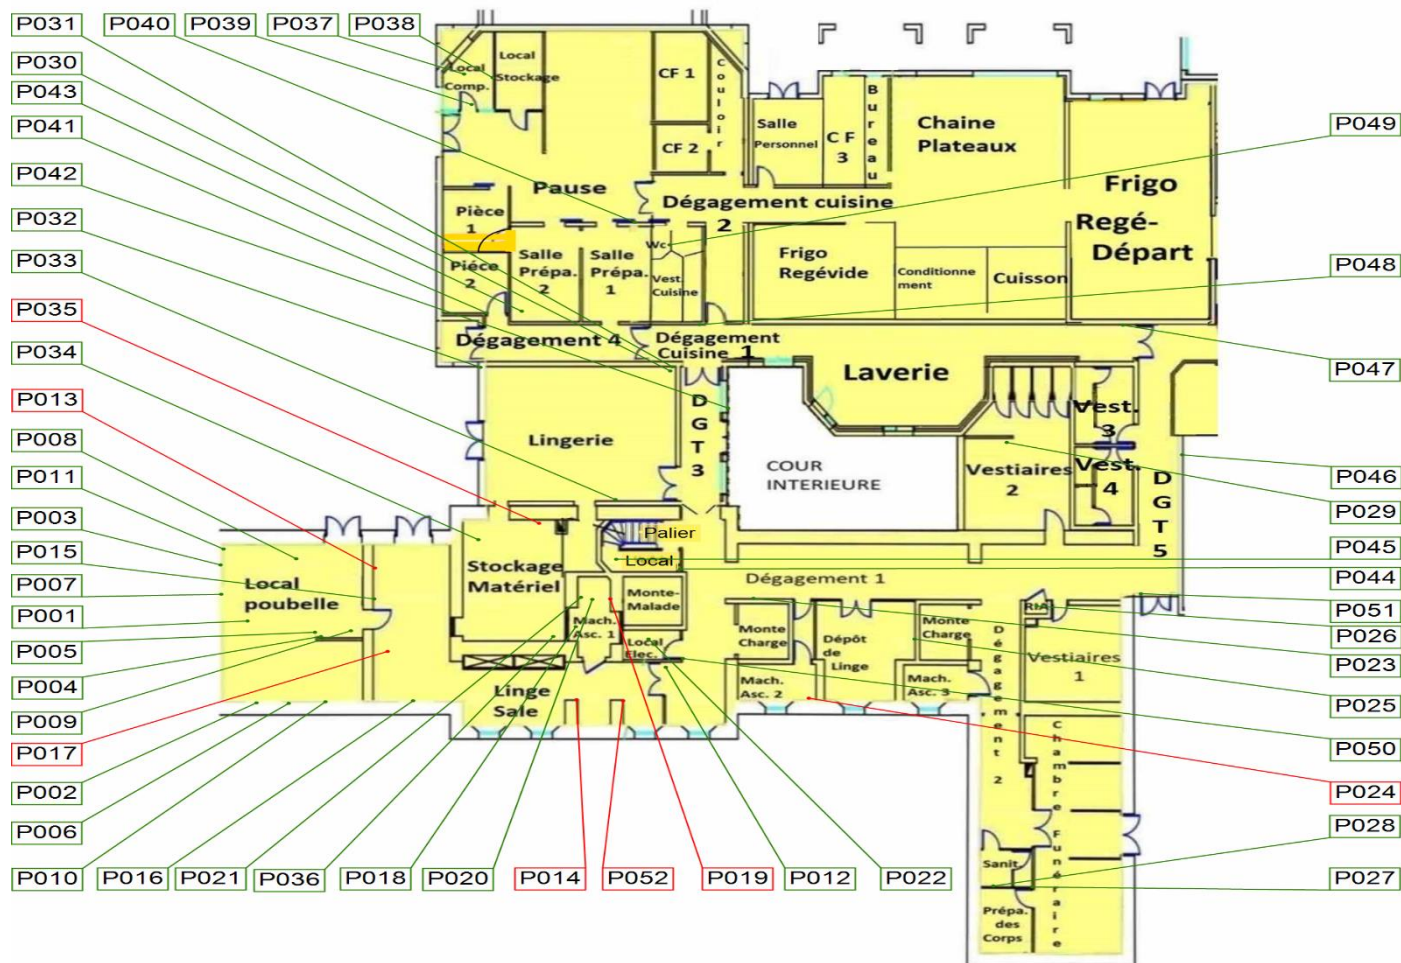

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Repérage des prélèvements effectués du rapport Apave n° 21373606-2		Localisation : Bât G	Lieu / Zone : RDC

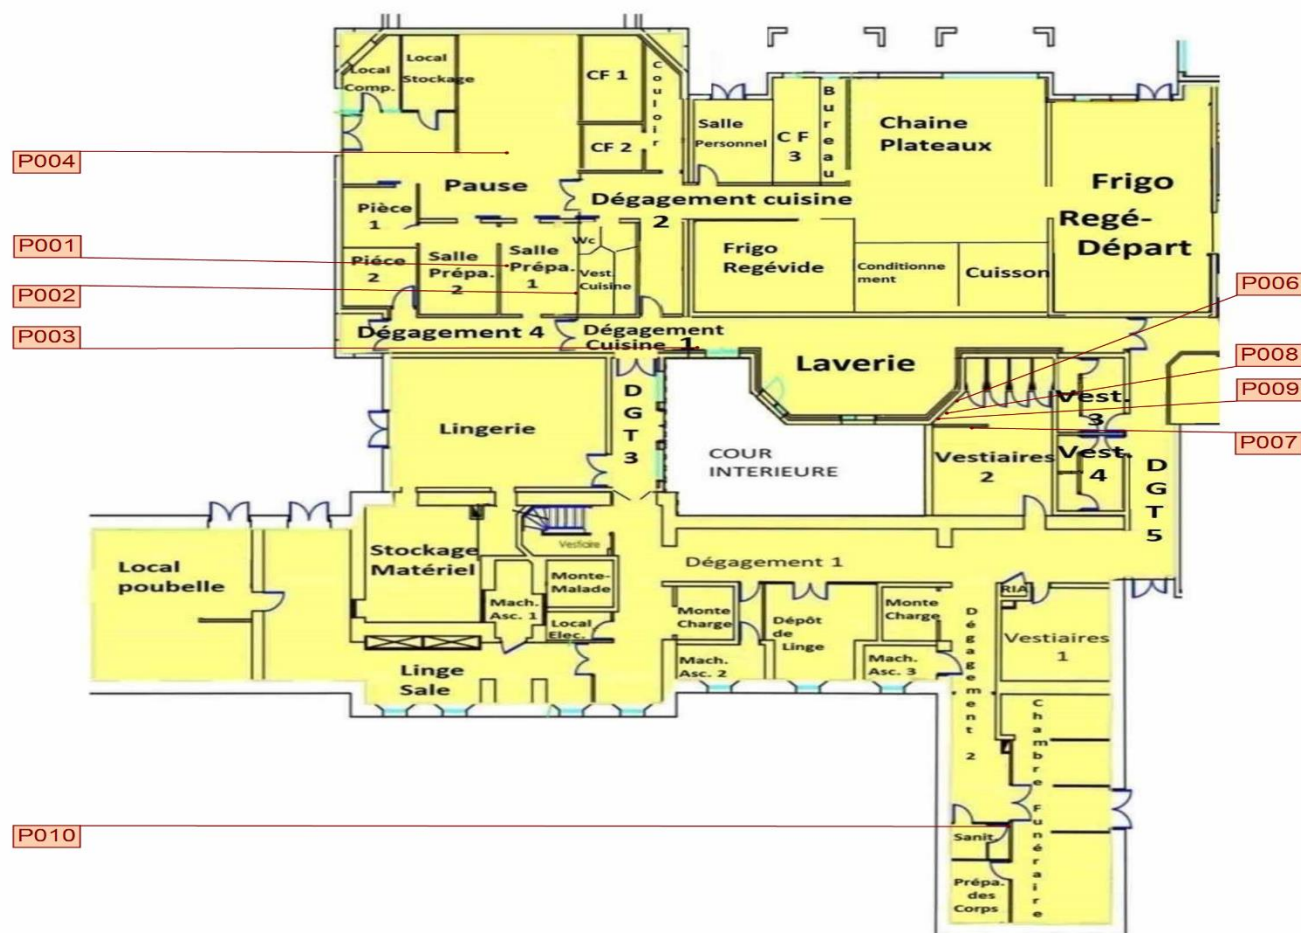





Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bât G	
Commentaires :		Lieu / Zone : RDC	

Légende :

- Conduits de ventilation en amiante-ciment
- Plaque noire amiantée sous évier
- Conduit de ventilation en amiante-ciment caché dans un coffrage

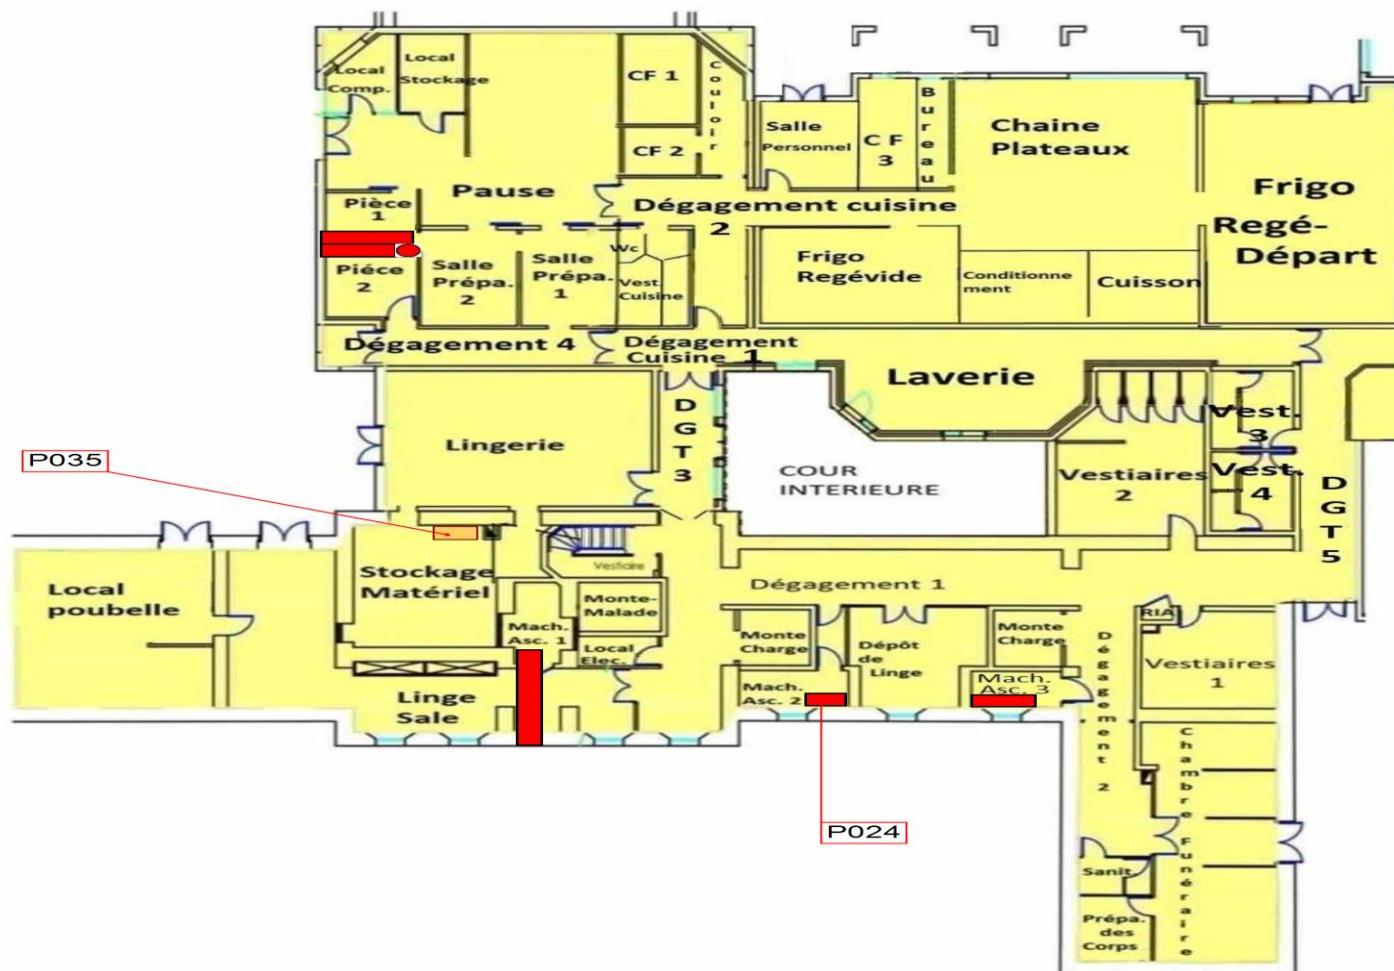


Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bât G	
Commentaire :		Lieu / Zone : RDC	

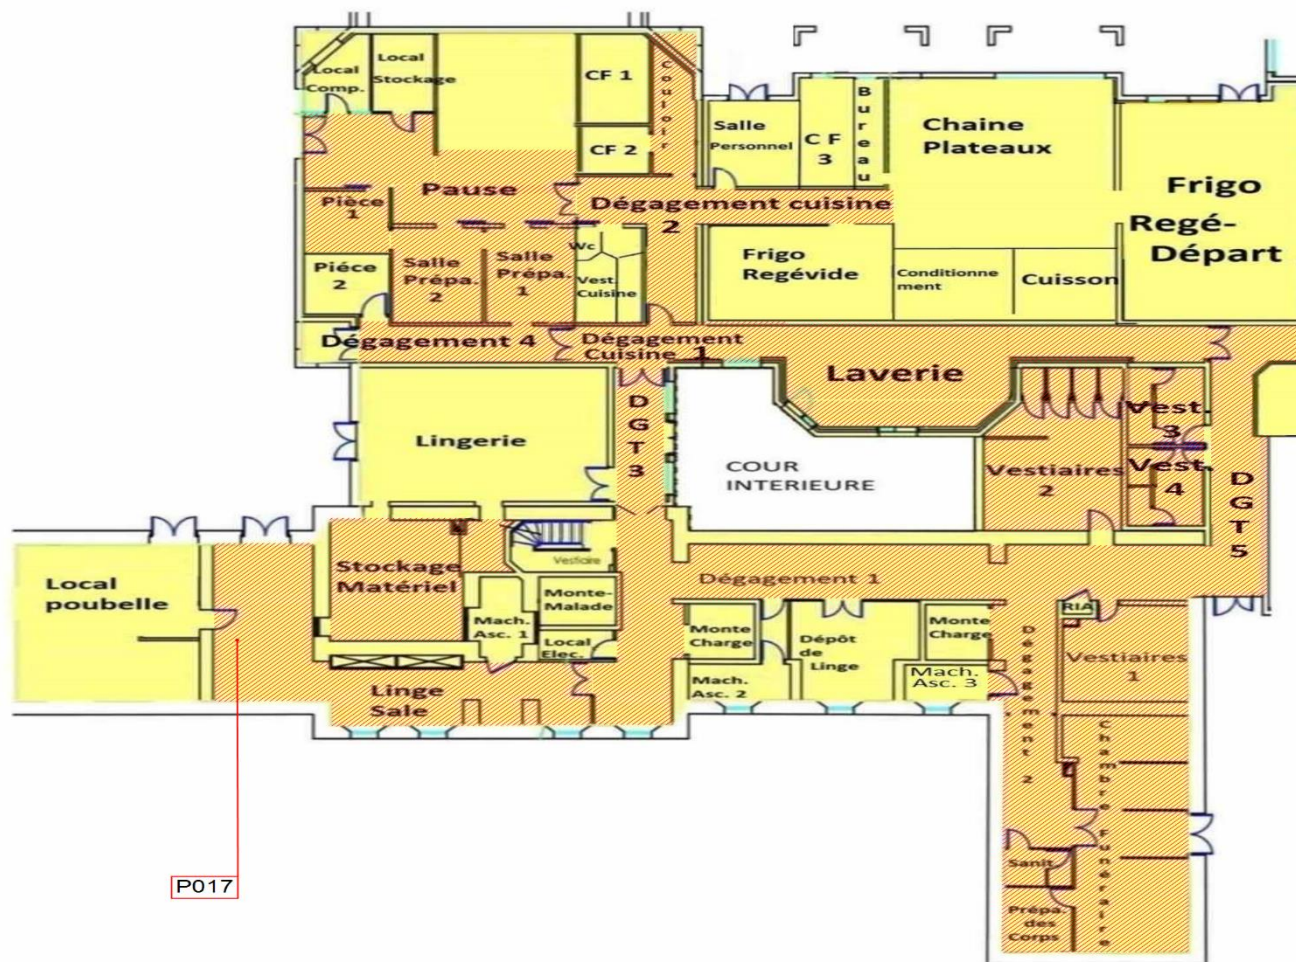




Titre : Croquis N°5	N° planche : 5/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bât G	Lieu / Zone : RDC

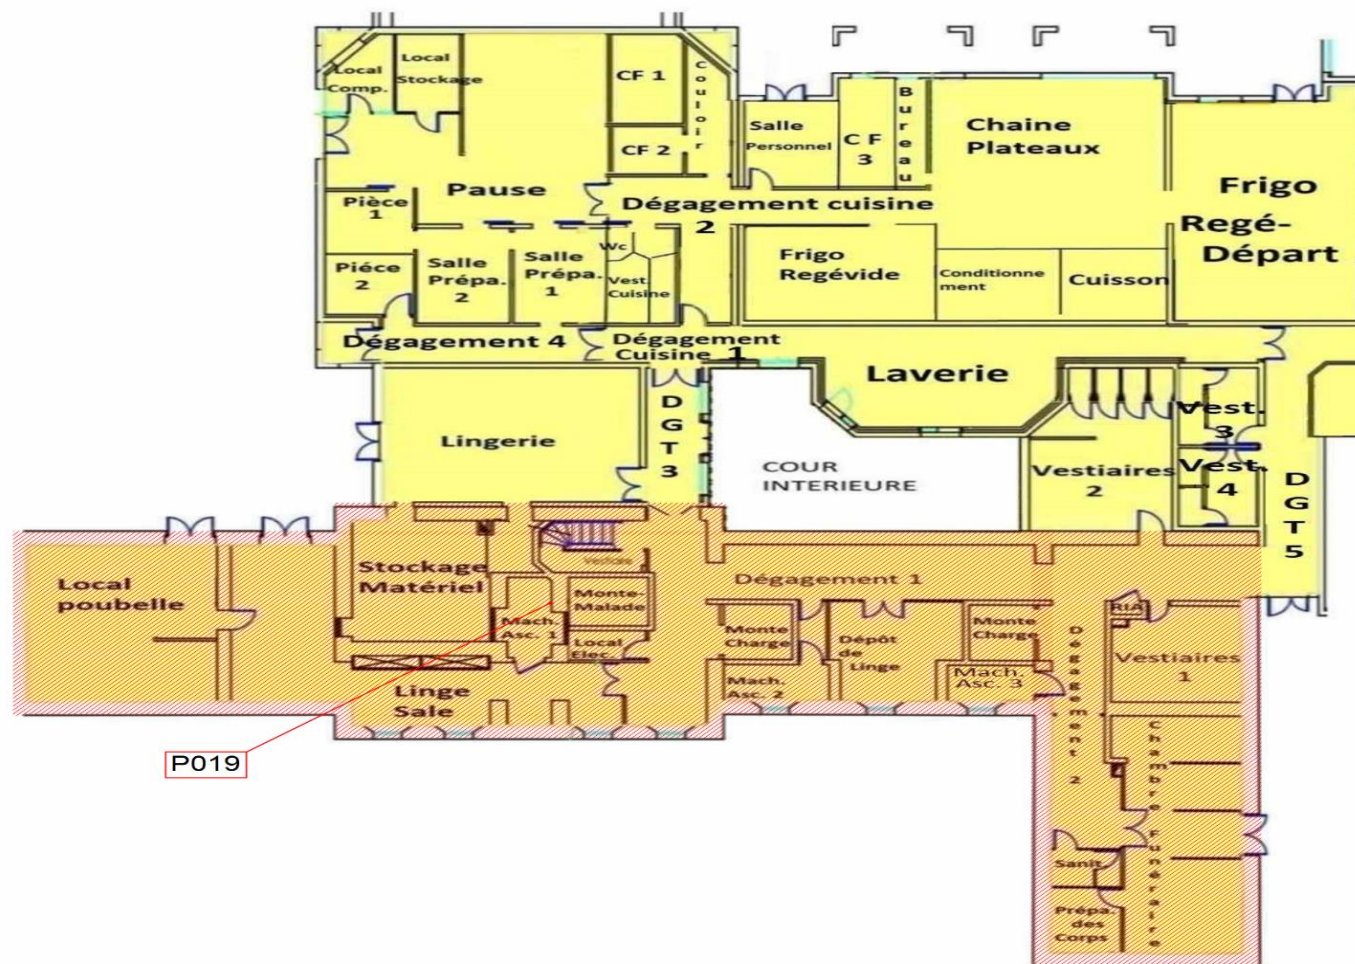


Titre : Croquis N°6	N° planche : 6/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bât G	Lieu / Zone : RDC

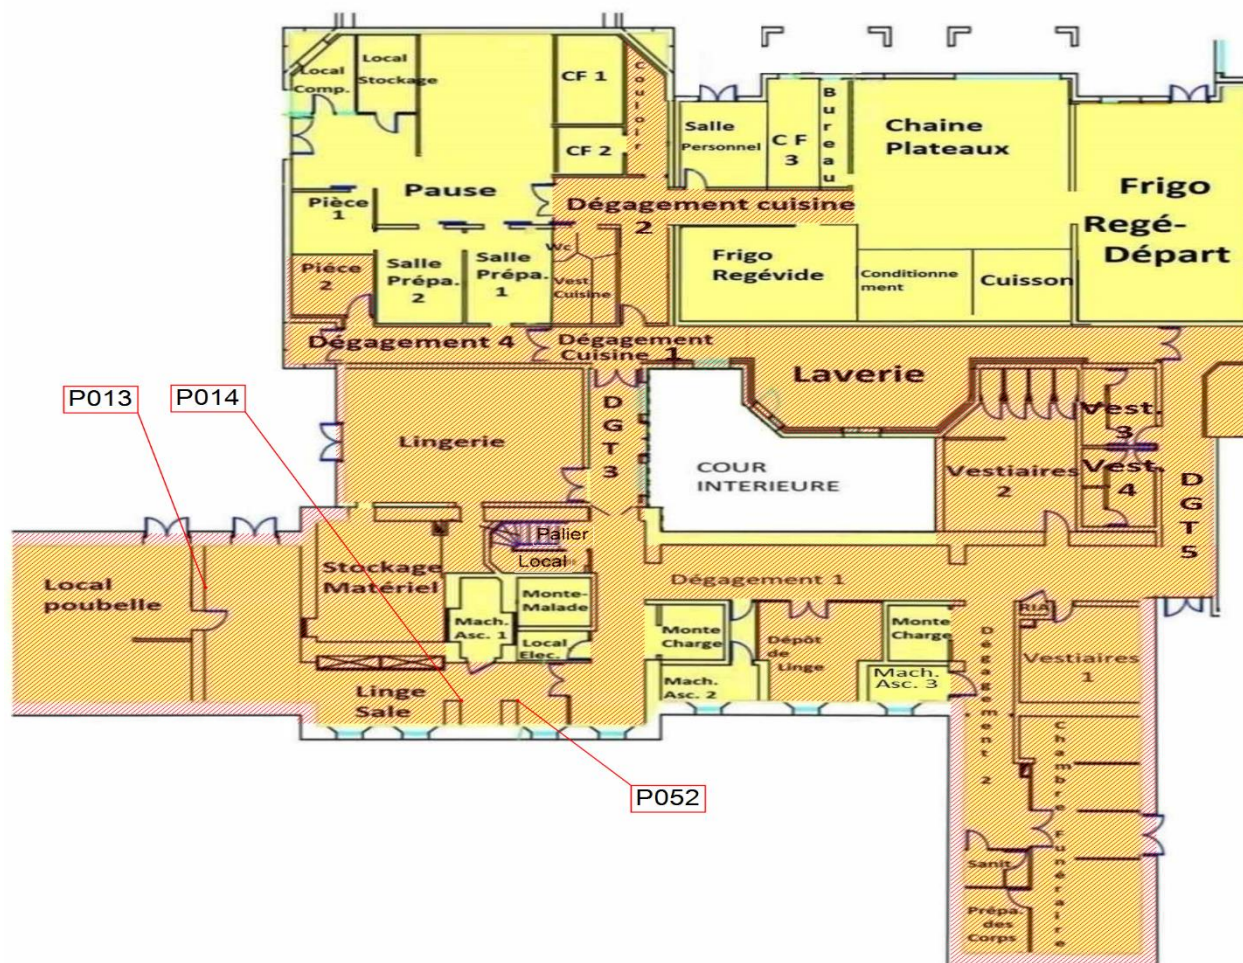



Titre : Croquis N°7	N° planche : 7/7	N° dossier : 66731-138980	Type : Croquis
Client : Hôpital de Guérande	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 25/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bât G	Lieu / Zone : RDC

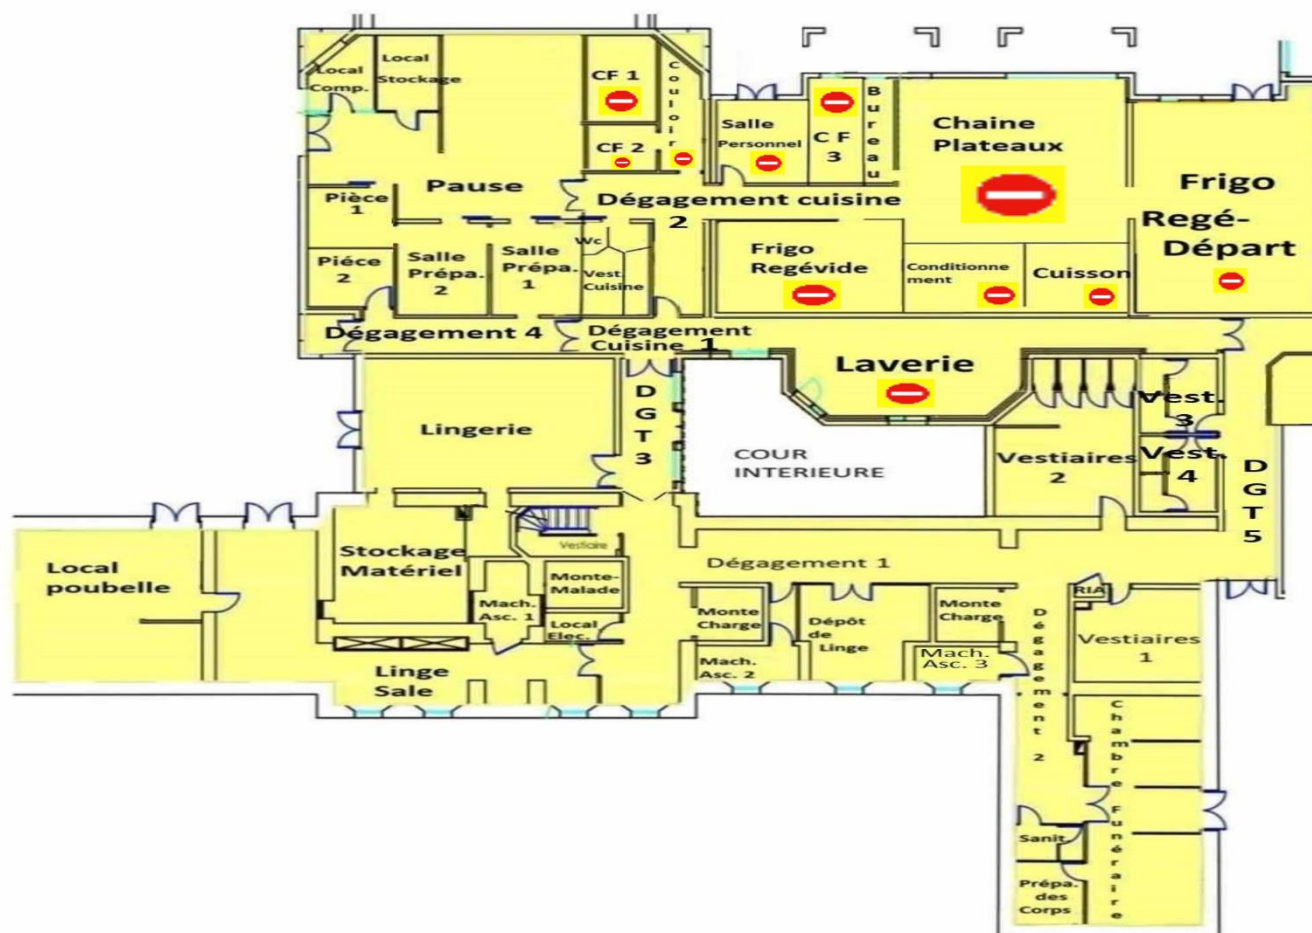

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720230701115659



APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Olivier BOUCHET  
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-102694-01

Numéro de dossier : 23N028284

Référence de dossier :

66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N028284-001 - Référence *P001-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-002 - Référence *P002-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 1 - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-003 - Référence *P003-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Mur - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-004 - Référence *P004-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Mur en bloc de béton creux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-005 - Référence *P005-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Poutre/Poteau - Enduit + béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-006 - Référence *P006-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Murs porteurs - Enduits - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N028284-007 - Référence P007-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plaque de plâtre en habillage - Enduit + calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-008 - Référence P008-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-009 - Référence P009-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plancher haut - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-010 - Référence P010-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 2 - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-011 - Référence P011-RDC - Local poubelles - Toutes zones en partie basse - Plaque anti-choc - PVC + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-012 - Référence P012-RDC - Linge sale - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC + ragréage + chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-013 - Référence P013-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plinthes clouées - Bois - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-014 - Référence P014-RDC - Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-015 - Référence P015-RDC - Linge sale - Toutes zones - Isolation - Laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-016 - Référence P016-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plancher haut - Béton + enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-017 - Référence P017-RDC - Linge sale - Toutes zones - Conduit de ventilation - Badigeon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N028284-018 - Référence P018-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Sol - Enduit - ciment + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-019 - Référence P019-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-020 - Référence P020-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-021 - Référence P021-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones en hauteur gauche/droite - Murs (plaque de plâtre collée) - Enduit + colle - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-022 - Référence P022-RDC - Local électrique - Toutes zones - Plafond - Enduit + béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-023 - Référence P023-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Colle de plaques de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-024 - Référence P024-RDC - Machinerie d'ascenseur 2 - Dans l'angle - Conduit de ventilation - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-025 - Référence P025-RDC - Dépôt linge - Toutes zones - Mur entrée gauche - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-026 - Référence P026-RDC - RIA - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-027 - Référence P027-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-028 - Référence P028-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-029 - Référence P029-RDC - Vestiaires 2 - Toutes zones vestiaires - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N028284-030 - Référence P030-RDC - Lingerie - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-031 - Référence P031-RDC - Lingerie - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-032 - Référence P032-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-033 - Référence P033-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-034 - Référence P034-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC + ragréage + chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-035 - Référence P035-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Evier - Matériau noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-036 - Référence P036-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Conduit plâtré en plénum n°1 - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-037 - Référence P037-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-038 - Référence P038-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-039 - Référence P039-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Plancher haut - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-040 - Référence P040-RDC - Pause - Toutes zones - Mur - Enduit ciment + plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N028284-041 - Référence P041-RDC - Pièce 2 - Toutes zones - Mur - Calicot + enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N028284-042 - Référence P042-RDC - *Dégagement 3 - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-043 - Référence P043-RDC - *Dégagement 4 - Pénétration murs - Conduit de ventilation - Matériau noir souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-044 - Référence P044-RDC - *Local - Toutes zones - Mur - Enduit + calicot - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-045 - Référence P045-RDC - *Local - Toutes zones - Plafond - Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-046 - Référence P046-RDC - *Dégagement 5 - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-047 - Référence P047-RDC - *Laverie - Toutes zones - Mur - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-048 - Référence P048-RDC - *Dégagement cuisine 1 - Toutes zones - Plinthes grises - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N028284-049 - Référence P049-RDC - *Wc - Douches et lavabo - Murs - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS****Réception résultat**

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 1/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N028284-001 - P001-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N028284-002 - P002-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 1 - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N028284-003 - P003-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Mur - Colle de carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 2/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	23N028284-004 - P004-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Mur en bloc de béton creux - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23N028284-005 - P005-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Poutre/Poteau - Enduit + béton - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 3/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N028284-006 - P006-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Murs porteurs - Enduits - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N028284-007 - P007-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plaque de plâtre en habillage - Enduit + calicot - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	23N028284-008 - P008-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N028284-009 - P009-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plancher haut - Floccage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau friable fibreux de type floccage (blanc) en traces	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 4/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	23N028284-010 - P010-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 2 - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N028284-011 - P011-RDC - Local poubelles - Toutes zones en partie basse - Plaque anti-choc - PVC + plâtre	Matériau souple (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23N028284-012 - P012-RDC - Linge sale - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC + ragréage + chappe	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 5/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	23N028284-013 - P013-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plinthes clouées - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	23N028284-014 - P014-RDC - Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type plaque métallique (gris)(i)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page 6/19  
 Référence laboratoire N° : 23RI045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284  
 Reçu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception : 31/07/2023  
 Date d'analyse : 03/08/2023  
 Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	23N028284-015 - P015-RDC - Linge sale - Toutes zones - Isolation - Laine	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	23N028284-016 - P016-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plancher haut - Béton + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N028284-017 - P017-RDC - Linge sale - Toutes zones - Conduit de ventilation Badigeon	Matériau souple de type mastic (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	23N028284-018 - P018-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Sol - Enduit ciment + béton	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	23N028284-019 - P019-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Murs - Enduit - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page 7/19  
 Référence laboratoire N° : 23RI045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284  
 Reçu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception : 31/07/2023  
 Date d'analyse : 03/08/2023  
 Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	23N028284-020 - P020-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23N028284-021 - P021-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones en hauteur gauche/droite - Murs (plaque de plâtre collée) - Enduit + colle - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N9YY	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23N028284-022 - P022-RDC - Local électrique - Toutes zones - Plafond - Enduit + béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 8/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23N028284-023 - P023-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Colle de plaques de plâtre	Matériau semi-dur (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (2)	23N028284-024 - P024-RDC - Machinerie d'ascenseur 2 - Dans l'angle - Conduit de ventilation - Ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / L4SL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	23N028284-025 - P025-RDC - Dépôt linge - Toutes zones - Mur entrée gauche - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N028284-026 - P026-RDC - RIA - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 9/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N028284-027 - P027-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / L4SL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 10/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	23N028284-028 - P028-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23N028284-029 - P029-RDC - Vestiaires 2 - Toutes zones vestiaires - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23N028284-030 - P030-RDC - Lingerie - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N028284-031 - P031-RDC - Lingerie - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 11/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N028284-032 - P032-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
033	23N028284-033 - P033-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 12/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N028284-034 - P034-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC + ragréage + chappe	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23N028284-035 - P035-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Evier - Matériau noir	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 13/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	23N028284-036 - P036-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Conduit plâtré en plénum n°1 - Plâtre	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23N028284-037 - P037-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Sol - Béton	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23N028284-038 - P038-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 14/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	23N028284-039 - P039-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Plancher haut - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23N028284-040 - P040-RDC - Pause - Toutes zones - Mur - Enduit ciment + plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23N028284-041 - P041-RDC - Pièce 2 - Toutes zones - Mur - Calicot + enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 15/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	23N028284-042 - P042-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23N028284-043 - P043-RDC - Dégagement 4 - Pénétration murs - Conduit de ventilation Matériau noir souple	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	23N028284-044 - P044-RDC - Local - Toutes zones - Mur - Enduit + calicot - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 16/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23N028284-045 - P045-RDC - Local - Toutes zones - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23N028284-046 - P046-RDC - Dégagement 5 - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23N028284-047 - P047-RDC - Laverie - Toutes zones - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 17/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)(ii)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23N028284-048 - P048-RDC - Dégagement cuisine 1 - Toutes zones - Plinthes grises - Colle de carrelage	Matériau souple (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	23N028284-049 - P049-RDC - Wc - Douches et lavabo - Murs - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / LL3A	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 18/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

**Observation(s) échantillon(s)**

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

**Observation(s) couche(s)**

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-045945-01

Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30

Page 19/19

Référence laboratoire N° : 23RI045290

Référence de suivi du dossier N° : 23N028284

Reçu au laboratoire le : 01/08/2023

Date de réception : 31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023

Référence dossier Client: 23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

Validé et approuvé par :

Adrianna Misztal  
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

PV\_00720230801128229





Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Olivier BOUCHET  
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-107079-01

Numéro de dossier : 23N030710

Référence de dossier :

66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N030710-001 - Référence P050-RDC - *Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N030710-002 - Référence P051-RDC - *Dégagement 5 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot -  
Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N030710-003 - Référence P052-RDC - *Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot -  
Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-016261-01 Date d'émission de rapport : 29/08/2023 21:26 Page 1/2  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE014828 Référence de suivi du dossier N° : 23N030710  
Reçu au laboratoire le : 25/08/2023 Date de réception : 24/08/2023  
Date d'analyse : 29/08/2023  
Référence dossier Client: 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N030710-001 - P050-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N030710-002 - P051-RDC - Dégagement 5 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N030710-003 - P052-RDC - Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

## Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-016261-01 Date d'émission de rapport : 29/08/2023 21:26 Page2/2  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE014828 Référence de suivi du dossier N° : 23N030710  
Reçu au laboratoire le : 25/08/2023 Date de réception : 24/08/2023  
Date d'analyse : 29/08/2023  
Référence dossier Client:66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Thomas Beaudet  
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRIEZ, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1



APAVE  
AGENCE DE SAINT NAZAIRE  
Rue Victor Schoelcher ZI des Noës CS  
60060  
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE  
N° SIRET : 90386907101210

DONNEUR D'ORDRE  
APAVE DIAGNOSTICS  
ZAC des Mottais Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO  
CONTACT : Monsieur PALATINUS Thomas



Pré Rapport de mission de  
repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante avant  
réalisation de travaux dans un  
immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents  
**Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage**



Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2  
Date : 28/10/2022

Lieu d'intervention :  
Bâtiment G HPLI  
28 AVENUE PIERRE DE LA  
BOUEXIERE  
44350 avenue pierre de la bouexière  
44350 GUÉRANDE

Destinataire rapport :  
APAVE DIAGNOSTICS

Date d'intervention :  
Du 16/09/2021 au 23/09/2021

Intervenant : Monsieur Claude BULOURDE

Signature :




**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité**  
**Nombre de pages total du document : 125 pages**

APAVE Infrastructures et Construction France  
6 rue du Général Audran  
92412 COURBEVOIE CEDEX



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

<b>1</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
<b>1.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Adresse :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE avenue pierre de la Bouexière 44350 GUÉRENDE	Numéro de Lot : Référence Cadastre : Non communiqué Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
Étage :	2	
Bâtiment :	G	
Nature du bâtiment : Bâtiment		
Cat. du bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques		
<b>1.2</b>	<b>DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	<b>DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE</b>
Nom :	APAVE DIAGNOSTICS	Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
Adresse :	ZAC des Mottais Rue des Bregeons 35400 SAINT-MALO	Adresse : 44350 GUÉRENDE
<b>1.3</b>	<b>EXÉCUTION DE LA MISSION</b>	
Repérage réalisé par : BULOURE Claude N° certificat de qualification : CPDI5358 Date d'obtention : 04/09/2019 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT Bâtiment K Parc d'affaires, Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE		Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ouest Adresse laboratoire : Rue Pierre Adolphe Bobierre BP 42301 F 44323 NANTES CEDEX 1-5597 Numéro d'accréditation :  Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : 10800207204 Date de validité : 31/12/2023
Date de la commande : 22/06/2021 Accompagnateur : Hervé PAGEOT		
<b>1.4</b>	<b>REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nature des travaux envisagés : "Réhabilitation d'une partie du bâtiment, changement d'activité de locaux à sommeil type U a bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC RdJ+RdC un étage + 100 m² sous un clocher surface totale 2600 m²"		
<b>1.5</b>	<b>VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE</b>	<b>DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT</b>
Nom de l'opérateur : BULOURE Claude AGENCE DE SAINT NAZAIRE Rue Victor Schoelcher ZI des Noës CS 60060 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE		Lieu et date d'établissement du rapport Fait à MONTOIR-DE-BRETAGNE le 28/10/2022
Signature 		
<b>1.6</b>	<b>CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT</b>	
<p>Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.</p> <p>L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.</p> <p>Locaux occupés par le personnel ou les résidents. Impossibilité de visiter, sonder et prélever pour une enquête exhaustive sur les matériaux apparents ou cachés de toute la construction.</p>		



### SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES .....	2
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	2
CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT .....	2
RESULTATS DU REPERAGE .....	4
Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux .....	4
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante .....	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES .....	6
Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre .....	6
Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre .....	6
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....	7
Objectif .....	7
Références réglementaires et normatives .....	7
Conditions de réalisation du repérage .....	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....	7
Programme de travaux défini par le propriétaire .....	7
Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage .....	8
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....	12
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....	12
PRECONISATIONS .....	12
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....	13
ANNEXE CROQUIS .....	45
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	52
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES .....	72
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....	73
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS .....	75
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	121
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....	122
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....	124

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

## 2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

## 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDJ	Bâtiment G	LOCAL PLONGE 1 - amenée d'air	2 Conduits	Document consulté		
		MACHINERIE ASCENSEUR 1	conduite fibre ciment	Document consulté		
		MACHINERIE ASCENSEUR 2	conduite fibre ciment	Document consulté		
		MACHINERIE ASCENSEUR 3	conduite fibre ciment	Document consulté		
		cage escalier / mur	peinture gouttelettes	Résultat d'analyse (P012 bis - idem)	S002	Z006
RDC	Bâtiment G	R+1 / combles	conduite fibre ciment Eternit	Document consulté		
		R+1 / combles	conduite fibre ciment Eternit	Document consulté		
		R+2 / combles Clocher -	conduite fibre ciment Eternit	Document consulté		
		cage escalier / mur	peinture gouttelettes	Résultat d'analyse (P012 bis)		Z006
		salle à manger/cuisine - combles	CTA - Calorifuge	Résultat d'analyse (P021)		Z007

## 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDJ	Bâtiment G	Plafond cuisine	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		murs / vestiaires F	bande calicot	Résultat d'analyse (P006)		
		murs / sanitaires	bande calicot	Résultat d'analyse (P010)		
		linge sale - ex cloisons	plafond - peinture noire	Résultat d'analyse (P011)		
		Murs / cuisine - faïence	Colle	Résultat d'analyse (P002)		Z002

Page :  
4/125

Repérage amiante avant travaux

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs / cuisine - plinthe	Colle	Résultat d'analyse (P003)		Z003
		Plancher / cuisine - carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		murs / vestiaires F	Peinture	Résultat d'analyse (P007)		
		murs / vestiaires F	Plinthe + Colle	Résultat d'analyse (P008)		
		murs / vestiaires F	Platre - Peinture	Résultat d'analyse (P009)		
		Plancher	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P005)		
RDC	Bâtiment G	chambre 133 / sol	dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P014)		
		circulation - Murs	peinture	Résultat d'analyse (P017)		
		salle à manger/cuisine - combles	joint gaine ventilation	Résultat d'analyse (P018)		
		salle à manger/cuisine - combles	plancher béton - feutre bitumineux	Résultat d'analyse (P020)		
		cuisine - Murs	platre	Résultat d'analyse (P022)		
		R+1/ placard circulation - Plafond	platre	Résultat d'analyse (P025)		
		R+1/ local services - sol	dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P026)		
		R+1/ local services - Plenum	toile fibreuse + platre	Résultat d'analyse (P027)		
		R+1/ local services - Plenum	feuille cartonnée + platre	Résultat d'analyse (P028)		
		R+1/ local services - Plafond	dalle faux plafond	Résultat d'analyse (P029)		
		R+1 / escalier - Murs	peinture goutelettes	Résultat d'analyse (P032)		
		R+1 / local escatrappe clocher - Murs	peinture bleu pâle	Résultat d'analyse (P034)		
		R+1 / local syndical - Murs	peinture violette	Résultat d'analyse (P035)		
		ascenseur Otis - portes palieres	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P013)		

Page :  
5/125

Repérage amiante avant travaux



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		placard technique circulation / sol - portes palieres	Ragréage	Résultat d'analyse (P015)		
		placard technique poste incendie	Placoplâtre - bande calicot	Résultat d'analyse (P016)		
		salle à manger/cuisine - combles	CTA - Flocage	Résultat d'analyse (P019)		
		cuisine - Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P023)		
		cuisine - carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P024)		
		R+1/ placard circulation	Placoplâtre - bande calicot	Résultat d'analyse (P030)		
		R+1/ placard circulation	murs - Peinture	Résultat d'analyse (P031)		
		R+1 / local escotrappe clocher - Sols	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P033)		

## 2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Justification
RDC	Bâtiment G	cage escalier / mur	peinture gouttelettes	

## 3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

## 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies. Selon la Norme NF X 46-020 « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

## 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

**Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,**

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités :

- 16 chambres en RDC (visuel sur 3 chambres seulement car patients en chambre alité)
- 16 chambres en R+1 (visuel sur 4 chambres seulement car patients en chambre alité)
- Cuisine : zone de travail permanente, impossibilité de prélèvement sans dégradation à risque sanitaire

- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Page :  
6/125

Repérage amiante avant travaux

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

4	COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
4.1	Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2	Références réglementaires et normatives
-----	---

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3	Conditions de réalisation du repérage
-----	---------------------------------------

## Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
16/09/2021 et 23/09/2021	visites technique et prélèvements

## Documents remis :

Titre
Programme de travaux

## Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

5	PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION
---	--------------------------------------

5.1	Programme de travaux défini par le propriétaire
-----	---

"Réhabilitation d'une partie du bâtiment, changement d'activité de locaux à sommeil type U a bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC  
 RdJ+RdC un étage + 100 m<sup>2</sup> sous un clocher surface totale 2600 m<sup>2</sup>"

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.



### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDJ	Bâtiment G	OUI	
RDC	Bâtiment G	OUI	

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
	Peintures décoratives	M
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P

Page :  
9/125

Repérage amiante avant travaux



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gainex et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P

Page :  
10/125

Repérage amiante avant travaux



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>		
<b>Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</b>	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
	Clapets / volets coupe- feu	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
<b>Vide- ordures</b>	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>		
<b>Portes et cloisons palières</b>	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux des cloisons palières	P
<b>Parois des équipements</b>	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
<b>Matériels en machinerie</b>	Freins d'ascenseurs	P
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>		
<b>Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes</b>	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
<b>Convecteurs et radiateurs</b>	Isolants thermiques cartonnés	P

Page :  
11/125

Repérage amiante avant travaux





## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

électriques	Tresses des diffuseurs	M
Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres- forts	Portes et parois	P
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P
<b>9 - Fondations et soubassements</b>		
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P

## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

DTA – mars 2004 – APAVE : voir en Annexe de ce rapport

## 7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Page :  
12/125


Repérage amiante avant travaux




## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION


ELEMENT : MACHINERIE ASCENSEUR 2		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment		BULOURE Claude
Localisation		
MACHINERIE ASCENSEUR 2 - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ( )		


  

ELEMENT : MACHINERIE ASCENSEUR 3		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment		BULOURE Claude
Localisation		
MACHINERIE ASCENSEUR 3 - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

Repérage amiante avant travaux


Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2


ELEMENT : MACHINERIE ASCENSEUR 1		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment		BULOURDE Claude
Localisation		
MACHINERIE ASCENSEUR 1 - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : R+1 / combles		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment Eternit		BULOURDE Claude
Localisation		
R+1 / combles - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2


ELEMENT : R+1 / combles		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment Eternit		BULOURE Claude
Localisation		
R+1 / combles - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : R+2 / combles Clocher		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment Eternit		BULOURE Claude
Localisation		
R+2 / combles Clocher - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

ELEMENT : LOCAL PLONGE 1		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
2 Conduits		BULOURE Claude
Localisation		
LOCAL PLONGE 1 - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Plafond/ cuisine		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		BULOURE Claude
Localisation		
Plafond/ cuisine - A		
Résultat amiante		
Néant		



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P001		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Panneaux de faux-plafond	16/09/2021	BULOURE Claude
<b>Localisation</b>		
Plafond cuisine - A		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> Panneaux de faux-plafond		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) ; matériau (pulvérulent) en traces (gris)	0
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P002		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Colle	16/09/2021	BULOURE Claude
<b>Localisation</b>		
Murs / cuisine - A		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> Colle		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (blanc)	0
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées


## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
Murs / cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
Plancher / cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) (transparent) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
Plancher - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
bande calicot	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
murs / vestiaires F - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
bande calicot		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) en traces (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
murs / vestiaires F - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (friable) (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (pulvérulent) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
murs / vestiaires F - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Platre - Peinture	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
murs / vestiaires F - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Platre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (pulvérulent) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment en traces (pulvérulent) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
bande calicot	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
murs / sanitaires - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
bande calicot		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P011		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDJ - Bâtiment G
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
plafond - peinture noire	16/09/2021	BULOURE Claude
<b>Localisation</b>		
linge sale - A		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> plafond / peinture noire		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (pulvérulent) (gris) (foncé)	0
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux


Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P012 bis		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture gouttelettes	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
cage escalier / mur - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture gouttelettes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0.1
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-077736-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-22-NS-077736-01	Fibres d'amiante non détectées




Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture gouttelettes	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
cage escalier / mur - A		
Résultat amiante		
Susceptible de contenir de l'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture gouttelettes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Quantité insuffisante Matériau de type peinture en traces (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	

Repérage amiante avant travaux


Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal - Peinture	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
ascenseur Otis - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Métal / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poudreux) (pulvérulent) (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées




## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol + colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
chambre 133 / sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle de sol + colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
placard technique circulation / sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (friable) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées




## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Placoplâtre - bande calicot	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
placard technique poste incendie - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Placoplâtre / bande calicot		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées


## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
peinture	16/09/2021	BULOURDE Claude
<b>Localisation</b>		
circulation - A		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		
peinture		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P018		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint gaine ventilation	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
salle à manger/cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
joint gaine ventilation		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (vert) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées






## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
CTA - Flocage	16/09/2021	BULOIRDE Claude
Localisation		
salle à manger/cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
CTA / Flocage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (pulvérulent) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées


## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plancher béton - feutre bitumineux	16/09/2021	BULOIRDE Claude
Localisation		
salle à manger/cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
plancher béton / feutre bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
CTA - Calorifuge	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
salle à manger/cuisine - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
CTA / Calorifuge		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau (rouge) en traces ; matériau de type mousse (marron) ; matériau (fibreuse) (beige)	2
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
platre	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
platre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
cuisine - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plâtre	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
R+1/ placard circulation - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur en traces (pulvérulent) en traces (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol + colle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
R+1/ local services - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle de sol + colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	0
CUST 01	Matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
toile fibreuse + plâtre	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
R+1/ local services - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
toile fibreuse + plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur matériau semi-dur (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
feuille cartonnée + plâtre	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
R+1/ local services - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
feuille cartonnée + plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle faux plafond	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
R+1/ local services - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle faux plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (friable) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Placoplâtre - bande calicot	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
R+1/ placard circulation - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Placoplâtre / bande calicot		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux


Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
murs - Peinture	16/09/2021	BULOURE Claude
Localisation		
R+1/ placard circulation - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
murs / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture goutelettes	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
R+1 / escalier - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture goutelettes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées





## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
R+1 / local escatrappe clocher - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	0
CUST 01	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture bleu pâle	16/09/2021	BULOURDE Claude
Localisation		
R+1 / local escatrappe clocher - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture bleu pâle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P035		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373606	RDC - Bâtiment G
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
peinture violette	16/09/2021	BULOURDE Claude
<b>Localisation</b>		
R+1 / local syndical - A		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		
peinture violette		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066852-01	Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux


Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	21373606		
N° planche :	1/7	Version :	0
		Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Adresse de l'immeuble :		28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUÉRANDE	
Bâtiment – Niveau :		Document 1	

SITUATION GEOGRAPHIQUE :  
(MAPS OU CADASTRE)

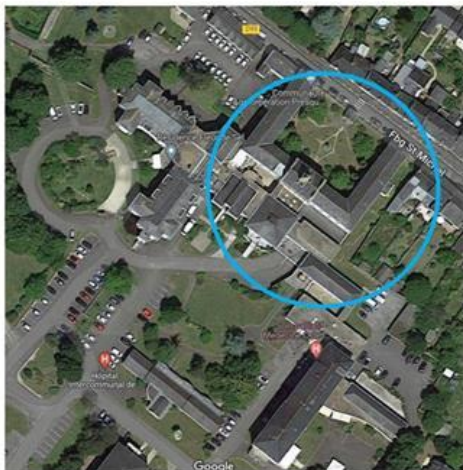

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	21373606			Adresse de l'immeuble :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUÉRANDE	
N° planche :	2/7	Version :	0			Type :
Origine du plan :				Cabinet de diagnostics	Bâtiment – Niveau :	Document 2

Hôpital Intercommunal de la presqu'île  
Site de Guérande

Résidence fleur de sel unités 1A8

Bâtiment hospitalisation V80

Résidence fleur de sel unités 9et10

Repérage amiante avant travaux

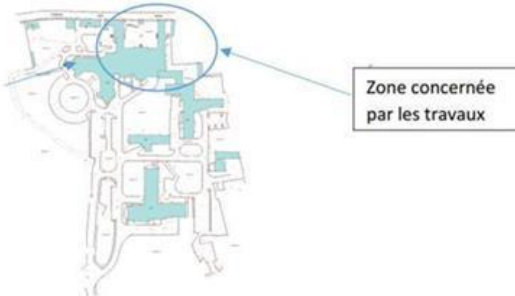
Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE	
N° dossier :	21373606			Adresse de l'immeuble :	44350 avenue pierre de la bouexière
N° planche :	3/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 3

**PROGRAMME DES TRAVAUX**

**Bâtiment G**




Réhabilitation d'une partie du bâtiment, changement d'activité de locaux à sommeil type U a bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC

RdJ+RdC un étage + 100 m<sup>2</sup> sous un clocher surface totale 2600 m<sup>2</sup>




Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

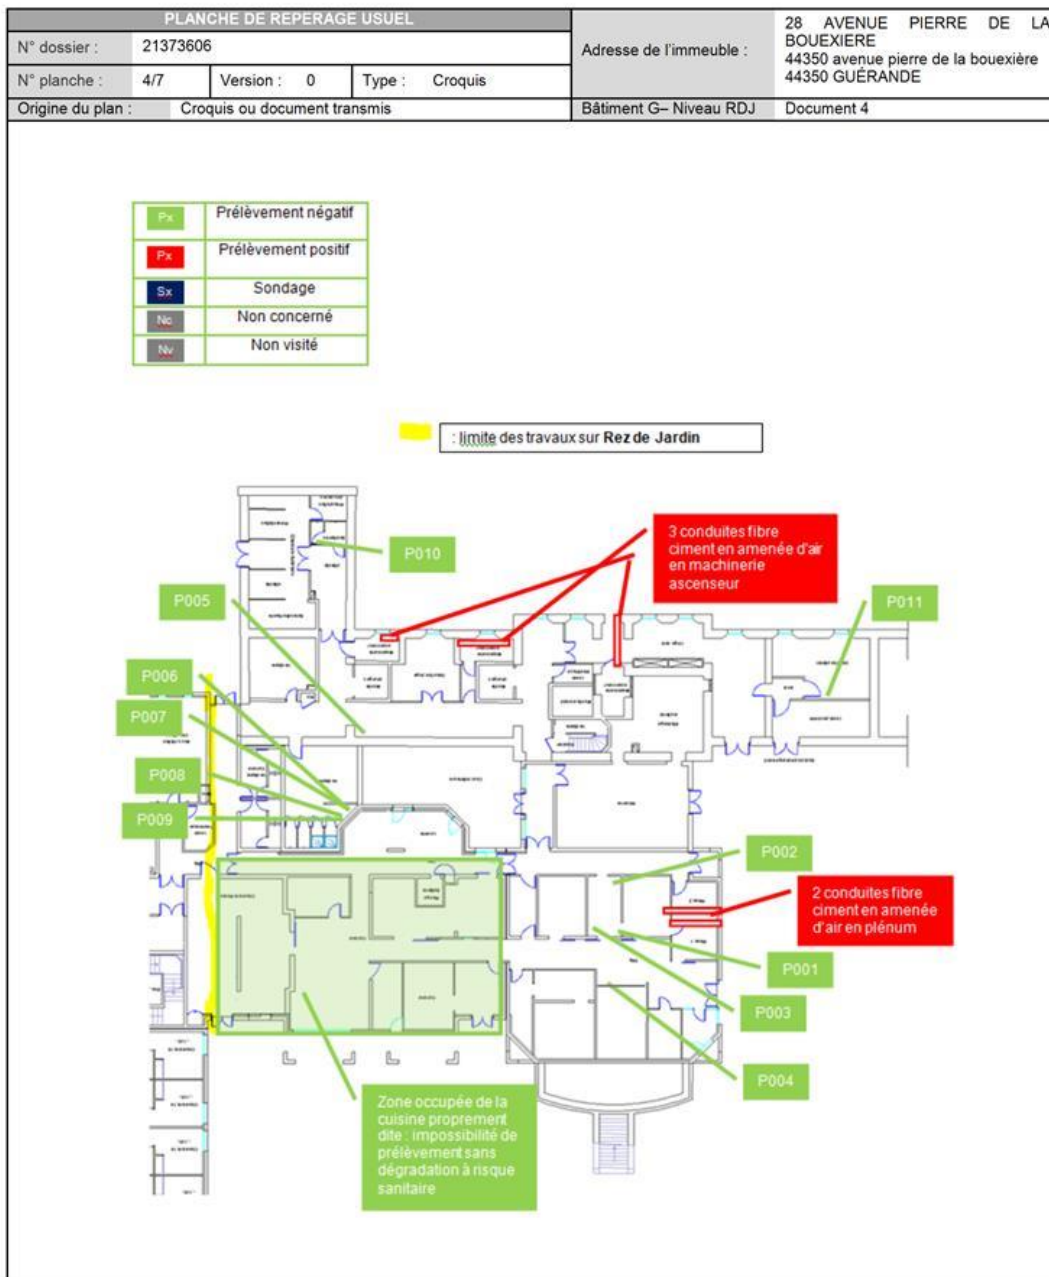


Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

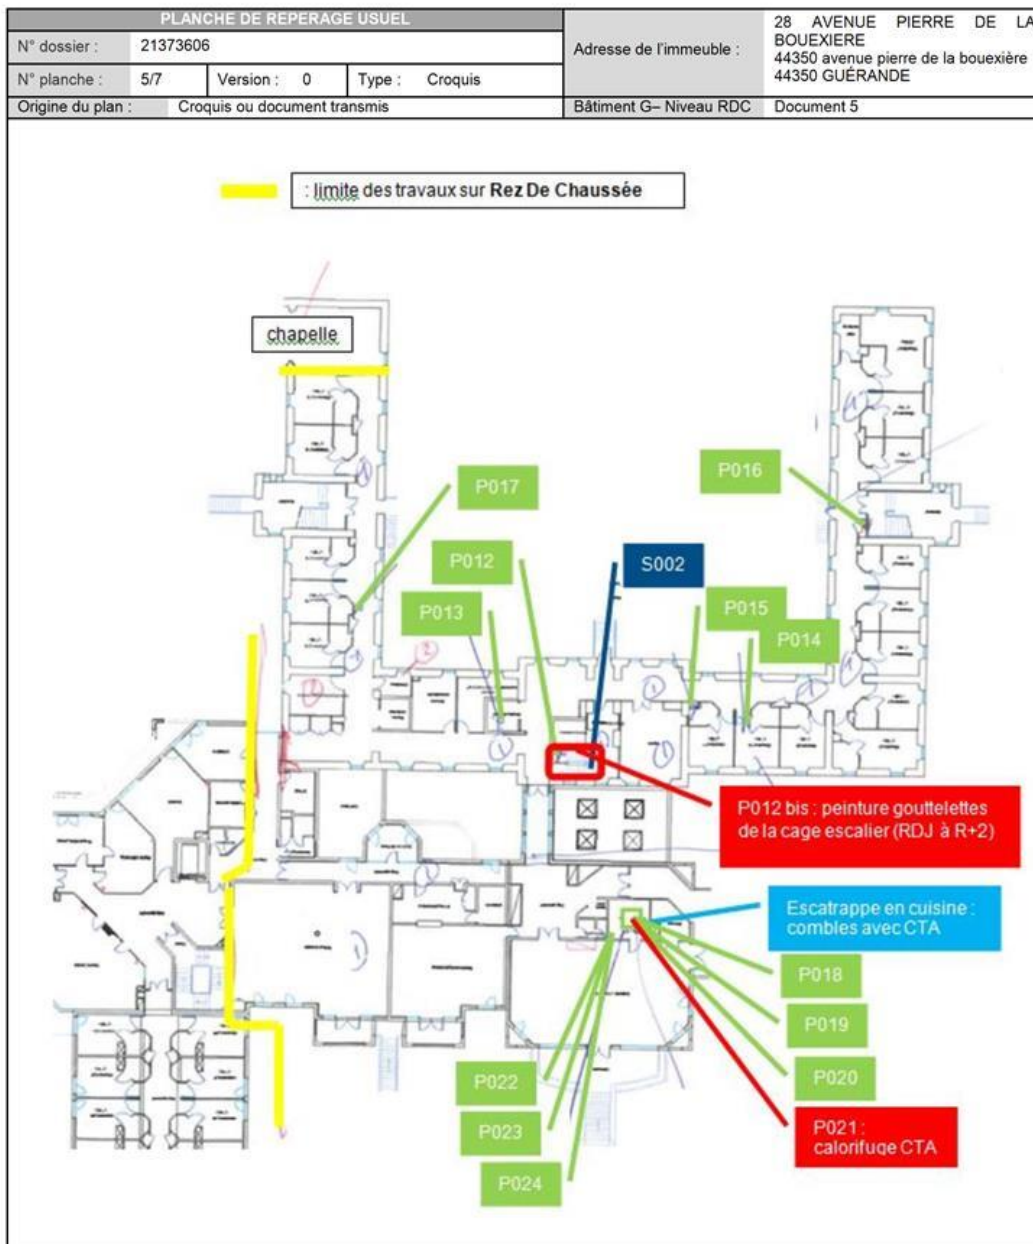


Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

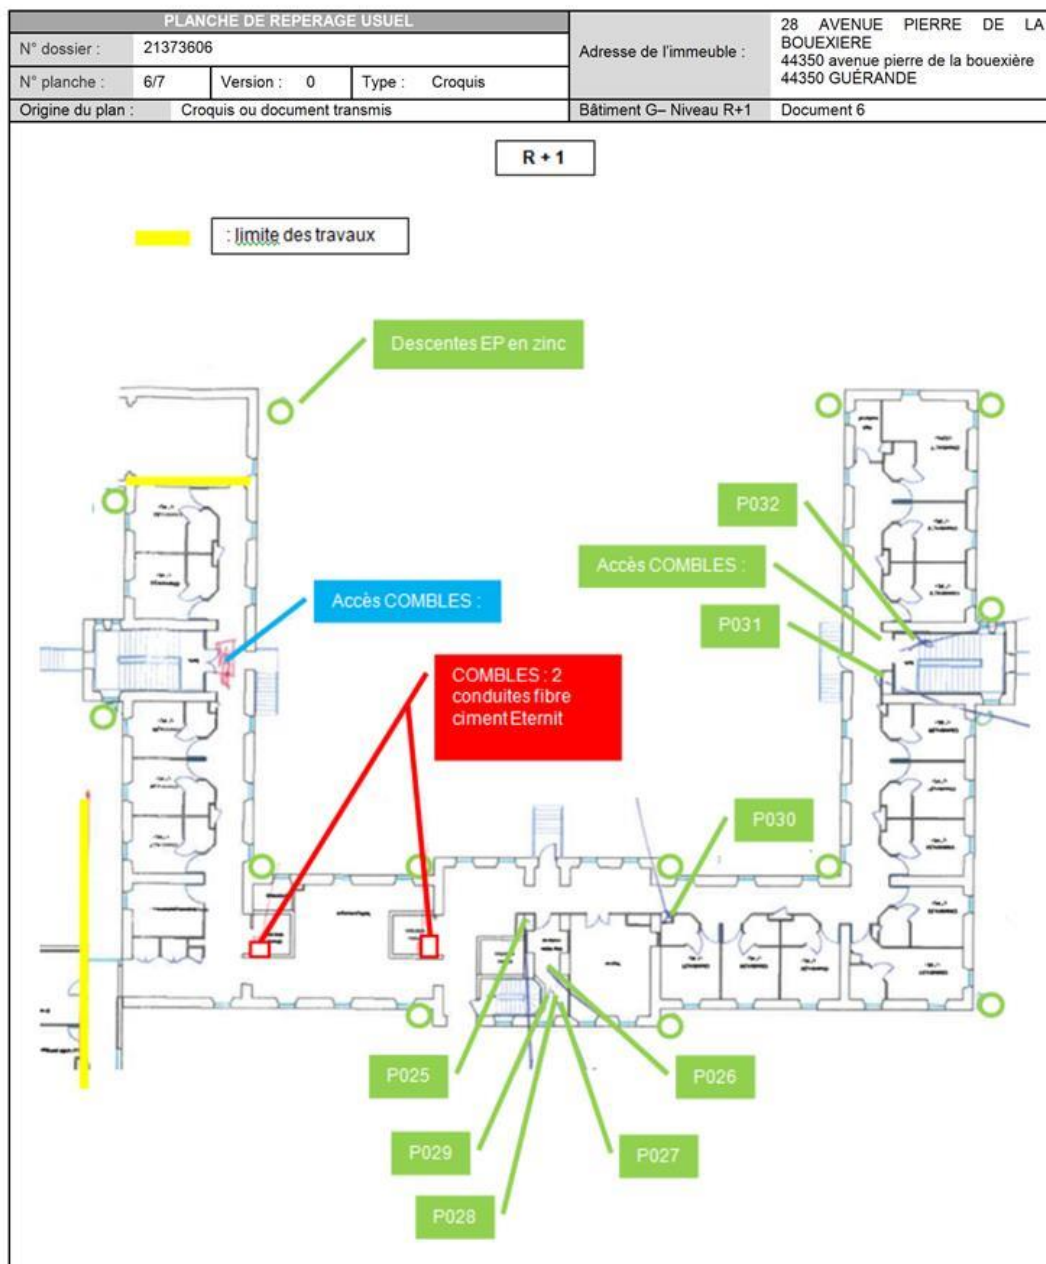

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

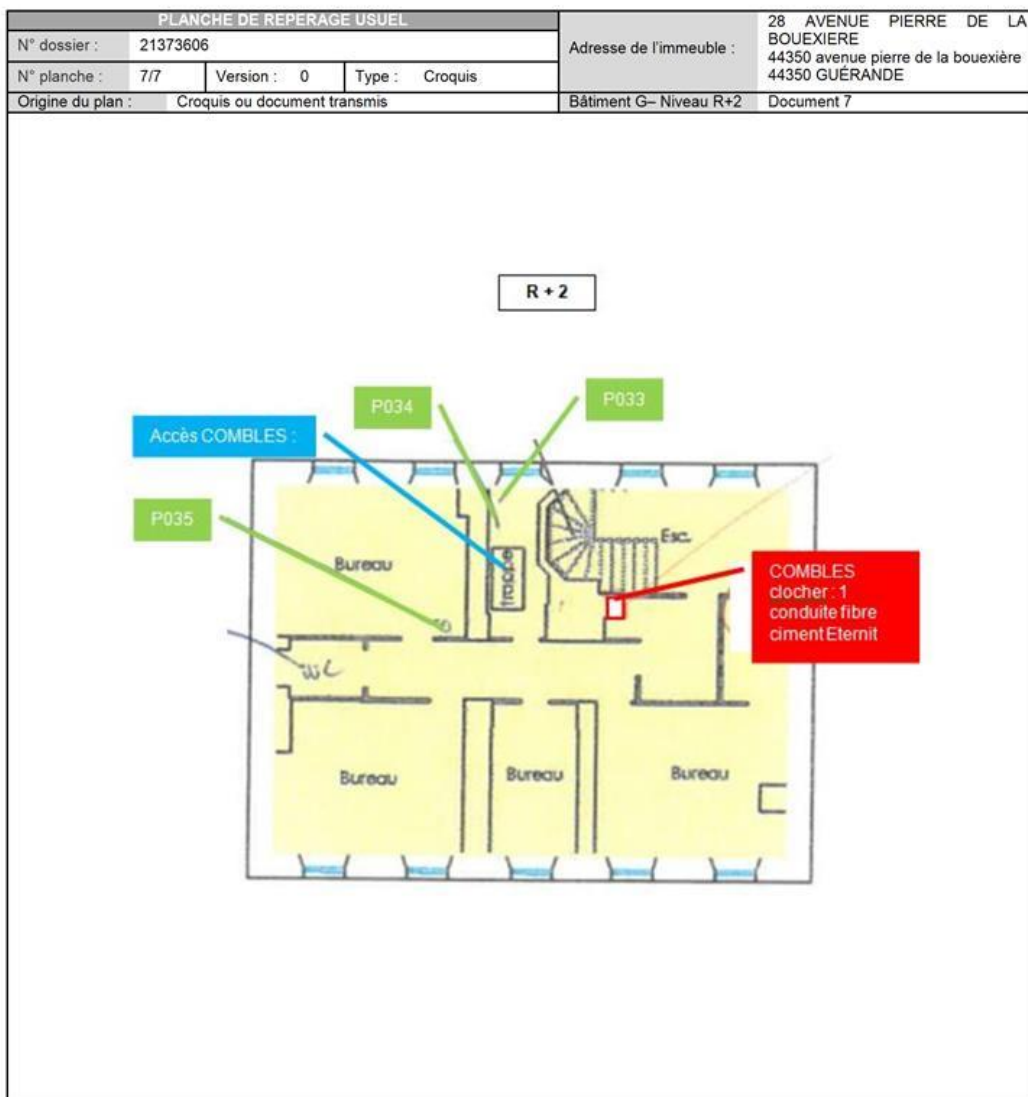



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV\_00720221000912815



Analyses pour le Bâtiment

APAVE NORD-OUEST SAS  
Monsieur Claude BULOURE  
ZI Des Noes  
101 rue Victor Shœlcher  
CS 60060  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-066852-01

Numéro de dossier : 22W029601

Référence de dossier :

21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUÉRANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22W029601-001 - Référence P001-RDJ - Bâtiment G - A - Plafond cuisine - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029601-002 - Référence P002-RDJ - Bâtiment G - A - Murs / cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029601-003 - Référence P003-RDJ - Bâtiment G - A - Murs / cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029601-004 - Référence P004-RDJ - Bâtiment G - A - Plancher / cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029601-005 - Référence P006-RDJ - Bâtiment G - A - murs / vestiaires F - bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029601-006 - Référence P007-RDJ - Bâtiment G - A - murs / vestiaires F - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Babin

F-44300 NANTES Cedex 3

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 3 89 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029601-007 - Référence P008-RDJ - Bâtiment G - A - murs / vestiaires F - Plinthe + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-008 - Référence P009-RDJ - Bâtiment G - A - murs / vestiaires F - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-009 - Référence P010-RDJ - Bâtiment G - A - murs / sanitaires - bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-010 - Référence P011-RDJ - Bâtiment G - A - linge sale - plafond - peinture noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-011 - Référence P012-RDC - Bâtiment G - A - cage escalier / mur - peinture gouttelettes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-012 - Référence P013-RDC - Bâtiment G - A - ascenseur Otis - Métal - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-013 - Référence P014-RDC - Bâtiment G - A - chambre 133 / sol - dalle de sol + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-014 - Référence P015-RDC - Bâtiment G - A - placard technique circulation / sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-015 - Référence P016-RDC - Bâtiment G - A - placard technique poste incendie - Placoplâtre - bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-016 - Référence P017-RDC - Bâtiment G - A - circulation - peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-017 - Référence P018-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - joint gaine ventilation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bélière  
F-44308 NANTES Cedex 3Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 2 88 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 254 052 00018 TVA FR48 529 254 052 APE 7120B

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029601-018 - Référence P019-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - CTA - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-019 - Référence P020-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - plancher béton - feutre bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-020 - Référence P021-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - CTA - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-021 - Référence P022-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-022 - Référence P023-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-023 - Référence P024-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-024 - Référence P025-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-025 - Référence P026-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - dalle de sol + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-026 - Référence P027-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - toile fibreuse + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-027 - Référence P028-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - feuille cartonnée + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-028 - Référence P029-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - dalle faux plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bonnaire  
F-44308 NANTES Cedex 3  
Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 2 88 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amianteanalyses/](http://www.eurofins.fr/amianteanalyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 284 092 00018 TVA FR48 529 284 092 APE 7120B



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029601-029 - Référence P030-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - Placoplâtre - bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-030 - Référence P031-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - murs - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-031 - Référence P032-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / escalier - peinture gouttelettes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-032 - Référence P033-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local escarapae clocher - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-033 - Référence P034-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local escarapae clocher - peinture bleu pâle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029601-034 - Référence P035-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local syndical - peinture violette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bonnaire  
F-44308 NANTES Cedex 3  
Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 2 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 284 092 00018 TVA FR48 529 284 092 APE 7120B

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS  
Sous-traitance Bâtiment Nantes  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 1/10  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client: 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W029601-001 - P001-RDJ - Bâtiment C - A - Plafond cuisine - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) ; matériau (pulvérulent) en traces (gris)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	22W029601-002 - P002-RDJ - Bâtiment C - A - Murs / cuisine - Colle	Matériau dur de type ciment-collé (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	22W029601-003 - P003-RDJ - Bâtiment C - A - Murs / cuisine - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-collé (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-69640 Dunkerque, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 2/10  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	22W029601-004 - P004-RDJ - Bâtiment C - A - Plancher / cuisine - Colle	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-collé (cimenteux) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) (transparent) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22W029601-005 - P005-RDJ - Bâtiment C - A - murs / vestiaires F - bande calicot	Matériau (pulvérulent) en traces (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / VBAH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	22W029601-006 - P007-RDJ - Bâtiment C - A - murs / vestiaires F - Peinture	Matériau de type peinture (friable) (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (pulvérulent) (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22W029601-007 - P008-RDJ - Bâtiment C - A - murs / vestiaires F - Plinthe + Colle	Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-collé (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".  
Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-59640 Dunkerque, FRANCE  
Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 3/10  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	22W029601-008 - P009-RDJ - Bâtiment C - A - murs / vestiaires F - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (pulvérulent) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment en traces (pulvérulent) (gris)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	22W029601-009 - P010-RDJ - Bâtiment C - A - murs / sanitaires - bande calicot	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / VBAH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / VBAH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
010	22W029601-010 - P011-RDJ - Bâtiment C - A - linge sale - plafond - peinture noire	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (pulvérulent) (gris) (foncé)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1) (2)	22W029601-011 - P012-RDC - Bâtiment G - A - cage escalier / mur - peinture gouttelettes	Matériau de type peinture en traces (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (poudreux) (blanc)	MOLP / BTJ3	2 / 2	-	Quantité insuffisante *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-69640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
 1-1935  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 4/10  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	22W029601-012 - P013-RDC - Bâtiment G - A - ascenseur Otis - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poudreux) (pulvérulent) (gris) (clair)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	22W029601-013 - P014-RDC - Bâtiment G - A - chambre 133 / sol - dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (fibres) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	22W029601-014 - P015-RDC - Bâtiment G - A - placard technique circulation / sol - Ragréage	Matériau semi-dur (friable) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	22W029601-015 - P016-RDC - Bâtiment G - A - placard technique poste incendie - Placoplatre - bande calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JQNS	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-59640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N° : 1-1935  
 Portée disponible sur : www.cofrac.fr

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 5/10  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	22W029601-016 - P017-RDC - Bâtiment G - A - circulation - peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	22W029601-017 - P018-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - joint gaine ventilation	Matériau semi-dur de type mastic (vert) (foncé)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22W029601-018 - P019-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - CTA - Flocage	Matériau friable fibreuse de type flocage (pulvérulent) (blanc)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22W029601-019 - P020-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - plancher béton - feutre bitumineux	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22W029601-020 - P021-RDC - Bâtiment G - A - salle à manger/cuisine - CTA - Calorifuge	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau (rouge) en traces ; matériau de type mousse (marron) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	22W029601-021 - P022-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-69640 Dunkerque, FRANCE  
Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 6/10  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (3)	22W029601-022 - P023-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	22W029601-023 - P024-RDC - Bâtiment G - A - cuisine - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) (clair)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	22W029601-024 - P025-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - plâtre	Matériau semi-dur en traces (pulvérulent) en traces (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-69640 Dunkerque, FRANCE  
Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 7/10  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22W029601-025 - P026-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22W029601-026 - P027-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - toile fibreuse + plâtre	Matériau semi-dur (plâtré) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur matériau semi-dur (gris) en traces	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	22W029601-027 - P028-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - feuille cartonnée + plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-59640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
 1-1935  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 8/10  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	22W029601-028 - P029-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ local services - dalle faux plafond	Matériau semi-dur (friable) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22W029601-029 - P030-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - Placoplâtre - bande calicot	Matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	22W029601-030 - P031-RDC - Bâtiment G - A - R+1/ placard circulation - murs - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc) en traces	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".  
Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-69640 Dunkerque, FRANCE  
Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 9/10  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (blanc)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	22W029601-031 - P032-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / escalier - peinture goutelettes	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	22W029601-032 - P033-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local escaptrappe clocher - Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragnage (rose)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	22W029601-033 - P034-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local escaptrappe clocher - peinture bleu pâle	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	22W029601-034 - P035-RDC - Bâtiment G - A - R+1 / local syndical - peinture violet	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-69640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
 1-1935  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 7:55 Page 10/10  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036089 Référence de suivi du dossier N° : 22W029601  
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexiere  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

## Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
- (3) Un matériau de type peinture blanche est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

## Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Julien Garcia  
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-89640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
 1-1935  
 Portée disponible sur  
 www.cofrac.fr



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### Document 2



APAVE NORD-OUEST SAS  
Monsieur Claude BULOURDE  
ZI Des Noes  
101 rue Victor Schœlcher  
CS 60060  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-066955-01

Numéro de dossier : 22W030073  
Référence de dossier : 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE  
44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUÉRANDE - HOPITAL  
INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 22W030073-001 - Référence P005 - RDJ - SI PVC - Colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bouteau  
F-44308 NANTES Cedex 3  
Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 2 51 83 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

Page :  
66/125

Repérage amiante avant travaux

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
 BATIMENT OUEST SAS  
 Sous-traitance Bâtiment Nantes  
 EUROFINS ABO  
 Site de la Géraudière  
 Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
 44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063669-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 11:10 Page 1/2  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036442 Référence de suivi du dossier N° : 22W030073  
 Reçu au laboratoire le : 27/10/2022 Date de réception : 27/10/2022  
 Date d'analyse : 27/10/2022  
 Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouxière  
 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W030073-001 - P00: - RDJ - SI PVC - Colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) (tacheté)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (cimentueux) (gris)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
 NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."  
 NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.  
 NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'annexe du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat concluant.  
 NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).  
 NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'annexe du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-59640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 0054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
 1-1935  
 Portée disponible sur  
 www.cofrat.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063669-01 Date d'émission de rapport : 28/10/2022 11:10 Page 2/2  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM036442 Référence de suivi du dossier N° : 22W030073  
Reçu au laboratoire le : 27/10/2022 Date de réception : 27/10/2022  
Date d'analyse : 27/10/2022  
Référence dossier Client 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouxière  
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

*Garcia*

Julien Garcia  
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-59640 Dunkerque, FRANCE  
Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 0004 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B



ACCREDITATION N°  
1-1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

PV\_00720221200944381



Analyses pour le Bâtiment

APAVE NORD-OUEST SAS  
Monsieur Claude BULOURDE  
ZI Des Noes  
101 rue Victor Sholeicher  
CS 60060  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-077736-01

Numéro de dossier : 22W035264

Référence de dossier :

21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la  
bouexière 44350 GUÉRANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE  
GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 22W035264-001 - Référence P012 bis-RDC - Bâtiment G - A - cage escalier / mur - peinture  
gouttelettes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS  
7 rue Pierre Adolphe Bottonne  
F-44308 NANTES Cedex 3  
Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

Page :  
69/125

Repérage amiante avant travaux

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
 Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
 BATIMENT OUEST SAS  
 Sous-traitance Bâtiment Nantes  
 EUROFINS ABO  
 Site de la Géraudière  
 Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
 44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-073447-01 Date d'émission de rapport : 21/12/2022 21:00 Page 1/2  
 Référence laboratoire N° : 22RI058632 Référence de suivi du dossier N° : 22W035264  
 Reçu au laboratoire le : 19/12/2022 Date de réception : 16/12/2022  
 Date d'analyse : 20/12/2022  
 Référence dossier Client 22W035264 - 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUÉRANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W035264-001 - P01: bis-RDC - Bâtiment G - A - cage escalier / mur - peinture gouttelettes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

## Observation(s) souche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

## Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
 Al. Wolności 80  
 82-200 Malbork, POLSKA

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-073447-01 Date d'émission de rapport : 21/12/2022 21:00 Page 2/2  
Référence laboratoire N° : 22RI058632 Référence de suivi du dossier N° : 22W035264  
Reçu au laboratoire le : 18/12/2022 Date de réception : 16/12/2022  
Date d'analyse : 20/12/2022  
Référence dossier Client 22W035264 - 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bouexière 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.  
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.  
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.  
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.  
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.  
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.  
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.  
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-699 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).  
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Alicja Matracka  
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.  
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wolności 80  
82-200 Malbork, POLSKA

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDJ	Bâtiment G	LOCAL PLONGE 1 - amenée d'air	2 Conduits	6 ml	
		MACHINERIE ASCENSEUR 1	conduite fibre ciment	4 ml	
		MACHINERIE ASCENSEUR 2	conduite fibre ciment	4 ml	
		MACHINERIE ASCENSEUR 3	conduite fibre ciment	4 ml	
		cage escalier / mur	peinture gouttelettes	40 m²	
RDC	Bâtiment G	R+1 / combles	conduite fibre ciment Eternit	3 ml	
		R+1 / combles	conduite fibre ciment Eternit	3 ml	
		R+2 / combles Clocher -	conduite fibre ciment Eternit	5 ml	
		cage escalier / mur	peinture gouttelettes	40 m²	
		salle à manger/cuisine - combles	CTA - Calorifuge	5 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux

Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Plafond cuisine Panneaux de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	Plafond cuisine	X	Panneaux de faux-plafond		P001	Non

Z002 - Murs / cuisine faïence Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	Murs / cuisine - faïence	X	Colle		P002	Non

Z003 - Murs / cuisine plinthe Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	Murs / cuisine - plinthe	X	Colle		P003	Non

Z004 - Plancher / cuisine carrelage Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	Plancher / cuisine - carrelage	X	Colle		P004	Non

Z005 - Plafond/ cuisine Panneaux de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	Plafond/ cuisine	X	Panneaux de faux-plafond	S001		Non



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

Z006 - cage escalier / mur peinture gouttelettes						Continue : OUI	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDJ	Bâtiment G	cage escalier / mur		peinture gouttelettes	S002	P012 bis - idem	Oui
RDC	Bâtiment G	cage escalier / mur	X	peinture gouttelettes		P012 bis	Oui

Z007 - salle à manger/cuisine combles CTA Calorifuge						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Ref sondage	Ref prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bâtiment G	salle à manger/cuisine - combles	X	CTA - Calorifuge		P021	Oui



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Repérage amiante avant travaux

Page :  
75/125

Document :	Document 1
------------	------------

### Attestations de communication du dossier technique amiante

**Dossier :** HLI de la Presqu'île site de Guérande  
Avenue de la Boussière  
44350 GUERANDE

Organisme ou société	Nom du lecteur	Date de la consultation du dossier	Signature

apave 2003

## Historique des interventions

Dossier : HLI de la Presqu'île, site de Guérande  
Avenue de la Bouezière  
44350 GUERANDE

Date	Description de l'intervention	Localisation de l'intervention	Nom et visa
30et31/10/96	Diagnostic amiante concernant les flocages, calbri/fuyages	Ensemble des locaux	CETE APAVE de Pibucot
2,5,15/03/2004	Repérage amiante en vue de la constitution du DTA	Ensemble des locaux	CETE APAVE Nord Ouest





Chapitre 1	Fiche récapitulative
Chapitre 2	Renseignements administratifs Attestation de compétence de l'intervenant
Chapitre 3	Rapports de repérage amiante (plan des locaux, signalisation et localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante)
Chapitre 4	Évaluation initiale de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante  Évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante détaillée dans les rapports de repérage du chapitre 3  Contrôles périodiques de l'état de conservation des matériaux
Chapitre 5	Enregistrement des travaux de retrait ou de confinement des produits et matériaux  Mesures conservatoires
Chapitre 6	Travaux de réhabilitation, d'aménagement, d'agrandissement
Chapitre 7	Procès verbaux d'analyses
Chapitre 8	Consignes générales de sécurité à l'égard des matériaux et produits contenant de l'amiante (procédures d'intervention, procédures de gestion et d'élimination des déchets)
Chapitre 9	Textes de référence
Annexes	Autres investigations

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

## Fiche récapitulative Dossier technique amiante

### Désignation de l'immeuble

Type : E.R.P. type U  
Commune : GUERANDE  
Lieu-dit : —  
Adresse : Avenue de la Bouzezière

Description sommaire : Bâtiment 5 RdC (administration), R+1 (SSIBPA), R+2 (V80, Fleurs de sel 128)  
R+3 (Fleurs de sel 128)

### Informations générales

Date de rédaction : 5/05/2004  
Mises à jour : —

### Dossier à consulter auprès de :

M. Mme —  
Adresse : Avenue de la Bouzezière  
44350 GUERANDE  
Modalités de consultation du dossier : —

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds (articles R1334-15 et R1334-16 du code de la santé publique)

Ensemble des locaux des bâtiments du site

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique

Ensemble des locaux des bâtiments du site

## Fiche récapitulative Dossier technique amiante

### Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Niveau	Local ou zone homogène	Matériau ou produit repéré	Localisation précise	État de conservation
Bâtiment V80 Rdc	circulation pharmacie	dalles de sol		dégradés à certains endroits
Bâtiment V80 1 <sup>er</sup> étage	accueil, soins pharmacie	dalles de sol		En bon état
Floors de sol	accueil, soins, bureau	dalles de sol		En bon état
(H&S) niveau 1	laboratoire, bureau, infirmerie et chambre infirmière	dalles de sol		En bon état
niveau 2	Kitchenette, chambre, bureau infirmière, salle d'attente, chambre de repos et chambre	dalles de sol		En bon état
Bâtiment V80 sous-sol	machinerie à ascenseurs	conduit en fibrociment	conduit vent, balcon	En bon état
Floors de sol H&S	machinerie à ascenseurs	" " "	" "	En bon état
niveau 0	bureau, cuisine	" " "	" "	" " "
combles	sous Vanachère et clocher	" " "	" "	En bon état
Bâtiment V80 1 <sup>er</sup> étage	local chauffière	" " "	" "	En bon état
Floors de sol H&S	conduits extérieurs	" " "	eaux pluviales	En bon état
SIDPA	local chauffière	plaque ondules en fibre	toiture	En bon état

Flacages, colorifugeages et faux-plafonds

1 : Bon état de conservation

2 : État intermédiaire de conservation

3 : Matériaux dégradés

Autres matériaux

B : Bon état de conservation

D : État dégradé

### Mesures préconisées par l'opérateur de repérage

Le présent document doit être communiqué à toutes les personnes susceptibles de réaliser des travaux. Des dispositions spécifiques de protection doivent être préconisées aux travailleurs intervenant sur les matériaux amiantés.

### Travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés

Aucun travail de retrait ou de confinement

## Consignes générales de sécurité

### I. INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifuges, cartons d'amiante, éléments en amiante liés ou trempés, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels.

### 2. INFORMATIONS DES PROFESSIONNELS

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers.

Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRT/EPF), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP).

### 3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

#### A - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante ciment),
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux-plafonds sans amiante sous une dalle flocage, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante,
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment,
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parois.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussières,

- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé :

- des demi-masques filtrants (type FFP 3) conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation,
- le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation,
- de plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### B - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

##### Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifuges et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

##### Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, chapes et volets coupe-feu) doivent être éliminés soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifuges et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vérifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n°11861'01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vérification).

##### Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.



Centre de Formation LOIRE-ANJOU  
5, Rue de la Johardiére - BP 289 - 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX  
Tél : 02 40 38 80 34 - Fax : 02 40 92 13 95- E-mail : formation.nantes@apaveno.com  
Organisme de Formation Certifié n° DI-1770, référentiel AFAQ ASCERT  
GIE - CETEN APAVE International, Groupement d'intérêt économique représentant les entités suivantes,  
membres du GIE : CETE APAVE Alsacienne, APAVE Parisienne, CETE APAVE Sud, CETE APAVE Lyonnaise,  
CETE APAVE nord-Ouest

FORMATION "OPERATEUR DE REPERAGE AMIANTE"

ATTESTATION DE COMPETENCE

N° 03113673.1.1

Délivrée à :

Monsieur Hubert GAUDIN

- ☐ A l'issue de la session de formation 033410PR143 organisée du 17/06/2003 au 20/06/2003 au CETE APAVE NORD OUEST SAINT HERBLAIN.
- ☐ Et du résultat aux contrôles des capacités de fin de stage.

Cette formation est conforme à l'arrêté du 2 décembre 2002  
relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la  
construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des  
matériaux et produits contenant de l'amiante en application de l'article 10-6 du décret 96-97 du  
07 février 1996 modifié.

Fait à Saint Herblain le 02/07/2003  
Le Chef du Centre de Formation

Lydie NOBLET

CETE APAVE nord ouest - Formation Professionnelle

20 000 314 156 02





Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

CONFIDENTIEL }

Référence : 04/091  
N° Affaire : 04137681

HLI DE LA PRESQU'ILE  
Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE

A l'attention de Mr Le Directeur

### RAPPORT AMIANTE

REPERAGE EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE OU D'UNE VENTE

SUIVANT LE DECRET 96/97 DU 07/02/96 MODIFIE PAR :  
LES DECRETS 97-855 DU 12/09/97, N° 2001-840 DU 13/09/01 ET N° 2002-839 DU 03/05/02

**Immeuble concerné**

HLI DE LA PRESQU'ILE  
Site de Guérande  
Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE

Opérateur CETE APAVE Nord Ouest : H. GAUDIN titulaire de l'attestation de compétence N° 03113673.1.1 délivrée par CETE APAVE NORD OUEST

Accompagnateur : Néant

Laboratoire : CETE Apave Nord Ouest – 2 rue des Mouettes 76132 Mont St Aignan Cedex  
Accréditation n°1-0970 du Cofrac – programme n° 144

Nbre Total de pages : 39

Date du rapport : 15 mars 2004

Diffusion : 1 exemplaire à l'attention de M Pageot

N° Polices d'Assurances Amiante : Police AXA n° 2060529504

Le présent document doit être joint au DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

<p>L'Opérateur CETE APAVE Nord Ouest :</p> <p style="text-align: center;">H. GAUDIN</p>	<p>Pour le CETE APAVE Nord Ouest Le Chef d'agence de St Nazaire</p>
---	---

Février 2003

Le présent rapport ne doit pas être communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

M.K16.0.04/02-04



Affaire : 04137681

## SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS
2. OBJET DE LA MISSION
3. CONDITIONS DE RÉALISATION
4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

Annexe 1 – Schéma de repérage de l'amiante  
Annexe 2 – Procès-verbaux d'analyses  
Annexe 3 – Fiche d'examen visuel

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

20 0000 100 02 00

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



N° Affaire : 04137681

**I. CONCLUSIONS**

Le schéma de repérage des matériaux et produits comportant de l'amiante est joint en annexe 1.

**RÉSULTATS DU REPÉRAGE**

- ☐ Des faux plafonds ont été repérés : Ils ne contiennent pas d'amiante.
- ☐ Il a été prélevé lors du repérage les matériaux suivants dont l'analyse est négative. Ils ne contiennent pas d'amiante.

N° échantillon	Localisation	Résultat d'analyse	Conclusions
P1 : dalle de sol	Bâtiment V80 (chambre 101 au 1 <sup>er</sup> étage)	Absence de fibres d'amiante	
P2 : plaque de faux plafonds	Fleur de sel 1 à 8 (sanitaire près salon mortuaire au Rdc niveau 0)	Absence d'amiante	
P3 : enduit sous plafond	Fleur de sel unité 10 (couloir Rdc près petit salon)	Absence de fibres d'amiante	

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

20 0000 100 02 00

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

N° Affaire : 04137681

□ Il a été repéré les matériaux et produits contenant de l'amiante suivants, sur décision de l'opérateur de repérage :

Matériau	Localisation	Nature	Conclusion
Dalles de sol	- Bâtiment V80 : . Rdc (circulation pharmacie, réserve pharmacie, linge sale, cage escalier, local ménage, réserve accueil)	Vinyl amiante	Dégradé à certains endroits
	. 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> (accueils, soins, pharmacie, vidoir, local ménage, sanitaires, plonge, réserve entretien)		En bon état
	- Fleur de sel (1 à 8) . niveau 0 : accueil soins, bureau, chambres Kerbrière 1 à 12, . niveau 1 : salon de coiffure, bureau infirmière, salon la Collégiale, bureau cadre infirmier, chambres Keramel et Kerbizienne . niveau 2 : bureau infirmière, salle St Michel, chambres Kerprévotr et Kersaillé		En bon état
Conduits en fibro-ciment	- Bâtiment V80 : . Sous sol : machinerie ascenseur  - Fleur de sel (1 à 8) . niveau 0 : machineries ascenseur, bureau chef cuisine, combles : rue Vannetaise (2 conduits) et clocher . Bâtiment CLIC et SSIDPA : local chaudière	Amiante ciment	En bon état
Conduits extérieurs en fibro-ciment	Conduits eaux pluviales Fleur de sel unité 9	Amiante ciment	En bon état
Toiture en plaque ondulée de fibro-ciment	Local chaudière du bâtiment CLIC et SSIDPA	Amiante ciment	En bon état

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



N° Affaire : 04137681

3

**OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES**

Le présent document doit être communiqué à toutes les personnes susceptibles de faire les travaux. Il constitue un élément important du dossier technique amiante que vous devez constituer avant le 31/12/2003 ou le 31/12/2005 selon la réglementation applicable à votre établissement.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du décret 96/98 modifié du 07/02/96 modifié par le décret n° 2001-840 du 13/09/01.


**PRÉCONISATIONS concernant les matériaux dégradés :**

- Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'oeuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante conformément à la norme NF X 46-020 et à une entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux conformément aux recommandations de la CRAM et aux guides de l'INRS.

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

20 0000 1000 02 00





N° Affaire : 04137681

3

### II. OBJET DE LA MISSION

**DÉFINITION ET LIMITE DE NOTRE MISSION :**

Notre intervention définie par notre remise de prix :

n° 04137681

en date du 14/01/2004

a pour but la recherche des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les locaux mentionnés en annexe 2.

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant de l'Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

Notre repérage porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE DE L'AMIANTE de l'annexe du décret 96/97 du 07/02/96 modifié par les décrets n° 97/855 du 12/09/97, n° 2001-840 du 13/09/01 et n° 2002-839 du 03/05/02 et de l'arrêté du 22/08/02.

Ce repérage ne porte pas sur les équipements techniques présents dans les locaux (exemple : matériels de cuisine, de chaufferie, équipements de travail, machines de process) pour lesquels il pourra être réalisé un audit spécifique facturé à la vacation.

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003

M.K16.0.04/02-04

30 0000 100 02 00



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

**apave** N° Affaire : 04137681

**Examen visuel d'un bâtiment  
pour le repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

**FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES**

**1. Renseignements généraux**

Demandeur du diagnostic :

- Nom : HLI DE LA PRESQU'ILE
- Adresse : Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE
- Téléphone : 02.40.62.65.40

Bâtiment à examiner :

- Désignation : HOPITAL DE GUERANDE
- Adresse : Avenue P. de la Bouexière  
44350 GUERANDE

Accompagnateur pour la visite :

- Nom : Mr PAGEOT
- Société : HLI de la Presqu'île (Hôpital de Guérande)
- Téléphone : 02.40.62.65.40

**2. Renseignements sur le(s) bâtiment(s) / locaux / zone(s) à inspecter**

Dates de la construction :

- Bâtiment V80 : 1976
- Fleur de sel (unités 9 et 10) : 1956
- Fleur de sol (unités 1 à 8) : non communiqué

Usage : Hôpital, maison de retraite

- nombre d'étages : R + 2 (V80), R+3 (Fleur de sol 9 et 10)  
R+1 (Fleur de sel 1 à 8), R+1 (bâtiment SSIDPA), Rdc  
(administration)
- nombre de sous-sols : R-1 (V80)
- surface approximative : Non communiquée
- type de construction (béton armé, métal, bois) : Béton

A-t-il fait l'objet de travaux de réaménagement ? : oui  
(si oui, nature et date approximative de ces travaux) :

- Bâtiment V80 : extension en 1999
- Fleur de sel (9,10) : restructuré en 2002, liaison et sous-sol en 2002/2003
- Fleur de sol (1 à 8) : rénové en 1989-1990

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04



N° Affaire : 04137681

**III. CONDITIONS DE RÉALISATION****DÉROULEMENT DE LA VISITE :**

**Bâtiment(s) concerné(s)** : Bâtiment V80  
Fleur de sel (unité 9 et 10) et couloir de liaison  
Fleur de sel (unité 1 à 8)  
Bâtiment administratif  
Chaufferie / atemoer  
Bâtiment SSIDPA, chapelle

**Date d'intervention** : 2, 5 et 15 mars 2004

**Opérateur APAVE ou CETE APAVE** : H. GAUDIN

**Accompagnateur** : Mr Pageot

\* Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

NOM DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE
Diagnostic amiante concernant les flocages et calorifugeages	APAVE DE L'OUEST	30 et 31/10/1996

\* Lors de la visite, il nous a été remis les plans suivants :

Plans de tous les niveaux de chaque bâtiment.

\* Lors de la visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants :

Néant

\* Le plan d'intervention et les consignes de sécurité ont été examinés.

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

25 0005 100 02 00



N° Affaire : 04137681

#### IV. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

##### LOCAUX EXAMINÉS

L'examen visuel est détaillé dans les fiches d'examen en annexe 3, qui listent également les locaux visités

##### PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES


Nombre de prélèvements : 3

Ces prélèvements sont localisés sur les plans en annexe 1.

Les résultats du laboratoire sont joints en annexe 2.

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

30 0000 100 07 06







## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

**apave**  
parisienne

Association loi 1901, fondée en 1974  
13 à 17, rue Solenne, 75854 PARIS CEDEX 17 - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 58 88 - Internet www.apave.com  
08/04/2004 N° Siret : 775605037 0003 - Code NAF : 7420 9 - N° TVA intracommunautaire : FR 25 775 690 639  
Laboratoires : 17 à 103, boulevard Victor-Hugo, 93400 SAINT-OUEN - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 59 50

Service : Laboratoire  
Ligne directe : 01-40-54-58-19 H L I de la Presqu'île  
Correspondant : JM MONTAGNON  
N/Réf : JMM/MCL  
V/Réf :  
V/Lettre du :

**Rapport d'essai N° 1040236-R01-Rév0**  
Date de réception : 01/04/2004  
Désignation : échantillon P1 (04/2300/1873) : dalle de sol - Bâtiment V80 - Chambre 101 (1er étage)  
Examen visuel : matériau non fibreux suivant l'arrêté du 06 mars 2003  
Description macroscopique : matériau non friable vert de type dalle de sol avec colle jaune  
Nombre de préparations : 1  
Date de l'essai : 06/04/2004  
N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q

Etablissement demandeur..... CETE Apave Nord-Ouest  
Affaire concernée ..... H L I de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement..... Site de Guerande - Avenue de la Bouesnière - 44350 Guerande  
Etablissement préleveur..... Apave St Nazaire  
Nom du preleveur ..... Mr Gaudin  
Méthode de prélèvement ..... /  
Date du prélèvement ..... 15/03/2004  
Nature du matériau ..... dalle de sol  
Année d'application..... /

**EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE**

Méthode d'examen :  
Observations et analyses réalisées en microscopie électronique à balayage en combinant les examens morphologiques et l'analyse par spectrométrie des rayons X en dispersion d'énergie

**Conclusion de l'examen : Absence de fibres d'amiante**  
Conservation de l'échantillon: 3 mois à compter de la date de ce courrier

Saint-Ouen, le 8 avril 2004

*Le Responsable de l'Unité d'Exploitation Analyses*  
**J-M MONTAGNON**

ACCREDITATION  
N° 1.087  
PORTÉE  
COMPLÈTEMENT  
SUR ENGAGEMENT  
**cofrac**  
ESSAIS

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation  
3.L505.1.080/01

AUXERRE Tél. 03 86 72 17 00 - BLOIS Tél. 02 54 90 56 56 - BOURGES Tél. 02 48 50 96 20 - CERVOY PONTLOISE Tél. 01 30 75 37 37 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Tél. 03 24 33 29 50 - CHARTRES Tél. 02 37 84 12 20  
CHATEAUXTEL Tél. 03 54 34 17 40 - CHÉTEL Tél. 01 45 17 21 00 - ÉVRY Tél. 01 69 91 86 86 - FORT-DE-FRANCE Tél. 0596 71 77 54 - ISSY-LES-MOULINEAUX Tél. 01 40 54 56 00 - MAIRIE-LA-VALLEE Tél. 01 60 37 55 37  
ORLÉANS Tél. 02 38 22 64 64 - POINTE-A-PITRE Tél. 0590 26 87 05 - REIMS Tél. 03 26 84 26 00 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Tél. 01 30 14 14 20 - TAVENNY Tél. 01 29 32 74 50 - TROYES Tél. 03 25 83 21 31  
Conformément à ses statuts et règlement intérieur à disposition sur demande.  
TAPAVE parisienne ne peut intervenir que pour ses Membres à jour de la "cotisation annuelle de base" leur permettant de faire appel à tous ses Services

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Laboratoire d'Analyses Environnementales et d'Essais Energétiques – Unité de ROUEN  
2, rue des Mouettes - B.P. 98 - 76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex  
Tél. 02 35 52 60 60 – Télécopieur : 02 35 52 61 61

CONFIDENTIEL



## RAPPORT D'ESSAI N° 04/2300/1874

## IDENTIFICATION DE L'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

## ETABLISSEMENT

N° de prestation : 04198907-01  
Raison Sociale du demandeur : CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire  
Etablissement concerné : HLI de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement : Site de Guérande – Avenue de la Bouexière – 44350 GUERANDE

## ECHANTILLON

Organisme préleveur, adresse : CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire  
Repère du prélèvement : P2  
Date du prélèvement : 15/03/2004  
Localisation du prélèvement : Rés. Fleur de sel – Unités 1 à 8 – Sanitaire près salon mortuaire (RdC : niv. 0)  
Description du matériau en place : Plaque faux plafond

## ESSAI

Numéro d'échantillon : 04/2300/1874  
Nature du matériau : Faux plafond  
Examen initial en laboratoire : Matériau friable beige et peinture blanche  
Nombre de préparations : 2  
Référence de l'essai : Examen au MOLP, norme MDHS N° 77 de juin 1994  
Principe : Caractéristiques optiques et morphologiques spécifiques des fibres

## CONCLUSION

CONCLUSION DE L'ESSAI: Absence d'amiante

MONT-SAINT-AIGNAN, le 26 mars 2004

Christelle Vallée

Ce rapport contient 1 page et 0 annexe.  
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais.  
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Sauf demande particulière du donneur d'ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant 5 ans à compter de la date d'édition du rapport, puis éliminés.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence technique du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.


20 0007 402 03 00

Siège Social : 51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 781 936 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B



Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2



Association loi 1901, fondée en 1974  
13 à 17, rue Solenne, 75054 PARIS CEDEX 17 - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 58 88 - Internet [www.apave.com](http://www.apave.com)  
N° Siret : 775609037 00001 - Code N.A.F. : 74339 - N° TVA intracommunautaire : FR 25 775 609 039  
08/04/2004 Laboratoire : 97 à 103, boulevard Victor-Hugo, 93400 SAINT-OUEN - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 59 59

Service : Laboratoire  
Ligne directe : 01-40-54-58-19  
Correspondant : JM MONTAGNON  
N/Réf : JMM/MCL  
V/Réf :  
V/Lettre du :

H L I de la Presqu'île

**Rapport d'essai N° 1040237-R01-Rév0**  
Date de réception : 01/04/2004  
Désignation : échantillon P3 (04/2300/1875) : enduit sous plafond - Résidence Fleur de Sel, Unité 10 (Kerbinou) - Couloir RdC (près petit salon)  
Examen visuel : matériau non fibreux suivant l'arrêté du 06 mars 2003  
Description macroscopique : matériau non friable blanc de type enduit  
Nombre de préparations : 1  
Date de l'essai : 06/04/2004  
N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q

Etablissement demandeur ..... CETE Apave Nord-Ouest  
Affaire concernée ..... H L I de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement ..... Site de Guerande - Avenue de la Bouesnière - 44350 Guerande  
Etablissement préleveur ..... Apave St Nazaire  
Nom du préleveur ..... Mr Gaudin  
Méthode de prélèvement ..... /  
Date du prélèvement ..... 15/03/2004  
Nature du matériau ..... enduit sous plafond  
Année d'application ..... /

**EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE**


Méthode d'examen :  
Observations et analyses réalisées en microscopie électronique à balayage en combinant les examens morphologiques et l'analyse par spectrométrie des rayons X en dispersion d'énergie

**Conclusion de l'examen : Absence de fibres d'amiante**  
Conservation de l'échantillon: 3 mois à compter de la date de ce courrier

Saint-Ouen, le 8 avril 2004

Le Responsable de l'Unité d'Exploitation Analyses  
**J-M MONTAGNON**

ACCREDITATION  
N° 11478  
PORTES  
COMPLÉMENTAIRE  
SUR DEMANDE





ESSAIS

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation 3.L505.1.080/01


AUXERRE Tél. 03 86 72 37 00 - BLOIS Tél. 02 54 90 54 56 - BOURGES Tél. 02 48 50 96 20 - CERGY PONTOISE Tél. 01 30 75 37 37 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Tél. 03 24 33 79 50 - CHARTRES Tél. 02 37 84 12 20  
CHATEAUBRIANT Tél. 02 54 34 12 40 - CHÉREY Tél. 01 45 17 21 00 - ÉVRY Tél. 01 65 91 84 86 - FORT DE FRANCE Tél. 0596 71 77 54 - ISSY-LES-MOULINEAUX Tél. 01 40 54 56 00 - MARNE-LA-VALLÉE Tél. 01 60 37 55 37  
ORLÉANS Tél. 02 38 22 64 64 - FORNIE-A-PITRE Tél. 0590 26 97 05 - REIMS Tél. 02 26 84 38 00 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELLES Tél. 01 30 14 14 30 - TAVERNAY Tél. 01 39 32 76 50 - TROYES Tél. 02 25 83 21 31


Conformément à ses statuts et règlement intérieur à disposition sur demande.  
TAPAVE parisienne ne peut intervenir que pour ses Membres à jour de la "cotisation annuelle de base" leur permettant de faire appel à tous ses Services




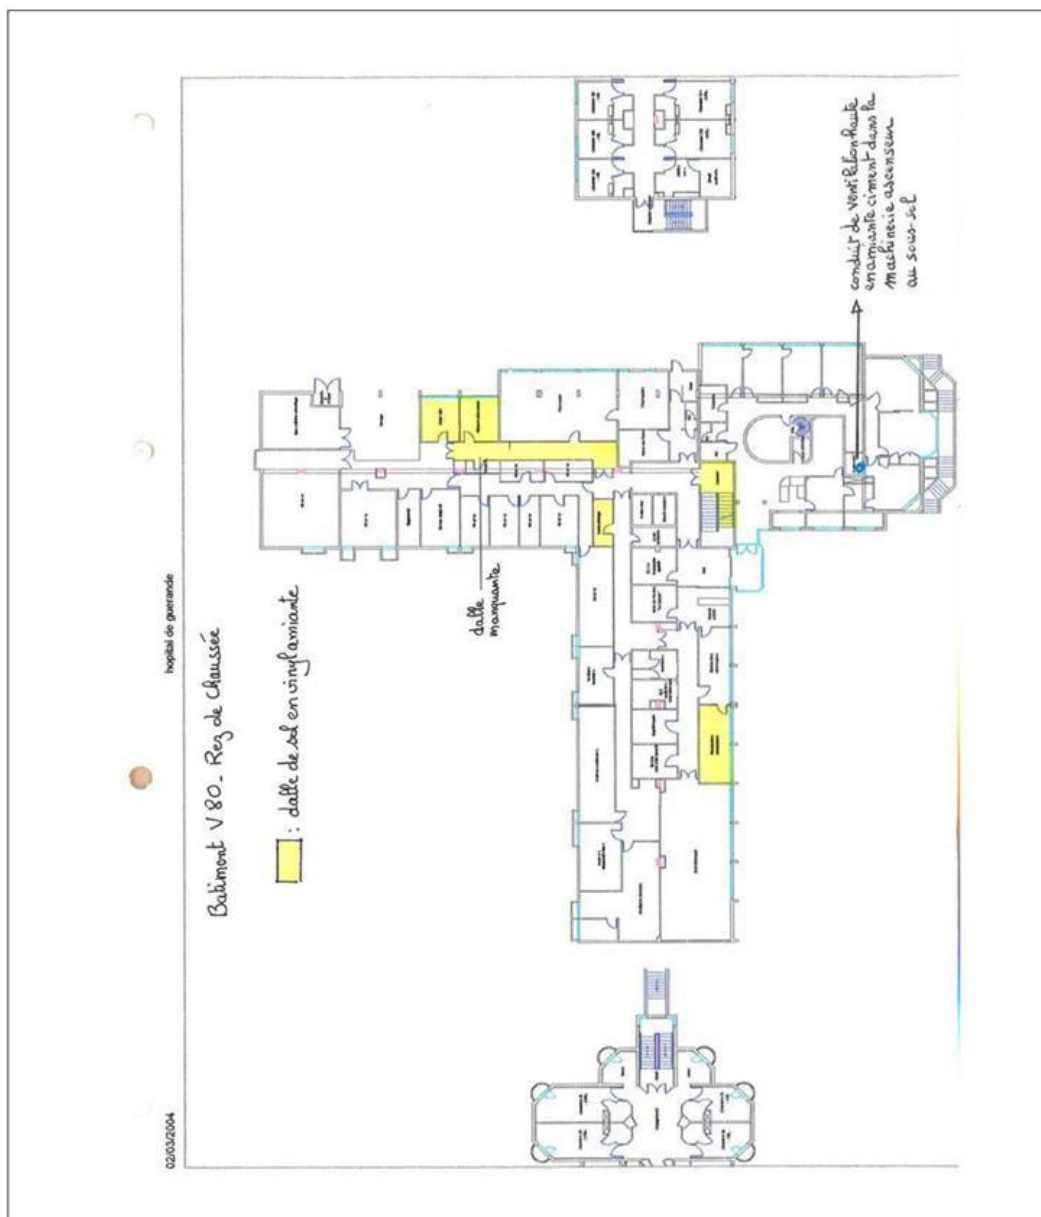





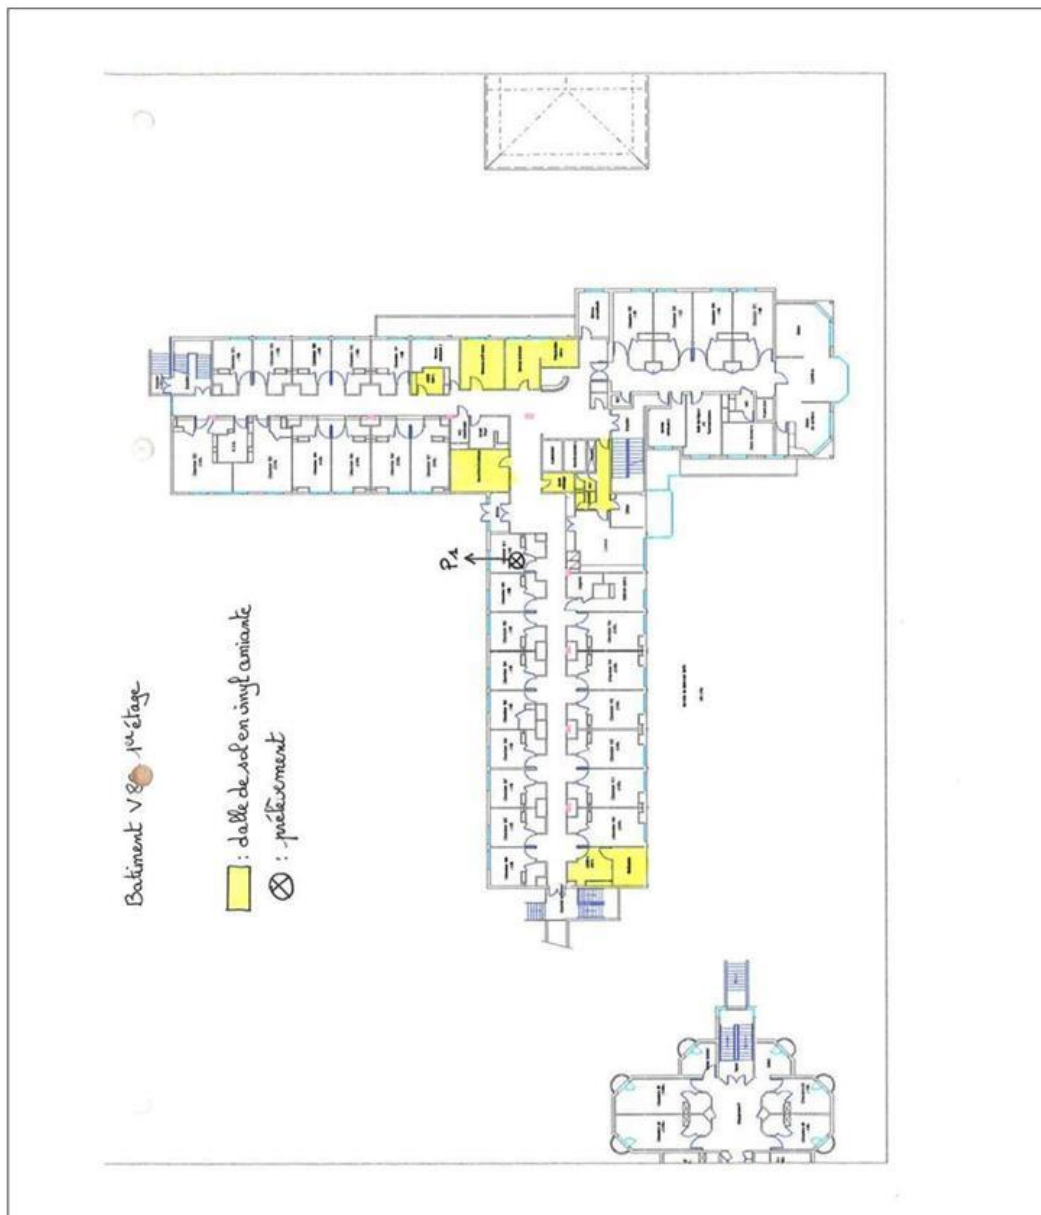

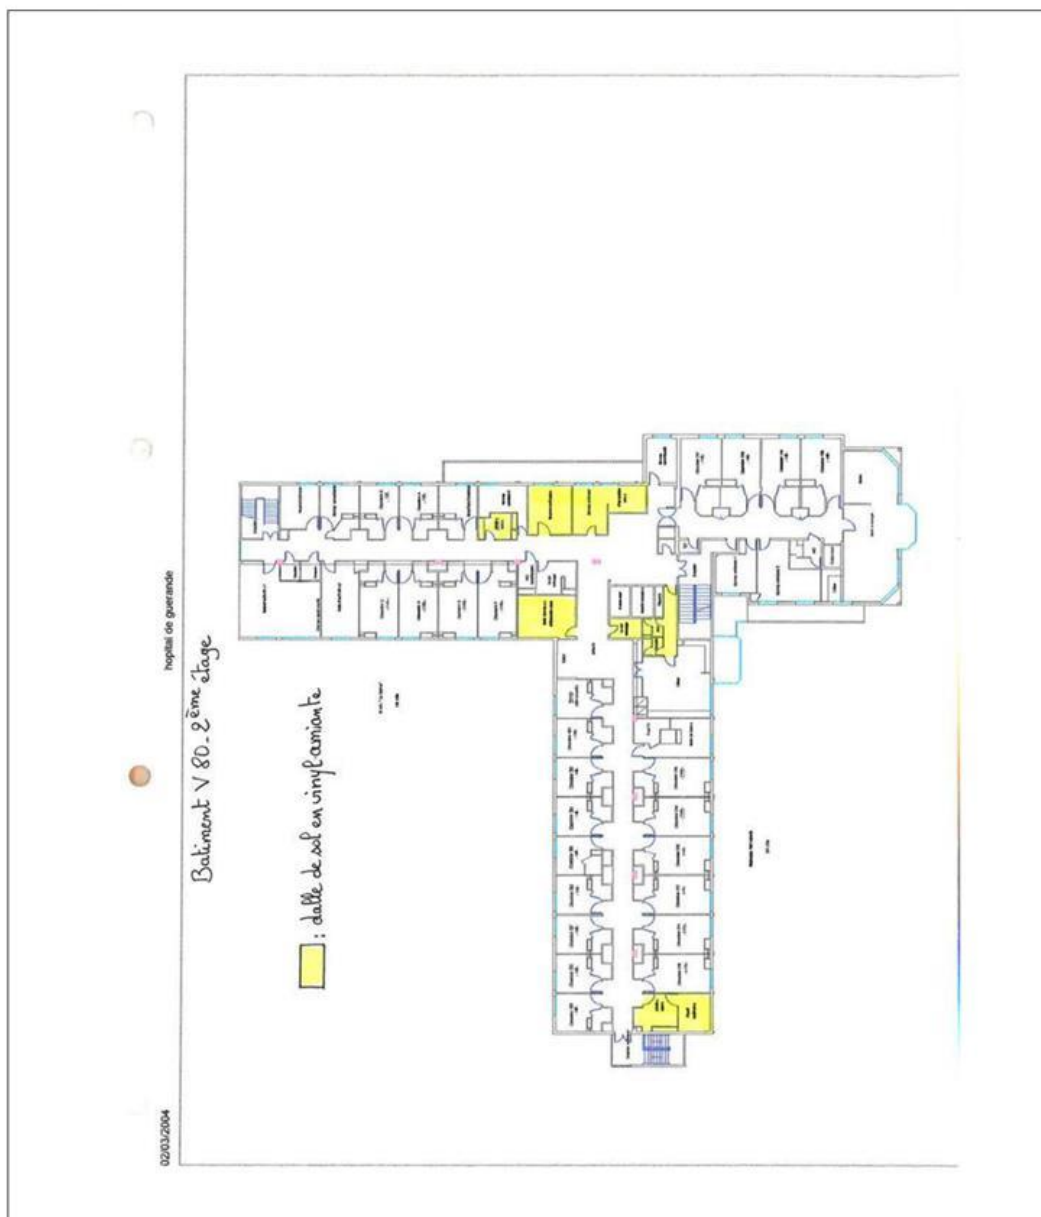

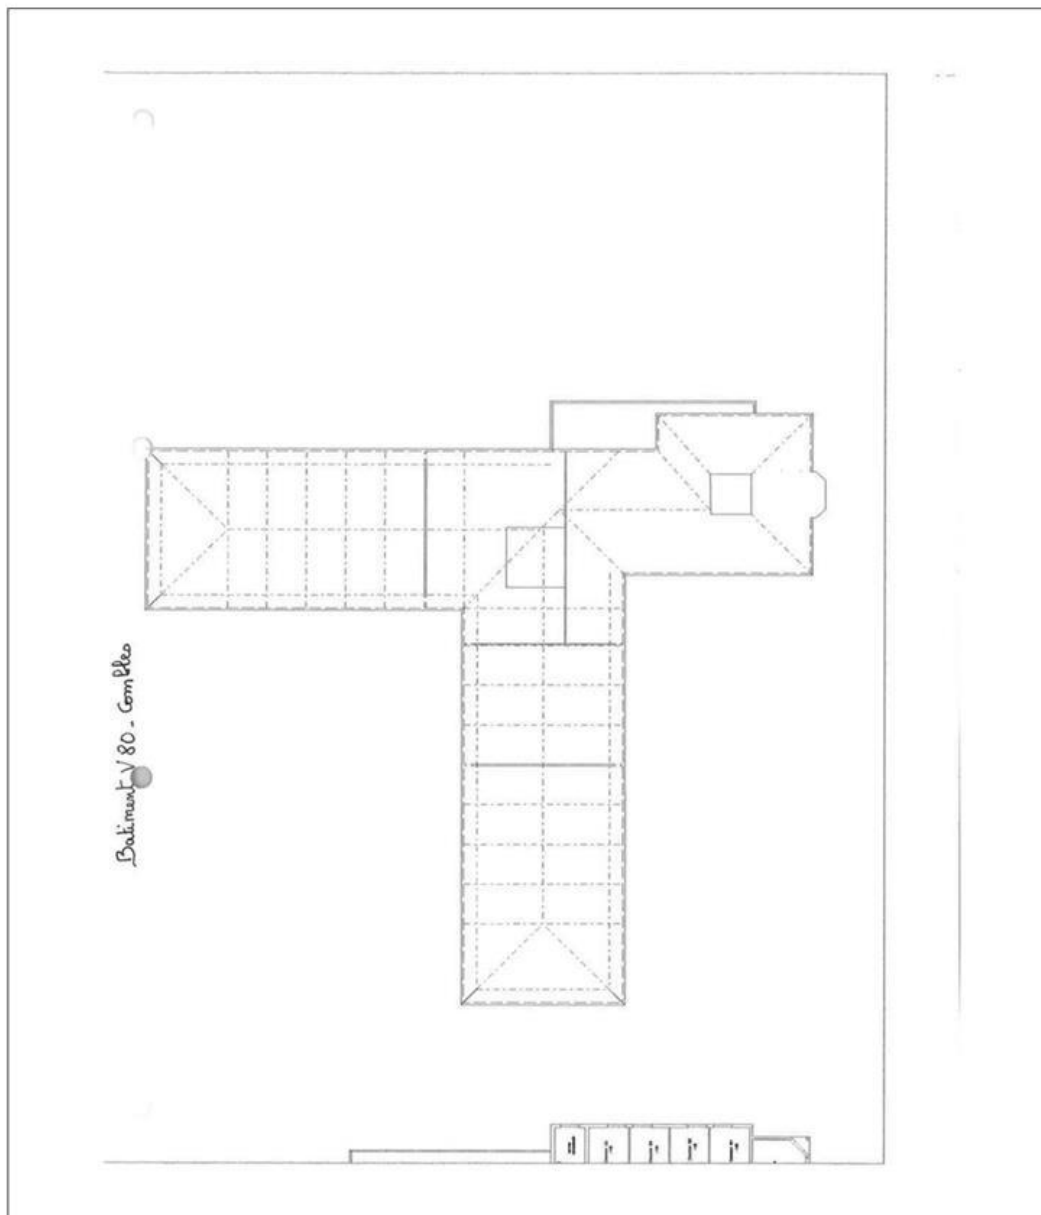

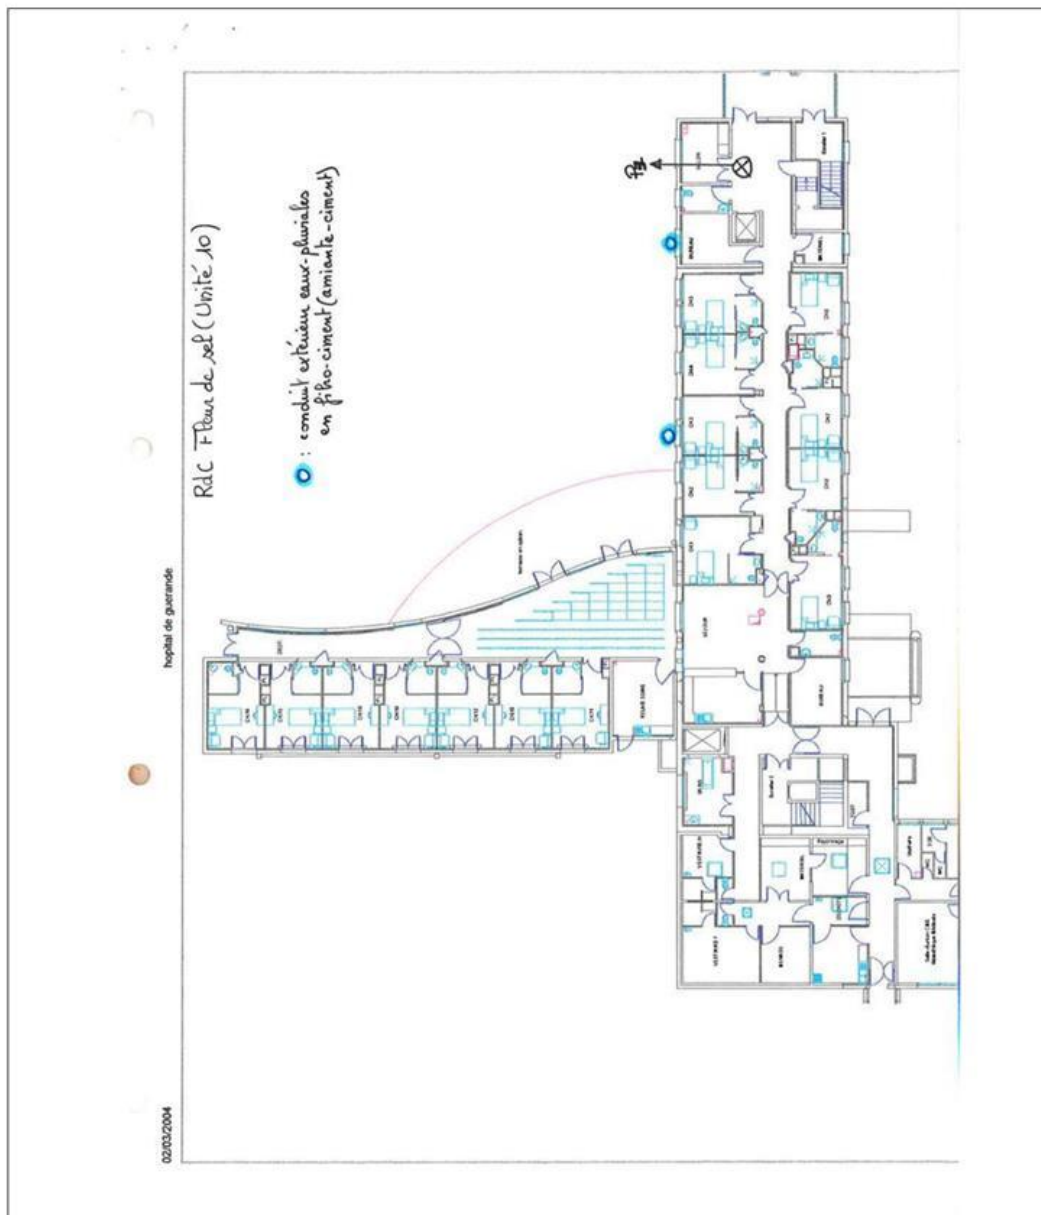

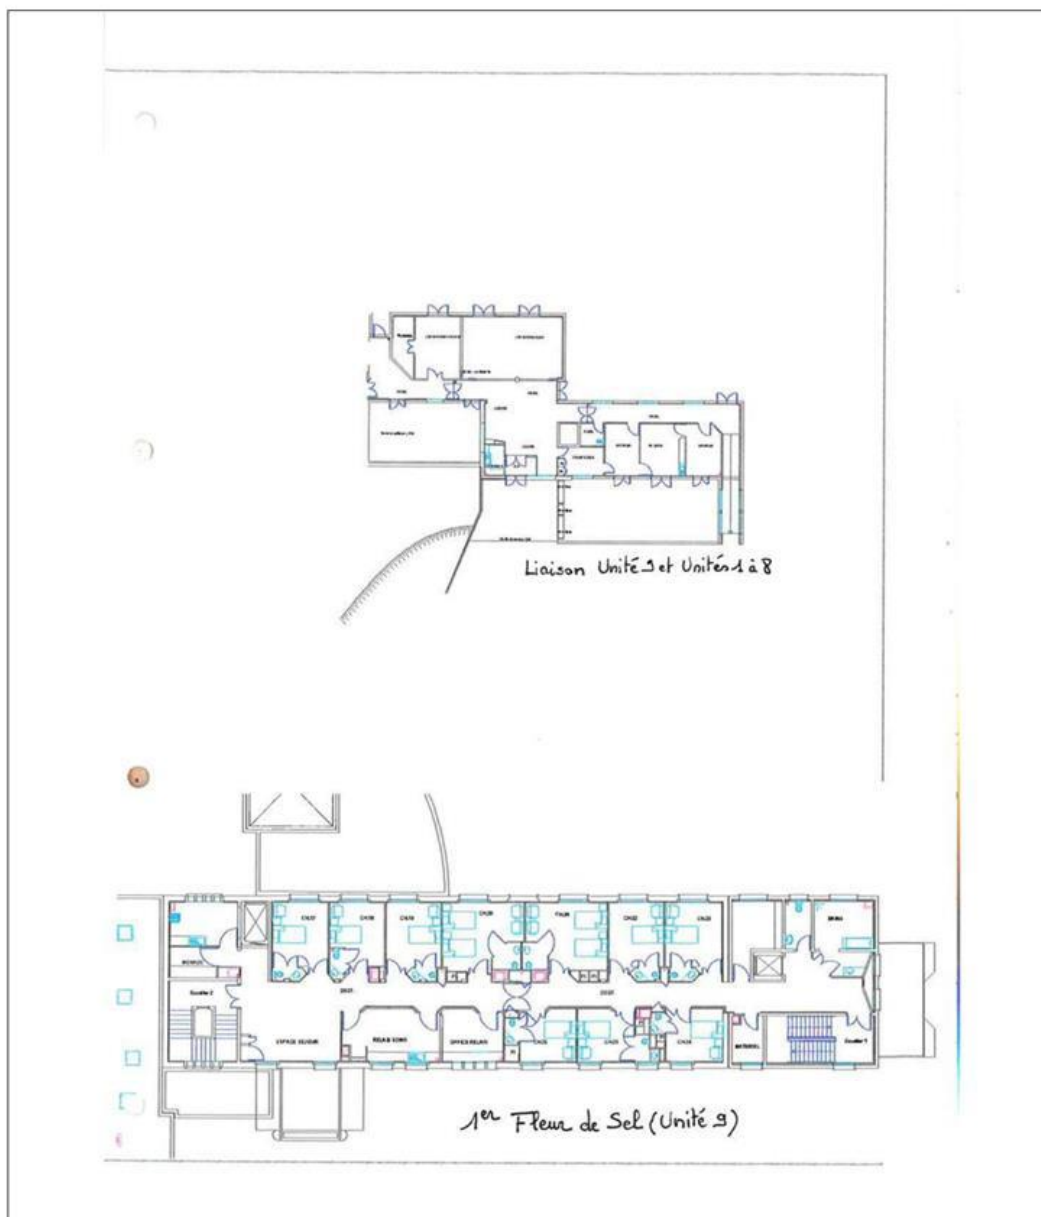








5ème : Unité hospital St Nazaire




Combles

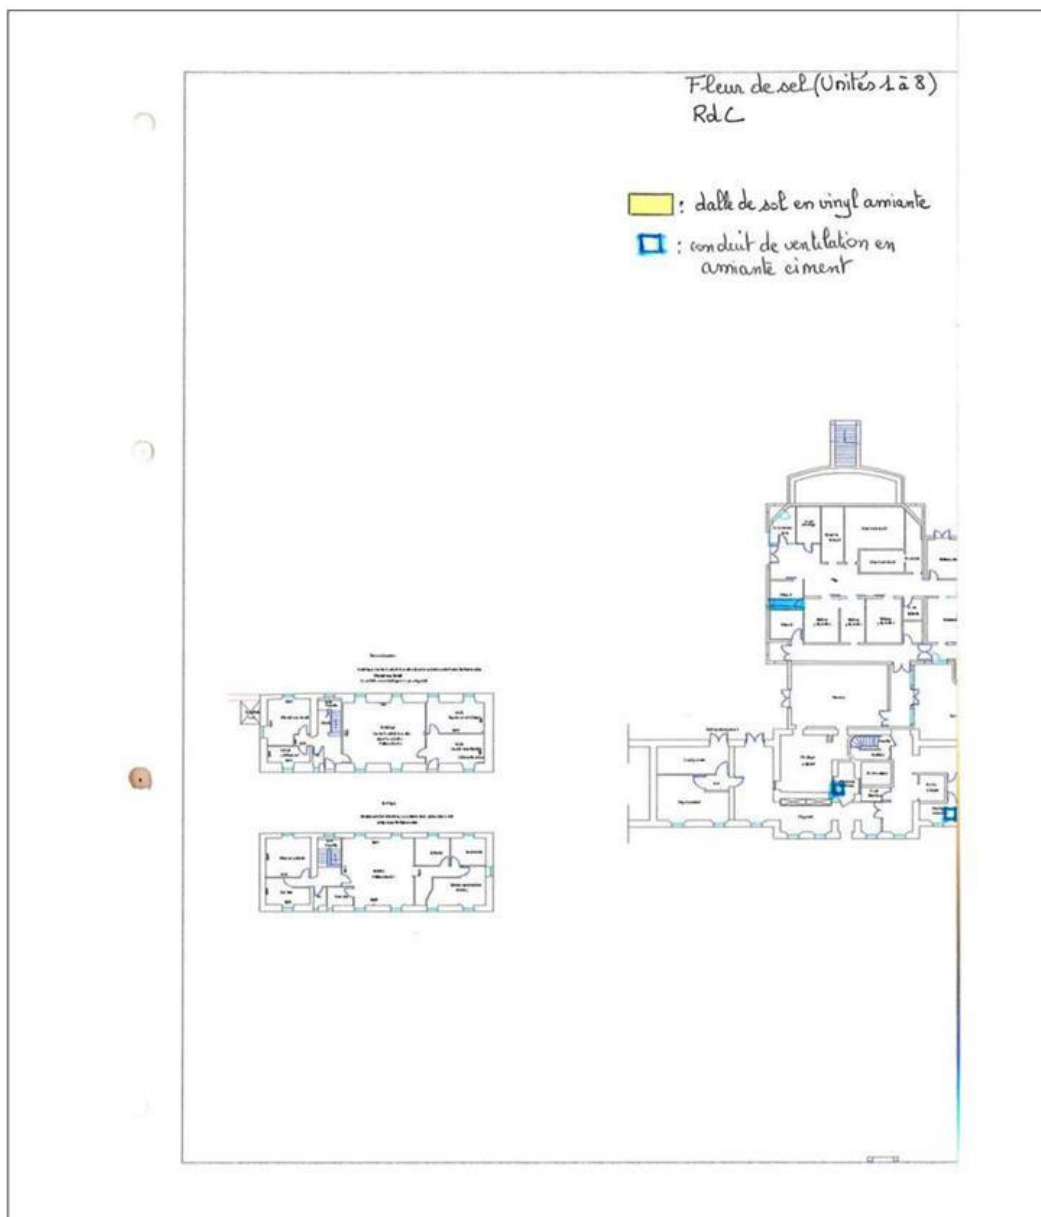


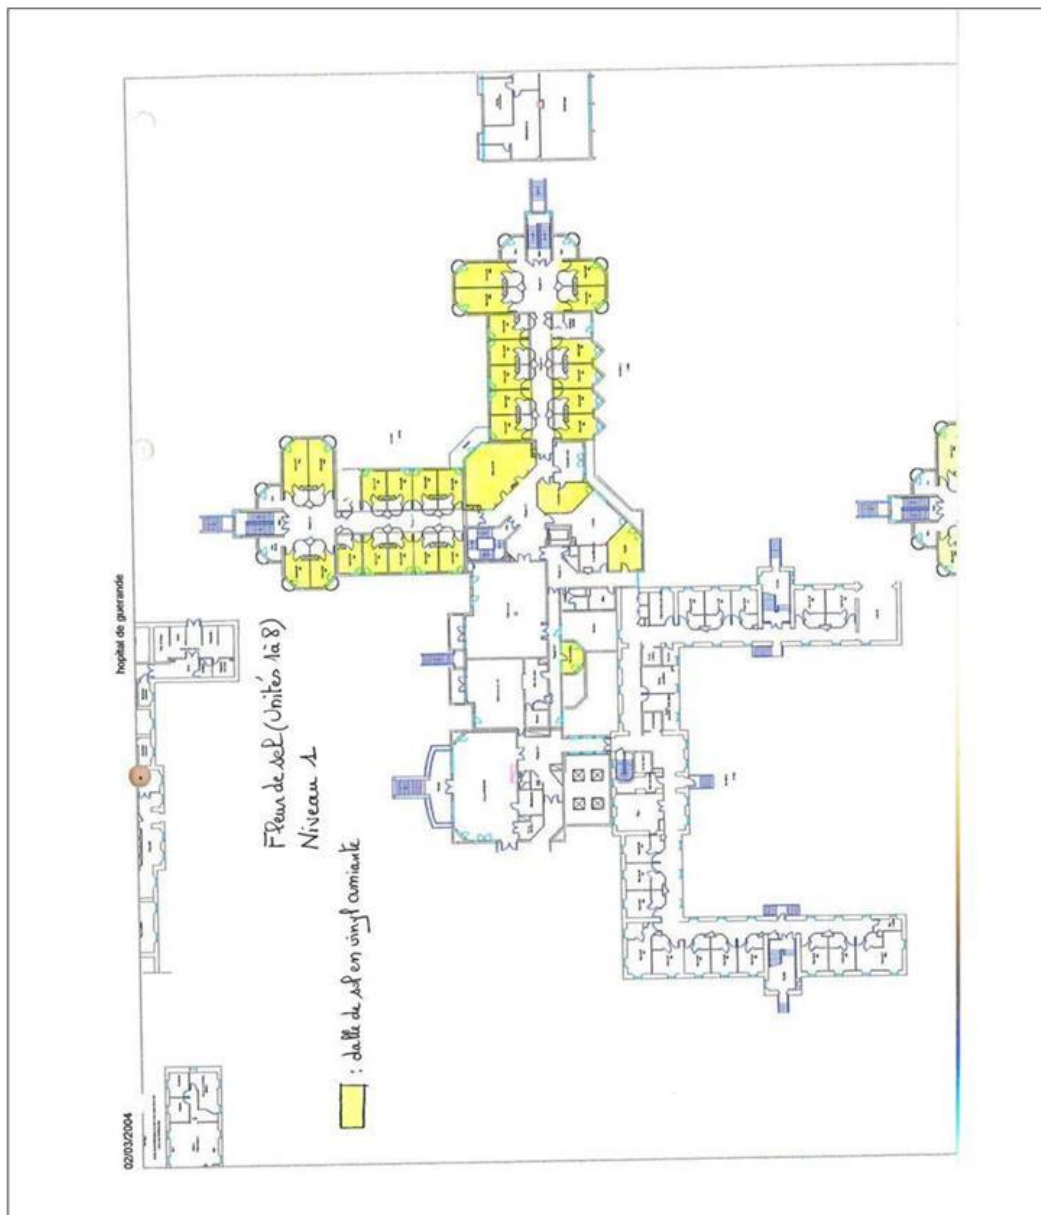

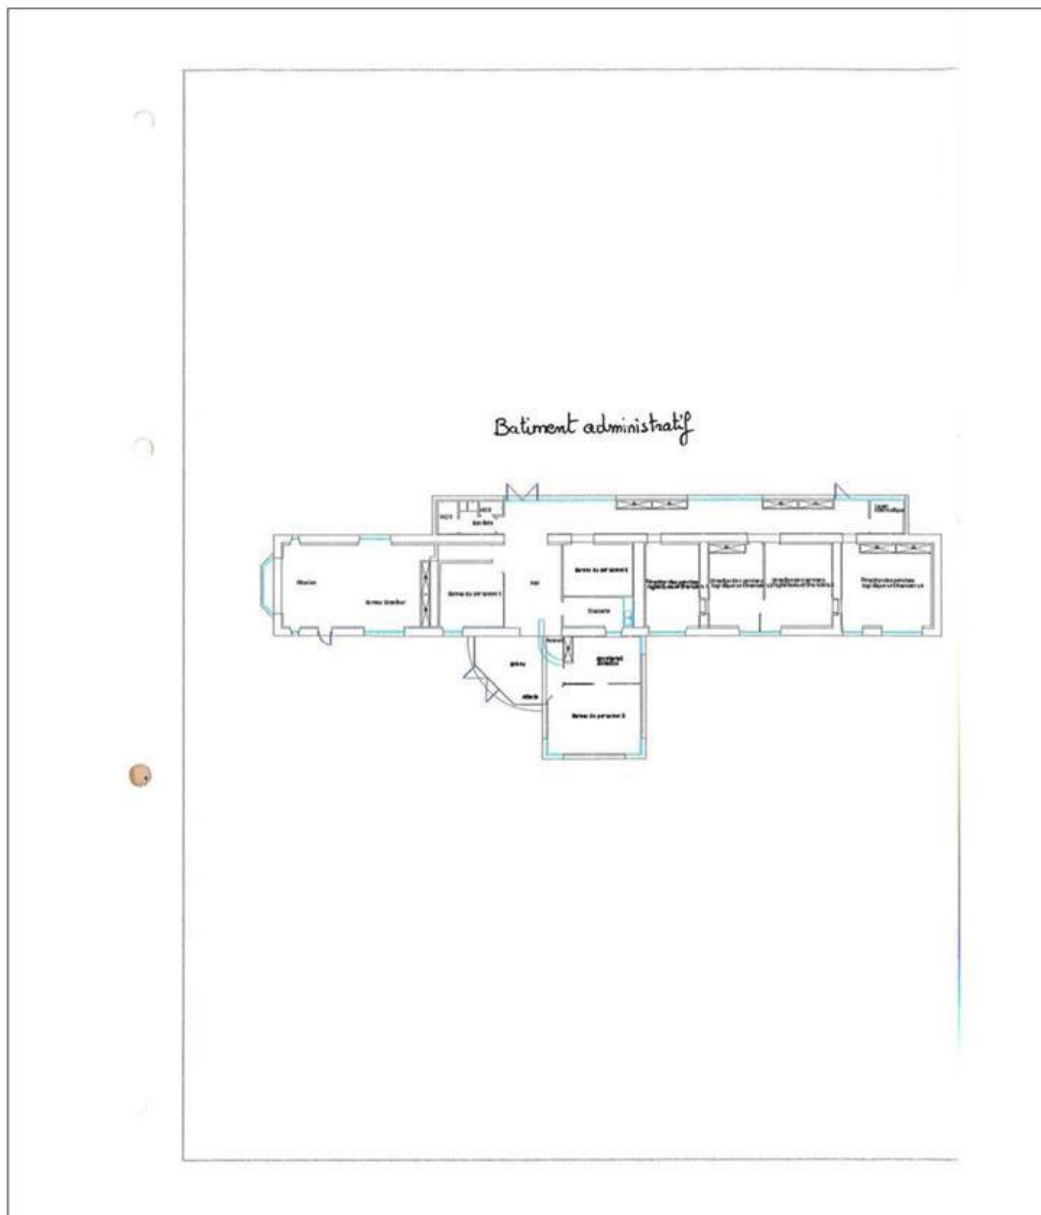

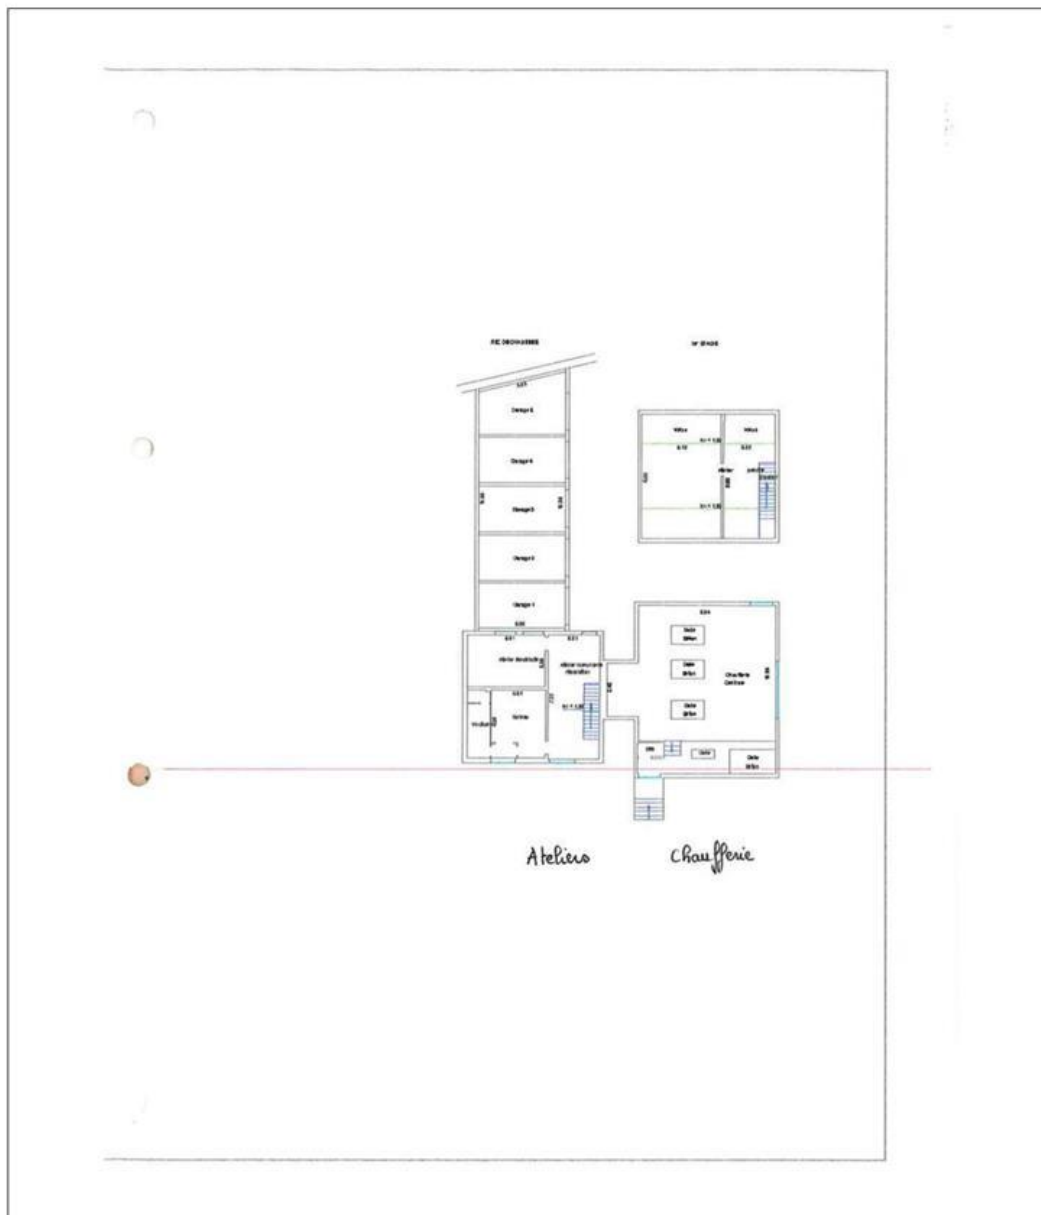





## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



N° Affaire : 04137681

Les fiches présentées ci après listent les locaux visités, identifient et localisent les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conformément au programme annexé au décret 96-97 modifié.

Conformément au décret 96-97 article 2, le repérage met en évidence également la présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds, dans les locaux, et atteste la présence ou l'absence d'amiante dans ces éléments.

Les abréviations suivantes sont utilisées :

**CARACTÉRISATION DE LA PRÉSENCE D'AMIANTE**

**NV :** Flocage, calorifugeage ou faux plafond ne contenant pas d'amiante, reconnu visuellement par l'opérateur.

**AV :** Les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante reconnus visuellement par l'opérateur.

**NPx :** Les matériaux ayant fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse négative (ils ne contiennent pas d'amiante).

**APx :** Les matériaux contenant de l'amiante repérés après prélèvement et analyse.

x : Numéro d'ordre pour l'identification du matériau ou produit.

**ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION**

Pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds

E1, E2 ou E3 suivant résultat de la grille d'évaluation.

Pour les autres matériaux

B : Matériau en bon état de conservation

D : Matériau dégradé

Exemple :

AP1-E3 : Prélèvement N°1 contenant de l'amiante après analyse, noté 3 pour son état de conservation

AV-B : Élément contenant de l'amiante reconnu visuellement, en bon état de conservation.

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.  
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

J01 0000 100 02 00

N° Affaire : 04137681

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments**  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)

Suivant l'annexe du décret 96-87 modifié

Bâtiment	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante		Suivant l'annexe du décret 96-87 modifié										Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel		
	Niveau	Local	Flocages, enduits projetés	Calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coïlés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Enlèvement de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	(Chapes/volants coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (trusses, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages		Calorifuges	Faux-plafonds
<b>BATIMENT V80</b>															
	Rdc	Circulation pharmacie, réserve pharmacie						AV-D						NV	
		Pharmacie													
		Déchets sous station, réserves, couloir réserves, local électrique												X	
		Linge sale, cage escalier						AV-D						X	
		Quai déchargement												NV	
		Local ménage, réserve accueil												NV	
		Local autocam						AV-B						NV	
		Archives médicales, archives administratives, douches												X	
		Vestiaires femmes, couloir vestiaire												NV	
		Couloir kiné, salle kiné, bureaux, réserve, sanitaires												NV	

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

M.K16.0.04/02-04

Février 2003

apave  
nord-ouest

N° Affaire : 04137681

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)**

Bâtiment	de contenu de l'amiante		Suivant l'annexe du décret 96-97 modifié										Suivant l'article 2 du décret 96-97 modifié				Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
	Niveau	Local	Fiocages, enduits projetés	Calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coïlés	Revetements durs des murs (plaques munières, amiante ciment, carton-plâtre)	Entourage de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Chapets/volants coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe- feu (treilles, bandes)	Conduits vides-ordures	Fiocages	Calorifuges	Faux-plafonds	Absence de Fiocage, Calorifuge ou Faux Plafond		
BATIMENT V80		Bureaux accueil, accueil	X											Nv			
		Salon mortuaire	X											Nv			
	Sous-sol	Local électrique, archives direction	X											Nv			
		Sanitaires, circulation, conseil administration	X											Nv			
		Machinerie ascenseur		AV										X		Conduit ventilation haute en amiante ciment	
	Rdc	Services administratifs : bureaux, couloir, réserves, sanitaires	X											Nv			
	1er	Salon restaurant, salon funér., salle personnel, bureau médecin	X											Nv			
		Chambres 128 à 132, couloir local électrique, sas escalier						Nv-3 (couloir)						Nv			
		Sanitaires, sanitaire chambres	X											Nv			
		Gaines techniques couloir 1 <sup>er</sup>	X											X			

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

Février 2003

M.K16.0.0402-04

35 0000 100-03 00

N° Affaire : UM137681

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments**  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)

Suivant l'annexe ou décret 96-87 modifié

Bâtiment	Niveau	Local	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante										Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel						
			Flocages, enduits peints	Calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coles ou vissés	Révetements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Enlèvement de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/vorlets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (trévissés, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages		Calorifuges	Faux-plafonds	Absence de Flocage, Calorifugeage ou Faux Plafond			
BATIMENT V80	1er	Bureau surveillance, bureau chef de service, sanitaire, lingerie																	
		Accueil soins, réserve, pharmacie, viduit, accueil																	
2ème		Salon, salle à manger, bureau, sanitaires																	

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

Février 2003

M.K16.0.04/02-04



N° Affaire : 04137561

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments (repérage pour constat ou en vue du DTA)**

Suivant l'annexe ou décret 96-57 modifié


Bâtiment	Niveau	Local	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante										Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel					
			Flocages, enduits projetés	Calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coïlés ou visés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Enlèvement de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/vollets coupe-feu rebouchage, joints portes coupe-feu (tréviss, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages		Calorifuges	Faux-plafonds	Absence de Flocage, Calorifugeage ou Faux Plafond		
BATIMENT V80	2 <sup>ème</sup>	Chambres 217 à 220, couloir, local ménage, escalier																
		Gaines techniques, couloir 2ème																
		Accueil soins, réserve, pharmacie, videor																
		Chambres A à F, secrétariat, couloir, réserve service																
		Sanitaires, chambres et secrétariat																
		Salles de réunion, bureaux infirmier																
		Salles personnel																
		Salles entretien, sanitaires, plonge, local ménage																
		Hall 1 <sup>er</sup> plonge																
		Chambres 201 à 216, couloir, salle de bains 211																
		Salles de bains, chambres																
		Combles																

Suivant l'article 2 du décret 96-57 modifié

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

Février 2003

M.K16.0.04/02-04



3

N° Affaire : U-137681

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments**  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)

Bâtiment		Selon l'annexe du décret 96-97 modifié										Selon l'article 2 du décret 96-97 modifié				Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
		Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante										Flocages, enduits peints				
Niveau	Local	Flocages, enduits peints	Catolufuges, enveloppes de catolufuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coïlés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Enlèvement de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/vivrets coupe-feu, rebouchage, joints portes coupe-feu (presses, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages	Catolufuges	Faux-plafonds	Absence de Flocages, Catolufuges ou Faux Plafond		
Rdc	Circulation chambres, chambres 301 à 309	X											Nv			
	Salon bureaux, couloir près salon												Nv			
	Réserve sous escalier	X											X			
	Gaine technique dans circulation	X											X			
	Toilettes, bureau infirmier, office	X											Nv			
	Salle à manger, accueil soins, chambres 310 à 316, circulation															
	Locaux inges, vestiaires, matériel TGBT, salle de bains	X											Nv			
	Salle réunion CME, salles diététicienne, bureaux, sanitaires, accueil												Nv			
Sous-sol	Passage canalisations	X											X			
	Bâtiment liaison : bureaux, salles de réunion, secrétariat accueil, salle de kiné	X											Nv			


Février 2003

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

M.K16.0.04/02-04

20 03 00 000 000 00

N° Affaire : 0-137681


  
 nord-ouest

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)**

Bâtiment	Niveau	Local	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Selon l'annexe du décret 96-97 modifié										Selon l'article 2 du décret 96-97 modifié				Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
				Flocages, enduits projetés	Catrefuges, enveloppes de catrefuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux coles ou vissés	Rivêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (carron, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/vorlets coupe-feu rebouchage, joints portes coupe-feu (treilles, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages	Catrefuges	Faux-plafonds	Absence de Flocage, Catrefuge ou Faux Plafond		
1 <sup>er</sup>		Chambres 317 à 326, bureaux, gaines techniques	X													Nv		
		Salle de bains, toilettes handicapés, couloir (côté Sd8), linge propre		Dito NP3												Nv		
		Reserves, accueil soins	X													Nv		
		Bureau médecin	X													X		
		Secrétariat, salle de bains, chambres, circulation	X													Nv		
2 <sup>ème</sup>		Chambres 331 et couloir proche	X													Nv		Poutre floquée
		Salle de soins, salle d'entretien	X													Nv		
3 <sup>ème</sup>		Vestiaires, combles, salle toilet, chambres, réserve, sanitaires	X													X		
		Conduit eaux pluviales		AV														
Ext																		

Contrat n° :

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

Février 2003

M.K16.0.04/02-04

N° Affaire : G-137681

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments**  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)

Suivant l'annexe 2 du décret 96-57 modifié

Suivant l'annexe du décret 96-57 modifié

Bâtiment	Niveau	Local	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Flocages, enduits projetés	Calorifuges, conduits de fluides	Faux-plafonds, panneaux collés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment)	Entourage de poteaux (ciment, amiante ciment, matériau sandwich, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Clapets/vois coupés, rebouchage, joints portes coupées (treilles, bandes)	Conduits vide-ordures	Flocages	Calorifuges	Faux-plafonds	Absence de Flocage, Calorifugeage ou Faux Plafond	Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
RESIDENCE FLEUR DE SEL UNITE 1 à 8	1 <sup>er</sup>	Espace animation, salle à manger, personnel et résident	X												Nv		
		Cuisine préparation du personnel, sanitaires	X												Dito NP2		Faux plafond en plâtre
		Circulation	X												Nv		
		Salon de coiffure, bureau infirmier, salon la collégiale													Nv		
		Bureau cadre infirmier													X		
		Sanitaires, salle préparation	X												X		
		Linge sale, plonge, réserve Kéralmel, salle de bains Kerbizienne	X												Dito NP2		Faux plafond en plâtre
		Chambres Kéralmel, chambres Kerbizienne	X														
		Circulation et gaine technique Kéralmel, et Kerbizienne, soins	X												Nv		

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

M.K16.0.04/02-04

Février 2003

apave  
nord-ouest

N° Affaire : G-137681

Contrat n° :

**Fiche de repérage de l'amiante dans les bâtiments  
(repérage pour constat ou en vue du DTA)**

Bâtiment	Niveau	Local	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Selvant l'annexe du décret 86-97 modifié										Selvant l'article 2 du décret 86-97 modifié			Observations, n° de fiche d'évaluation éventuel
				Fibrociment, enduits projetés	Calorifuges, enveloppes de fluides	Faux-plafonds, panneaux coisés ou vissés	Revêtements durs des murs (plaques moulurées, amiant, ciment)	Enlèvement de poteaux (ciment, amiant, carton-plâtre)	Panneaux de cloison	Dalles de sol	Chapeaux/vols coupe-feu (treilles, bandes)	Conduits vide-ordures	Fibrociment	Calorifuges	Faux-plafonds	Absence de Fibrociment, Calorifuges ou Faux Plafonds	
RESIDENCE FLEUR DE SEL UNITE 1 à 8	Niveau 0	Réserve alimentaire, bureau, réception, quai	X												Nv		
		Local ballon ECS, local compresseur, réserve palette	X												X		
		Réserve entretien, réserves matériel, sanitaires	X												Nv		
		Local groupe froid, Réserve entretien, cuisinier/réserve conserves	X												X		
		Bureau chef cuisine		Av											Dilo NP2		2 conduits en fibrociment Faux plafond plâtre
		Locaux humides, cuisine, plonge	X												Dilo NP2		
		Local blouse	X												Dilo NP2		Fibrociment
		Salle de repos, bureaux, local poubelles	X												X		
		Zones froides	X												Dilo NP2		

Le présent rapport ne doit pas être reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.

Février 2003

M.K16.0.04/02-04



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

**parisienne**  
Association loi 1902, fondée en 1974  
13 o 17, rue Solneuve, 75854 PARIS CEDEX 17 - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 58 88 - Internet : www.apave.com  
N° Siret : 755695207 0003 - Code NAF : 7420 - N° TVA intracommunautaire : FR 22 775 600 630  
08/04/2004 Laboratoires : 97 o 103, boulevard Victor-Hugo, 93400 SAINT-OUEN - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 59 50

Service : Laboratoire  
Ligne directe : 01-40-54-58-19 H.L.I. de la Presqu'île  
Correspondant : JM MONTAGNON  
N/Réf : JMM/MCL  
V/Réf :  
V/Lettre du :

**Rapport d'essai N° 1040236-R01-Rév0**  
Date de réception : 01/04/2004  
Désignation : échantillon P1 (04/2300/1873) : dalle de sol - Bâtiment V80 - Chambre 101 (1er étage)  
Examen visuel : matériau non fibreux suivant l'arrêté du 06 mars 2003  
Description macroscopique : matériau non friable vert de type dalle de sol avec colle jaune  
Nombre de préparations : 1  
Date de l'essai : 06/04/2004  
N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q


Etablissement demandeur ..... CETE Apave Nord-Ouest  
Affaire concernée ..... H.L.I. de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement ..... Site de Guerande - Avenue de la Bouescière - 44350 Guerande  
Etablissement préleveur ..... Apave St Nazaire  
Nom du preleveur ..... Mr Gaudin  
Méthode de prélèvement ..... /  
Date du prélèvement ..... 15/03/2004  
Nature du matériau ..... dalle de sol  
Année d'application ..... /

**EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE**

Méthode d'examen :  
Observations et analyses réalisées en microscopie électronique à balayage en combinant les examens morphologiques et l'analyse par spectrométrie des rayons X en dispersion d'énergie

**Conclusion de l'examen : Absence de fibres d'amiante**  
Conservation de l'échantillon: 3 mois à compter de la date de ce courrier

Saint-Ouen, le 8 avril 2004  
**Le Responsable de l'Unité d'Exploitation Analyses**  
**J-M MONTAGNON**

 ACCREDITATION  
N° 1028  
PORTÉE  
COMMANDE  
SUR DEMANDE  
ESSAIS

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation 3.1.505.1.080/01

AUXERRE Tél. 03 84 72 17 03 - BLOIS Tél. 02 54 90 54 54 - BOURGES Tél. 02 48 59 94 30 - CERGY PONTOISE Tél. 01 30 75 37 37 - CHARLEVILLÉ-MÉZIÈRES Tél. 03 24 33 29 50 - CHARTRES Tél. 02 37 84 12 20  
CHATELAIN Tél. 02 54 34 12 40 - CRÉTEIL Tél. 01 45 12 21 00 - ÉVRY Tél. 01 60 91 86 86 - FORT DE FRANCE Tél. 0594 71 77 54 - ISSY-LES-MOULINEAUX Tél. 01 40 54 56 00 - MARNE-VALETTES Tél. 01 40 37 55 37  
ORLÉANS Tél. 02 38 22 64 64 - POINTE-A-PÊRE Tél. 0590 26 67 05 - REIMS Tél. 03 24 84 28 00 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Tél. 01 30 14 14 30 - TAVERNY Tél. 01 39 32 76 30 - TROYES Tél. 02 25 83 21 31

Conformément à ses statuts et règlement intérieur à disposition sur demande.  
L'APAVE parisienne ne peut intervenir que pour ses Membres à jour de la "cotisation annuelle de base" leur permettant de faire appel à tous ses Services

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Laboratoire d'Analyses Environnementales et d'Essais Energétiques - Unité de ROUEN  
2, rue des Mouettes - B.P. 98 - 76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex  
Tél. 02 35 52 60 60 - Télécopieur : 02 35 52 61 61

CONFIDENTIEL



## RAPPORT D'ESSAI N° 04/2300/1874

## IDENTIFICATION DE L'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

## ETABLISSEMENT

N° de prestation : 04198907-01  
Raison Sociale du demandeur : CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire  
Etablissement concerné : HLI de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement : Site de Guérande - Avenue de la Bouexière - 44350 GUERANDE

## ECHANTILLON

Organisme préleveur, adresse : CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire  
Repère du prélèvement : P2  
Date du prélèvement : 15/03/2004  
Localisation du prélèvement : Rés. Fleur de sel - Unités 1 à 8 - Sanitaire près salon mortuaire (RdC : niv. 0)  
Description du matériau en place : Plaque faux plafond

## ESSAI

Numéro d'échantillon : 04/2300/1874  
Nature du matériau : Faux plafond  
Examen initial en laboratoire : Matériau friable beige et peinture blanche  
Nombre de préparations : 2  
Référence de l'essai : Examen au MOLP, norme MDHS N° 77 de juin 1994  
Principe : Caractéristiques optiques et morphologiques spécifiques des fibres

## CONCLUSION

CONCLUSION DE L'ESSAI: Absence d'amiante

MONT-SAINT-AIGNAN, le 26 mars 2004

Christelle Vallée

Ce rapport contient 1 page et 0 annexe.  
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais.  
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Sauf demande particulière du donneur d'ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant 5 ans à compter de la date d'édition du rapport, puis éliminés.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence technique du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

20 0007 402 03 00

Siège Social : 51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 781 936 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

**parisienne**  
Association loi 1901, fondée en 1974  
13 à 17, rue Solvère, 75854 PARIS CEDEX 17 - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 58 88 - Internet www.apave.com  
N° Siret : 77505019 0005 - Code N.A.S. : 7438 - N° TVA intra-communautaire : FR 25 775 690 639  
08/04/2004 Laboratoires : 97 à 103, boulevard Victor-Hugo, 93400 SAINT-OUEN - Tél. 01 40 54 58 00 - Fax 01 40 54 59 50

Service : Laboratoire  
Ligne directe : 01-40-54-58-19 H L I de la Presqu'île  
Correspondant : JM MONTAGNON  
N/Réf : JMM/MCL  
V/Réf :  
V/Lettre du :

**Rapport d'essai N° 1040237-R01-Rév0**  
Date de réception : 01/04/2004  
Désignation : échantillon P3 (04/2300/1875) : enduit sous plafond - Résidence Fleur de Sel, Unité 10 (Kerbinion) - Couloir RdC (près petit salon)  
Examen visuel : matériau non fibreux suivant l'arrêt du 06 mars 2003  
Description macroscopique : matériau non friable blanc de type enduit  
Nombre de préparations : 1  
Date de l'essai : 06/04/2004  
N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q


Etablissement demandeur..... CETE Apave Nord-Ouest  
Affaire concernée..... H L I de la Presqu'île  
Adresse du prélèvement..... Site de Guerande - Avenue de la Bouescière - 44350 Guerande  
Etablissement préleveur..... Apave St Nazaire  
Nom du préleveur..... Mr Gaudin  
Méthode de prélèvement..... /  
Date du prélèvement..... 15/03/2004  
Nature du matériau..... enduit sous plafond  
Année d'application..... /

**EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE**

Méthode d'examen :  
Observations et analyses réalisées en microscopie électronique à balayage en combinant les examens morphologiques et l'analyse par spectrométrie des rayons X en dispersion d'énergie

**Conclusion de l'examen : Absence de fibres d'amiante**  
Conservation de l'échantillon: 3 mois à compter de la date de ce courrier

Saint-Ouen, le 8 avril 2004  
*Le Responsable de l'Unité d'Exploitation Analyses*  
**J-M MONTAGNON**

 ACCREDITATION  
N° 1018  
PORTES  
COMMANDE  
EN GRANDE  
ESSAIS

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation 3.1.505.1.080/01.

AUBERRE Tél. 03 86 72 17 09 - BLOIS Tél. 02 54 90 56 56 - BOURGES Tél. 02 48 50 94 20 - CERGY PONTOISE Tél. 01 39 75 37 37 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Tél. 03 24 33 29 50 - CHARTRES Tél. 02 37 84 12 30  
CHATELAIN Tél. 02 54 34 12 40 - CRETEIL Tél. 01 45 17 31 00 - EVRY Tél. 01 60 91 84 86 - FORT DE FRANCE Tél. 0596 7177 54 - ISSY LES MOULINEAUX Tél. 01 40 54 56 00 - MARNE-LA-VALLÉE Tél. 01 60 37 55 37  
ORLÈANS Tél. 02 38 72 64 64 - POINTE-A-PITRE Tél. 0590 26 87 05 - REIMS Tél. 03 26 84 38 00 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Tél. 01 30 14 14 30 - TAVERNY Tél. 01 29 32 74 50 - TROYES Tél. 03 25 83 21 31  
Conformément à ses statuts et règlement intérieur à disposition sur demande.  
TAPAVE parisienne ne peut intervenir que pour ses Membres à jour de la "cotisation annuelle de base" leur permettant de faire appel à tous ses Services

Commentaire :



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



## Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5358      Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BULOURDE Claude**

Est certifié(e) selon le référentiel ICert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention    Amiante Avec Mention\*\*  
Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

Amiante sans mention    Amiante Sans Mention\*  
Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 02/09/2019.

[illegible]

Certification de personnes  
Diagnostic  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE 04/08 11 rev13

Page :  
121/125

## Repérage amiante avant travaux



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat RC n° 10800807204 1/2



AXA France IARD  
DIRECTION ENTREPRISES  
Production R.C. - Grands Comptes  
Télécopie 01.57.65.07.90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de Apave Infrastructure Construction France

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800207204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L. 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 400 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 400  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2



Contrat RC n° 10800807204 2/2

## TABLEAU DES GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties				Limites de garantie
Responsabilité Professionnelle	Civile	Exploitation/	Après Livraison/	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus				5 000 000 € par année d'assurance
<u>Sans pouvoir excéder pour :</u>				
a) les dommages immatériels non consécutifs				5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement				2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada sous limites :				5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA/CANADA				1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb*				2 500 000 € par année d'assurance

\* Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précitées ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 12/12/2022  
Par délégation

POUR L'ASSUREUR :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 077 460 E.C.S. Nanterre  
Entrepreneur régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 077 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets



### Les différentes sortes de déchets d'amiante


Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.**

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

## Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606  
Numéro de rapport : 21373606-2

### A CHAQUE DECHET SA FILIERE

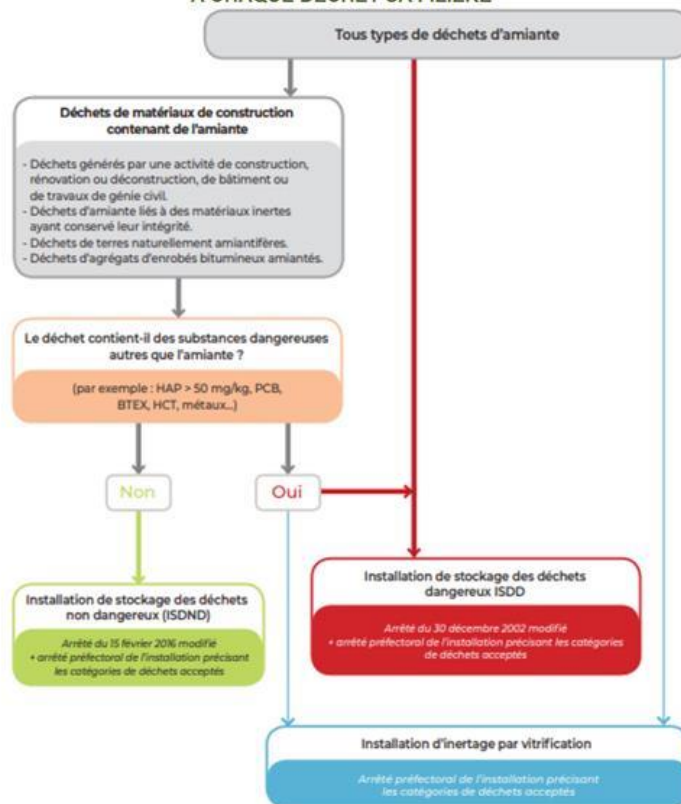

Document INRS

#### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

#### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>

Page :  
125/125

Repérage amiante avant travaux

## Commentaire :

## ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

**« Évaluation périodique »**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- A)** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B)** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**« Action corrective de premier niveau »**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- A)** Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B)** Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C)** Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

**« Action corrective de second niveau »**

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- A)** Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B)** Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C)** Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**BOUCHET Olivier**  
sous le numéro **20-1154**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> sans mention	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> avec mention	Prise d'effet : 18/12/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE</b> individuel	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gaz</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CREP</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <b>Métropole</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	<i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i>		
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014



## ANNEXE : Attestation d'assurance

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE**  
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156  
68313 ILLZACH CEDEX  
Tél : 03 89 61 64 64  
Fax : 08 20 20 26 32  
Portefeuille : 0201050284

APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE FR

### Vos références :

Contrat n° 10800807204  
Client n° 0416806720

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE**  
**Immeuble Canopy**  
**6 rue du Général Audran**  
**92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	<b>5 000 000 € par année d'assurance</b>
a) les dommages immatériels non consécutifs	<b>5 000 000 € par année d'assurance</b>
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	<b>2 500 000 € par année d'assurance</b>
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	<b>5 000 000 € par année d'assurance</b>
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	<b>1 000 000 € par année d'assurance</b>
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	<b>2 500 000 € par année d'assurance *</b>

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

**Fin du rapport**
