

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	66754-138578 A
Propriétaire	Hôpital de Guérande
Donneur d'ordre	Hôpital de Guérande
Adresse de l'immeuble	28 Avenue Pierre de la Bouexière
	44350 GUERANDE
Type de bien	Bâtiment E
Date de la commande	29/03/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	17/07/2023
Date d'émission du rapport de repérage	28/08/2023
Référence du programme de travaux / démolition	Pas de programme travaux fourni

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO  
Tél : 33 (0)2 14 74 64 40  
centreouest@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 0098

Opérateur de repérage :

**BOUCHET Olivier**  
Apave Diagnostics  
Le 28/08/2023

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.*

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

**Commentaires :**

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux de démolition.

Par conséquent, il faut entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels.

Le présent pré-rapport énumère dans une liste exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever l'ensemble de ces réserves afin de rendre un rapport définitif.

La gaine technique de l'ascenseur et la cabine d'ascenseur devront faire l'objet d'un diagnostic amiante avant démolition : la présence d'un technicien spécialisé est donc nécessaire (mise hors-tension de l'ouvrage, accès à la gaine...etc.).

En l'absence de moyens d'accès sécurisés et d'un professionnel sur place pour garantir l'étanchéité, aucun sondage et prélèvement n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, relevé d'étanchéité, conduits, accessoires de toiture...). De même, les planchers au sol en extérieur (sous faux-plancher et sous lit de cailloux) devront faire l'objet d'investigations (sondages destructifs).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Le repérage sur le croquis n°2 relatif au prélèvement P026 positif (conduit enterré en amiante ciment et visible dans un piège à eau) est incomplet : pas de possibilité de destruction dans le sol afin de connaître son cheminement.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Dégagement 2	Sous-sol	Conduit de fluide enterré	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P026)	Z026

- Liste des locaux non visités concernées par la démolition :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Ascenseur/gaine technique	Sans objet	Pas d'accompagnement technique	Mission spécifique sur demande du client
Toiture	Extérieur	Prévoir un moyen d'accès et un accompagnement (étancheur pour rebouchage après prélèvements)	Inaccessibles sans sondages destructifs
Sol	Extérieur	Prévoir un étancheur pour rebouchage après sondage	Inaccessibles sans sondages destructifs

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

➤ Liste des éléments non inspectés :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Cafétaria	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Dégagement/Accueil	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Circulation 1	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Eléments de sécurité (portes coupe-feu...etc.)	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de sécurité toujours en service (impossibilité d'effectuer des sondages destructifs)	A réaliser après libération des locaux
		Sol/mur	Joint de dilatation	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Circulation 2	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
		Sol/mur	Joint de dilatation	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Eléments de sécurité (portes coupe-feu...etc.)	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de sécurité toujours en service (impossibilité d'effectuer des sondages destructifs)	A réaliser après libération des locaux
Matériel	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Atelier intellectuel/physique	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Assistante social 1	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Assistante social 2	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Local 1	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Stockage au sol empêchant l'accès à la totalité du plénum	Débarrasser la réserve

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Local 2	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Stockage au sol empêchant l'accès à la totalité du plénum	Débarrasser la réserve
Bureau	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Façades	Extérieur	Murs	Joint de dilatation	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
		Ensemble des bâtis des ouvertures alu/PVC	Matériaux d'étanchéité	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
		Bardage en bois	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
Toiture	Extérieur	Toiture terrasse	Matériaux d'étanchéité et accessoires de toiture	Eléments de construction inaccessibles sans sondages destructifs	Prévoir un moyen d'accès et un accompagnement (étanchéité pour rebouchage après prélèvements)
Sol	Extérieur	Plancher	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de construction inaccessibles sans dépose du faux-plancher	A réaliser après libération des locaux

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :  
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>7</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	7
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	7
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE : .....	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	7
<b>PERIMETRE DE LA DEMOLITION .....</b>	<b>7</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	8
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION .....	9
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	9
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>10</b>
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	13
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>60</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>66</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>83</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>84</b>

**1 Description de la mission****1.1 Objet de la mission :**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **66754-138578**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT E**

**1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :**

Propriétaire de l'immeuble : **NO**

Adresse du propriétaire :

Représenté par :

Donneur d'ordre : **NO**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur BOUCHET Olivier**

N° de certification de l'opérateur : **20-1154**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

**1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :**

Dénomination :

Adresse complète : **28 Avenue Pierre de la Bouexière  
- 44350 GUERANDE**

Bâtiment :

Escalier : **Sans objet**

Etage : **RDC sur sous-sol**

Porte : **Sans objet**

N° de lot :

Référence Cadastre : **Sans objet**

Date du permis de Construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Hôpital**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

**1.4 Identification du laboratoire d'analyse :**

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

**2 Périmètre de la démolition**

**Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :**

Bâtiment E



## 3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique)  
: Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
<b>8. Équipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.



#### 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**  
Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **17/07/2023**

#### 4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

#### 4.2 Analyse Documentaire :

Néant

#### 4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 5 Résultats détaillés du repérage

### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Véranda	RDC
Sas	RDC
Cafétaria	RDC
Aumônerie	RDC
Dégagement/Accueil	RDC
Sanitaires	RDC
Circulation 1	RDC
Circulation 2	RDC
Matériel	RDC
Atelier intellectuel/physique	RDC
Médecin 1	RDC
Médecin 2	RDC
Examen	RDC
Assistante social 1	RDC
Assistante social 2	RDC
Local 1	Sous-sol
Dégagement 1	Sous-sol
Dégagement 2	Sous-sol
Local 2	Sous-sol
Bureau	Sous-sol
Zone livraison	Sous-sol
Façades	Extérieur
Combles	Combles

### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Ascenseur/gaine technique	Sans objet	Mission spécifique sur demande du client
Toiture	Extérieur	Inaccessibles sans sondages destructifs
Sol	Extérieur	Inaccessibles sans sondages destructifs

➤ Liste des éléments non inspectés :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
Cafétaria	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Dégagement/Accueil	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Circulation 1	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Eléments de sécurité (portes coupe-feu...etc.)	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de sécurité toujours en service (impossibilité d'effectuer des sondages destructifs)	A réaliser après libération des locaux
		Sol/mur	Joint de dilatation	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
Circulation 2	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
		Sol/mur	Joint de dilatation	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Eléments de sécurité (portes coupe-feu...etc.)	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de sécurité toujours en service (impossibilité d'effectuer des sondages destructifs)	A réaliser après libération des locaux
Matériel	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Atelier intellectuel/physique	RDC	Coffrage	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Accès impossible sans destruction	Démontage après libération des locaux
		Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Assistante social 1	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Assistante social 2	RDC	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Local 1	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits	Stockage au sol empêchant l'accès à la totalité du plénum	Débarrasser la réserve

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen d'accès à prévoir
			potentiellement amiantés		
Local 2	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Stockage au sol empêchant l'accès à la totalité du plénum	Débarrasser la réserve
Bureau	Sous-sol	Plénum	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Faux-plafond recouvert de laine de verre	Démontage après libération des locaux
Façades	Extérieur	Murs	Joint de dilatation	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
		Ensemble des bâtis des ouvertures alu/PVC	Matériaux d'étanchéité	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
		Bardage en bois	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Inaccessible sans destruction	A réaliser après libération des locaux
Toiture	Extérieur	Toiture terrasse	Matériaux d'étanchéité et accessoires de toiture	Eléments de construction inaccessibles sans sondages destructifs	Prévoir un moyen d'accès et un accompagnement (étanchéité pour rebouchage après prélèvements)
Sol	Extérieur	Plancher	Matériaux et produits potentiellement amiantés	Eléments de construction inaccessibles sans dépose du faux-plancher	A réaliser après libération des locaux

## 5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Véranda</b>	RDC	Sol	Dalles préfabriquées sur plots	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Murs	Baies vitrées	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond	Baies vitrées	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Faux-plancher sur dalles préfabriquées	Matériaux et produits potentiellement amiantés			<b>Non</b>	
<b>Sas</b>	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse (P003)	Z003	<b>Non</b>	
		Sol	Béton/colle ancienne moquette	Résultat d'analyse (P001)	Z001	<b>Non</b>	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse (P002)	Z002	<b>Non</b>	
<b>Cafétaria</b>	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	<b>Non</b>	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	<b>Non</b>	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	<b>Non</b>	
<b>Aumônerie</b>	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		<b>Non</b>	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	<b>Non</b>	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
<b>Dégagement t/Accueil</b>	RDC	Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse (P006)	Z006	<b>Non</b>	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Poteau/poutre	Enduit ciment et plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Sanitaires	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Calicot/enduit	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Circulation 1	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Doublage	Colle plaque de plâtre	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutre	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Linteau dans plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Barre bétonnée dans plénum (jonction bâtiment)	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
Circulation 2	RDC	Doublage	Colle plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plénum	Isolation, pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Poutre dans plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
Matériel	RDC	Plénum	Isolation, pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
	RDC	Plénum	Isolation, pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z029	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Atelier intellectuel/ physique</b>		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z018	Non	
<b>Médecin 1</b>	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
<b>Médecin 2</b>	RDC	Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
<b>Examen</b>	RDC	Doublage	Isolation	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut dans plénum	Plaques de plâtre vissées	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Evier inox	Plaque noire isophonique	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
<b>Assistante social 1</b>	RDC	Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z018	Non	
<b>Assistante social 2</b>	RDC	Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Bois cloués - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Sol	PVC/Ragréage/béton	Résultat d'analyse	Z018	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Local 1</b>	Sous-sol	Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Plinthes PVC	Colle	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Sol	Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Poutre/poteau	Enduit ciment/plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Isolation sur plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
<b>Dégagement t 1</b>	Sous-sol	Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Isolation sur plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Murs	Enduit/béton	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Sol	Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	
<b>Dégagement t 2</b>	Sous-sol	Murs	Enduit/béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Sol	Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Conduit de fluide enterré	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Oui	Estimatif de la quantité impossible
<b>Local 2</b>	Sous-sol	Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Isolation sur plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plinthes PVC	Colle	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Sol	Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Poutre/poteau	Enduit ciment/plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
<b>Bureau</b>	Sous-sol	Plénum	Isolation, pare-vapeur	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Murs	Enduit/calicot	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Poutre/poteau	Enduit ciment/plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
<b>Zone livraison</b>	Sous-sol	Poutre/poteau	Enduit ciment/plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Murs	Enduit/béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Sol n°1	Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	

Rapport n° : 66754-138578 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit/béton - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Murs	Enduit/béton - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Sol n°2	Enrobé	Document consulté		Non	
Façades	Extérieur	Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		En soubassement du mur	Etanchéité	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Conduit d'eau pluviale	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Toiture	Extérieur	Toiture véranda	Panneaux vitrés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Toiture ardoise	Ardoises	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Combles	Combles	Sol	Isolation	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Rampant	Ardoises	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Rampants/Murs	Calicot/enduit	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
		Conduit	Calorifuge	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	

## Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux de démolition.

Par conséquent, il faut entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels.

Le présent pré-rapport énumère dans une liste exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever l'ensemble de ces réserves afin de rendre un rapport définitif.


La gaine technique de l'ascenseur et la cabine d'ascenseur devront faire l'objet d'un diagnostic amiante avant démolition : la présence d'un technicien spécialisé est donc nécessaire (mise hors-tension de l'ouvrage, accès à la gaine...etc.).


En l'absence de moyens d'accès sécurisés et d'un professionnel sur place pour garantir l'étanchéité, aucun sondage et prélèvement n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, relevé d'étanchéité, conduits, accessoires de toiture...). De même, les planchers au sol en extérieur (sous faux-plancher et sous lit de cailloux) devront faire l'objet d'investigations (sondages destructifs).


Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.


Le repérage sur le croquis n°2 relatif au prélèvement P026 positif (conduit enterré en amiante ciment et visible dans un piège à eau) est incomplet : pas de possibilité de destruction dans le sol afin de connaître son cheminement.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Plafond		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Fabrication en 2004		

ELEMENT : Conduit d'eau pluviale		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Conduit d'eau pluviale - Toutes zones côté bâtiment D
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> PVC
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
PVC		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement : 		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement	Partie de composant PVC
Résultat amiante : Absence d'amiante		
Commentaires		
PVC		

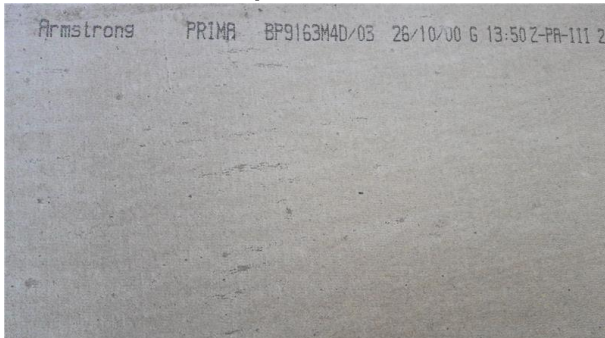ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement : 		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant RDC - Aumônerie - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement	Partie de composant PVC
Résultat amiante : Absence d'amiante		
Commentaires		
PVC		


ELEMENT : Plafond		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Aumônerie - Plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Armstrong fabrication en 2000		

PRELEVEMENT : P001			
<div>Emplacement :</div> <div></div>			
<div>Nom du client</div> <div>NO</div>	<div>Numéro de dossier</div> <div>66754-138578</div>	<div>Pièce ou local – Composant</div> <div>RDC - Sas - Sol - Toutes zones</div>	
<div>Nom de l'opérateur</div> <div>BOUCHET Olivier</div>	<div>Date de prélèvement</div> <div>17/07/2023</div>	<div>Partie de composant</div> <div>Béton/colle ancienne moquette</div>	
<div>Résultat amiante : Absence d'amiante</div>			
<div>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</div>			
<div>Objet :</div> <div>Béton+colle ancienne moquette</div> <div>Planche de croquis n° :</div>	<div></div>		
<div>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</div>			
<div>Référence Couche</div>	<div>Description visuelle</div>	<div>Epaisseur (cm)</div>	<div>Conclusion amiante</div>
<div>RAW PRODUCT</div>	<div>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces</div>	<div>0</div>	<div>Fibres d'amiante non détectées</div>



## PRELEVEMENT : P002

Emplacement :

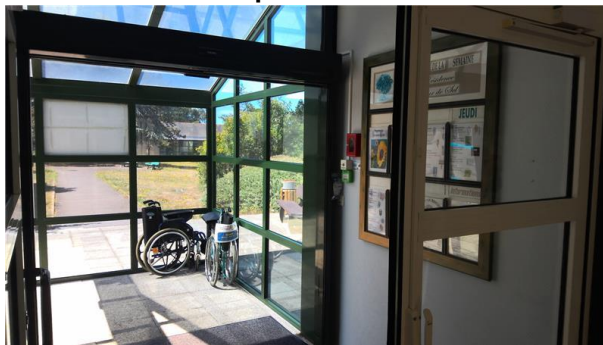

Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant RDC - Sas - Doublage - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 17/07/2023	Partie de composant Isolation

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :  
Isolation

Planche de croquis n° :




## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

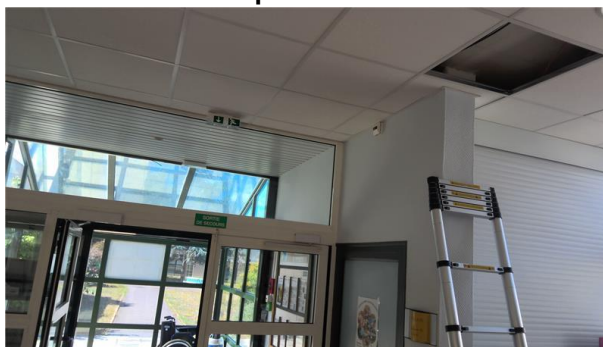

Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant RDC - Sas - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 17/07/2023	Partie de composant Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit/calicot / Peinture

Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau de type tresse de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P004

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement/Accueil - Plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Plaque de faux-plafond

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
<p align="center"><b>Emplacement :</b></p> 			
<p align="center"><b>Nom du client</b> NO</p>	<p align="center"><b>Numéro de dossier</b> 66754-138578</p>	<p align="center"><b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement/Accueil - Poteau/poutre - Toutes zones</p>	
<p align="center"><b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier</p>	<p align="center"><b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023</p>	<p align="center"><b>Partie de composant</b> Enduit ciment et plâtreux - Peinture</p>	
<p align="center"><b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante</p>			
<p align="center"><b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b></p>			
<p><b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture</p> <p><b>Planche de croquis n° :</b></p>			
<p align="center"><b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b></p>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement/Accueil - Sol - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 17/07/2023	Partie de composant PVC/Ragréage/béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

PVC/Ragréage/béton

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P007****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Cafétaria - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Bois cloués - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**

Bois cloués / Peinture

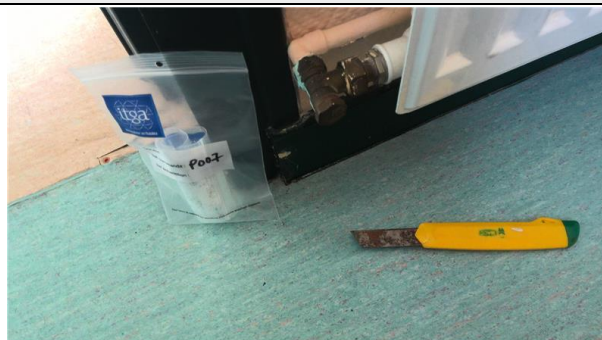**Planche de croquis n° :****DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P008

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sanitaires - Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Colle de faïence

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 04	Matériau de type tresse de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sanitaires - Plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Calicot/enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Calicot/enduit  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P010


## Emplacement :

**Nom du client**  
NO**Numéro de dossier**  
66754-138578**Pièce ou local – Composant**  
RDC - Circulation 1 - Doublage -  
Toutes zones**Nom de l'opérateur**  
BOUCHET Olivier**Date de prélèvement**  
17/07/2023**Partie de composant**  
Colle plaque de plâtre**Résultat amiante :** Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Colle plaque de plâtre

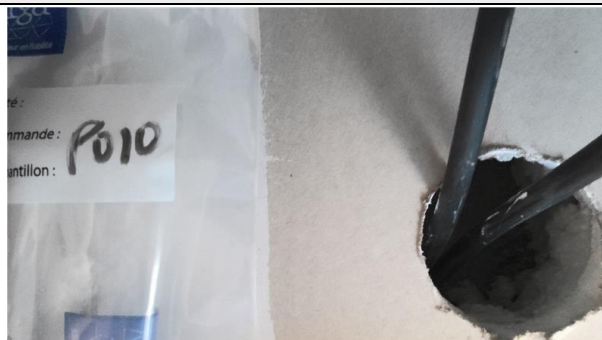**Planche de croquis n° :**


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces ; matériau de type polystyrène	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P011

## Emplacement :

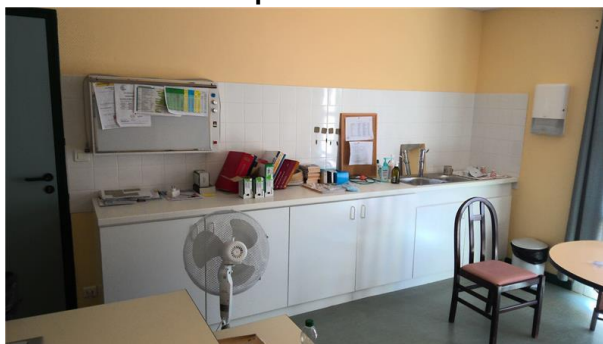

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Examen - Evier inox - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque noire isophonique

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Plaque noire isophonique

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (bitumineux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Murs - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit/calicot	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit/calicot  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P013

Emplacement :




<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Poutre - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



**Objet :**

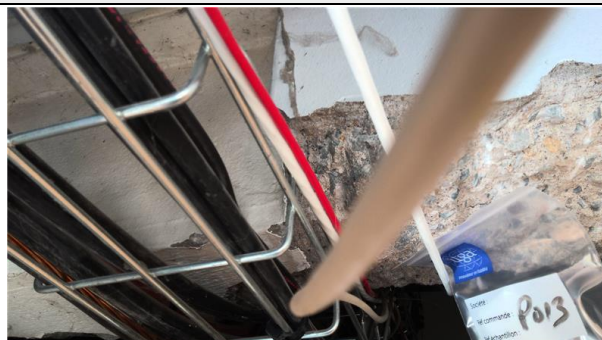

Enduit ciment / Peinture

**Planche de croquis n° :**

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Linteau dans plénum - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Barre bétonnée dans plénum (jonction bâtiment) - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P016

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 2 - Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Enduit/calicot

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 2 - Poutre dans plénum - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit ciment  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Matériel - Sol - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> PVC/Ragréage/béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**  
PVC/Ragréage/béton

**Planche de croquis n° :**




## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

## Emplacement :

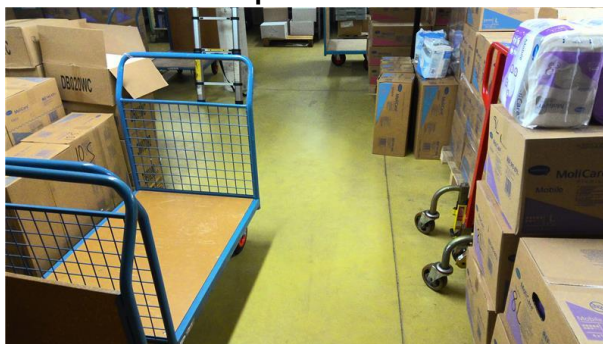

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Sol - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Béton/joint souple de dilatation - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



**Objet :**  
Béton / Peinture

**Planche de croquis n° :**



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Plinthes PVC - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle PVC  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P021

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit/calicot

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P022

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Poutre/poteau - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment/plâtreux - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit ciment/plâtreux / Peinture


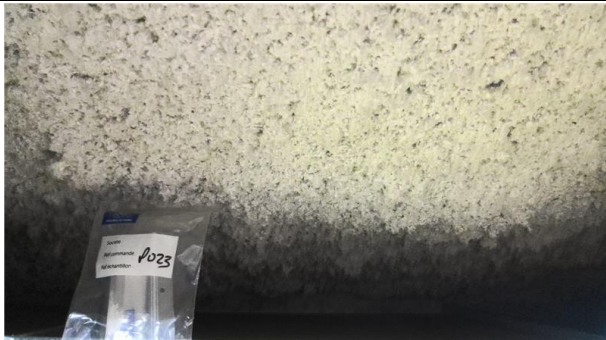
## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P023			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Isolation sur plancher haut - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Flocage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Flocage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P024

## Emplacement :

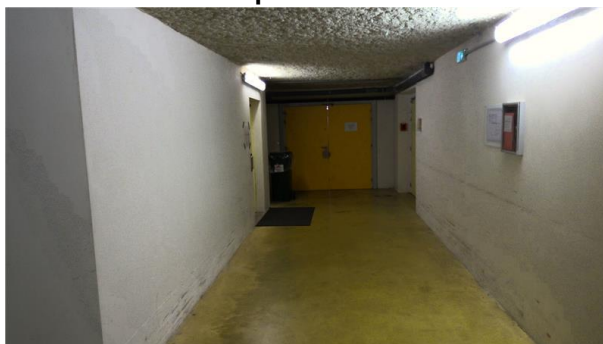

Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement 1 - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 17/07/2023	Partie de composant Enduit/béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit/béton

## Planche de croquis n° :




## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P025

## Emplacement :

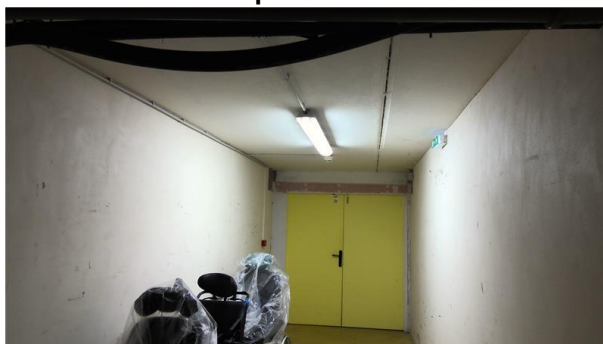

**Nom du client**  
NO**Numéro de dossier**  
66754-138578**Pièce ou local – Composant**  
Sous-sol - Dégagement 2 - Plancher  
haut - Toutes zones**Nom de l'opérateur**  
BOUCHET Olivier**Date de prélèvement**  
17/07/2023**Partie de composant**  
Béton - Peinture**Résultat amiante :** Absence d'amiante



## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**  
Béton / Peinture**Planche de croquis n° :**

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Dégagement 2 - Conduit de fluide enterré - Dans piège à eau	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Amiante ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Ciment  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P027			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Bureau - Sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Carrelage, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc) (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P028

## Emplacement :

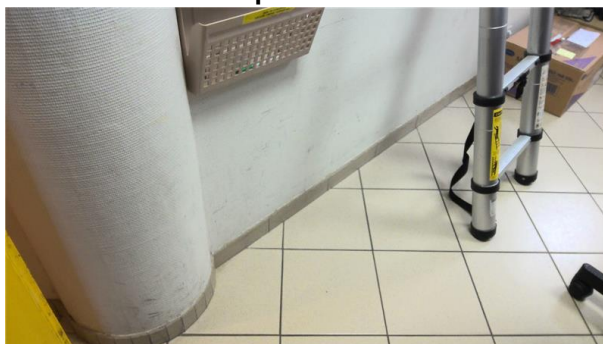

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Bureau - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de plinthes

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Colle de plinthes

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (friable) (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P029

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Bureau - Plénum - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Isolation, pare-vapeur

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Isolation, pare-vapeur

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau de type colle (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P030

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Zone livraison - Murs - Toutes zones en ceinturage
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit/béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :



Enduit/béton

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Zone livraison - Murs - Toutes zones dans l'angle	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit/béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit/béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P032

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Mur - Toutes zones côté bâtiment G
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit ciment / Peinture

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P033

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Mur - Toutes zones côté façade livraison
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit ciment / Peinture

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P034

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Mur - Toutes zones côté bâtiment D
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit ciment / Peinture

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P035

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66754-138578	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs - Toutes zones en soubassement
Nom de l'opérateur BOUCHET Olivier	Date de prélèvement 17/07/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Enduit ciment / Peinture



## Planche de croquis n° :







## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P036			
<p align="center"><b>Emplacement :</b></p> 			
<p align="center"><b>Nom du client</b> NO</p>	<p align="center"><b>Numéro de dossier</b> 66754-138578</p>	<p align="center"><b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - En soubassement du mur - Toutes zones</p>	
<p align="center"><b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier</p>	<p align="center"><b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023</p>	<p align="center"><b>Partie de composant</b> Etanchéité</p>	
<p align="center"><b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante</p>			
<p align="center"><b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b></p>			
<p><b>Objet :</b> Etanchéité</p> <p><b>Planche de croquis n° :</b></p>			
<p align="center"><b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b></p>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau (bitumineux) ; matériau de type aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
<p align="center"><b>Emplacement :</b></p> 			
<p align="center"><b>Nom du client</b> NO</p>	<p align="center"><b>Numéro de dossier</b> 66754-138578</p>	<p align="center"><b>Pièce ou local – Composant</b> Combles - Combles - Sol - Toutes zones</p>	
<p align="center"><b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier</p>	<p align="center"><b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023</p>	<p align="center"><b>Partie de composant</b> Isolation</p>	
<p align="center"><b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante</p>			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<p><b>Objet :</b> Isolation</p> <p><b>Planche de croquis n° :</b></p>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Combles - Combles - Conduit - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Calorifuge	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Calorifuge  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Combles - Combles - Rampant - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Ardoises	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Ardoises  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ardoise (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P040

Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66754-138578	<b>Pièce ou local – Composant</b> Combles - Combles - Rampants/Murs - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> BOUCHET Olivier	<b>Date de prélèvement</b> 17/07/2023	<b>Partie de composant</b> Calicot/enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Calicot/enduit

**Planche de croquis n° :**


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**ANNEXE : Plans / Croquis**



Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/5	N° dossier : 66754-138578	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 17/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment E	Lieu / Zone : Plan de masse
Commentaire : Diagnostic amiante avant-démolition du bâtiment E			


 Bâtiment E concerné par le présent diagnostic

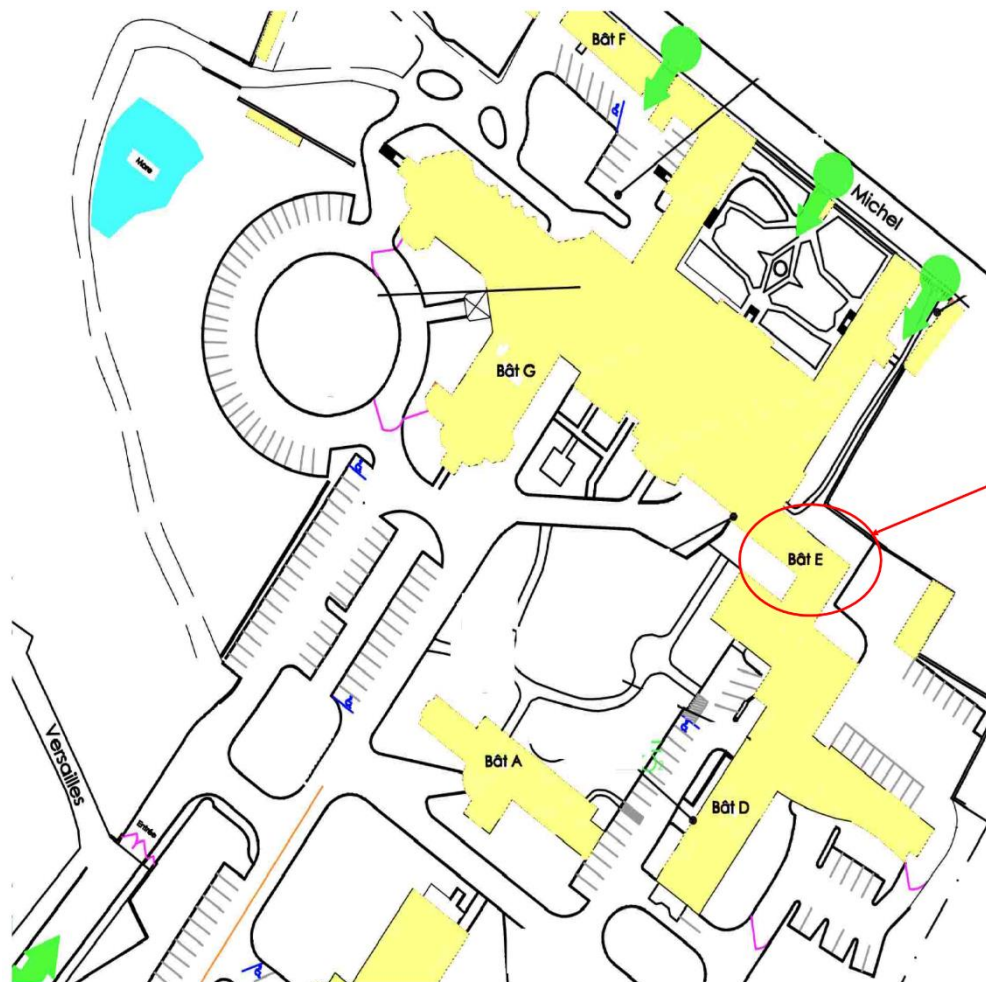


Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/5	N° dossier : 66754-138578	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 17/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment E	
Commentaire : Prélèvements effectués et repérage d'un conduit amianté		Lieu / Zone : Sous-sol	



Conduit enterré en amiante-ciment

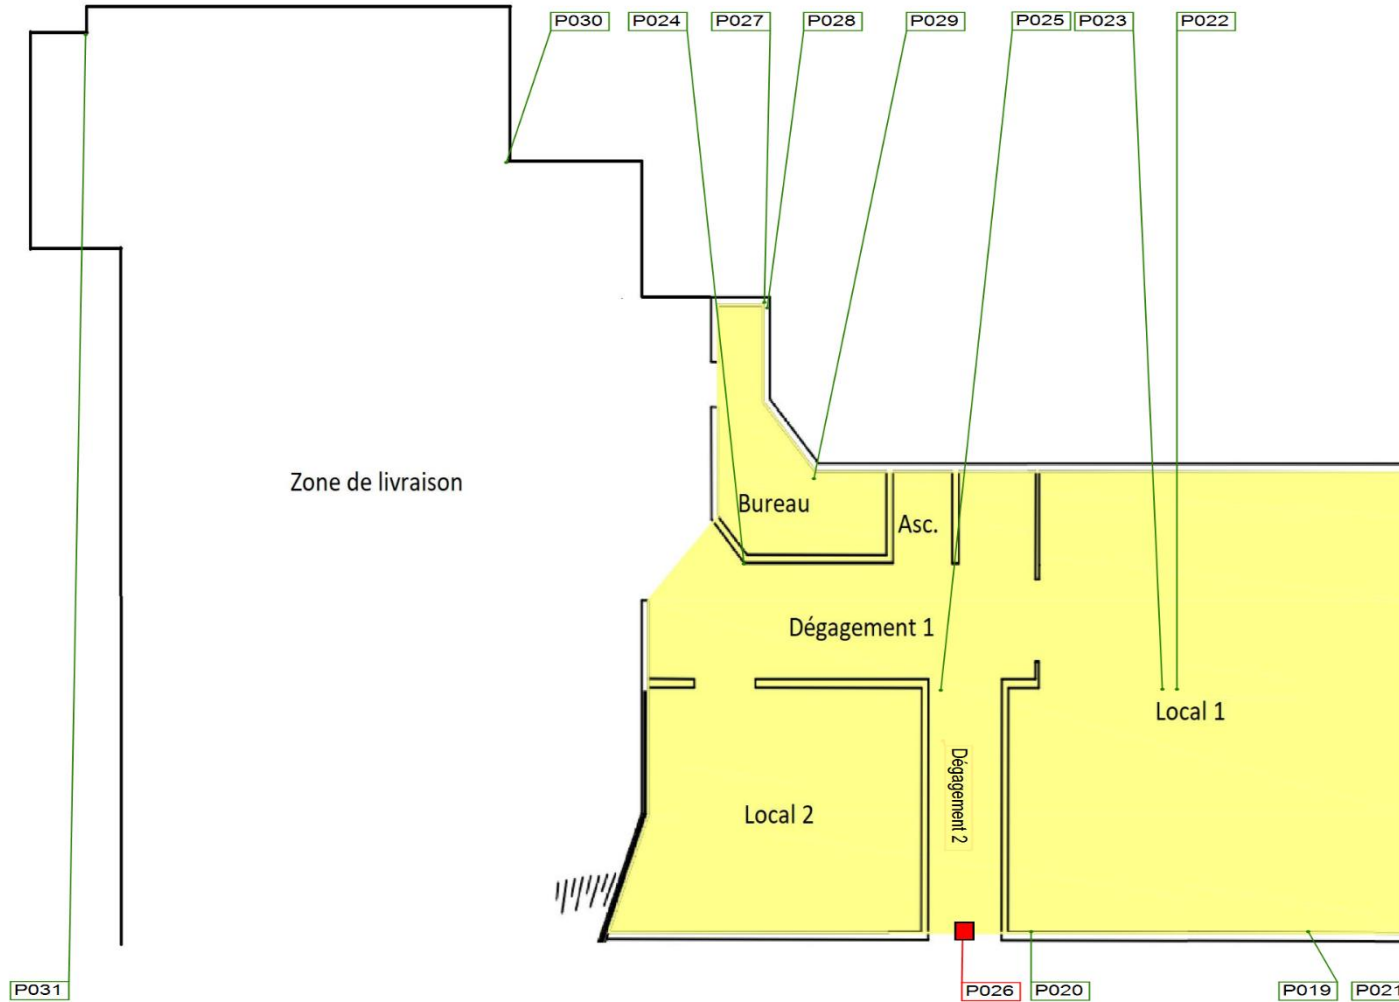


Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/5	N° dossier : 66754-138578	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 17/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire : Ensemble des prélèvements effectués		Localisation : Bâtiment E	Lieu / Zone : RDC

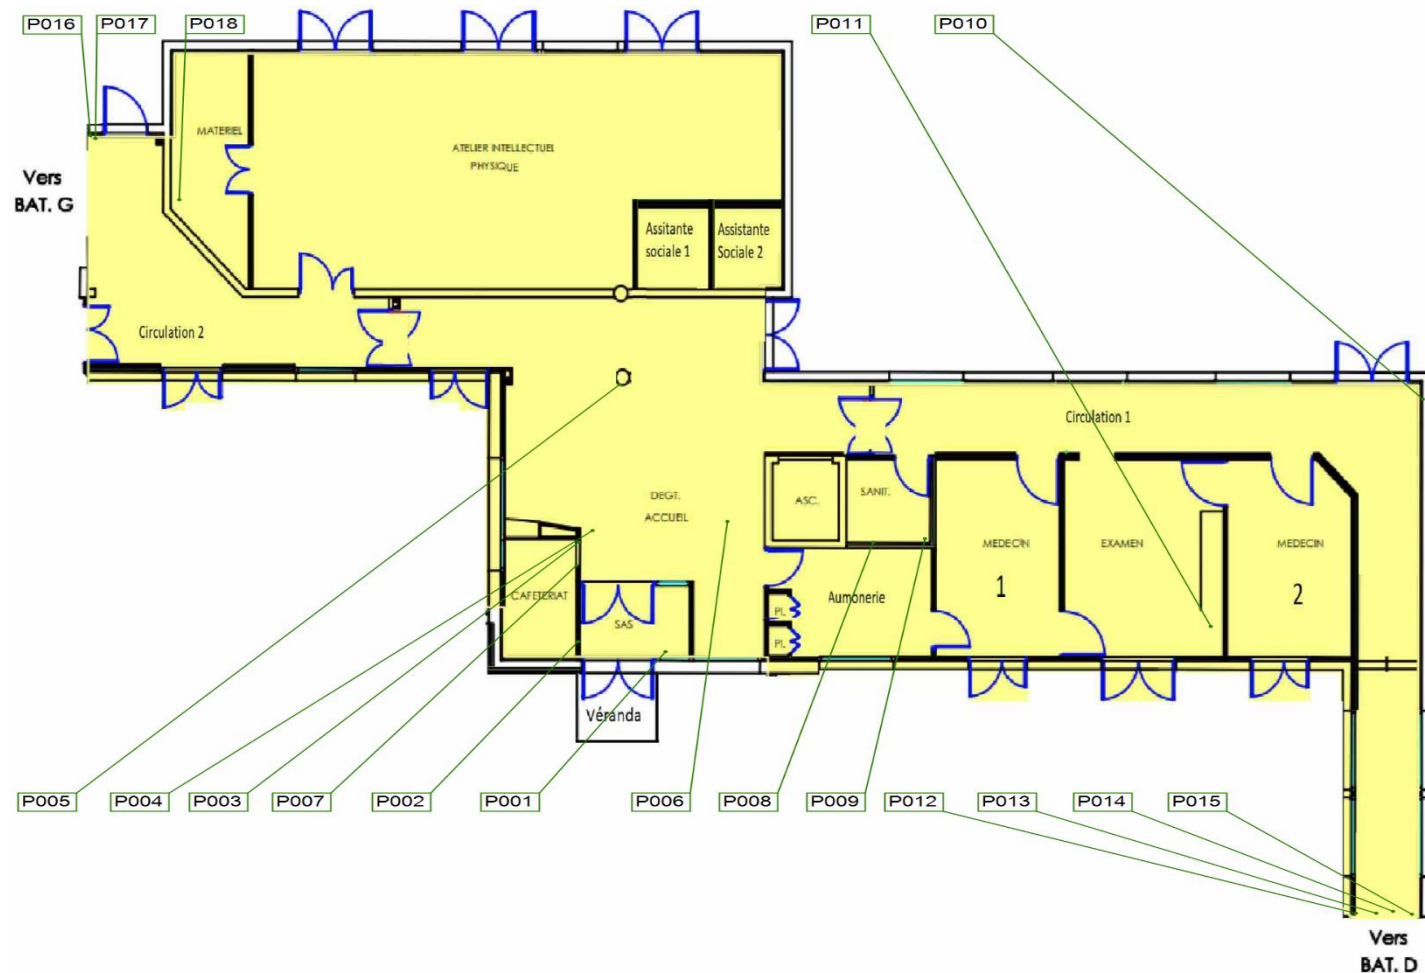




## Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante


Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/5	N° dossier : 66754-138578	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 17/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment E	Lieu / Zone : R+1

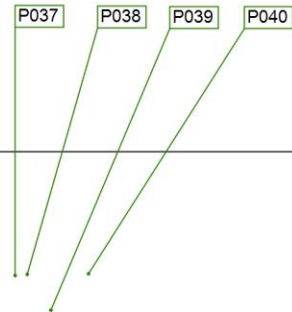

Combles non-aménagés

Titre : Croquis N°5	N° planche : 5/5	N° dossier : 66754-138578	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : BOUCHET Olivier	Date : 17/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire : Ensemble des prélèvements effectués		Localisation : Bâtiment E	Lieu / Zone : Extérieur

 Toitures et sols non visités

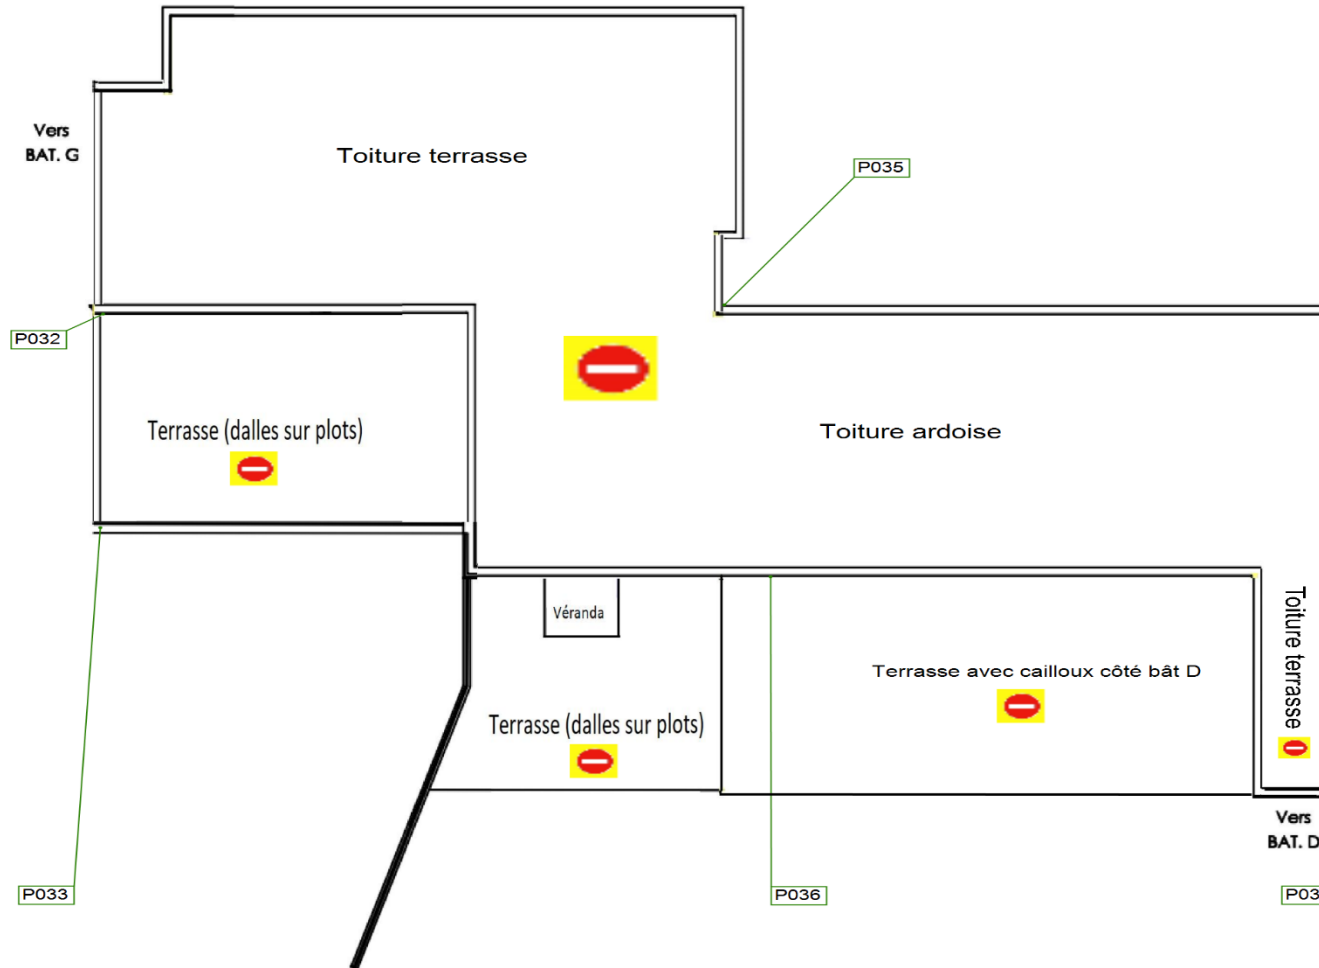

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720230701112811



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Olivier BOUCHET  
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-102050-01

Numéro de dossier : 23N027745

Référence de dossier :

66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N027745-001 - Référence P001-RDC - Sas - Toutes zones - Sol - Béton/colle ancienne moquette, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-002 - Référence P002-RDC - Sas - Toutes zones - Doublage - Isolation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-003 - Référence P003-RDC - Sas - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-004 - Référence P004-RDC - Dégageement/Accueil - Toutes zones - Plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-005 - Référence P005-RDC - Dégageement/Accueil - Toutes zones - Poteau/poutre - Enduit ciment et plâtreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-006 - Référence P006-RDC - Dégageement/Accueil - Toutes zones - Sol - PVC/Ragréage/béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-007 - Référence P007-RDC - Cafeteria - Toutes zones - Plinthes - Bois cloués - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027745-008 - Référence P008-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-009 - Référence P009-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plafond - Calicot/enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-010 - Référence P010-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Doublage - Colle plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-011 - Référence P011-RDC - Examen - Toutes zones - Evier inox - Plaque noire isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-012 - Référence P012-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-013 - Référence P013-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Poutre - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-014 - Référence P014-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Linteau dans plénum - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-015 - Référence P015-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Barre bétonnée dans plénum (jonction bâtiment) - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-016 - Référence P016-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-017 - Référence P017-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Poutre dans plénum - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-018 - Référence P018-RDC - Matériel - Toutes zones - Sol - PVC/Ragréage/béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
  
- N° 23N027745-019 - Référence P019-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Sol - Béton/joint souple de dilatation - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027745-020 - Référence *P020-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-021 - Référence *P021-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-022 - Référence *P022-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Poutre/poteau - Enduit ciment/plâtreux - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-023 - Référence *P023-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Isolation sur plancher haut - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-024 - Référence *P024-Sous-sol - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-025 - Référence *P025-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Plancher haut - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-026 - Référence *P026-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Conduit de fluide enterré - Ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-027 - Référence *P027-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-028 - Référence *P028-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-029 - Référence *P029-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plénum - Isolation, pare-vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-030 - Référence *P030-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones en ceinturage - Murs - Enduit/béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-031 - Référence *P031-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones dans l'angle - Murs - Enduit/béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027745-032 - Référence *P032-Extérieur - Façades - Toutes zones côté bâtiment G - Mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-033 - Référence *P033-Extérieur - Façades - Toutes zones côté façade livraison - Mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-034 - Référence *P034-Extérieur - Façades - Toutes zones côté bâtiment D - Mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-035 - Référence *P035-Extérieur - Façades - Toutes zones en soubassement - Murs - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-036 - Référence *P036-Extérieur - Façades - Toutes zones - En soubassement du mur - Etanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-037 - Référence *P037-Combles - Combles - Toutes zones - Sol - Isolation*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-038 - Référence *P038-Combles - Combles - Toutes zones - Conduit - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-039 - Référence *P039-Combles - Combles - Toutes zones - Rampant - Ardoises*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-040 - Référence *P040-Combles - Combles - Toutes zones - Rampants/Murs - Calicot/enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page1/11  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
Date d'analyse : 01/08/2023  
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N027745-001 - P001-RDC - Sas - Toutes zones - Sol - Béton/colle ancienne moquette	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N027745-002 - P002-RDC - Sas - Toutes zones - Doublage - Isolation	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N027745-003 - P003-RDC - Sas - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (blanc)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N027745-004 - P004-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
42 rue des Tisserands  
68124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-8977  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page2/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N027745-005 - P005-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Poteau/poutre - Enduit ciment et plâtreux - Peinture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N027745-006 - P006-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Sol - PVC/Ragréage/béton	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N027745-007 - P007-RDC - Cafétaria - Toutes zones - Plinthes - Bois cloués - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N027745-008 - P008-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page3/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (blanc)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	23N027745-009 - P009-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plafond - Calicot/enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	23N027745-010 - P010-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Doublage - Colle plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimentueux) (gris) en traces ; matériau de type polystyrène	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	23N027745-011 - P011-RDC - Examen - Toutes zones - Evier inox - Plaque noire isophonique	Matériau (bitumineux)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page4/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	23N027745-012 - P012-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	23N027745-013 - P013-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Poutre - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	23N027745-014 - P014-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Linteau dans plénum - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	23N027745-015 - P015-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Barre bétonnée dans plénum (jonction bâtiment) - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	23N027745-016 - P016-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page5/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	23N027745-017 - P017-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Poutre dans plénum - Enduit ciment	Matériau dur (gris)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	23N027745-018 - P018-RDC - Matériel - Toutes zones - Sol - PVC/Ragréage/béton	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	23N027745-019 - P019-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Sol - Béton/joint souple de dilatation - Peinture	Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page6/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	23N027745-020 - P020-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	23N027745-021 - P021-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
022	23N027745-022 - P022-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Poutre/poteau - Enduit ciment/plâtreux - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	23N027745-023 - P023-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Isolation sur plancher haut - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	23N027745-024 - P024-Sous-sol - Dégageement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/béton	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page 7/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client: 66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (gris)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	23N027745-025 - P025-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Plancher haut - Béton - Peinture	Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	23N027745-026 - P026-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Conduit de fluide enterré - Ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP * / YD8K	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
027	23N027745-027 - P027-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc) (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	23N027745-028 - P028-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (friable) (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page 8/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client: 66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	23N027745-029 - P029-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plénum - Isolation, pare-vapeur	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	23N027745-030 - P030-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones en ceinturage - Murs - Enduit/béton - Peinture	Matériau semi-dur (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	23N027745-031 - P031-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones dans l'angle - Murs - Enduit/béton - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	23N027745-032 - P032-Extérieur - Façades - Toutes zones côté bâtiment G - Mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	23N027745-033 - P033-Extérieur - Façades - Toutes zones côté façade livraison - Mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page9/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23N027745-034 - P034-Extérieur - Façades - Toutes zones côté bâtiment D - Mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	23N027745-035 - P035-Extérieur - Façades - Toutes zones en soubassement - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	23N027745-036 - P036-Extérieur - Façades - Toutes zones - En soubassement du mur - Etanchéité	Matériau (bitumineux) ; matériau de type aluminium	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	23N027745-037 - P037-Combles - Combles - Toutes zones - Sol - Isolation	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
038	23N027745-038 - P038-Combles - Combles - Toutes zones - Conduit - Calorifuge	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	23N027745-039 - P039-Combles - Combles - Toutes zones - Rampant - Ardoises	Matériau dur de type ardoise (gris) (foncé)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page 10/11  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 01/08/2023  
 Référence dossier Client: 66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	23N027745-040 - P040-Combles - Combles - Toutes zones - Rampants/Murs - Calicot/enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-8977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





GEA (GRAND EST ANALYSES)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page 11/11  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745  
Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
Date d'analyse : 01/08/2023  
Référence dossier Client: 66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Marie Christelle Pierreveldin  
Cheffe d'Equipe Technicienne META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
42 rue des Tisserands  
68124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-8977  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**BOUCHET Olivier**  
sous le numéro 20-1154

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> sans mention	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> avec mention	Prise d'effet : 18/12/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE</b> individuel	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gaz</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CREP</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <b>Métropole</b>	Prise d'effet : 14/10/2020	Validité : 13/10/2027
	Zone d'intervention : France métropolitaine		
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Prise d'effet : 19/11/2020	Validité : 18/11/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

## ANNEXE : Attestation d'assurance

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE**  
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156  
68313 ILLZACH CEDEX  
Tél : 03 89 61 64 64  
Fax : 08 20 20 26 32  
Portefeuille : 0201050284

APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE FR

### Vos références :

Contrat n° 10800807204  
Client n° 0416806720

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE**  
**Immeuble Canopy**  
**6 rue du Général Audran**  
**92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2





Contrat : 10800807204

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	<b>5 000 000 € par année d'assurance</b>
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

**Fin du rapport**
