

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	66749-138010 A
Propriétaire	NO
Donneur d'ordre	NO
Adresse de l'immeuble	44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière
Type de bien	Hôpital
Date de la commande	29/03/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	10/07/2023
Date d'émission du rapport de repérage	10/07/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO
Tél : 33 (0)2 14 74 64 40
centreouest@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00098

Opérateur de repérage :
GOUBAULT Antonin
Apave Diagnostics
Le 10/07/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides au démarrage des travaux ou de la démolition.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Une stratégie pour être mis en place afin d'affiner les résultats d'enduits muraux et situés dans les pléniums lors de la libération des locaux et au démarrage des travaux.

Le plâtre étant un matériau hétéroclite les résultats peuvent varier selon les points de prélèvements, suite aux prélèvements complémentaire le nombre de résultats positifs importants oblige à étendre la cartographie sur l'ensemble de l'étage concernant l'amiante pour le plâtre peinture dans les pléniums.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Dégagement	RDC	Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z015
Escaliers	RDC	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Bureau médecin du travail	RDC	Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z015
Réserve	RDC	Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P015)	Z015
		Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P058)	Z058
Palier	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	Z061
WC n°2	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z062
Dégagement n°1	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Chambre n°1	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Salle d'eau n°1	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z061
Cuisine n°1	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z061
Salle de réunion	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Tisanerie	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Photocopie	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Dégagement n°2	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z065
Chambre n°2	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Chambre n°3	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031
Cuisine n°2	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z065
Salle d'eau n°2	R+1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z065
Façade Ouest	Extérieur	Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z023
Local chaudière	RDC	Plafond	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021
		Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P023)	Z023

➤ Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
---	-------	--	--

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

3/121

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Combles	R+2	Pas de trappes d'accès.	Pas de trappe d'accès.

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	6
PROGRAMME DE TRAVAUX	6
PROGRAMME DE REPERAGE	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	9
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	9
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	10
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	10
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	10
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	11
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	21
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	22
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	88
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	93
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	119
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	120

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **66749-138010**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT F (Clic)**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **NO**

Adresse du propriétaire :

Représenté par :

Donneur d'ordre : **NO**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur GOUBAULT Antonin**

N° de certification de l'opérateur : **C3416**

Organisme : **QUALIXPERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **44350 GUERANDE**

Adresse complète : **28 Avenue Pierre de la Bouexière
- 44350 GUERANDE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **SO**

Date de la construction : **SO**

Bâtiment : **BATIMENT F (CLIC)**

Etage : **RDC AU COMLES**

Escalier : **SO**

Porte : **SO**

Fonction principale du bâtiment : **Hôpital**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Curage complet du sol au plafond.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

7/121

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :


Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage**5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :****➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau ICG	RDC
Accueil ICG	RDC
Salle de réunion	RDC
Local rangement	RDC
Entrée	RDC
Dégagement	RDC
Escaliers	RDC
WC n°1	RDC
Bureau médecin du travail	RDC
Réserve	RDC
Palier	R+1
WC n°2	R+1
Dégagement n°1	R+1
Chambre n°1	R+1
Salle d'eau n°1	R+1
Cuisine n°1	R+1
Salle de réunion	R+1
Tisanerie	R+1
Photocopie	R+1
Dégagement n°2	R+1
Chambre n°2	R+1
Chambre n°3	R+1
Cuisine n°2	R+1
Salle d'eau n°2	R+1
Façade Nord	Extérieur
Façade Sud	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Façade Est	Extérieur
Façade Ouest	Extérieur
Local chaudière	RDC

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Combles	R+2	Pas de trappe d'accès.

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Bureau ICG	RDC	Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Accueil ICG	RDC	Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	PVC - Non peint			Non	
		Portes	Comprimbande			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbande			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Salle de réunion	RDC	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbande			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Local rangement	RDC	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	Z066	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage +Colle	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Entrée	RDC	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage +Colle	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plinthes	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	PVC - Non peint			Non	
		Portes	Comprimbande			Non	
Dégagement	RDC	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z015	Oui	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage +Colle	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Escaliers	RDC	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plinthes	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage +Colle	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
WC n°1	RDC	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage +Colle	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Bureau médecin du travail	RDC	Murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z015	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
Réserve	RDC	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Oui	4 m2
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Oui	4 m2
Palier	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plinthes	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Oui	6 m2
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
WC n°2	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	3 m2
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Oui	
Dégagement n°1	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	2 m2
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
Chambre n°1	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	9 m2
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des	PVC - Non peint			Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

15/121

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		fenêtres					
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
Salle d'eau n°1	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z061	Oui	3 m2
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
Cuisine n°1	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Evier	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z061	Oui	4 m2
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
Salle de réunion	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

16/121

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante			
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	30 m2
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Non	
Tisanerie	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	3 m2
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
Photocopie	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	3 m2
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
Dégagement	R+1	Murs	Calicot - Toile de	Résultat d'analyse	Z028	Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

17/121

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
t n°2			verre peinte				
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	2 m2
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Oui	2 m2
Chambre n°2	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	9 m2
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribande			Non	
Chambre n°3	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Lattis	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	Oui	9 m2
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

18/121

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P066)		Non	
Cuisine n°2	R+1	Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z065	Oui	8 m2
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Evier	Plaque isophonique	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
Salle d'eau n°2	R+1	Murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z065	Oui	8 m2
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compriband			Non	
Façade Nord	Extérieur	Conduit de fluide	Zinc - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Couverture	Ardoises naturelle - Non peint			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

19/121

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des seuils de porte	Béton	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Ensemble des seuils des appuis de fenêtres	Béton	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Ensemble des tableaux	Joint pierre	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Sous bassement	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Ensemble des murs	Pierres, mortier - Non peint			Non	
		Sous bassement	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
Façade Sud	Extérieur	Conduit de fluide	Zinc - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Ensemble des murs	Pierres, mortier - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des tableaux	Joint pierre	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Ensemble des seuils de porte	Béton	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Ensemble des seuils des appuis de fenêtres	Béton	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Sous bassement	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Sous bassement	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Couverture n°2	Ardoises	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
Façade Est	Extérieur	Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Portail	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
Façade Ouest	Extérieur	Ensemble des fenêtres	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z023	Oui	2.5 ml
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Portail	Métal - Peinture			Non	
Local chaudière	RDC	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Plafond	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Oui	4 m2
		Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Oui	0.20 ml
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides au démarrage des travaux ou de la démolition.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Une stratégie pour être mis en place afin d'affiner les résultats d'enduits muraux et situés dans les plénums lors de la libération des locaux et au démarrage des travaux.

Le plâtre étant un matériau hétéroclite les résultats peuvent varier selon les points de prélèvements, suite aux prélèvements complémentaire le nombre de résultats positifs importants oblige à étendre la cartographie sur l'ensemble de l'étage concernant l'amiante pour le plâtre peinture dans les plénums.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage



Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

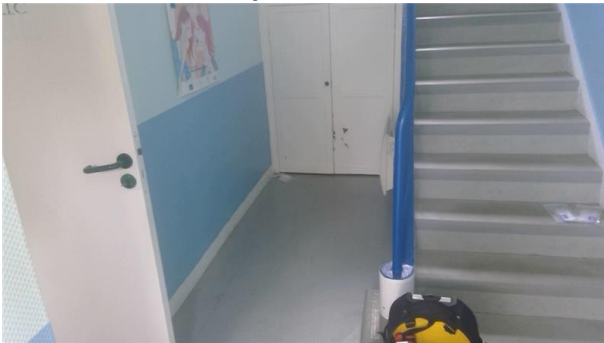PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement :

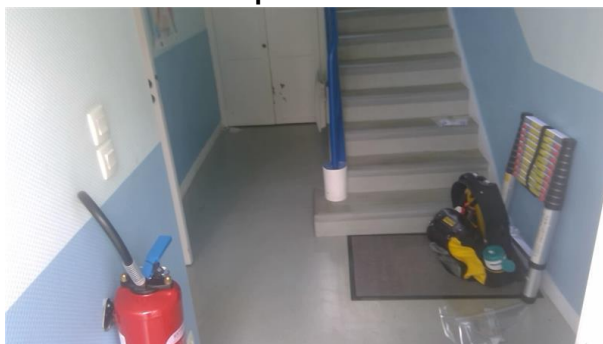


Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ragréage +Colle
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet : Ragréage +Colle Planche de croquis n° :1	
--	---

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

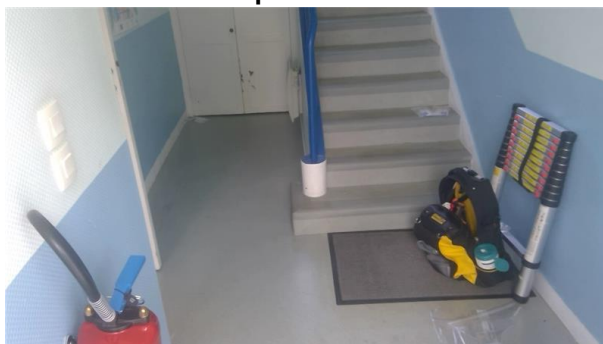

Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Béton - Non peint
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton / Non peint

Planche de croquis n° :1




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :

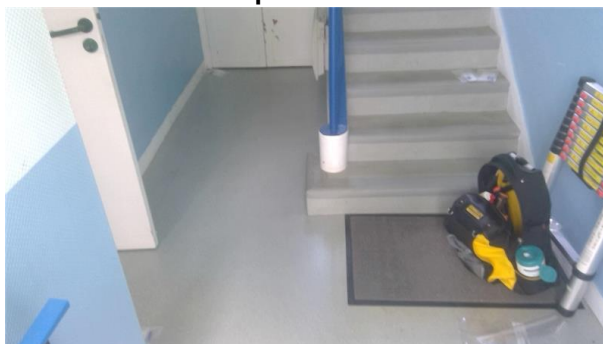

Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Plinthes - Toutes zones
	44350	

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture
--	-----------------------------------	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Béton / Peinture



Planche de croquis n° :1







DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°1 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ragraéage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragraéage + colle Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

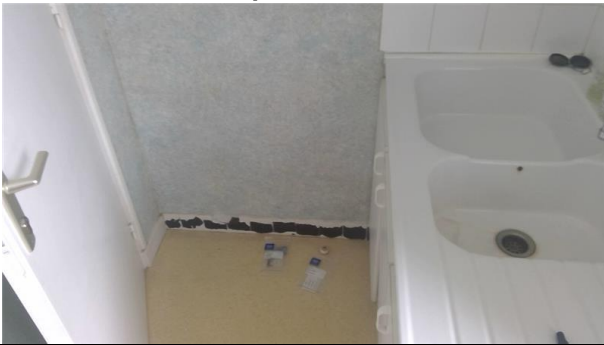PRELEVEMENT : P013			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014



Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Murs - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Calicot - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calicot / Papier peint Planche de croquis n° :1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Murs - Murs</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Plâtre - Papier peint</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Plâtre / Papier peint</p> <p>Planche de croquis n° :1</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :1

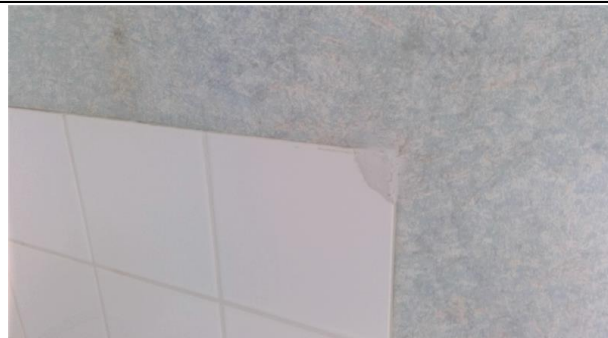

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Plafond - Plafond dans le plénum
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture
---	--	---


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Plâtre / Peinture



Planche de croquis n° :1







DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local rangement - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local chaudière - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local chaudière - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local chaudière - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :

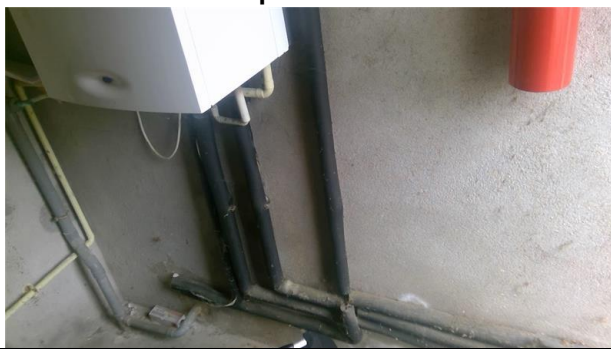

Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local chaudière - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Calorifuge

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



Objet :
Calorifuge

Planche de croquis n° :1




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local chaudière - Conduit de fluide - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ragréage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage + colle Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (granulaire) (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027


Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :

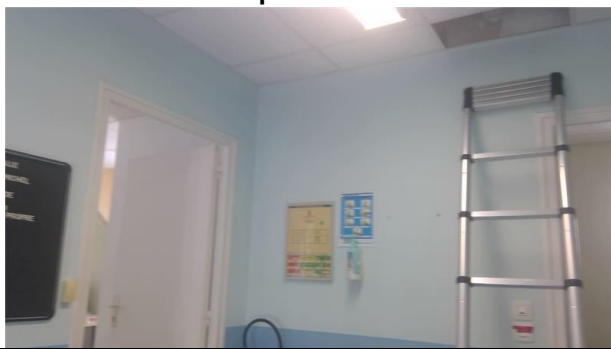

Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Murs - Murs
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Calicot / Toile de verre peinte



Planche de croquis n° :2






DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

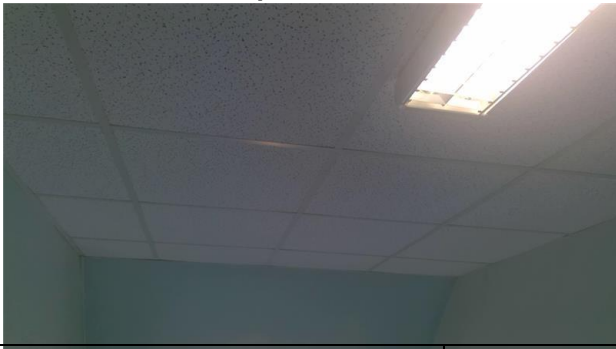PRELEVEMENT : P029			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p>Nom du client NO</p>	<p>Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p>Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Murs - Murs</p>	
<p>Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p>Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p>Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte</p>	
<p>Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Plâtre / Toile de verre peinte</p> <p>Planche de croquis n° :2</p>			
<p>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

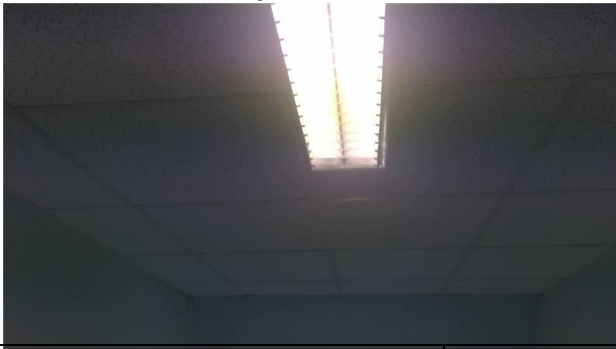PRELEVEMENT : P030					
Emplacement : 					
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Faux-plafond - Plafond			
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :2					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P031			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Plafond - Plafond dans le plénum</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Plâtre - Peinture</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</p>			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<p>Objet : Plâtre / Peinture</p> <p>Planche de croquis n° :2</p>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°2 - Revêtement de mur - Murs</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Colle - Faïence</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Colle / Faïence</p> <p>Planche de croquis n° :2</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033



Emplacement :







Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de réunion - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :2		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de réunion - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ragraéage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragraéage Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Tisanerie - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Tisanerie - Evier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque isophonique / Revêtement bitumineux Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Cuisine n°2 - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	--

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple
---	--	---


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Revêtement souple

Planche de croquis n° :2

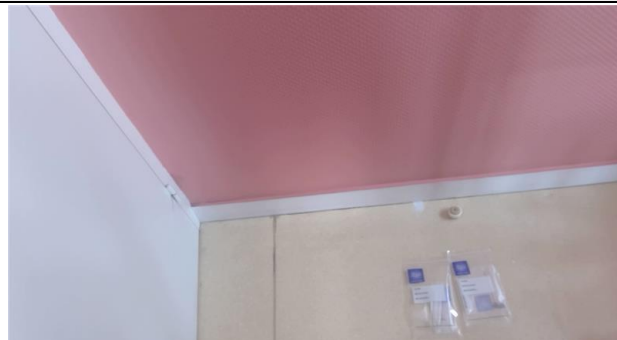

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :




Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Cuisine n°2 - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	--

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ragréage
---	--	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet : Ragréage Planche de croquis n° :2	
---	---

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :

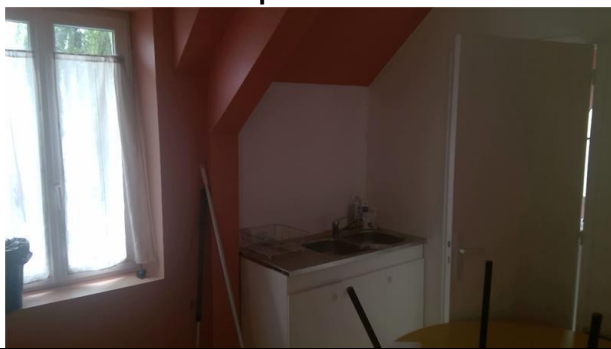

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66749-138010
44350 GUERANDE
28 Avenue Pierre de la Bouexière
44350

Pièce ou local – Composant
R+1 - Cuisine n°2 - Murs - Murs

Nom de l'opérateur
GOUBAULT Antonin

Date de prélèvement
10/07/2023

Partie de composant
Calicot - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n° :2



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Cuisine n°2 - Evier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plaque isophonique	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque isophonique Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type liège (marron) + (noir)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Vue d'ensemble



Emplacement



Nom du client
NO

Numéro de dossier
66749-138010
44350 GUERANDE
28 Avenue Pierre de la Bouexière

44350

Pièce ou local – Composant
Extérieur - Façade Sud - Ensemble des murs
- Toutes zones

Nom de l'opérateur
GOUBAULT Antonin

Date de prélèvement
10/07/2023

Partie de composant
Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :




Objet :
Enduit / Peinture




Planche de croquis n° :3



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043			
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350		Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Ensemble des murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350		Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Ensemble des tableaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Joint pierre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint pierre Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Vue d'ensemble



Emplacement

**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66749-138010
44350 GUERANDE
28 Avenue Pierre de la Bouexière




44350**Pièce ou local – Composant**
Extérieur - Façade Sud - Ensemble des
seuils de porte - Toutes zones**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
10/07/2023**Partie de composant**
Béton**Résultat amiante :** Absence d'amiante




DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :




Objet :
Béton**Planche de croquis n° :3**

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
Vue d'ensemble 		Emplacement 	
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Ensemble des seuils des appuis de fenêtres - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047			
Vue d'ensemble 		Emplacement 	
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Sous bassement - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Vue d'ensemble 		Emplacement 	
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Sous bassement - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Ensemble des murs - Toutes zones
----------------------------	---	--

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :3



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Est - Ensemble des murs - Toutes zones
	44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture
--	-----------------------------------	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :3



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052					
Emplacement : 					
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Est - Ensemble des murs - Toutes zones			
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P053

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Nord - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement :



Nom du client
NO

Numéro de dossier
66749-138010
44350 GUERANDE
28 Avenue Pierre de la Bouexière
44350

Pièce ou local – Composant
Extérieur - Façade Nord - Ensemble des
murs - Toutes zones

Nom de l'opérateur
GOUBAULT Antonin

Date de prélèvement
10/07/2023

Partie de composant
Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :3




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Nord - Sous bassement - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056


Emplacement :

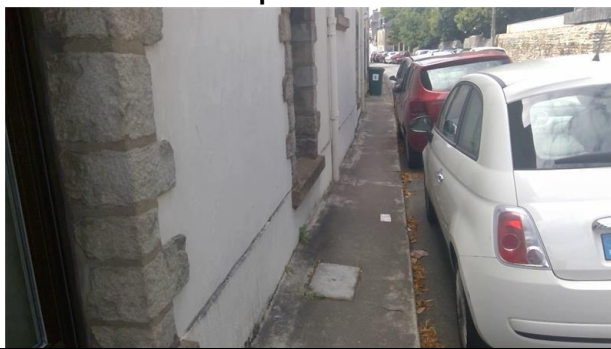




Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Nord - Sous bassement - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

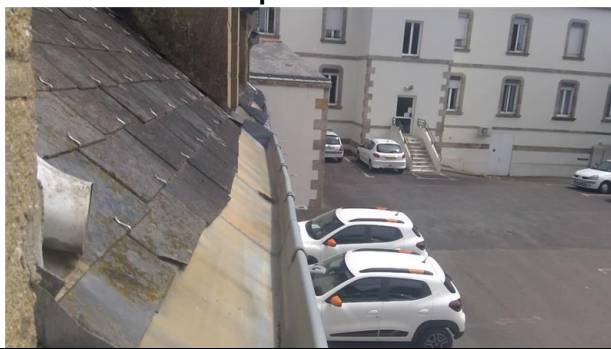

PRELEVEMENT : P057



Emplacement :







Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Couverture n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Ardoises	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ardoises Planche de croquis n° :3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plaque (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

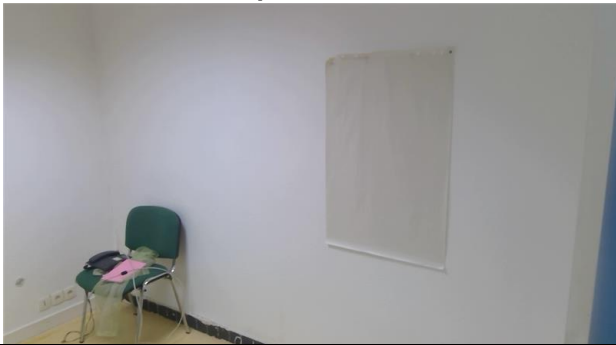

PRELEVEMENT : P058			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Papier peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Papier peint Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

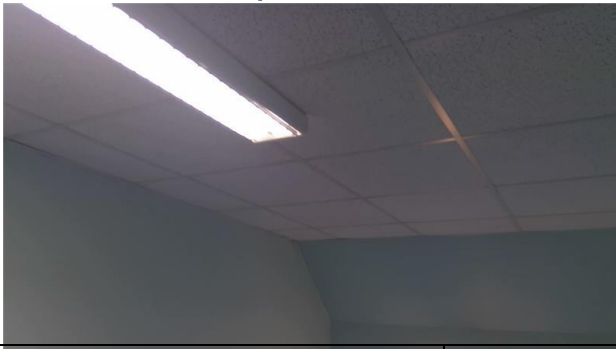

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Papier peint Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P060			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau médecin du travail - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P062			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Plâtre - Peinture</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</p>			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<p>Objet : Plâtre / Peinture</p> <p>Planche de croquis n° :2</p>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P063			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de réunion - Murs - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de réunion - Plafond - Plafond dans le plénum</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 10/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Plâtre - Peinture</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Plâtre / Peinture</p> <p>Planche de croquis n° :2</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P066

Emplacement :

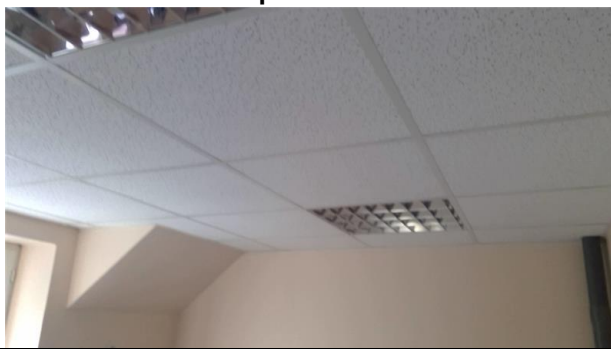

Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre n°3 - Plafond - Plafond dans le plénum
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Plâtre / Peinture

Planche de croquis n° :2




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66749-138010 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de réunion - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 10/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Bâtiment F CLIC		N° planche : 1/4	N° dossier : 66749-138010	Type : Croquis
Client : NO		Version : 0	Adresse : 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière	
Intervenant : GOUBAULT Antonin		Date : 10/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			44350 GUERANDE	
Commentaire :			Localisation : BATIMENT F	Lieu / Zone : RDC

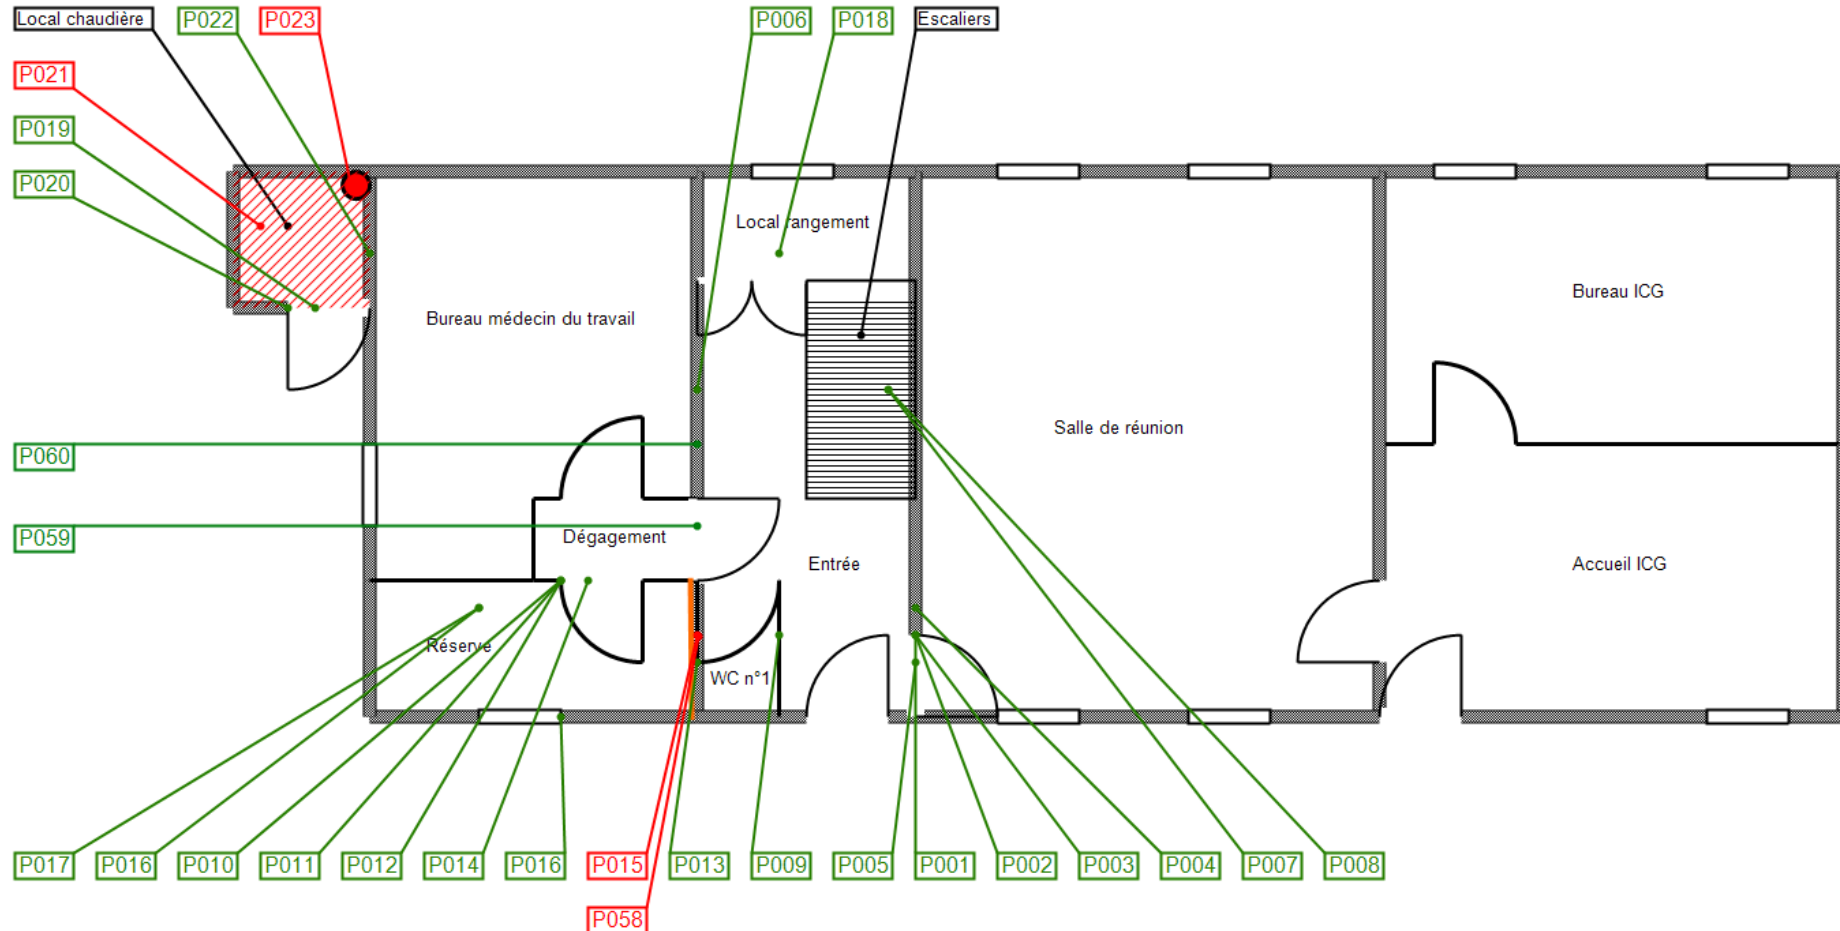

Titre : Bâtiment F CLIC		N° planche : 2/4	N° dossier : 66749-138010	Type : Croquis
Client : NO		Version : 0	Adresse : 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin		Date : 10/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : BATIMENT F	Lieu / Zone : R+1

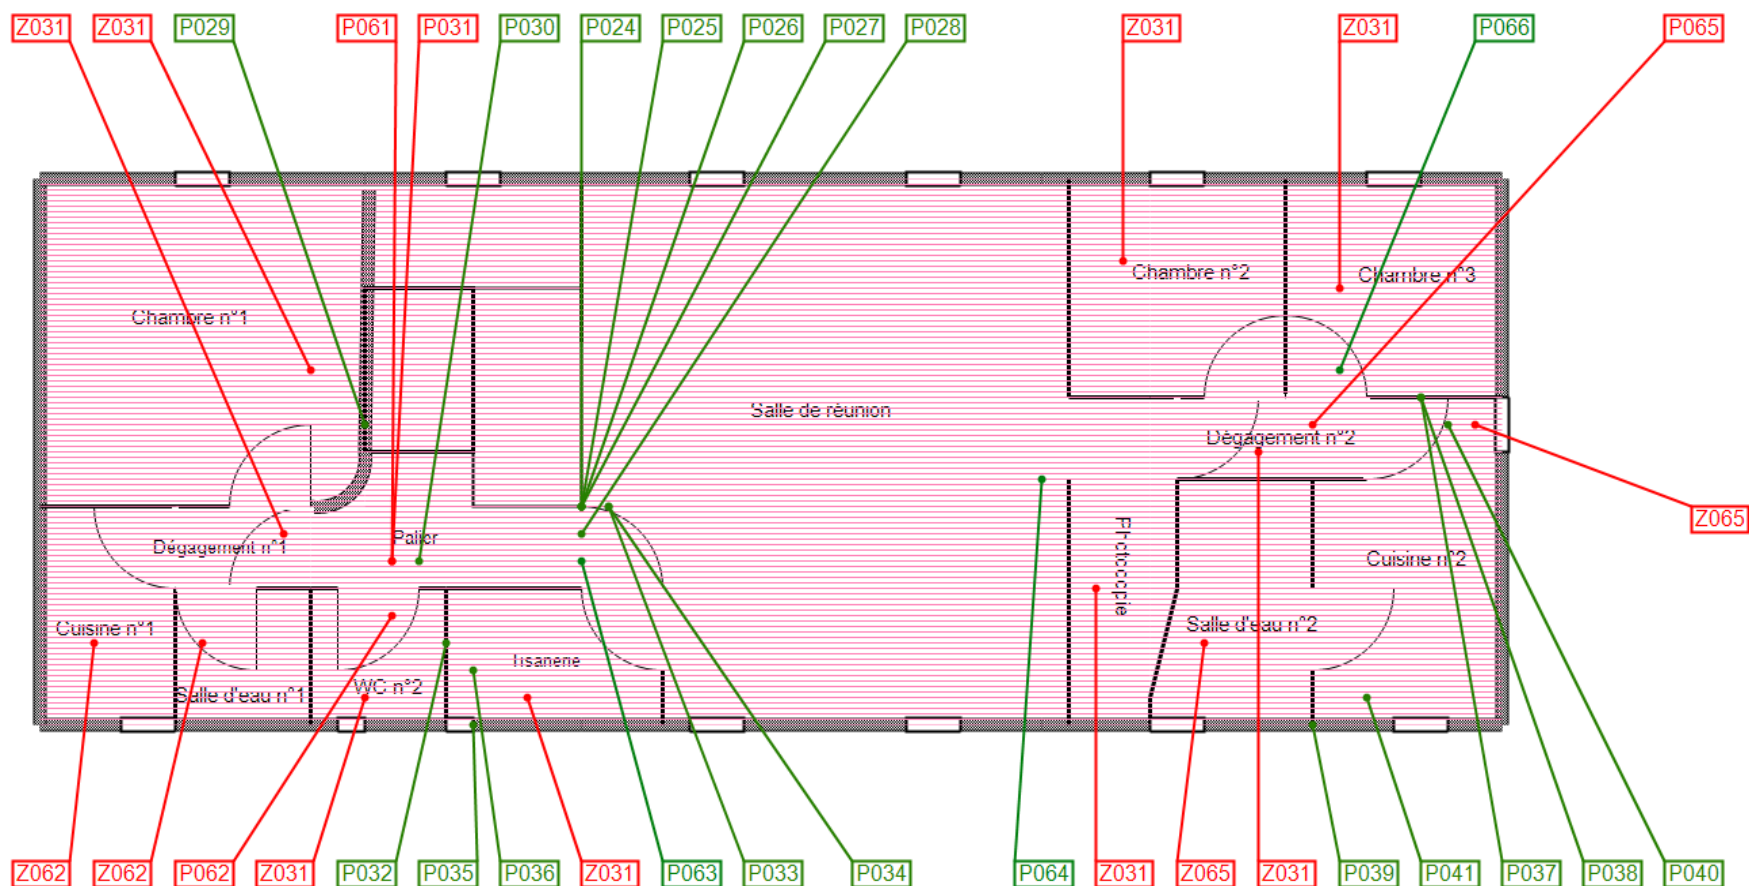





Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :


 Non visité

Titre : Bâtiment F CLIC	N° planche : 3/4	N° dossier : 66749-138010	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 10/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		44350 GUERANDE	
Commentaire :		Localisation : BATIMENT F	Lieu / Zone : R+2

Combles



Titre : Bâtiment F CLIC	N° planche : 4/4	N° dossier : 66749-138010	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 10/07/2023	44350 GUERANDE	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : BATIMENT F	
Commentaire :		Lieu / Zone : Extérieur	

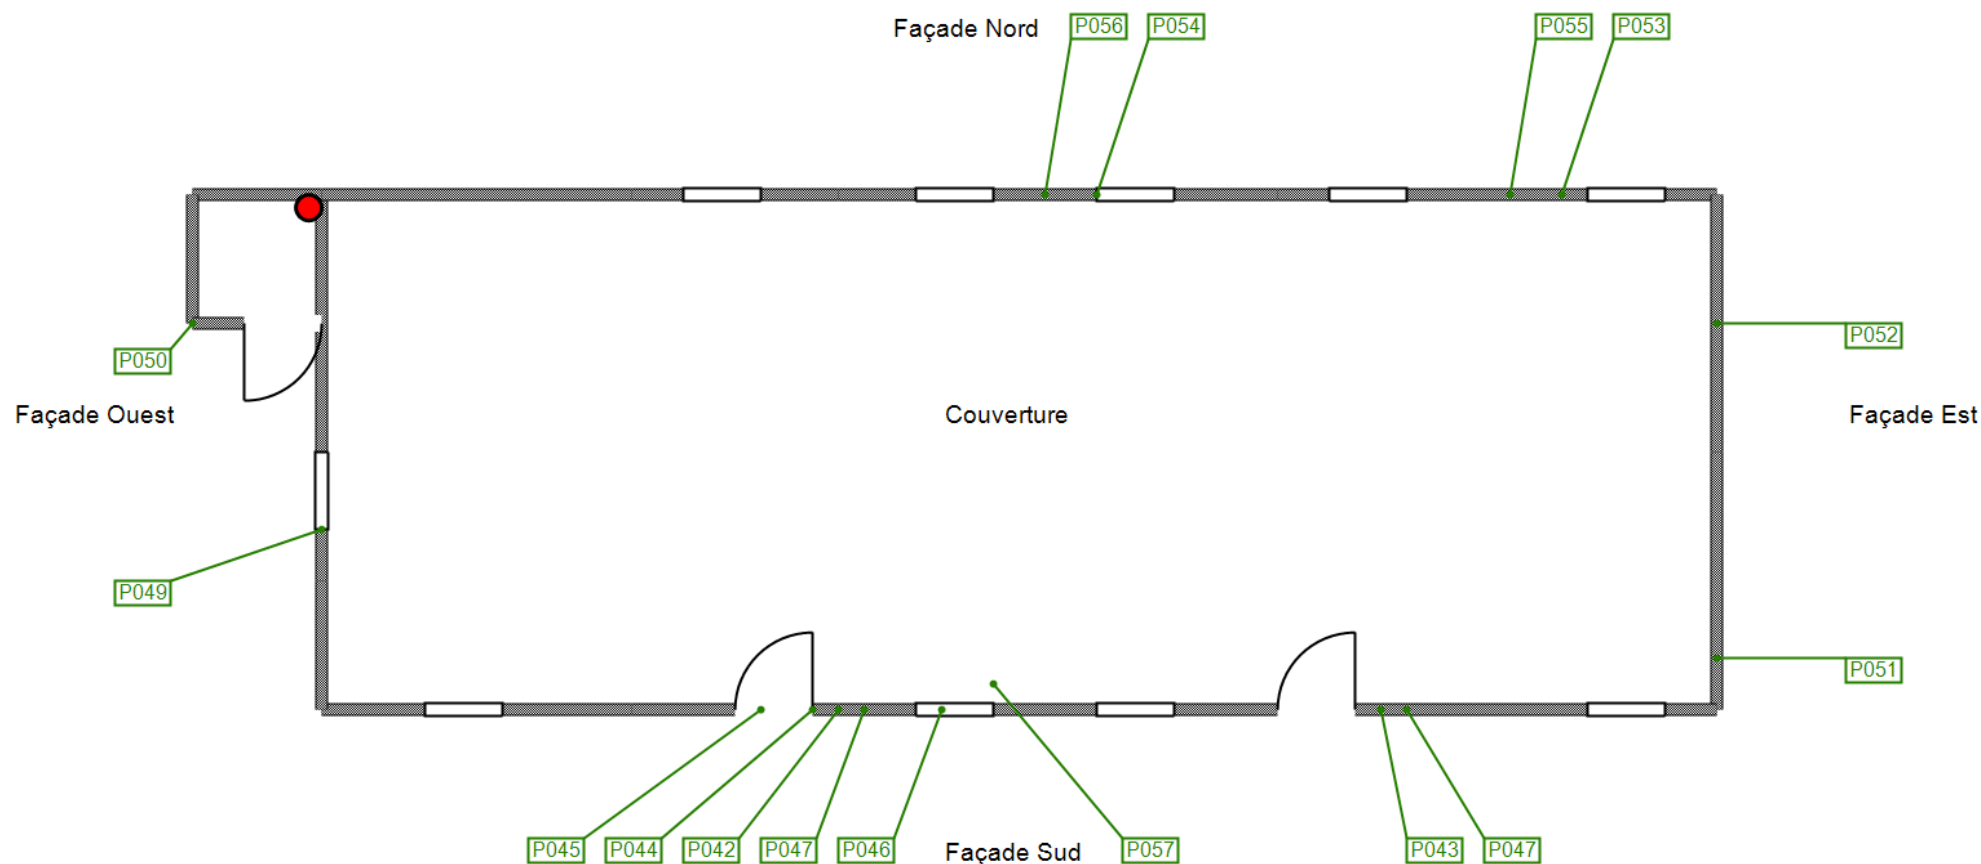

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720230701105987



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-087393-01

Numéro de dossier : 23N026215

Référence de dossier :

66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N026215-001 - Référence P001-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-002 - Référence P002-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Ragréage +Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-003 - Référence P003-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Béton - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-004 - Référence P004-RDC - Entrée - Toutes zones - Plinthes - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-005 - Référence P005-RDC - Entrée - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-006 - Référence P006-RDC - Entrée - Murs - Murs - Plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-007 - Référence P007-RDC - Entrée - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N026215-008 - Référence P008-RDC - Entrée - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-009 - Référence P009-RDC - WC n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-010 - Référence P010-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-011 - Référence P011-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Ragraage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-012 - Référence P012-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-013 - Référence P013-RDC - Réserve - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-014 - Référence P014-RDC - Réserve - Murs - Murs - Calicot - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-015 - Référence P015-RDC - Réserve - Murs - Murs - Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-016 - Référence P016-RDC - Réserve - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-017 - Référence P017-RDC - Réserve - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-018 - Référence P018-RDC - Local rangement - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-019 - Référence P019-RDC - Local chaudière - Sol - Revêtement de sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N026215-020 - Référence P020-RDC - Local chaudière - Murs - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-021 - Référence P021-RDC - Local chaudière - Plafond - Plafond - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-022 - Référence P022-RDC - Local chaudière - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-023 - Référence P023-RDC - Local chaudière - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-024 - Référence P024-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-025 - Référence P025-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-026 - Référence P026-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-027 - Référence P027-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-028 - Référence P028-R+1 - Palier - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-029 - Référence P029-R+1 - Palier - Murs - Murs - Plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-030 - Référence P030-R+1 - Palier - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-031 - Référence P031-R+1 - Palier - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N026215-032 - Référence P032-R+1 - WC n°2 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-033 - Référence P033-R+1 - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-034 - Référence P034-R+1 - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-035 - Référence P035-R+1 - Tisanerie - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-036 - Référence P036-R+1 - Tisanerie - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique - Revêtement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-037 - Référence P037-R+1 - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-038 - Référence P038-R+1 - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-039 - Référence P039-R+1 - Cuisine n°2 - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-040 - Référence P040-R+1 - Cuisine n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-041 - Référence P041-R+1 - Cuisine n°2 - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-042 - Référence P042-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-043 - Référence P043-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N026215-044 - Référence P044-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des tableaux - Joint pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-045 - Référence P045-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des seuils de porte - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-046 - Référence P046-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des seuils des appuis de fenêtres - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-047 - Référence P047-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-048 - Référence P048-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-049 - Référence P049-Extérieur - Façade Ouest - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-050 - Référence P050-Extérieur - Façade Ouest - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-051 - Référence P051-Extérieur - Façade Est - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-052 - Référence P052-Extérieur - Façade Est - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-053 - Référence P053-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-054 - Référence P054-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-055 - Référence P055-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N026215-056 - Référence P056-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N026215-057 - Référence P057-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Couverture n°2 - Ardoises, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01 Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32 Page 1/17
Référence laboratoire N° : 23RI041540 Référence de suivi du dossier N° : 23N026215
Reçu au laboratoire le : 14/07/2023 Date de réception : 13/07/2023
Date d'analyse : 17/07/2023
Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350
GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N026215-001 - P001-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N026215-002 - P002-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Ragréage +Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N026215-003 - P003-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Béton - Non peint	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 2/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 ⁽¹⁾	23N026215-004 - P004-RDC - Entrée - Toutes zones - Plinthes - Béton - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (orange)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23N026215-005 - P005-RDC - Entrée - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	23N026215-006 - P006-RDC - Entrée - Murs - Murs - Plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N026215-007 - P007-RDC - Entrée - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 3/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	23N026215-008 - P008-RDC - Entrée - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N026215-009 - P009-RDC - WC n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (vert)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23N026215-010 - P010-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 4/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	23N026215-011 - P011-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23N026215-012 - P012-RDC - Réserve - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23N026215-013 - P013-RDC - Réserve - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 ⁽²⁾	23N026215-014 - P014-RDC - Réserve - Murs - Murs - Calicot - Papier peint					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 5/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N9YY	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015 (3)	23N026215-015 - P015-RDC - Réserve - Murs - Murs - Plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	23N026215-016 - P016-RDC - Réserve - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 6/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	23N026215-017 - P017-RDC - Réserve - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23N026215-018 - P018-RDC - Local rangement - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 7/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23N026215-019 - P019-RDC - Local chaudière - Sol - Revêtement de sol - Béton	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23N026215-020 - P020-RDC - Local chaudière - Murs - Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 ⁽⁴⁾	23N026215-021 - P021-RDC - Local chaudière - Plafond - Plafond - Fibres-ciment	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	23N026215-022 - P022-RDC - Local chaudière - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau de type mousse (noir)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 8/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (4)	23N026215-023 - P023-RDC - Local chaudière - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibres-ciment	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	23N026215-024 - P024-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23N026215-025 - P025-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N026215-026 - P026-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage	Matériau dur (granulaire) (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N026215-027 - P027-R+1 - Palier - Sol - Revêtement de sol - Béton					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 9/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23N026215-028 - P028-R+1 - Palier - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X4LC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XRE5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	23N026215-029 - P029-R+1 - Palier - Murs - Murs - Plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page10/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23N026215-030 - P030-R+1 - Palier - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N026215-031 - P031-R+1 - Palier - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N026215-032 - P032-R+1 - WC n°2 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23N026215-033 - P033-R+1 - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 11/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N026215-034 - P034-R+1 - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23N026215-035 - P035-R+1 - Tisanerie - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23N026215-036 - P036-R+1 - Tisanerie - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23N026215-037 - P037-R+1 - Cuisine n° ; - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 12/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23N026215-038 - P038-R+1 - Cuisine n° ; - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23N026215-039 - P039-R+1 - Cuisine n° ; - Murs - Murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / AUN5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	23N026215-040 - P040-R+1 - Cuisine n° ; - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page13/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23N026215-041 - P041-R+1 - Cuisine n° : - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique	Matériau de type liège (marron) + (noir)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	23N026215-042 - P042-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23N026215-043 - P043-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	23N026215-044 - P044-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des tableaux - Joint pierre	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page14/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	23N026215-045 - P045-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des seuils de porte - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23N026215-046 - P046-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Ensemble des seuils des appuis de fenêtres - Béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23N026215-047 - P047-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23N026215-048 - P048-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	23N026215-049 - P049-Extérieur - Façade Ouest - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page15/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	23N026215-050 - P050-Extérieur - Façade Ouest - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23N026215-051 - P051-Extérieur - Façade Est - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	23N026215-052 - P052-Extérieur - Façade Est - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	23N026215-053 - P053-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23N026215-054 - P054-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 16/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	23N026215-055 - P055-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	23N026215-056 - P056-Extérieur - Façade Nord - Toutes zones - Sous bassement - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	23N026215-057 - P057-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Couverture n°2 - Ardoises	Matériau semi-dur de type plaque (noir)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-042269-01

Date d'émission de rapport : 20/07/2023 20:32

Page 17/17

Référence laboratoire N° : 23RI041540

Référence de suivi du dossier N° : 23N026215

Reçu au laboratoire le : 14/07/2023

Date de réception : 13/07/2023

Date d'analyse : 17/07/2023

Référence dossier Client: 23N026215 - 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350

GUERANDE - NO

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Alicja Matracka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720230801122785

Rapport n° : 66749-138010 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT F (Clic)

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

115/121

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104892-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 23:04 Page 1/3
Dossier N° : 23N030012 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:
66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P058-RDC - Réserve - Murs - Murs - Plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P059-RDC - Dégagement - Murs - Murs - Plâtre - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / FSV4	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P060-RDC - Bureau médecin du travail - Murs - Murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P061-R+1 - Palier - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P062-R+1 - WC n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P063-R+1 - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104892-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 23:04 Page 2/3
 Dossier N° : 23N030012 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
 Référence dossier Client:
 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière
 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P064-R+1 - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P065-R+1 - Dégagement n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P066-R+1 - Chambre n°3 - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P067-RDC - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / SL3G *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104892-01	Date d'émission de rapport : 18/08/2023 23:04	Page 3/3
Dossier N° : 23N030012	Date de réception : 16/08/2023	Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client: 66749-138010 A - 44350 GUERANDE 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO		



Audrey Deshayes
Technicien Analyste Microscopie


Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence




Certificat N° C3416

Monsieur Antonin GOUBAULT

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.


dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Date d'établissement le lundi 02 août 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport
