


2BDM

PARIS 7ème ARRONDISSEMENT
HOTEL DU CHATELET

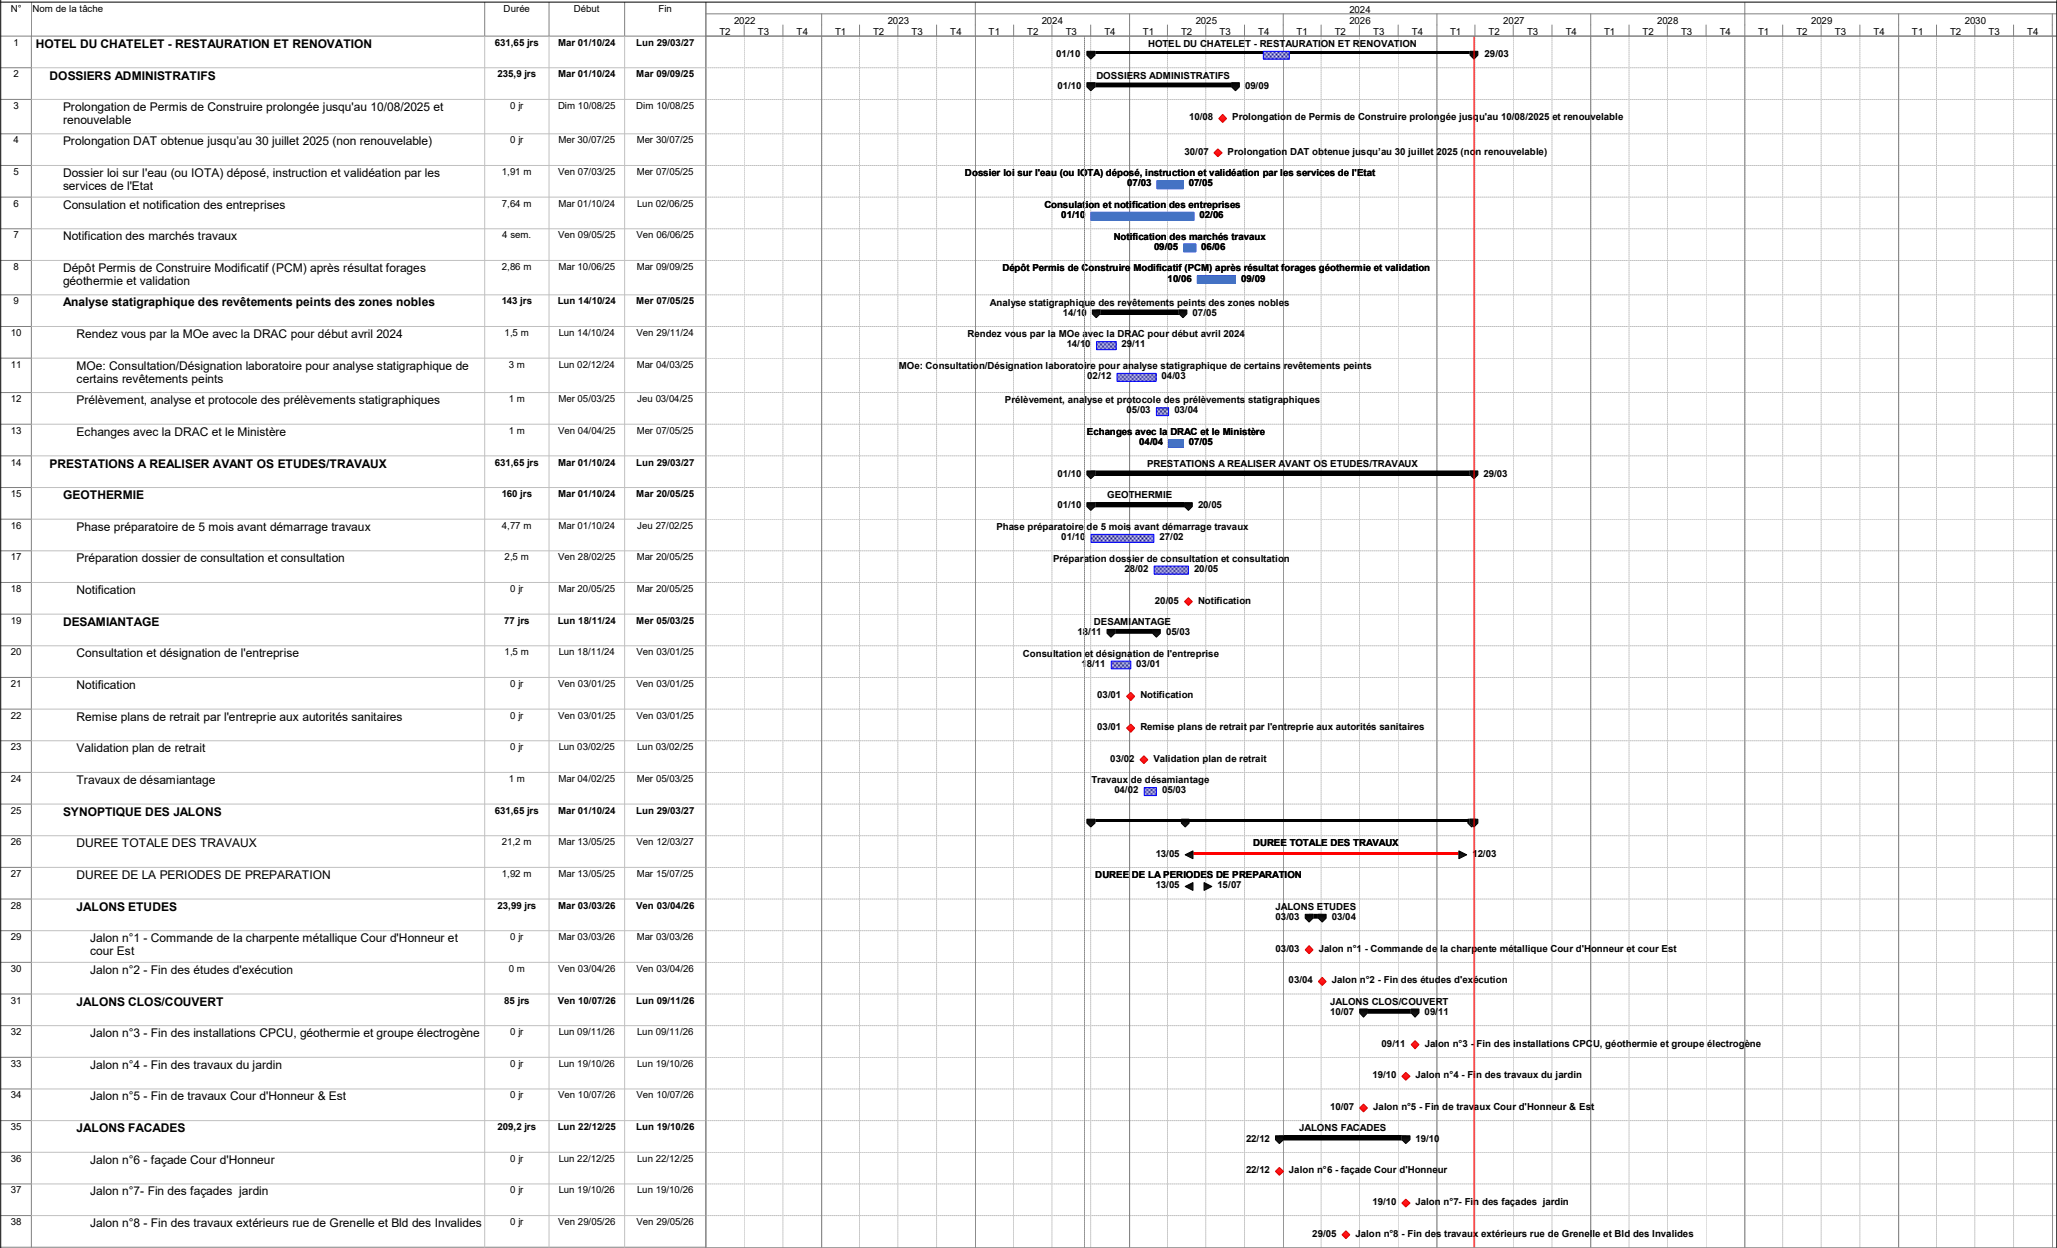

2BDM

Nom de la tâche				Durée	Début	Fin																																				
							2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
							T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
39	Jalon n°9 - Façade cour Ouest					0 j	Mer	08/04/26	Mer 08/04/26																																	
40	Jalon n°10 - Fin des travaux charpente et couverture					0 sem.	Mer	14/01/26	Mer 14/01/26																																	
41	JALONS CLOS/COUVERT					189,1 jrs	Lun	29/06/26	Mer 24/03/27																																	
42	Jalon n°11 - Fin des travaux des salle à manger RdeC et R+2					0 j	Lun	29/06/26	Lun 29/06/26																																	
43	Jalon n°12 - Fin des travaux des salons d'apparats					0 j	Ven	16/10/26	Ven 16/10/26																																	
44	Jalon n°13 - Fin des travaux de l'aile Ouest					0 j	Mer	02/09/26	Mer 02/09/26																																	
45	Jalon n°14 - Fin des travaux de l'ail Est et appartement VIP des combles					0 j	Mer	29/07/26	Mer 29/07/26																																	
46	Jalon n°15- Fin des travaux de l'aile Ouest bureaux					0 j	Ven	28/08/26	Ven 28/08/26																																	
47	Jalon n°16 - Fin Locaux techniques					0 j	Lun	09/11/26	Lun 09/11/26																																	
48	Réception					0 j	Mer	24/03/27	Mer 24/03/27																																	
49	TRAVAUX					52 jrs	Mar	13/05/25	Lun 28/07/25																																	
50	PERIODE DE PREPARATION					52 jrs	Mar	13/05/25	Lun 28/07/25																																	
51	Etat des lieux & constats d'huissier					1 sem.	Mar	13/05/25	Lun 19/05/25																																	
52	Aménagement de la base vie intérieure					3 sem.	Mar	20/05/25	Mer 11/06/25																																	
53	Dépose des équipements & protection des équipements restant sur site					4 sem.	Mar	20/05/25	Mer 18/06/25																																	
54	Plan d'installation de chantier y/c validation + demande d'emprise extérieure à la Ville de Paris					15 jrs	Mer	04/06/25	Mer 25/06/25																																	
55	Instruction de la demande d'emprise extérieure avec le commissariat					4 sem.	Jeu	26/06/25	Jeu 24/07/25																																	
56	Aménagement de la base vie(Rue de Grenelles et Boulevard des invalides)					12 jrs	Jeu	19/06/25	Ven 04/07/25																																	
57	Démarches administratives (PPSPS/ DICT/ Agrément/ etc)					1,91 m	Mar	27/05/25	Lun 28/07/25																																	
58	ETUDES & APPROVISIONNEMENTS					263 jrs	Ven	16/05/25	Lun 01/06/26																																	
59	Relevés sur sites					1,91 m	Mer	11/06/25	Ven 08/08/25																																	
60	Echantillons et fiches produits/validations					3,82 m	Mer	18/06/25	Mer 15/10/25																																	
61	Demandes administratives installation échafaudage Plans echafaudages et agréments					6 sem.	Mar	20/05/25	Mer 02/07/25																																	
62	Lots architecturaux					9,55 m	Mar	20/05/25	Mer 18/03/26																																	
63	Synthèse technique					7,64 m	Mar	03/06/25	Ven 30/01/26																																	
64	Synthèse architecturale					9,55 m	Mar	20/05/25	Mer 18/03/26																																	
65	Dossiers concessionnaires					1,91 m	Mar	10/06/25	Jeu 07/08/25																																	
66	Lots techniques calculs, LT production SS et Terrasse					6,68 m	Ven	16/05/25	Lun 15/12/25																																	
67	Lots techniques distribution intérieure					5,73 m	Mar	10/06/25	Ven 05/12/25																																	
68	Lots géothermie et CPCU					3,82 m	Mar	03/06/25	Mer 01/10/25																																	
69	Etudes de la structure BA et métallique de la terrasse technique					2,86 m	Mar	03/06/25	Mar 02/09/25																																	
70	Validation des études					8,77 m	Mer	02/07/25	Ven 03/04/26																																	
71	Fabrication et livraisons de la structure métallique					15 sem.	Jeu	24/07/25	Jeu 06/11/25																																	
72	Etudes du monte plat y/c validation					1,91 m	Mar	22/07/25	Ven 19/09/25																																	
73	Fabrication du monte-plat et livraisons					20 sem.	Ven	19/09/25	Mer 11/02/26																																	
74	Commande/fabrication charpente métallique					2,86 m	Mar	03/03/26	Lun 01/06/26																																	
75	TRAVAUX					462 jrs	Lun	02/06/25	Mer 24/03/27																																	
76	VRD & AMENAGEMENTS EXTERIEURS					327,2 jrs	Lun	07/07/25	Lun 19/10/26																																	

2BDM

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
					T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
77	Jardin et installations techniques	63 jrs	Lun 07/07/25	Ven 03/10/25																																				
78	Consignations/ Curage/dépose	2.86 m	Lun 07/07/25	Ven 03/10/25																																				
79	Lots techniques	200 jrs	Lun 06/10/25	Lun 20/07/26																																				
80	Implantation des réseaux enterrés par les lots techniques	2.86 m	Lun 06/10/25	Sam 04/04/26																																				
81	Démolition de la cuve à fioul et de l'abri de jardin / déplacement du groupe électrogène	10 jrs	Lun 06/10/25	Ven 17/10/25																																				
82	LT et réseaux géothermie	2 m	Jeu 18/12/25	Ven 20/02/26																																				
83	Modification réseaux CPCU	1.91 m	Lun 22/12/25	Jeu 19/02/26																																				
84	GO de la nouvelle cuve à fioul, du socle GE et de l'abri de jardin	0.95 m	Ven 21/11/25	Lun 22/12/25																																				
85	Equipements technique de la cuve à fioul et jonction avec le groupe électrogène	0.95 m	Lun 22/12/25	Mer 21/01/26																																				
86	Essais groupe électrogène	4 jrs	Mer 27/05/26	Lun 01/06/26																																				
87	Plomberie fontaine en liaison avec restauration de la fontaine	0.95 m	Jeu 22/01/26	Jeu 19/02/26																																				
88	Restauration de la fontaine (etat sanitaire et protocole inclus)	1.91 m	Ven 20/02/26	Ven 17/04/26																																				
89	Réseaux d'arrosage	0.95 m	Sam 18/04/26	Mer 20/05/26																																				
90	Réseaux d'alimentation électrique	1.91 m	Sam 18/04/26	Ven 19/06/26																																				
91	Eclairage extérieur	4 sem.	Lun 22/06/26	Lun 20/07/26																																				
92	Espaces verts	264,2 jrs	Lun 06/10/25	Lun 19/10/26																																				
93	Abattage des arbres et stockage en fond de jardin	4 sem.	Lun 06/10/25	Ven 31/10/25																																				
94	Terrassement & VRD	20 jrs	Lun 03/11/25	Lun 01/12/25																																				
95	Construction bois du mur en claustra	15 jrs	Lun 22/12/25	Mar 13/01/26																																				
96	Aménagements extérieurs/ Cheminements / Arrosage automatique	2.86 m	Jeu 21/05/26	Jeu 20/08/26																																				
97	Construction de la cuve à récupération d'EP	1.91 m	Mer 14/01/26	Jeu 12/03/26																																				
98	Construction de la terrasse extérieure	0.95 m	Sam 18/04/26	Mer 20/05/26																																				
99	Plantations du jardin	2.86 m	Mer 22/07/26	Lun 19/10/26																																				
100	Cours d'Honneur & Est	62 jrs	Lun 13/04/26	Ven 10/07/26																																				
101	Dépose des pavés pour nettoyage et tri	0.95 m	Lun 13/04/26	Mar 12/05/26																																				
102	Terrassement	2 sem.	Mer 13/05/26	Jeu 28/05/26																																				
103	Implantation et pose des réseaux regards et remblaiement/couche de forme	2 sem.	Ven 29/05/26	Jeu 11/06/26																																				
104	Repose des pavés	0.95 m	Ven 12/06/26	Ven 10/07/26																																				
105	Cour Ouest	25 jrs	Lun 13/07/26	Lun 17/08/26																																				
106	Dépose des équipements	1 sem.	Lun 13/07/26	Lun 20/07/26																																				
107	Dépose des pavés pour nettoyage et tri	1 sem.	Mar 21/07/26	Lun 27/07/26																																				
108	Terrassement pour décaissement	1 sem.	Mar 28/07/26	Lun 03/08/26																																				
109	Repose des pavés	2 sem.	Mar 04/08/26	Lun 17/08/26																																				
110	RENOVATION DU CLOS-COUVERT	298 jrs	Mar 03/06/25	Mer 05/08/26																																				
111	Façades Cour d'Honneur	120 jrs	Jeu 03/07/25	Lun 22/12/25																																				
112	Montage de l'échafaudage	4 sem.	Jeu 03/07/25	Jeu 31/07/25																																				
113	Etablissement du protocole de nettoyage avec le laboratoire	3 sem.	Ven 01/08/25	Ven 22/08/25																																				
114	Nettoyage par cataplasme et microgommage	6 sem.	Lun 25/08/25	Ven 03/10/25																																				

2BDM

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030							
				T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4							
115	Rénovation des menuiseries extérieures	8 sem.	Lun 08/09/25	Ven 31/10/25																																							
116	Travaux de maçonnerie en façade	6 sem.	Lun 27/10/25	Lun 08/12/25																																							
117	Contrôle MOe	3 sem.	Mar 18/11/25	Lun 08/12/25																																							
118	Dépose de l'échafaudage/nettoyage	3 sem.	Mar 02/12/25	Lun 22/12/25																																							
119	Façades Jardin	70 Jrs	Mar 09/12/25	Mer 18/03/26																																							
120	Montage de l'échafaudage	2 sem.	Mar 09/12/25	Lun 22/12/25																																							
121	Traitement en maçonnerie de la façade	7 sem.	Mar 23/12/25	Mer 11/02/26																																							
122	Contrôle MOe	3 sem.	Jeu 12/02/26	Mer 04/03/26																																							
123	Dépose de l'échafaudage/nettoyage	2 sem.	Jeu 05/03/26	Mer 18/03/26																																							
124	Façades Rue de Grenelles & Boulevard des Invalides (1/2) + parapluie pavillon Nord-Est	131 Jrs	Mar 03/06/25	Lun 08/12/25																																							
125	Instruction de la demande d'emprise aux autorités concernées	1,62 m	Mar 03/06/25	Jeu 24/07/25																																							
126	Montage de l'échafaudage/ Parapluie	4 sem.	Lun 25/08/25	Ven 19/09/25																																							
127	Dépose des volées pour déplombage en atelier	1 sem.	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25																																							
128	Etablissement du protocole de nettoyage avec le laboratoire	2 sem.	Lun 22/09/25	Ven 03/10/25																																							
129	Nettoyage par cataplasme et microgommage	4 sem.	Lun 06/10/25	Ven 31/10/25																																							
130	Rénovation des menuiseries extérieures	4 sem.	Lun 20/10/25	Lun 17/11/25																																							
131	Travaux de maçonnerie en façade	3 sem.	Lun 10/11/25	Lun 01/12/25																																							
132	Contrôle MOe	3 sem.	Lun 27/10/25	Lun 17/11/25																																							
133	Dépose de l'échafaudage/nettoyage	3 sem.	Mar 18/11/25	Lun 08/12/25																																							
134	Façades Boulevard des Invalides 2/2	75 Jrs	Jeu 12/02/26	Ven 29/05/26																																							
135	Montage de l'échafaudage	3 sem.	Jeu 12/02/26	Mer 04/03/26																																							
136	Dépose des volés pour déplombage en atelier	1 sem.	Jeu 05/03/26	Mer 11/03/26																																							
137	Etablissement du protocole de nettoyage avec le laboratoire	2 sem.	Jeu 05/03/26	Mer 18/03/26																																							
138	Nettoyage par cataplasme et microgommage	3 sem.	Jeu 19/03/26	Mer 08/04/26																																							
139	Rénovation des menuiseries extérieures	3 sem.	Jeu 09/04/26	Lun 27/04/26																																							
140	Travaux de maçonnerie en façade	2 sem.	Mar 28/04/26	Mer 13/05/26																																							
141	Contrôle MOe	2 sem.	Mar 28/04/26	Mer 13/05/26																																							
142	Dépose de l'échafaudage	2 sem.	Ven 15/05/26	Ven 29/05/26																																							
143	Façades Cours Ouest	85 Jrs	Mar 09/12/25	Mer 08/04/26																																							
144	Montage de l'échafaudage	4 sem.	Mar 09/12/25	Mer 07/01/26																																							
145	Etablissement du protocole de nettoyage avec le laboratoire	2 sem.	Jeu 08/01/26	Mer 21/01/26																																							
146	Nettoyage par cataplasme et microgommage	3 sem.	Jeu 22/01/26	Mer 11/02/26																																							
147	Rénovation des menuiseries extérieures	4 sem.	Jeu 12/02/26	Mer 11/03/26																																							
148	Travaux de maçonnerie en façade	2 sem.	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26																																							
149	Contrôle MOe	2 sem.	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26																																							
150	Dépose de l'échafaudage/nettoyage	2 sem.	Jeu 26/03/26	Mer 08/04/26																																							
151	Corps de logis principal	115 Jrs	Ven 01/08/25	Mer 14/01/26																																							
152	Nettoyage des combles	2 sem.	Ven 01/08/25	Jeu 14/08/25																																							

2BDM

Nom de la tâche					Durée	Debut	Fin	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
								T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
153	Reprise d'appui pour la charpente métallique					1,91 m	Lun 18/08/25	Mar 14/10/25																																			
154	Isolation					1,91 m	Mer 15/10/25	Ven 12/12/25																																			
155	Rénovation Charpente/Couverture côté Cour d'Honneur					2,86 m	Lun 18/08/25	Jeu 13/11/25																																			
156	Rénovation Charpente/Couverture côté Jardin					1,91 m	Ven 14/11/25	Mer 14/01/26																																			
157	Rénovation des cheminées en toiture en coordination avec le lot charpente couverture					2,86 m	Mer 15/10/25	Mer 14/01/26																																			
158	Pavillon Nord-Est					55 jrs	Mer 15/10/25	Ven 02/01/26																																			
159	Rénovation Charpente/couverture du Pavillon Nord-Est					2,5 m	Mer 15/10/25	Ven 02/01/26																																			
160	Zone équipements techniques en toiture					168 jrs	Lun 08/12/25	Mer 05/08/26																																			
161	Commande/fabrication charpente métallique					2,86 m	Lun 08/12/25	Ven 06/03/26																																			
162	Isolation thermique combles					0,96 m	Lun 09/03/26	Sam 04/04/26																																			
163	Assemblage, grutage de la charpente métallique et pose en toiture avec plateformes					4 sem.	Lun 09/03/26	Ven 03/04/26																																			
164	Grutage des unités extérieures de clim					6 jrs	Sam 04/04/26	Sam 11/04/26																																			
165	Installation équipements techniques en toiture					1,91 m	Lun 13/04/26	Ven 12/06/26																																			
166	Réseaux et raccordement des unités de clim ext					1,91 m	Lun 08/06/26	Mer 05/08/26																																			
167	RENOVATION INTERIEURE					462 jrs	Lun 02/06/25	Mer 24/03/27																																			
168	Réseaux verticaux CVC/CFO/Cfa					7,64 m	Mar 04/11/25	Ven 03/07/26																																			
169	Aile Ouest - Nouvelle cuisine					462 jrs	Lun 02/06/25	Mer 24/03/27																																			
170	Curage des locaux					2 sem.	Jeu 19/06/25	Mer 02/07/25																																			
171	GO - Renforts structurels de la cuisine					1,91 m	Jeu 03/07/25	Mar 02/09/25																																			
172	GO - Réhausse du plancher et maçonnerie					1,91 m	Mer 03/09/25	Jeu 30/10/25																																			
173	Corps d'Etat Techniques & Architecturaux					4,77 m	Ven 31/10/25	Mar 31/03/26																																			
174	Equipements de cuisine/raccordements est essais					1,24 m	Lun 14/09/26	Mer 21/10/26																																			
175	Corps de logis principal - Salles à manger au RdC et R+2					357 jrs	Lun 02/06/25	Lun 26/10/26																																			
176	Dossier plomb					0 j	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25																																			
177	Dépose et d éplombage RDC et R+2					1,91 m	Lun 02/06/25	Jeu 31/07/25																																			
178	Curage des locaux					2,86 m	Ven 01/08/25	Mer 29/10/25																																			
179	GO - Création de la trémie du monte-plat/ajustement plancher					3,82 m	Jeu 30/10/25	Ven 27/02/26																																			
180	GO - Extension de la courette					1,91 m	Lun 02/03/26	Ven 24/04/26																																			
181	Corps d'Etat Techniques & Architecturaux					5,73 m	Lun 27/04/26	Lun 26/10/26																																			
182	Installation du monte-plat					0,96 m	Ven 29/05/26	Lun 29/06/26																																			
183	Corps de logis principal - Salons d'apparats au RdC et R+2					309 jrs	Ven 01/08/25	Ven 16/10/26																																			
184	Déplombage et curage					1,91 m	Ven 01/08/25	Mar 30/09/25																																			
185	Curage des locaux					15 jrs	Jeu 30/10/25	Jeu 20/11/25																																			
186	GO - Création de la trémie du monte-plat					1,91 m	Ven 21/11/25	Mer 21/01/26																																			
187	GO - Extension de la courette					0,96 m	Jeu 22/01/26	Jeu 19/02/26																																			
188	Corps d'Etat Techniques & Architecturaux					5,73 m	Ven 20/02/26	Mer 19/08/26																																			
189	Installation du monte-plat/essais					1,91 m	Jeu 20/08/26	Ven 16/10/26																																			
190	Corps de logis principal - Bureaux au R+1/R+3/R+4					136 jrs	Ven 20/02/26	Mer 02/09/26																																			

2BDM

PARIS 7ème ARRONDISSEMENT
HOTEL DU CHATELET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
191	Démontage des dalles de fx plafond - Curage des locaux	10 jrs	Ven 20/02/26	Jeu 05/03/26
192	Tirages des réseaux CET	2,86 m	Ven 06/03/26	Jeu 04/06/26
193	Pose des VCV Clim	0,95 m	Ven 05/06/26	Ven 03/07/26
194	Fermeture des plafonds	0,95 m	Lun 06/07/26	Mar 04/08/26
195	Repose des terminaux	0,95 m	Mer 05/08/26	Mer 02/09/26
196	Combles	115,1 jrs	Ven 05/06/26	Mar 17/11/26
197	Curage et nettoyage/GO	2 sem.	Ven 05/09/26	Ven 19/06/26
198	Aménagement de l'accès de la chambre VIP	1,91 m	Ven 19/06/26	Mer 19/08/26
199	Réalisations des lots techniques et architecturaux dans l'appartVIP dans les comble.	3,82 m	Mar 21/07/26	Mar 17/11/26
200	Aile Est - Ancienne cuisine	105 jrs	Ven 27/02/26	Mer 29/07/26
201	Curage de l'ancienne cuisine	10 jrs	Ven 06/03/26	Jeu 19/03/26
202	Corps d'Etat Techniques & Architecturaux	4,77 m	Ven 27/02/26	Mer 29/07/26
203	Aile Ouest - Bureaux	440 jrs	Jeu 03/07/25	Mer 24/03/27
204	Curage	2 sem.	Jeu 03/07/25	Jeu 17/07/25
205	Gros-oeuvre	0,95 m	Mer 01/04/26	Lun 27/04/26
206	Corps d'état techniques et architecturaux	3,82 m	Mar 28/04/26	Ven 28/08/26
207	Equipements techniques Toiture	105 jrs	Lun 09/03/26	Mer 05/08/26
208	MAD équipement terrasse	0 j	Mer 05/08/26	Mer 05/08/26
209	Isolation themique combles	0,95 m	Lun 09/03/26	Sam 04/04/26
210	Sous-sol	305 jrs	Lun 01/09/25	Lun 09/11/26
211	Consignation et démontage des équipements et réseaux à remplacer	2,86 m	Lun 01/09/25	Jeu 27/11/25
212	Corps d'Etat Techniques & Architecturaux	11 m	Ven 28/11/25	Lun 09/11/26
213	Colonnes montantes de distribution fluides et CFO/CFA tous niveaux et terrasse	4,77 m	Jeu 04/12/25	Jeu 30/04/26
214	Stations CPCU et géothermie/LT CVC	5,73 m	Jeu 05/03/26	Mer 02/09/26
215	LT AC et Plomberie	4 m	Sam 04/04/26	Mar 11/08/26
216	Locaux CFO/CFA	4,3 m	Ven 03/04/26	Mer 19/08/26
217	Local laverie et hotte	6 sem.	Jeu 04/06/26	Ven 17/07/26
218	Mise sous tension électrique	0 j	Ven 08/05/26	Ven 08/05/26
219	OPR ET RECEPTION	95 jrs	Mar 10/11/26	Mer 24/03/27
220	Essais entreprises/SSI/GTB	2 m	Mar 10/11/26	Mar 12/01/27
221	Rapport final bureau de contrôle	1 sem.	Mar 22/12/26	Mar 29/12/26
222	Consuel	1 j	Mer 30/12/26	Mer 30/12/26
223	OPR et levée des réserves majeures	2,5 m	Jeu 07/01/27	Mer 24/03/27
224	Trasmission par les entreprises du DOE	0 j	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27
225	RECEPTION	0 j	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27
