
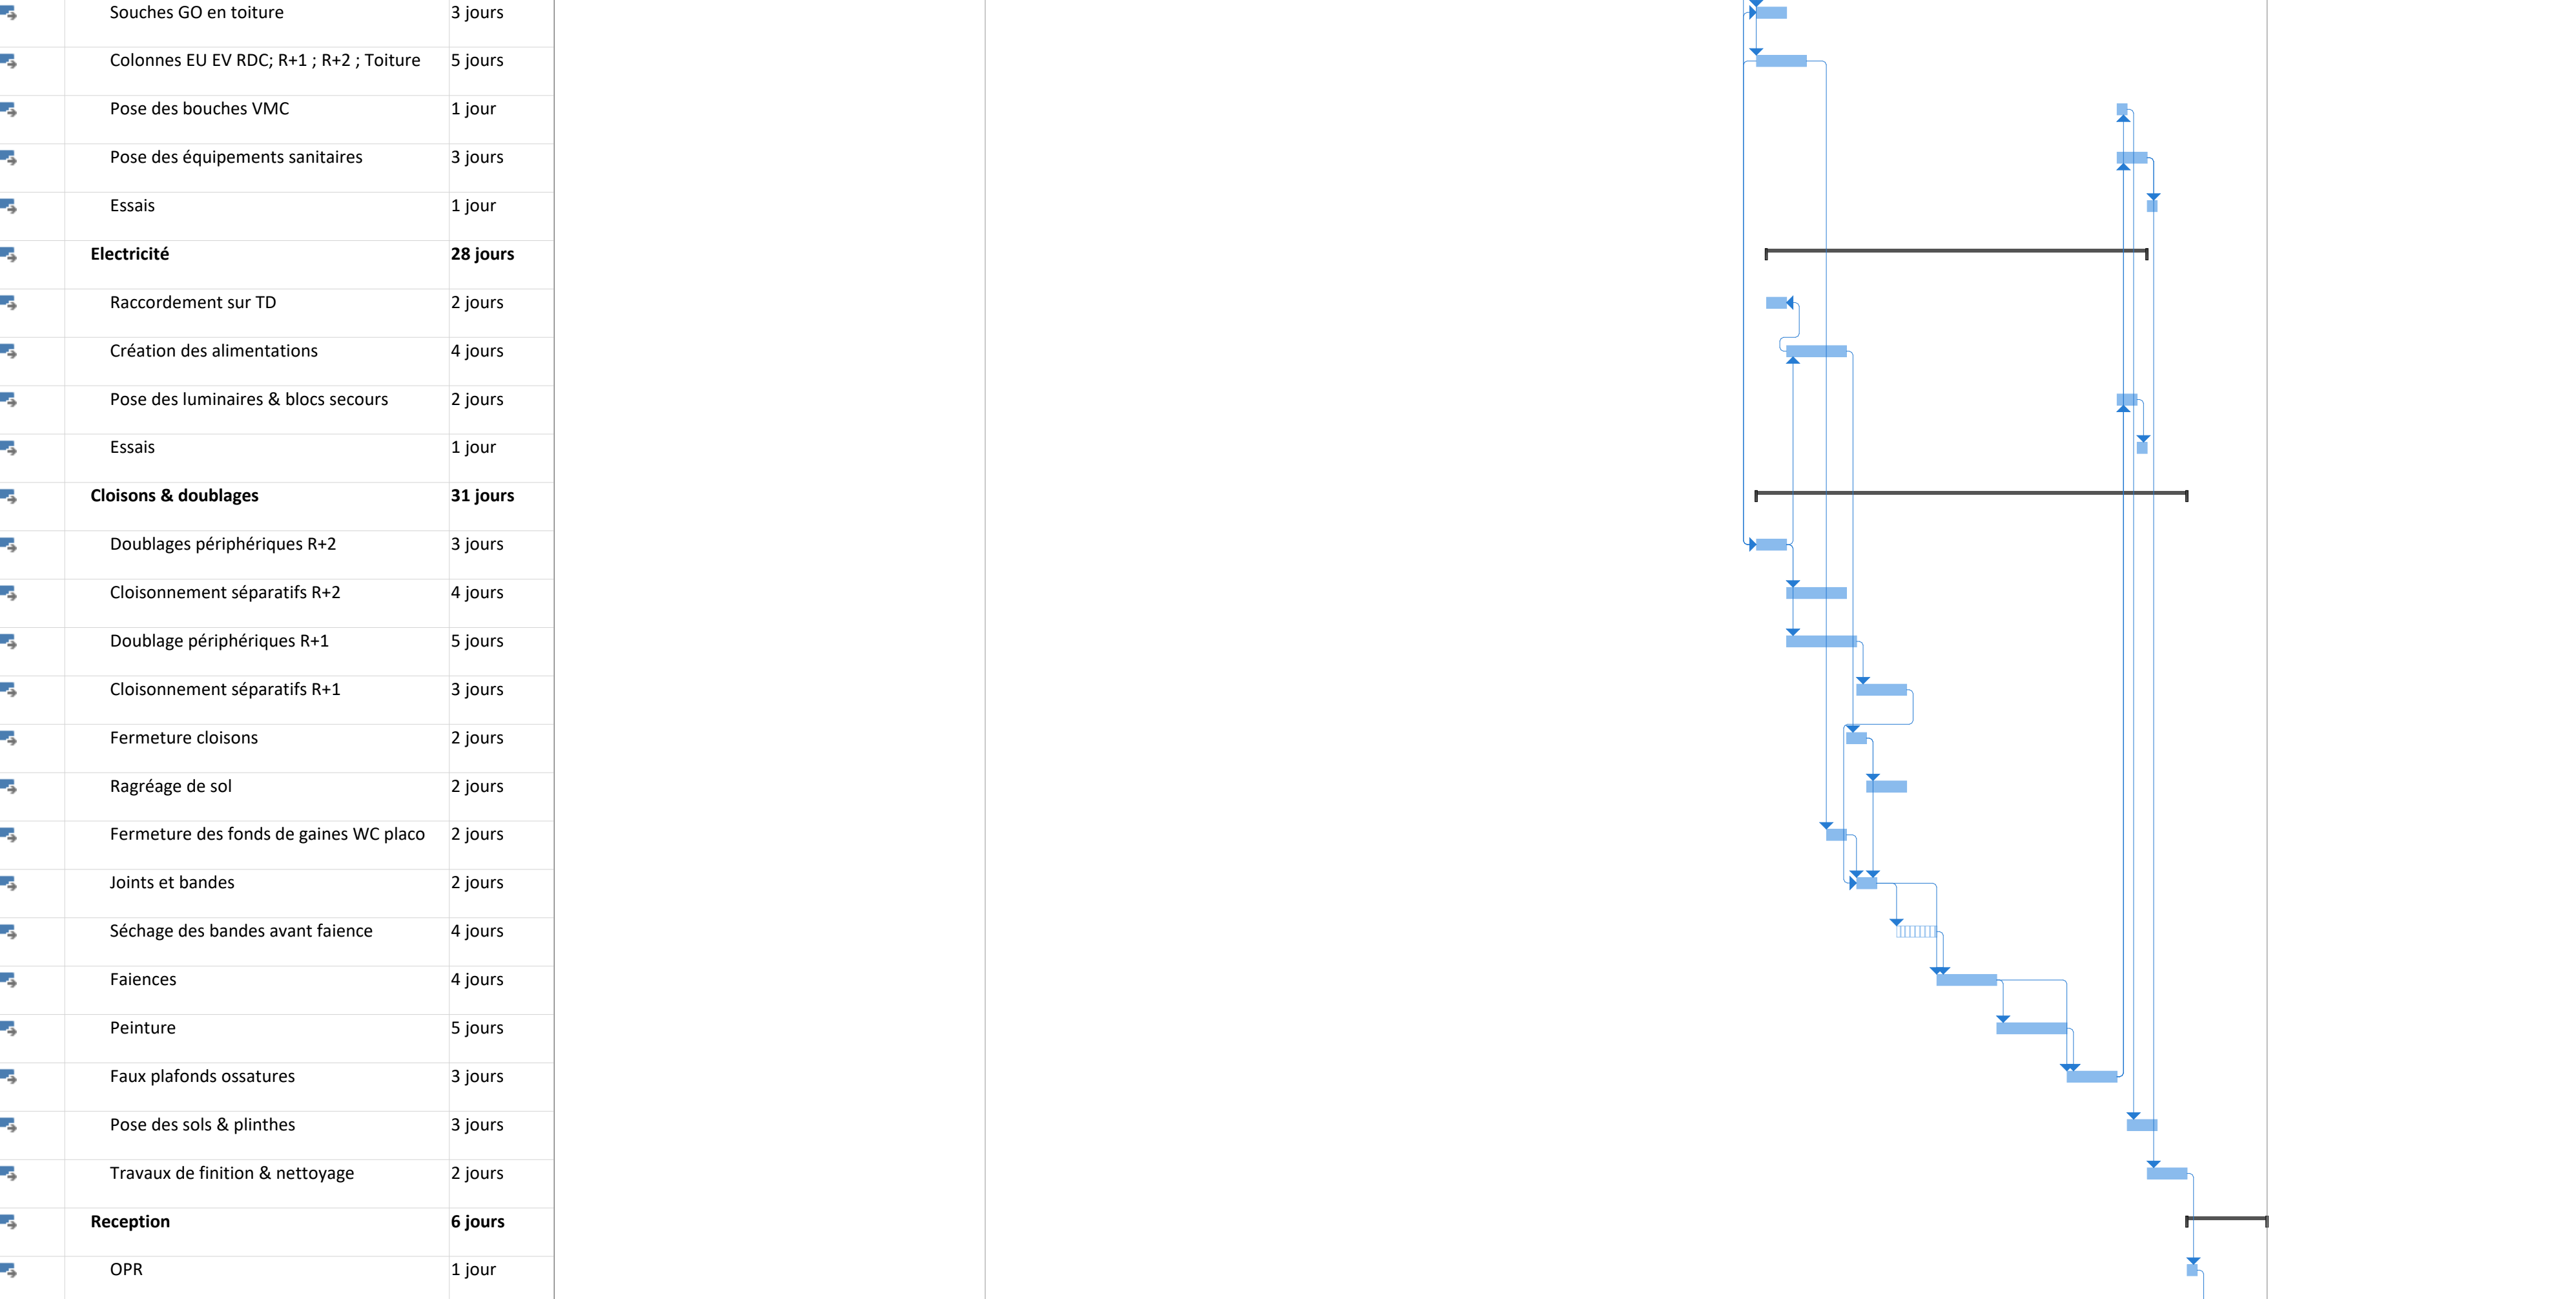


























Page 1

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	2025																							
				Mois -1	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5			Mois 6															
37		Souches GO en toiture	3 jours																								
38		Colonnes EU EV RDC; R+1 ; R+2 ; Toiture	5 jours																								
39		Pose des bouches VMC	1 jour																								
40		Pose des équipements sanitaires	3 jours																								
41		Essais	1 jour																								
42		Electricité	28 jours																								
43		Raccordement sur TD	2 jours																								
44		Création des alimentations	4 jours																								
45		Pose des luminaires & blocs secours	2 jours																								
46		Essais	1 jour																								
47		Cloisons & doublages	31 jours																								
48		Doublages périphériques R+2	3 jours																								
49		Cloisonnement séparatifs R+2	4 jours																								
50		Doublage périphériques R+1	5 jours																								
51		Cloisonnement séparatifs R+1	3 jours																								
52		Fermeture cloisons	2 jours																								
53		Ragréage de sol	2 jours																								
54		Fermeture des fonds de gaines WC placo	2 jours																								
55		Joints et bandes	2 jours																								
56		Séchage des bandes avant faïence	4 jours																								
57		Faïences	4 jours																								
58		Peinture	5 jours																								
59		Faux plafonds ossatures	3 jours																								
60		Pose des sols & plinthes	3 jours																								
61		Travaux de finition & nettoyage	2 jours																								
62		Reception	6 jours																								
63		OPR	1 jour																								
64		Levée de reserves	5 jours													20/05											
