


Libellé	Date de début	Date de fin estimée	Etat
▼ TRX_309 MOPHA Addictologie	09/04/2024	07/03/2026	-
▼ Lancement	15/04/2024	10/05/2024	✓
🚩 Reunion de lancement		30/04/2024	✓
▼ Recueil besoins (Pôle et services support)	06/05/2024	12/07/2024	✓
🚩 Validation besoins		11/07/2024	✓
Consultation de BET	24/06/2024	19/07/2024	✓
Etudes préalables	22/07/2024	20/10/2024	✓
Rédaction DCE HDJ	01/07/2024	12/07/2024	✓
Consultation des entreprises HDJ	22/07/2024	23/08/2024	✓
➤ Travaux HDJ	16/09/2024	15/11/2024	✓
▼ Travaux HTC	29/09/2024	14/09/2025	🔌
Rédaction DCE HC	18/11/2024	13/12/2024	✓
🚩 Publication		07/02/2025	□
▼ Consultation entreprise	07/02/2025	12/05/2025	🔌
🚩 DLRO		14/03/2025	□
Analyse des offres	17/03/2025	30/04/2025	🔌
🚩 Notification titulaire		13/06/2025	□
Préparations	16/06/2025	18/07/2025	🔌
▼ Réalisation travaux	21/07/2025	09/01/2026	🔌
Protections de chantier	21/07/2025	25/07/2025	🔌
Déposes et consignations électriques	28/07/2025	01/08/2025	🔌

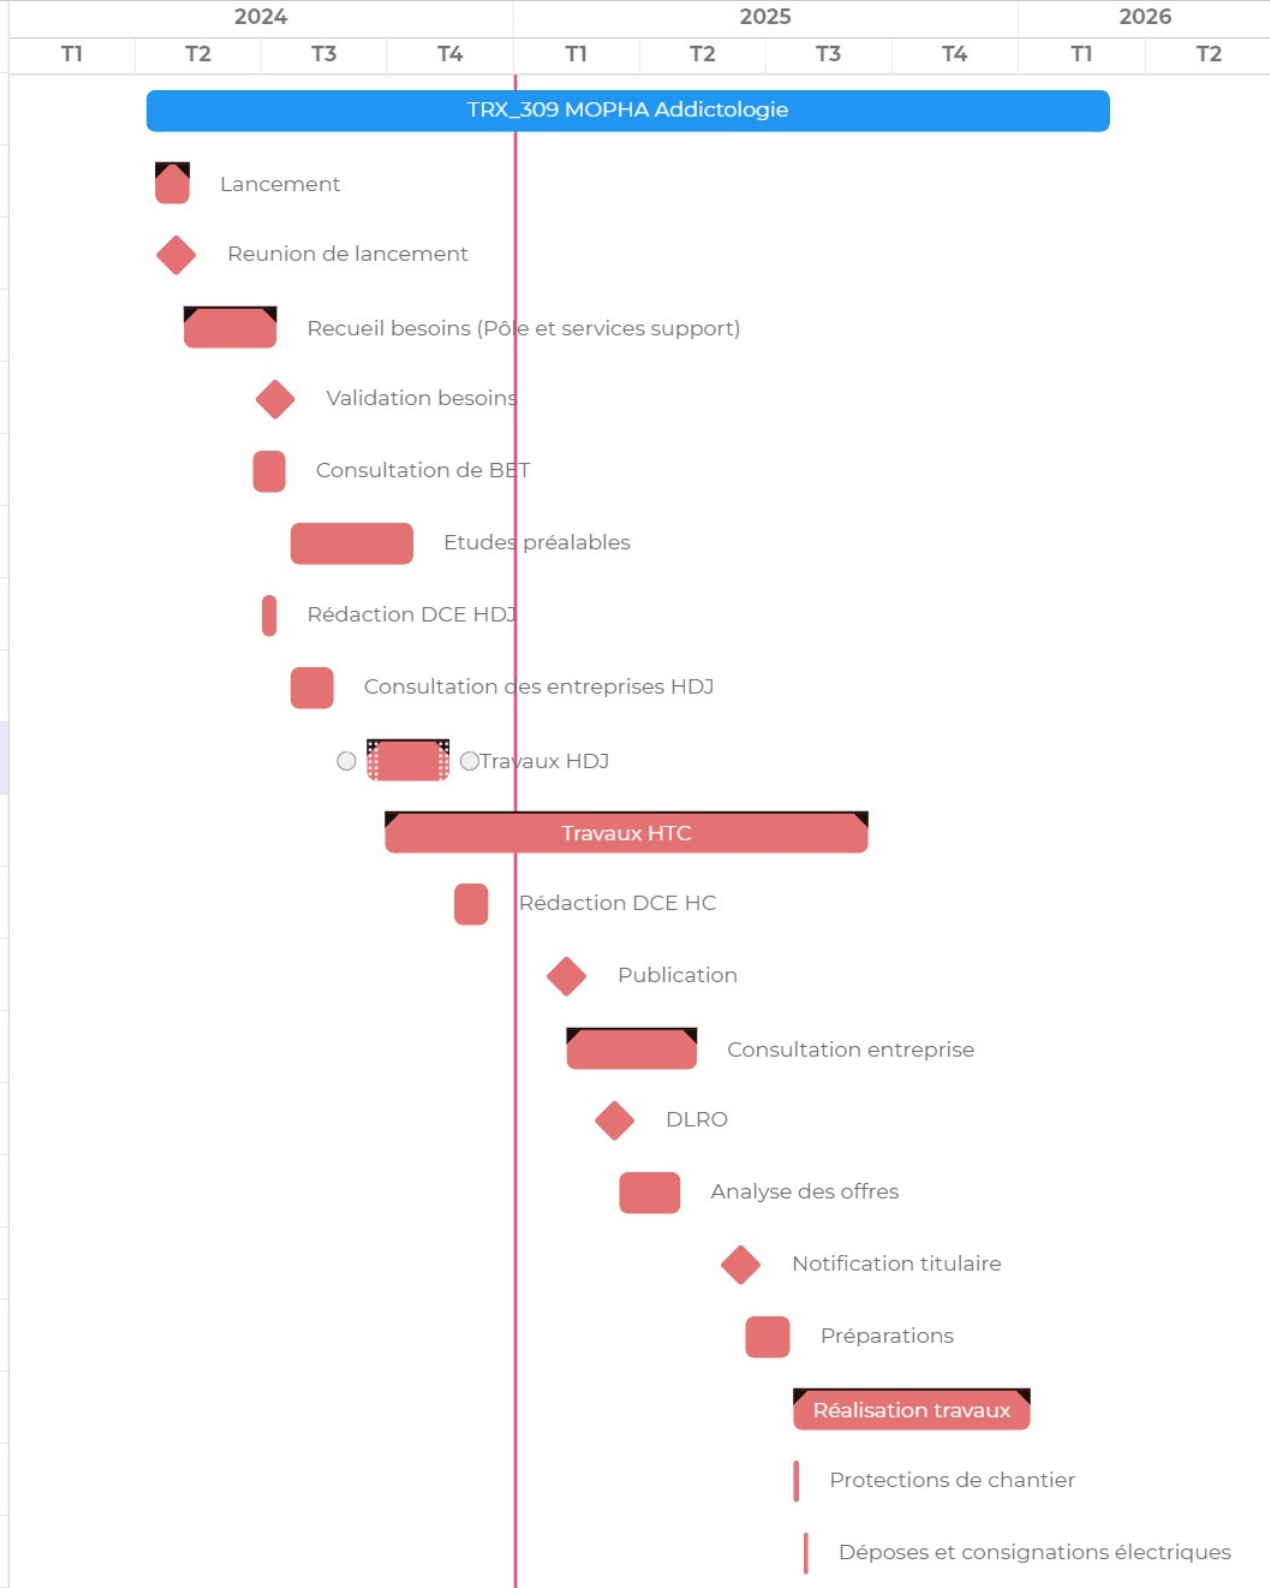

Dépotes et consignations pl	28/07/2025	01/08/2025	🔌
Démolitions	04/08/2025	15/08/2025	🔌
Cloisonnements	25/08/2025	12/09/2025	🔌
Plomberie	18/08/2025	10/10/2025	🔌
Câblages élec	18/08/2025	10/10/2025	🔌
Carrelage/Faïence	15/09/2025	26/09/2025	🔌
Mise en peinture des parois	15/09/2025	10/10/2025	🔌
Ragréage	13/10/2025	15/10/2025	🔌
Appareillages électriques	13/10/2025	31/10/2025	🔌
Modifications appel malades	13/10/2025	31/10/2025	🔌
Modifications SSI	13/10/2025	31/10/2025	🔌
Pose des sols	15/10/2025	23/10/2025	🔌
Appareillage sanitaire	27/10/2025	07/11/2025	🔌
Pose du mobilier d'agencem	27/10/2025	07/11/2025	🔌
Signalétique	27/10/2025	07/11/2025	🔌
Finitions	03/11/2025	05/12/2025	🔌
Nettoyage	24/11/2025	28/11/2025	🔌
🚩 OPR		12/12/2025	□
🚩 PV réception + levée de réserves		31/12/2025	□
🚩 Commission de sécurité		30/01/2026	□
Emménagement	30/01/2026	24/02/2026	🔌

Dépotes et consignations plomberie	
Démolitions	
Cloisonnements	
Plomberie	
Câblages élec	
Carrelage/Faïence	
Mise en peinture des parois	
Ragréage	
Appareillages électriques	
Modifications appel malades	
Modifications SSI	
Pose des sols	
Appareillage sanitaire	
Pose du mobilier d'agencem	
Signalétique	
Finitions	
Nettoyage	
OPR	
PV réception + levée de réserves	
Commission de	
Emménagement	
