



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP=


ANNEXE 02 – planning prévisionnel

MARCHÉ PUBLIC CSPS

**PRESTATIONS DE CSPS PHASES CONCEPTION, ACT ET DET
POUR LES TRAVAUX D'AUGMENTATION DU GABARIT DE
L'ECLUSE D'ABLON-SUR-SEINE**

**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire
aval**

**18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS**

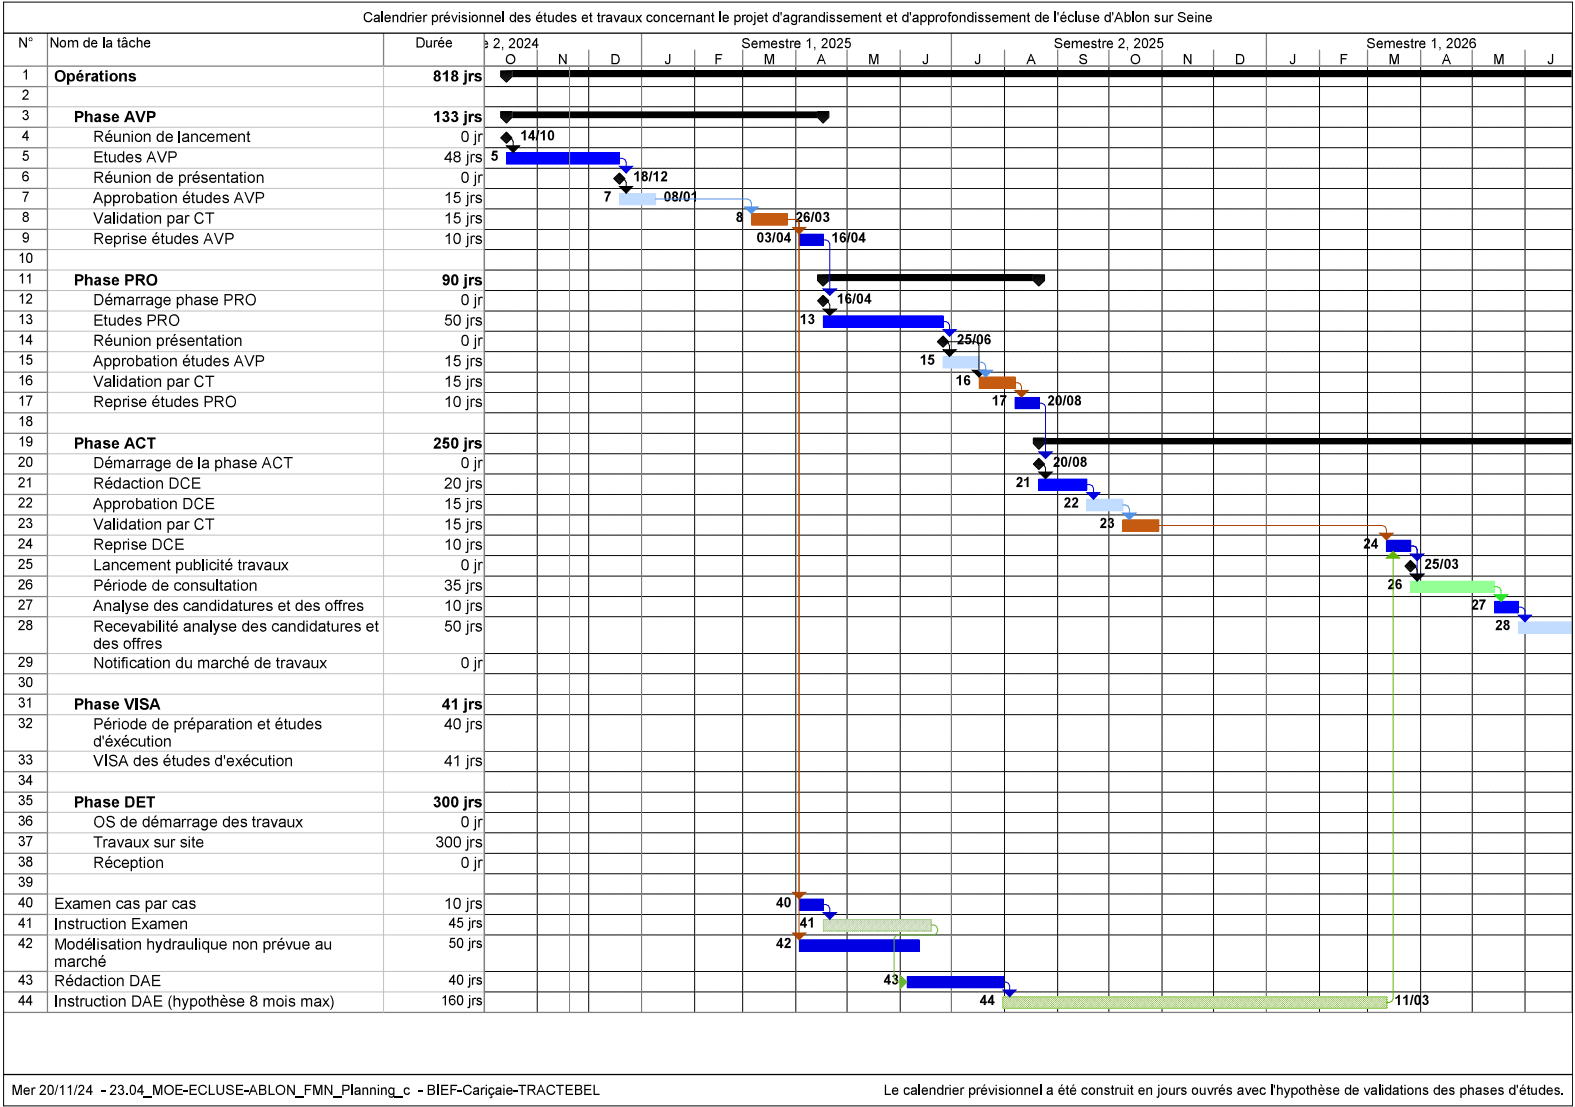

Calendrier prévisionnel des études et travaux concernant le projet d'agrandissement et d'approfondissement de l'écluse d'Ablon sur Seine																			
N°	Nom de la tâche	Durée	J	J	A	Semestre 2, 2026				J	F	Semestre 1, 2027				Semestre 2, 2027			
			S	O	N	D						M	A	M	J	J	A	S	O
1	Opérations	818 jrs																	
2																			
3	Phase AVP	133 jrs																	
4	Réunion de lancement	0 jr																	
5	Etudes AVP	48 jrs																	
6	Réunion de présentation	0 jr																	
7	Approbation études AVP	15 jrs																	
8	Validation par CT	15 jrs																	
9	Reprise études AVP	10 jrs																	
10																			
11	Phase PRO	90 jrs																	
12	Démarrage phase PRO	0 jr																	
13	Etudes PRO	50 jrs																	
14	Réunion présentation	0 jr																	
15	Approbation études AVP	15 jrs																	
16	Validation par CT	15 jrs																	
17	Reprise études PRO	10 jrs																	
18																			
19	Phase ACT	250 jrs																	
20	Démarrage de la phase ACT	0 jr																	
21	Rédaction DCE	20 jrs																	
22	Approbation DCE	15 jrs																	
23	Validation par CT	15 jrs																	
24	Reprise DCE	10 jrs																	
25	Lancement publicité travaux	0 jr																	
26	Période de consultation	35 jrs																	
27	Analyse des candidatures et des offres	10 jrs																	
28	Recevabilité analyse des candidatures et des offres	50 jrs																	
29	Notification du marché de travaux	0 jr																	
30																			
31	Phase VISA	41 jrs																	
32	Période de préparation et études d'exécution	40 jrs																	
33	VISA des études d'exécution	41 jrs																	
34																			
35	Phase DET	300 jrs																	
36	OS de démarrage des travaux	0 jr																	
37	Travaux sur site	300 jrs																	
38	Réception	0 jr																	
39																			
40	Examen cas par cas	10 jrs																	
41	Instruction Examen	45 jrs																	
42	Modélisation hydraulique non prévue au marché	50 jrs																	
43	Rédaction DAE	40 jrs																	
44	Instruction DAE (hypothèse 8 mois max)	160 jrs																	
