

Maitre de l'ouvrage

UNIVERSITE DE BORDEAUX

35, PLACE Pey-Berland

33076 BORDEAUX Cedex



**AMENAGEMENT DU PLATEAU RMSB ET INCIA
ZONE NORD IBIO
CAMPUS CARREIRE
146 Rue Léo Saignat
33000 BORDEAUX
INSTALLATIONS DE CHANTIER – Ind 1**

BUREAU D'ETUDES :

Date : Juillet 2024



10 Allée Jean DUBUFFET

33 130 BEGLES

Tel : 05 57 59 28 90

@ : secretariat@math-ingenierie.fr

ZONE PONCTUELLE
DE LIVRAISON

BATIMENT IBIO
NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX

DESSERTE A
MATERIAUX A
L'ETAGE

ZONE DE TRAVAUX
EN R+1 DU BATIMENT

ACCES POMPIER CONSERVE
DURANT LES TRAVAUX

BENNES A DECHETS


Distance : 8m des bâtiments

An aerial photograph of a large parking lot filled with various cars. In the background, there are several buildings, including a large, ornate stone building and a modern glass-fronted building. A specific area in the foreground is outlined with a dashed orange line, indicating a designated zone. A white text box with orange text is overlaid on this area.

**ZONE PONCTUELLEMENT DEDIEE AUX
LIVRAISONS DE MATERIEL**

PRINCIPE DESSERTE A MATERIAUX

Desserte à matériaux installée en façade du bâtiment :

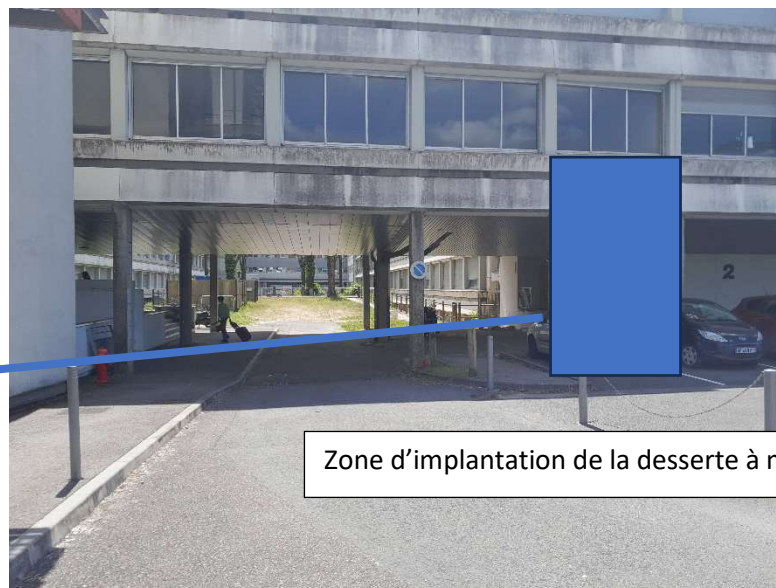


Zone d'implantation de la desserte à matériaux

La desserte sera mise en œuvre à la hauteur de l'allège de la baie vitrée, l'allège servant de garde-corps pour les ouvriers qui déchargeront depuis l'intérieur.

La baie vitrée aura été préalablement déposée. L'ouverture sera sécurisée en dehors des périodes de livraison par la mise en œuvre d'un panneau OSB sur toute l'ouverture. Le panneau OSB sera chevillé dans les poteaux béton de part et d'autre de la baie vitrée.

Un affichage « **ZONE DE LIVRAISON, NE PAS ENCOMBRER** » sera mis en œuvre sur le panneau côté intérieur.

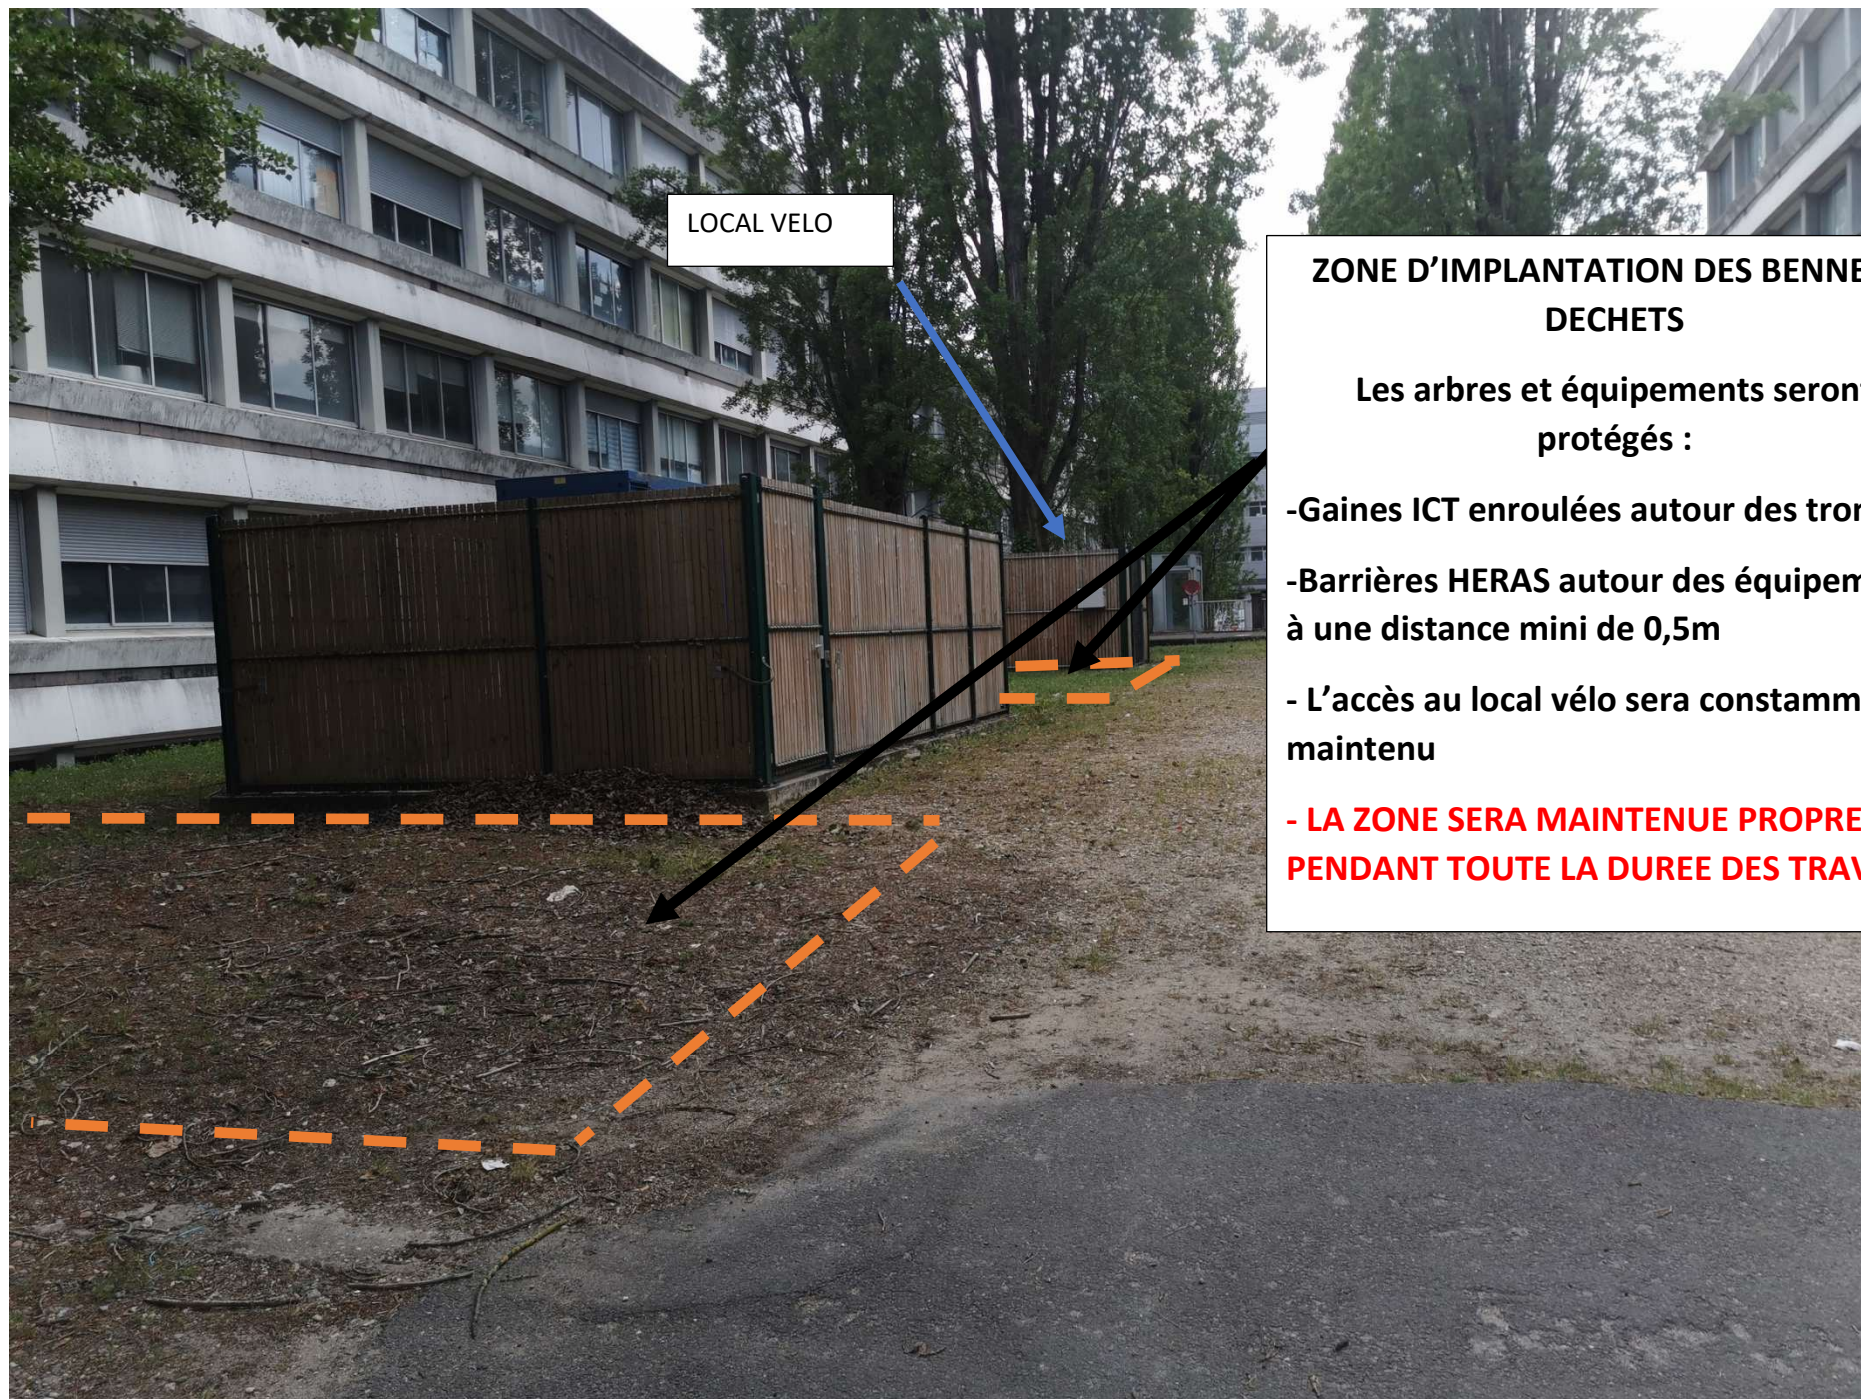

LOCAL VELO

ZONE D'IMPLANTATION DES BENNES A DECHETS

Les arbres et équipements seront
protégés :

- Gaines ICT enroulées autour des troncs
- Barrières HERAS autour des équipements
à une distance mini de 0,5m
- L'accès au local vélo sera constamment
maintenu
- **LA ZONE SERA MAINTENUE PROPRE
PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX**
