

20/12/2024



Schéma Directeur Équipements Sûreté

Phasage
travaux

LOUVRE

Phasage travaux :

- mars 2026-> juin 2026 : Réseaux en sous-sol Richelieu + Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie PCC + Locaux techniques	4 mois
- juillet 2026 -> juin 2027 : Réseaux en sous-sol Richelieu+ Serveurs 1 et 2 + PCC Mollien N2 + base-vie + Locaux techniques + Richelieu + Rohan	12 mois
- juillet 2027 -> aout 2027 : Richelieu + Rohan + C2RMF	2 mois
- septembre 2027 -> décembre 2027: Richelieu + Rohan + C2RMF + PCZ Richelieu + Locaux techniques	4 mois
- janvier 2028 -> mars 2029 : Denon + PCZ Denon + Locaux techniques	15 mois
- avril 2029 -> mars 2030: Flore + Lemonnier + Annexes + Tuileries + PCZ Lemonnier + Locaux techniques	12 mois
- avril 2030 -> mars 2031: Napoléon + PCZ Napoléon + Locaux techniques	12 mois
- octobre 2031 -> février 2033: Sully + PCZ Sully + Locaux techniques	16 mois

Lot 1 : Réseaux – Systèmes finaux

Lot 2 : PCC / PCZ / Locaux techniques

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

3

4 mois


6

Serveur 1

Réseaux
Rb - S1 - S2

Serveur 2

PCC N2
Base-vie N3

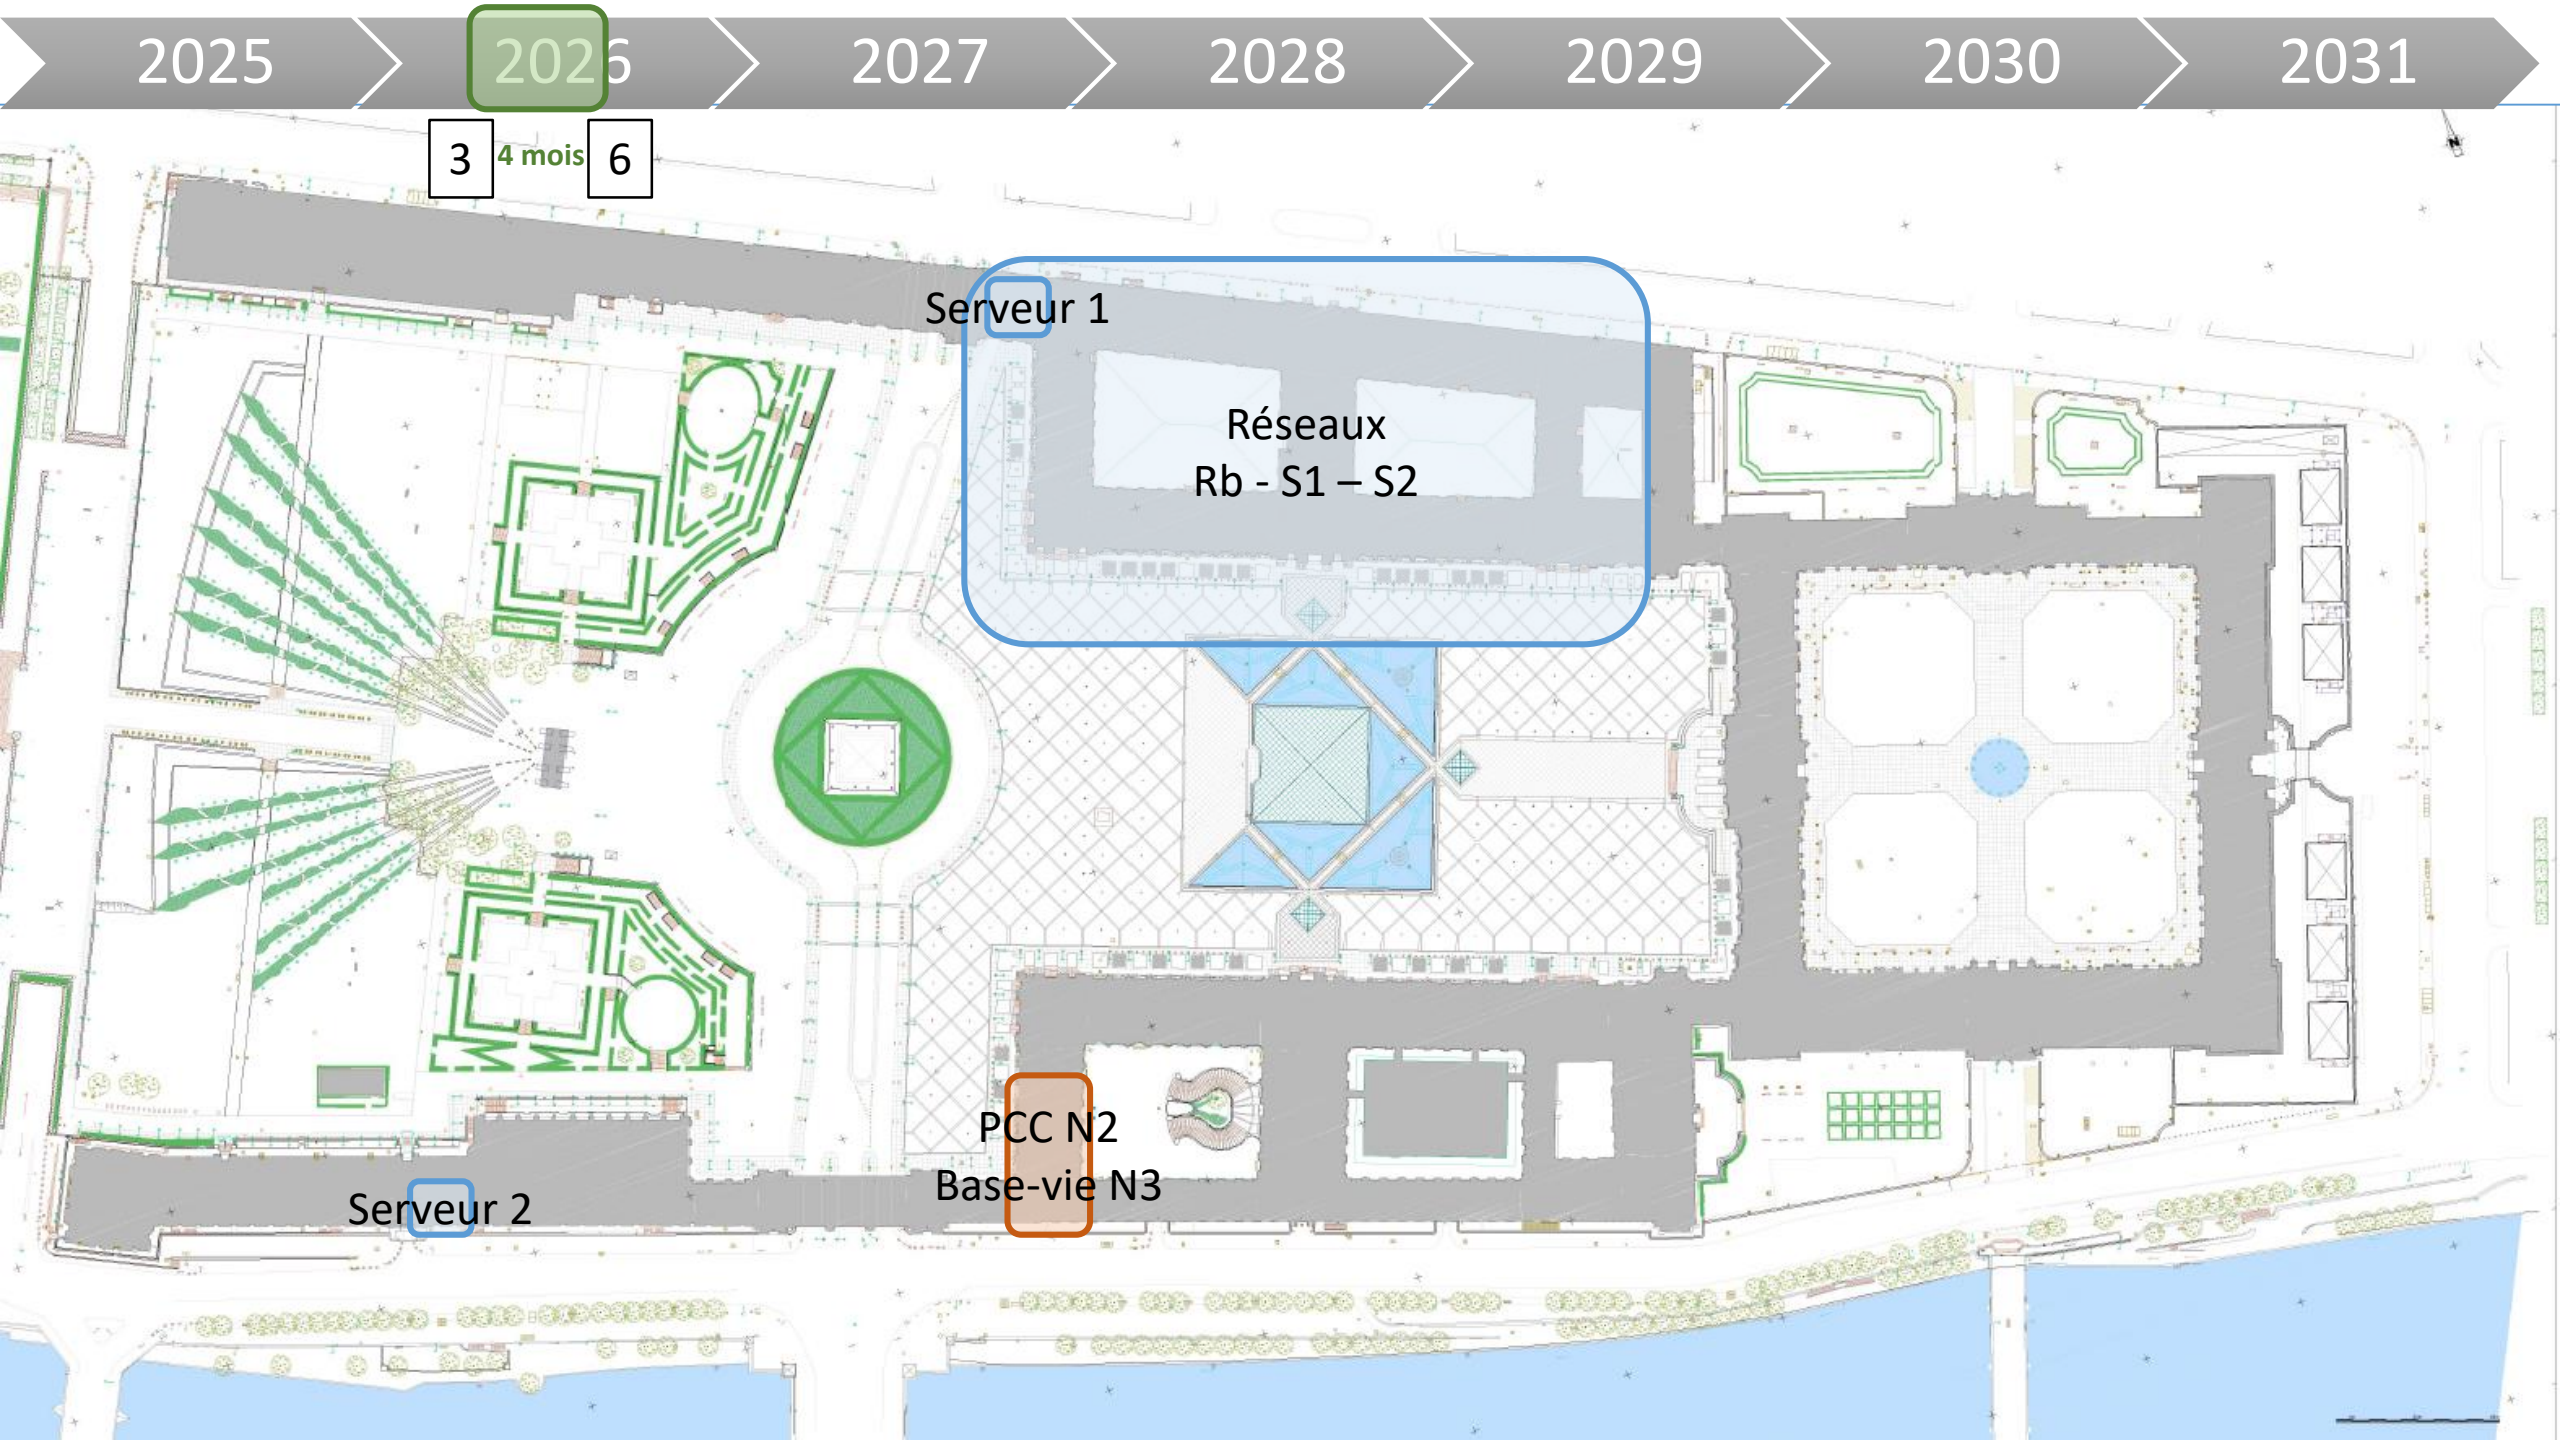

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

7

12 mois

6

Serveur 1

Richelieu / Rohan
Réseaux
Rb - S1 - S2

Serveur 2

PCC
Base-vie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031


7

8

2 mois

Richelieu / Rohan

C2RMF

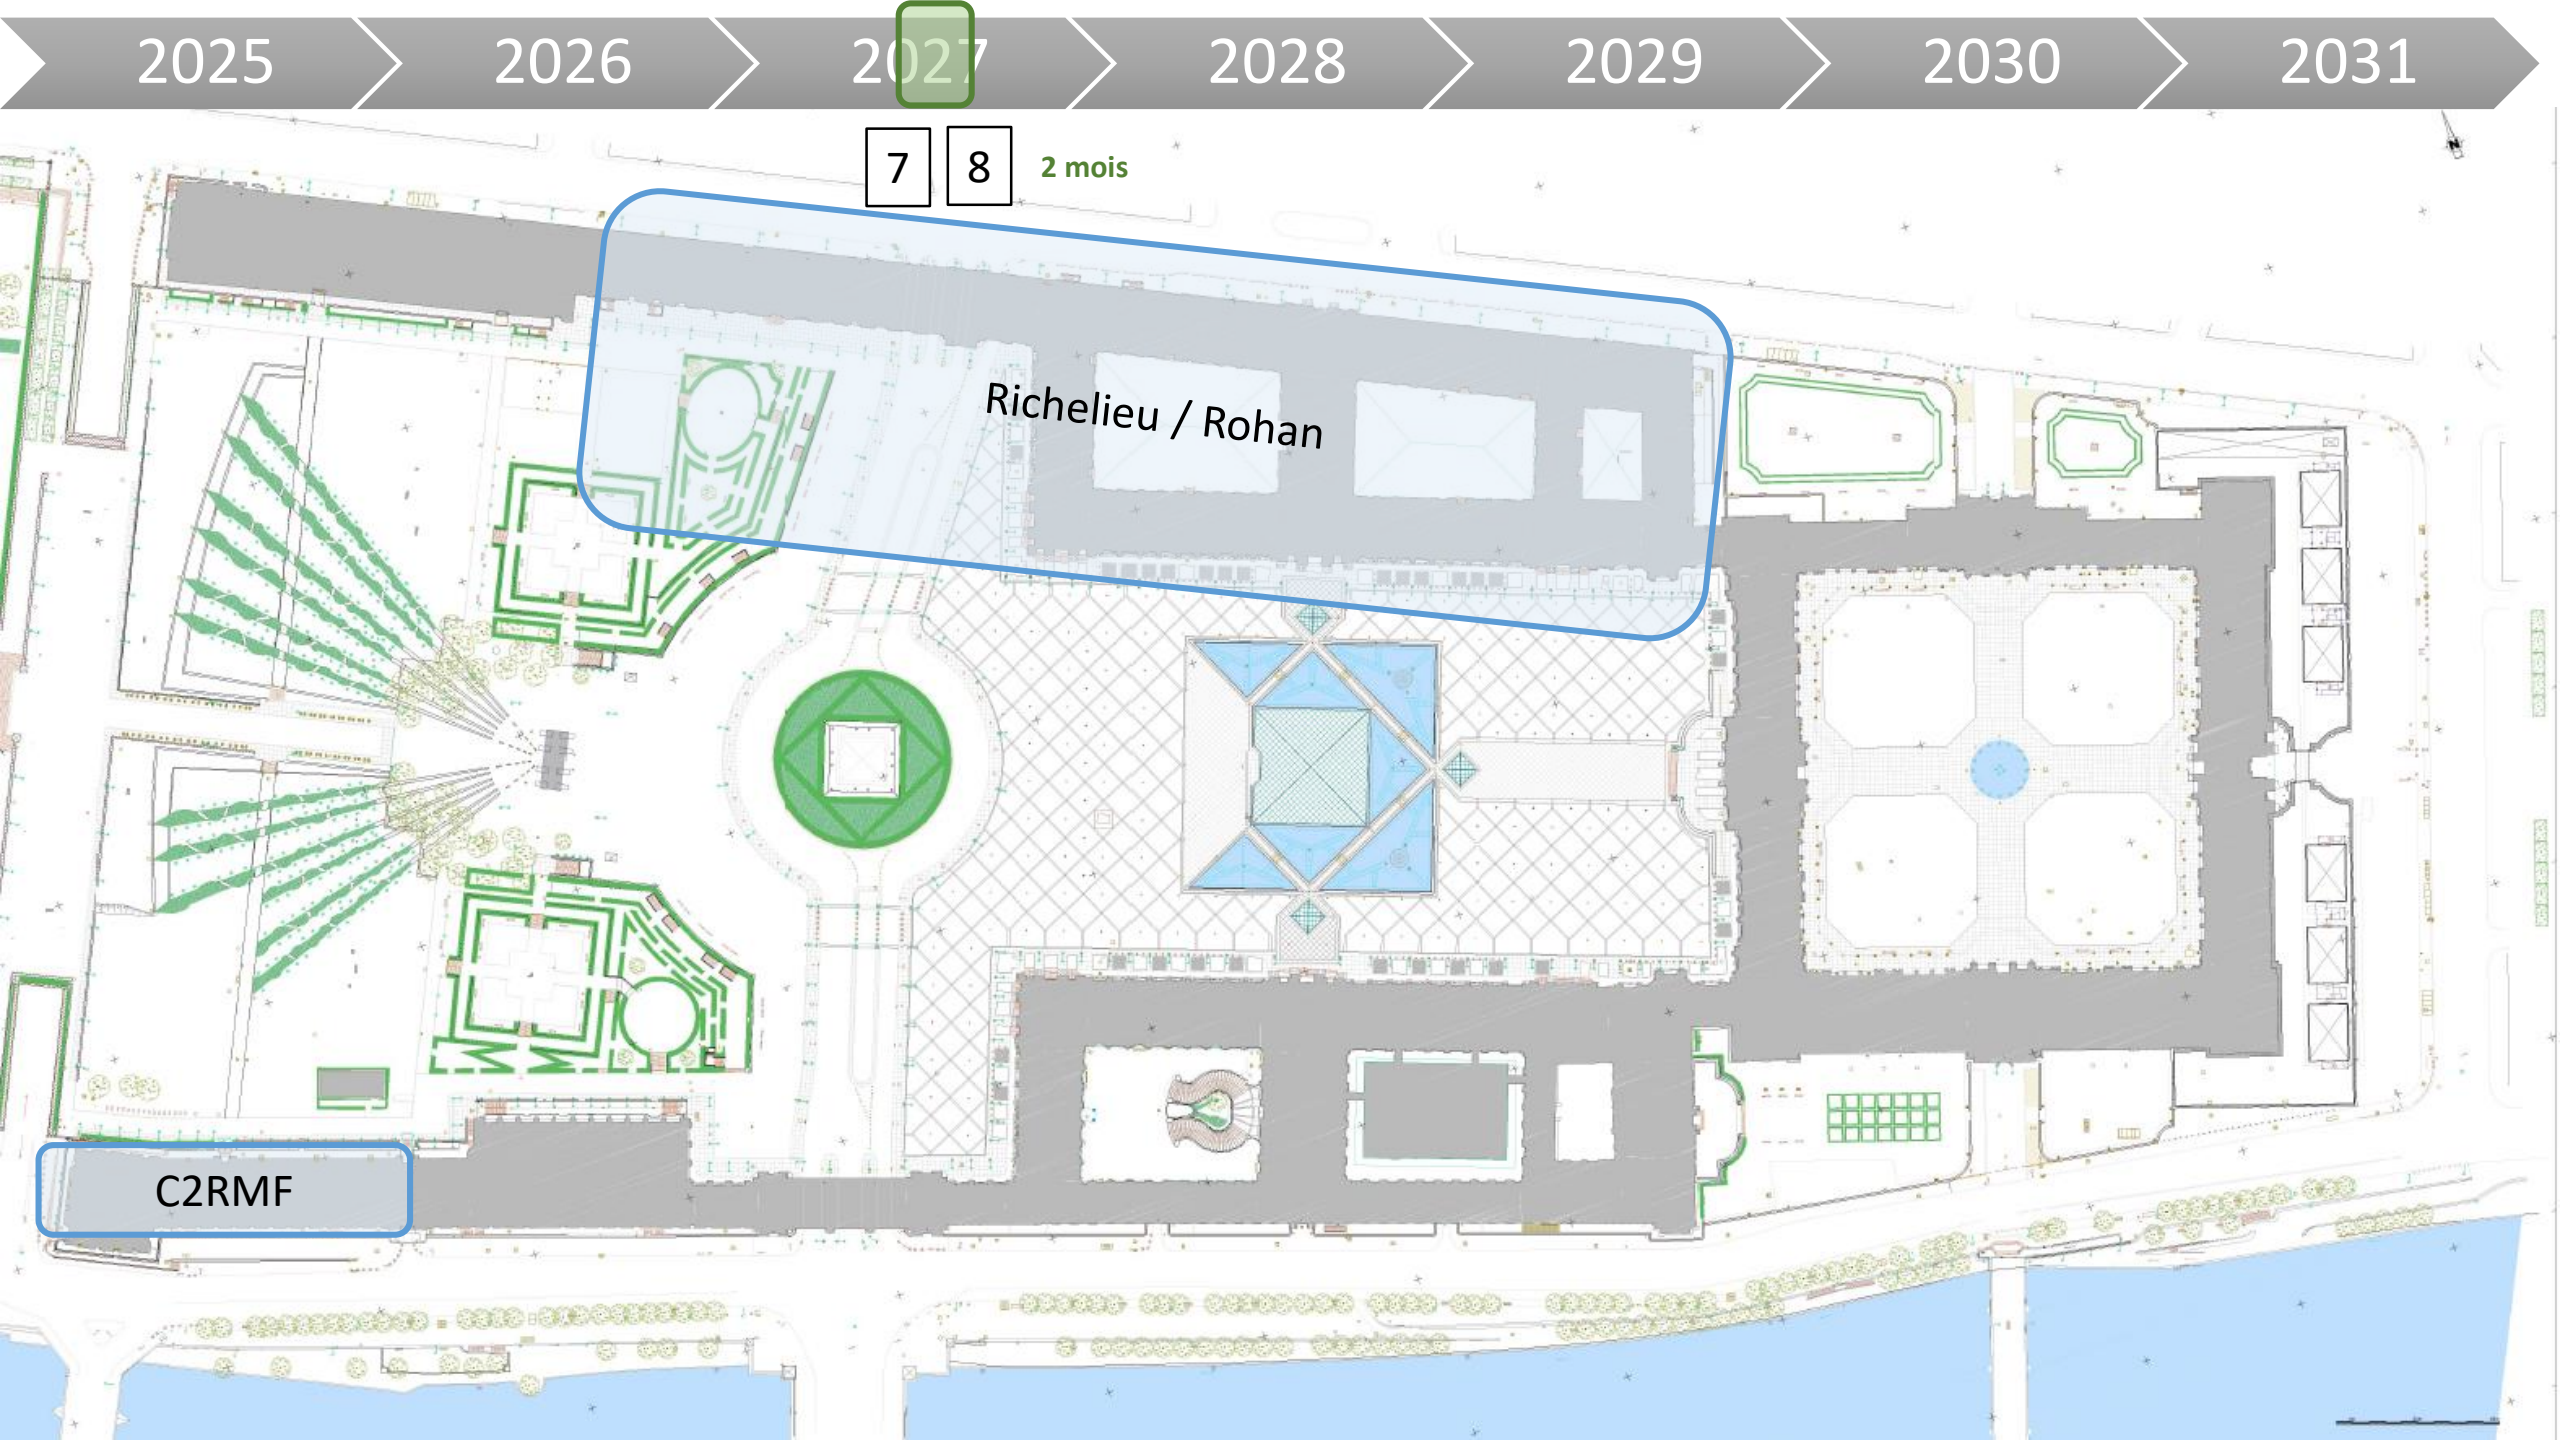

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

9

12


4 mois

PCZ

Richelieu

Richelieu / Rohan

C2RMF

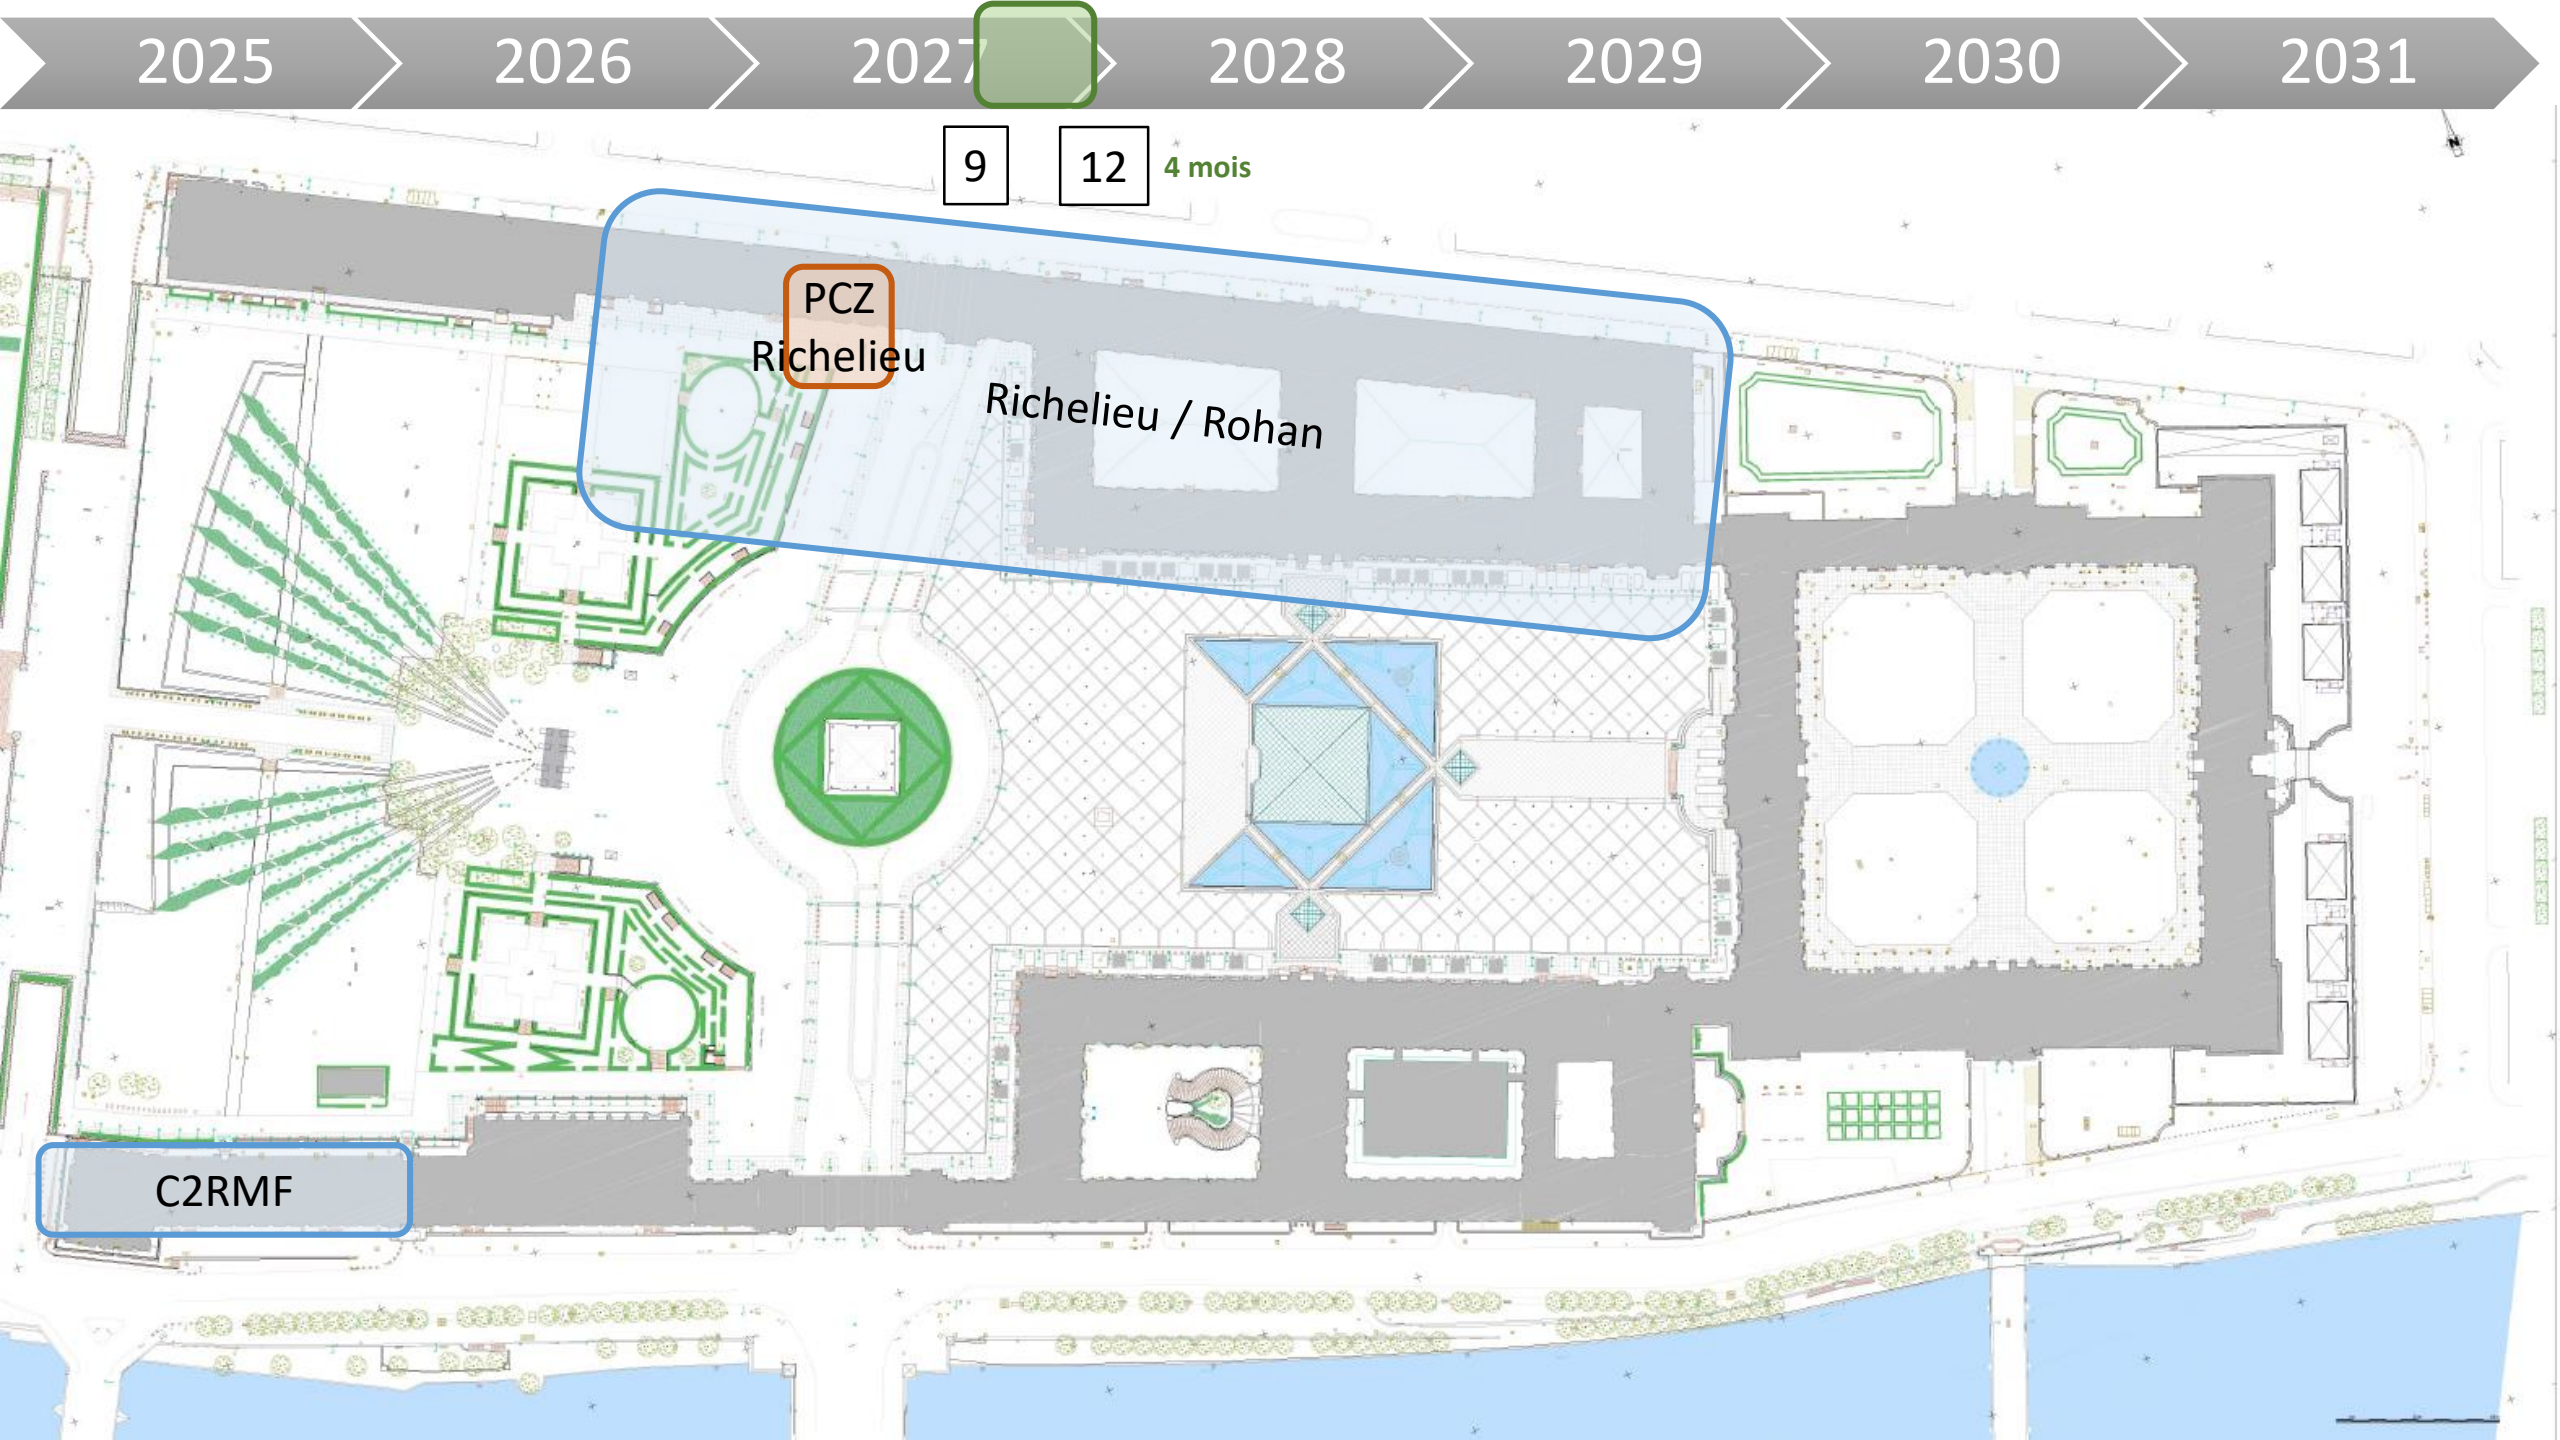

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031


1


15 mois

3

Denon

PCZ
Denon

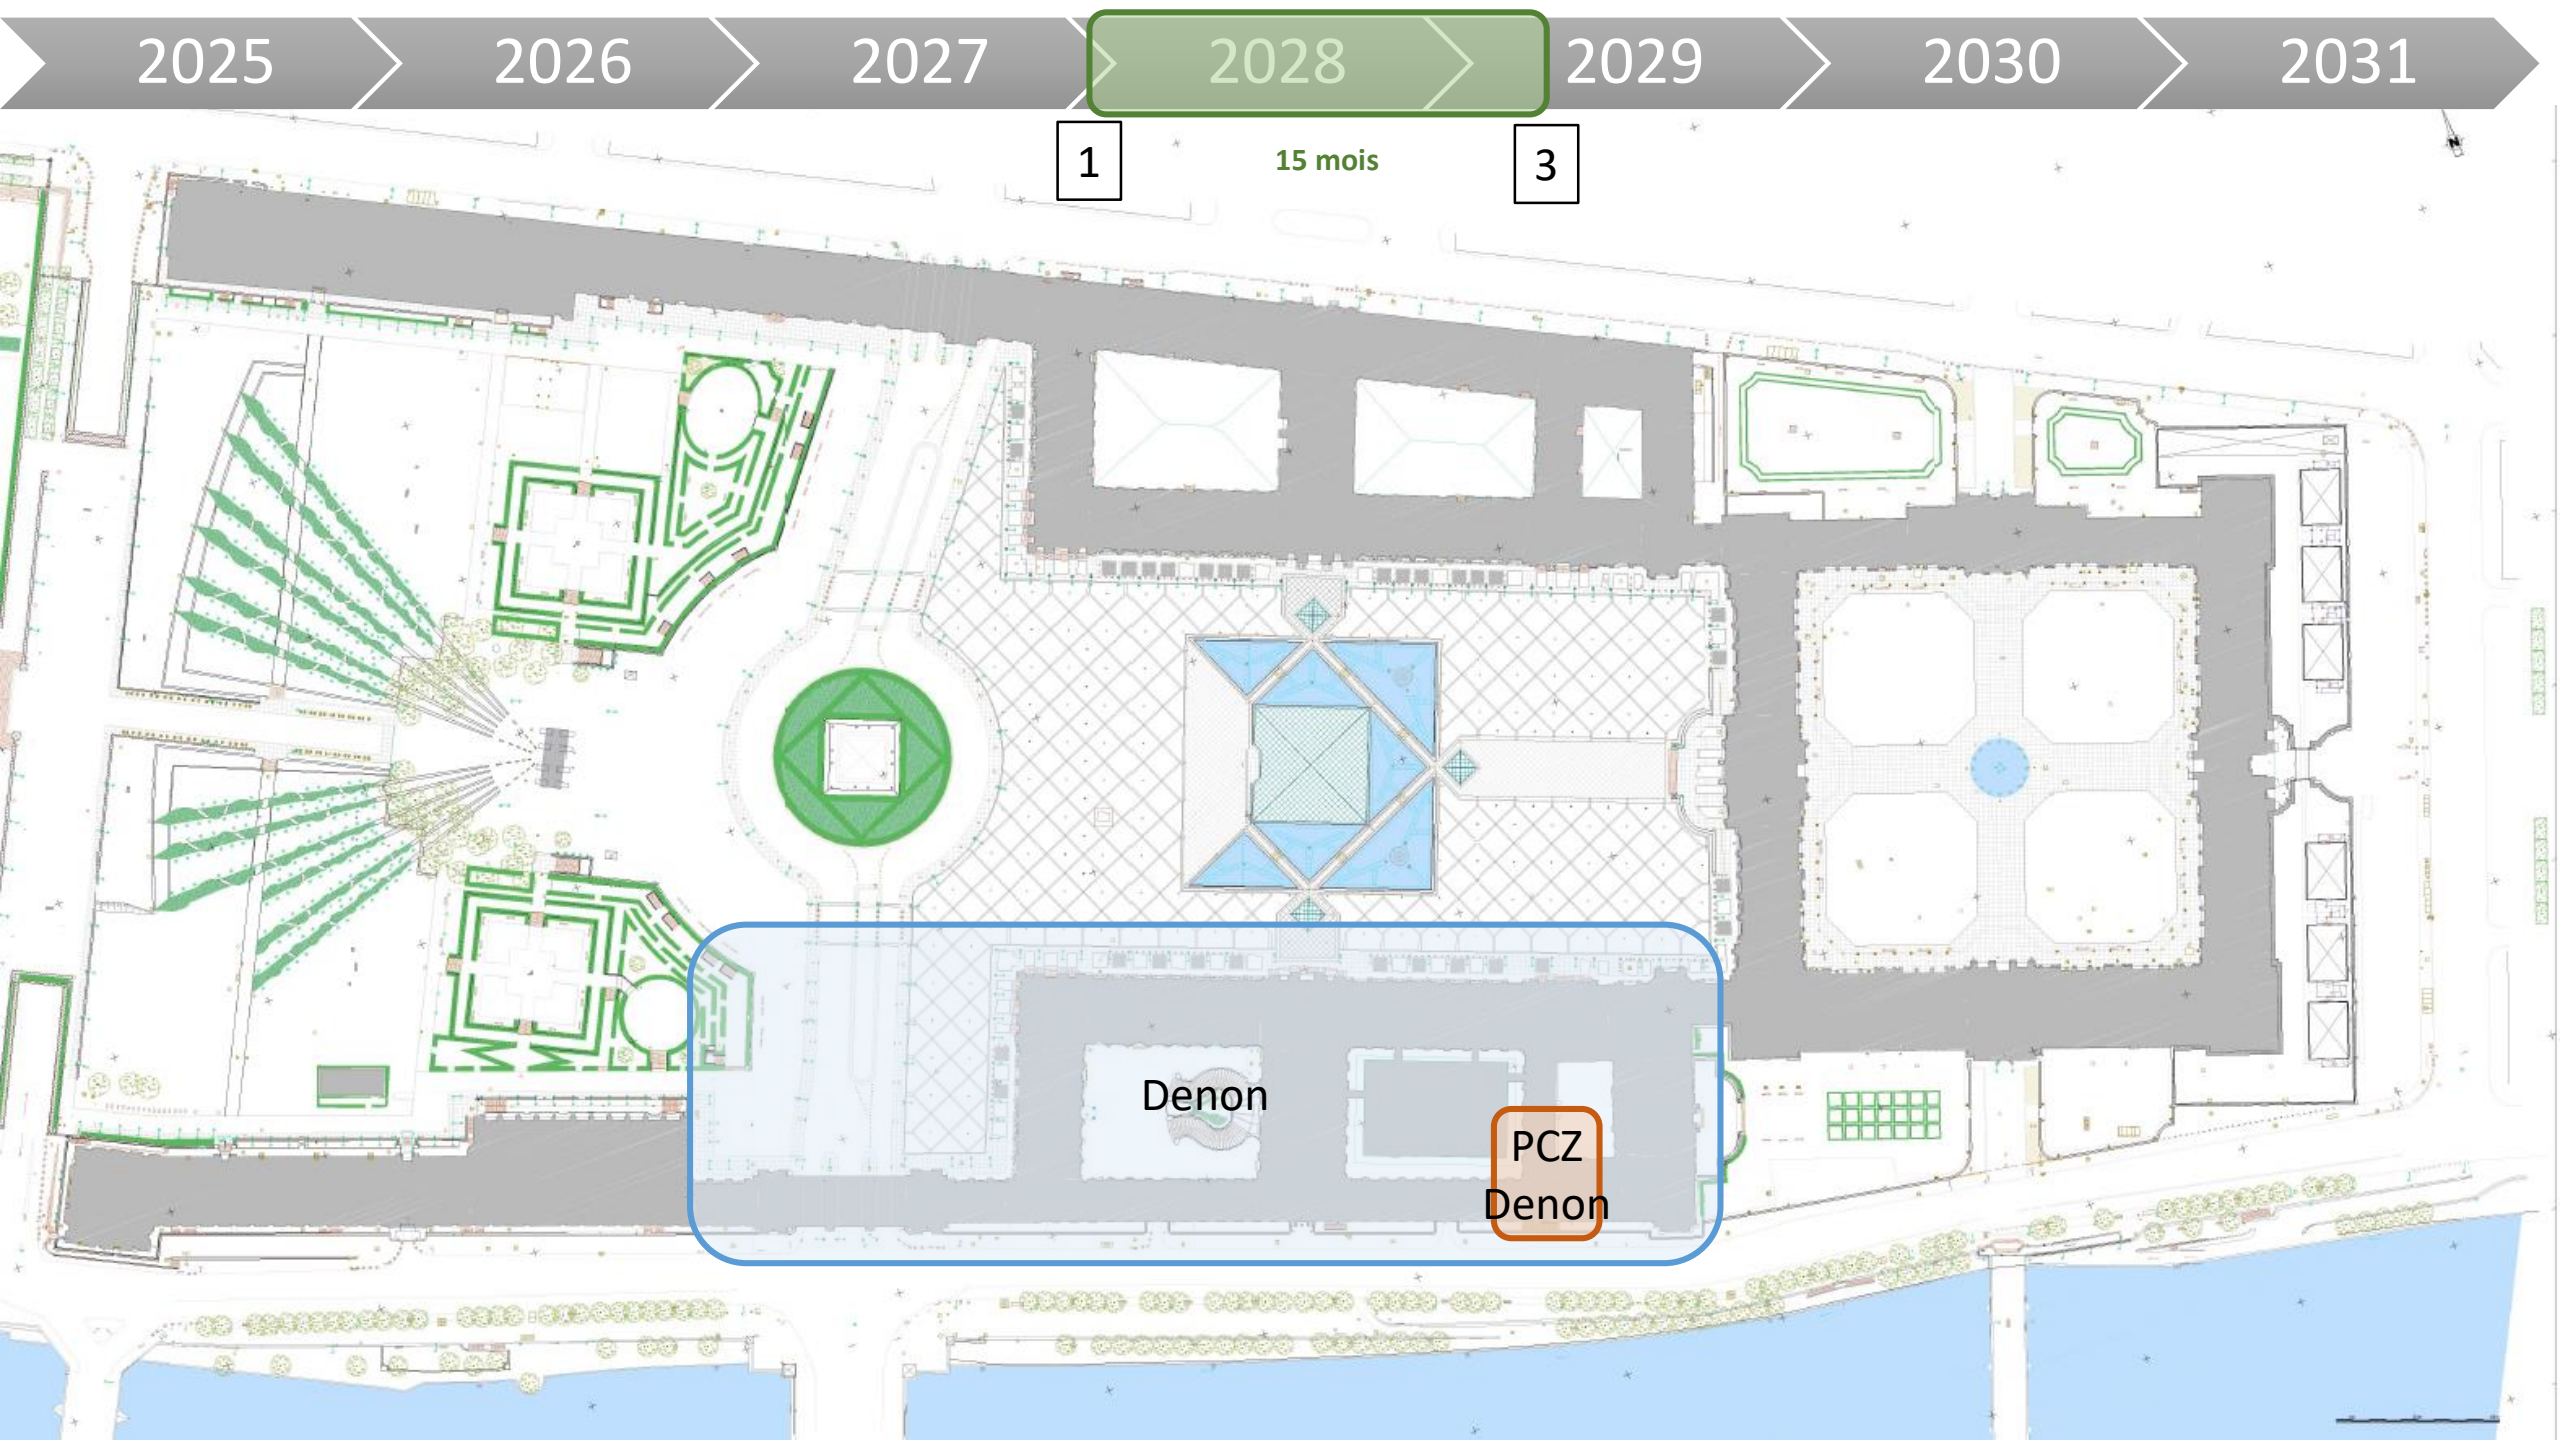

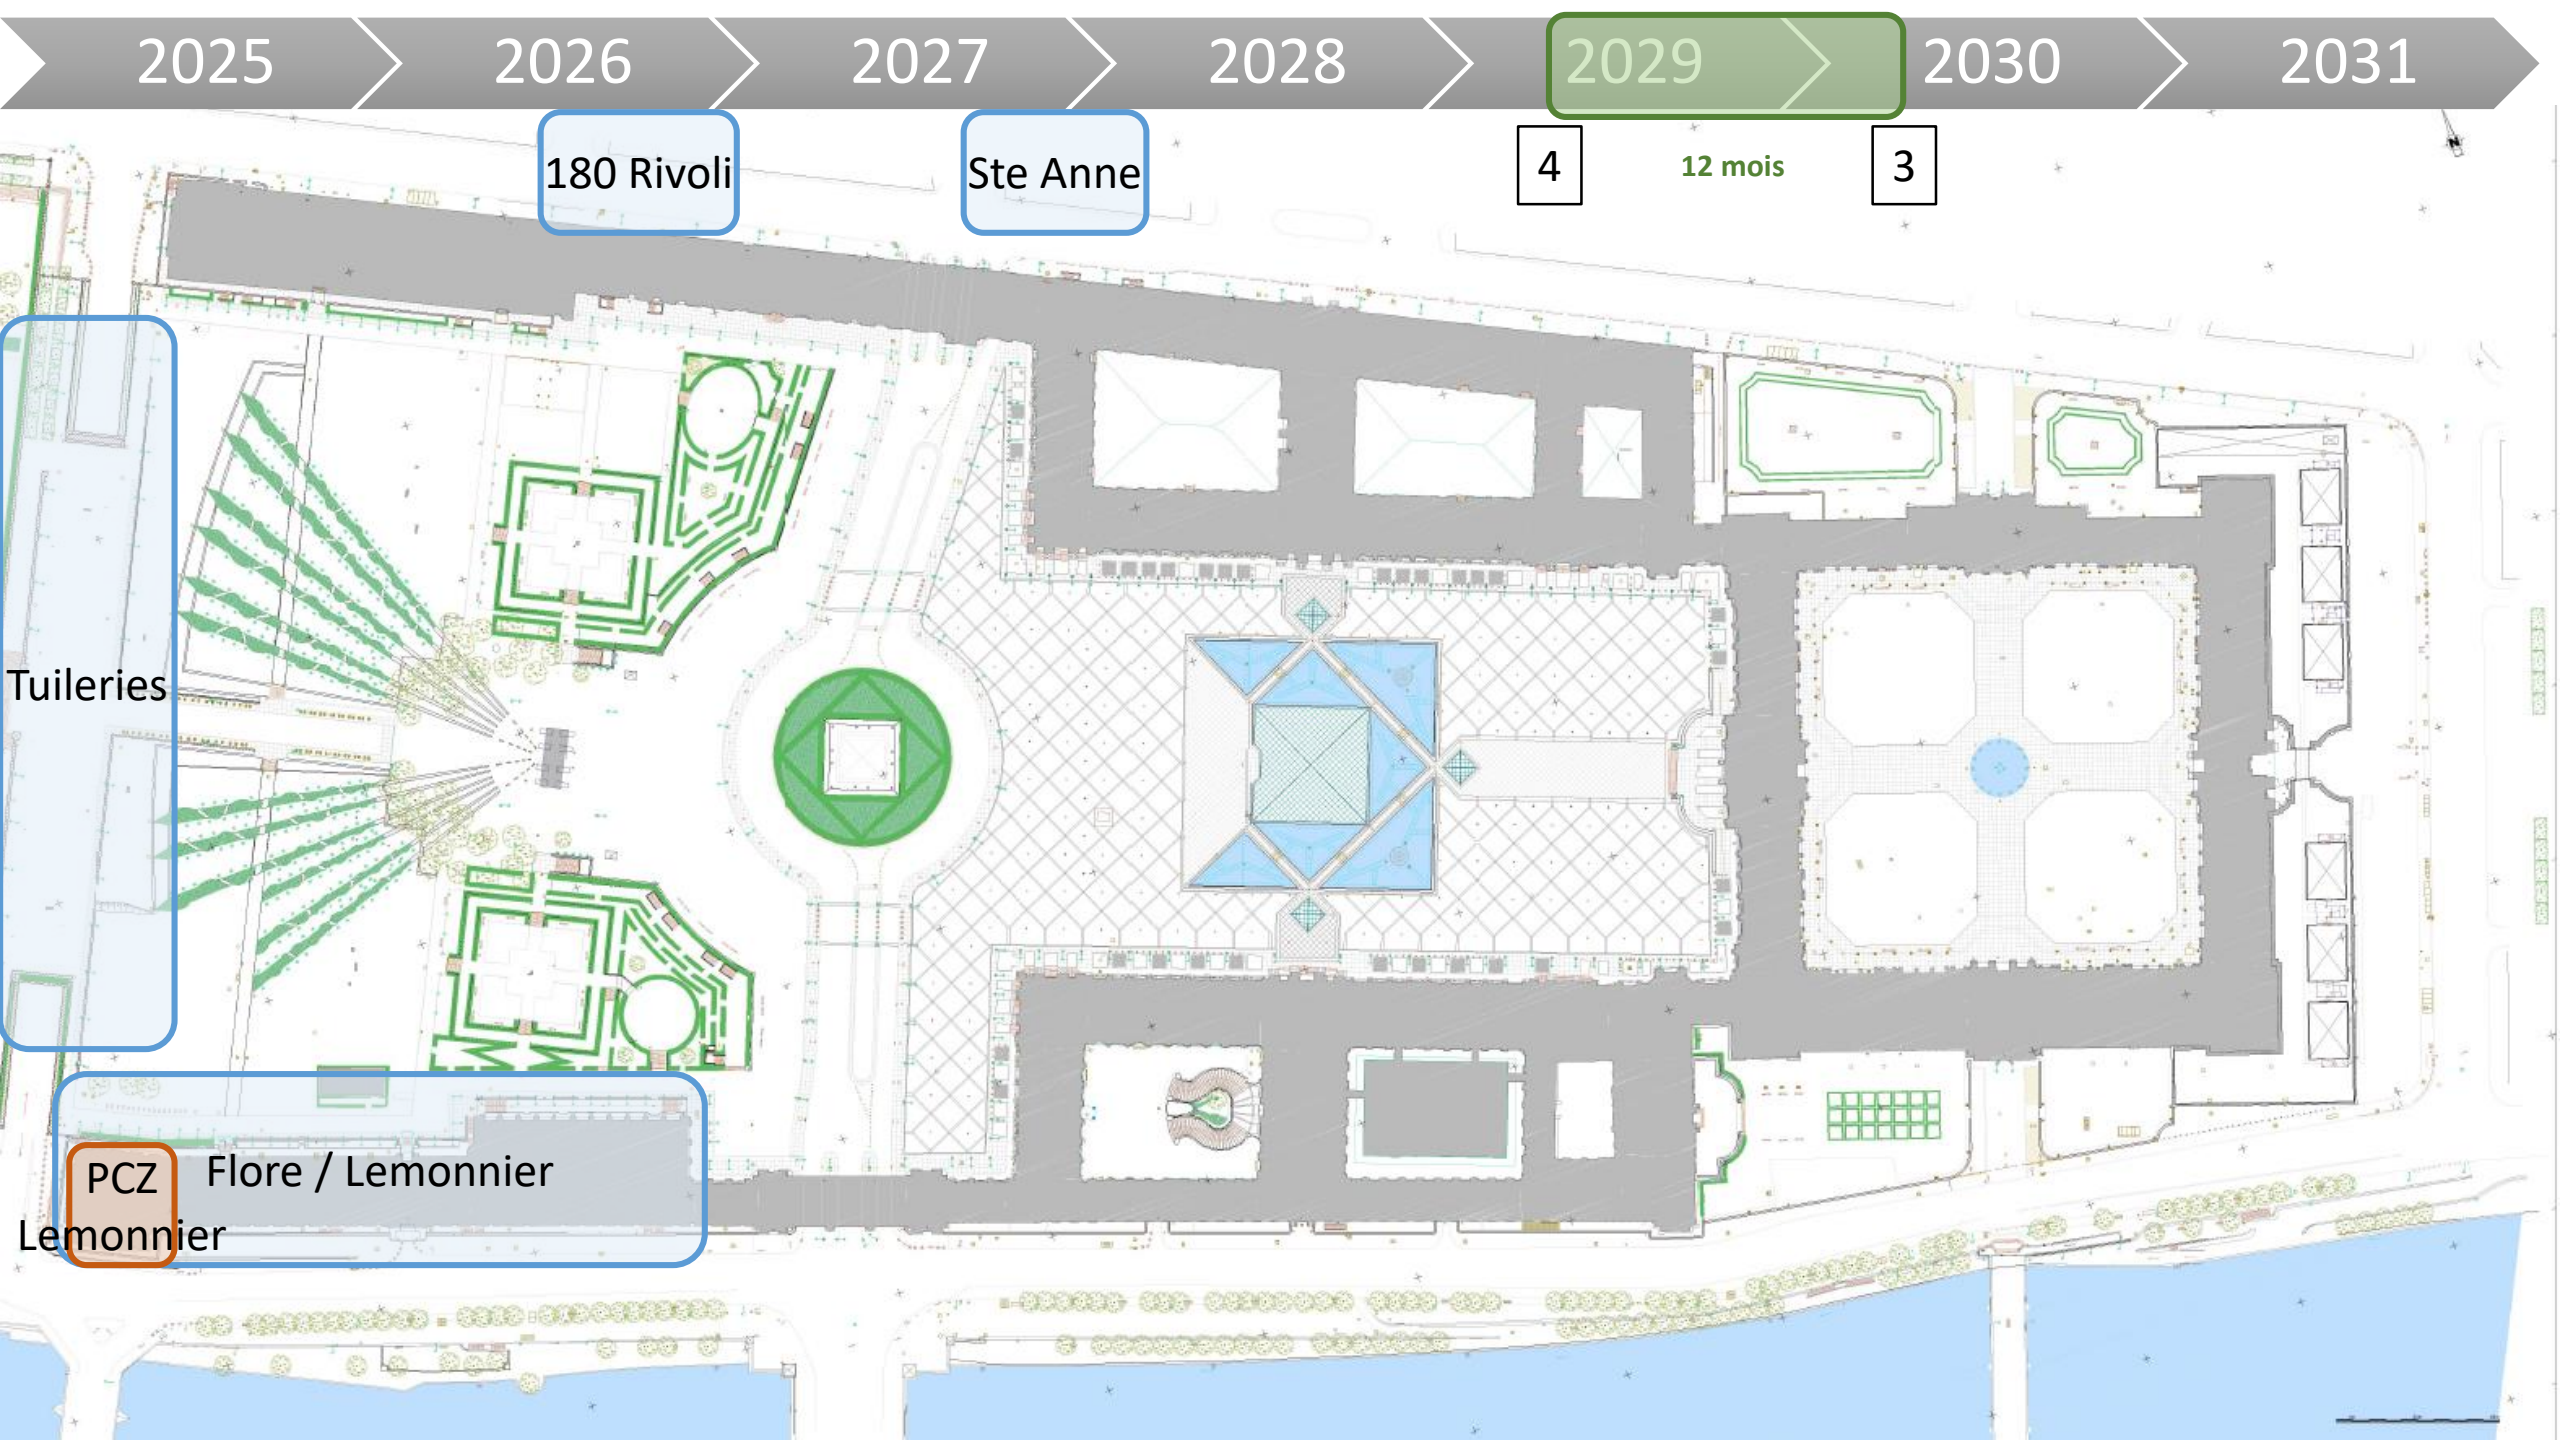

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

180 Rivoli

Ste Anne

4

12 mois

3

Tuileries

PCZ Flore / Lemonnier

Lemonnier

2025

2026

2027

2028

2029


2030

2031

4

12 mois

3

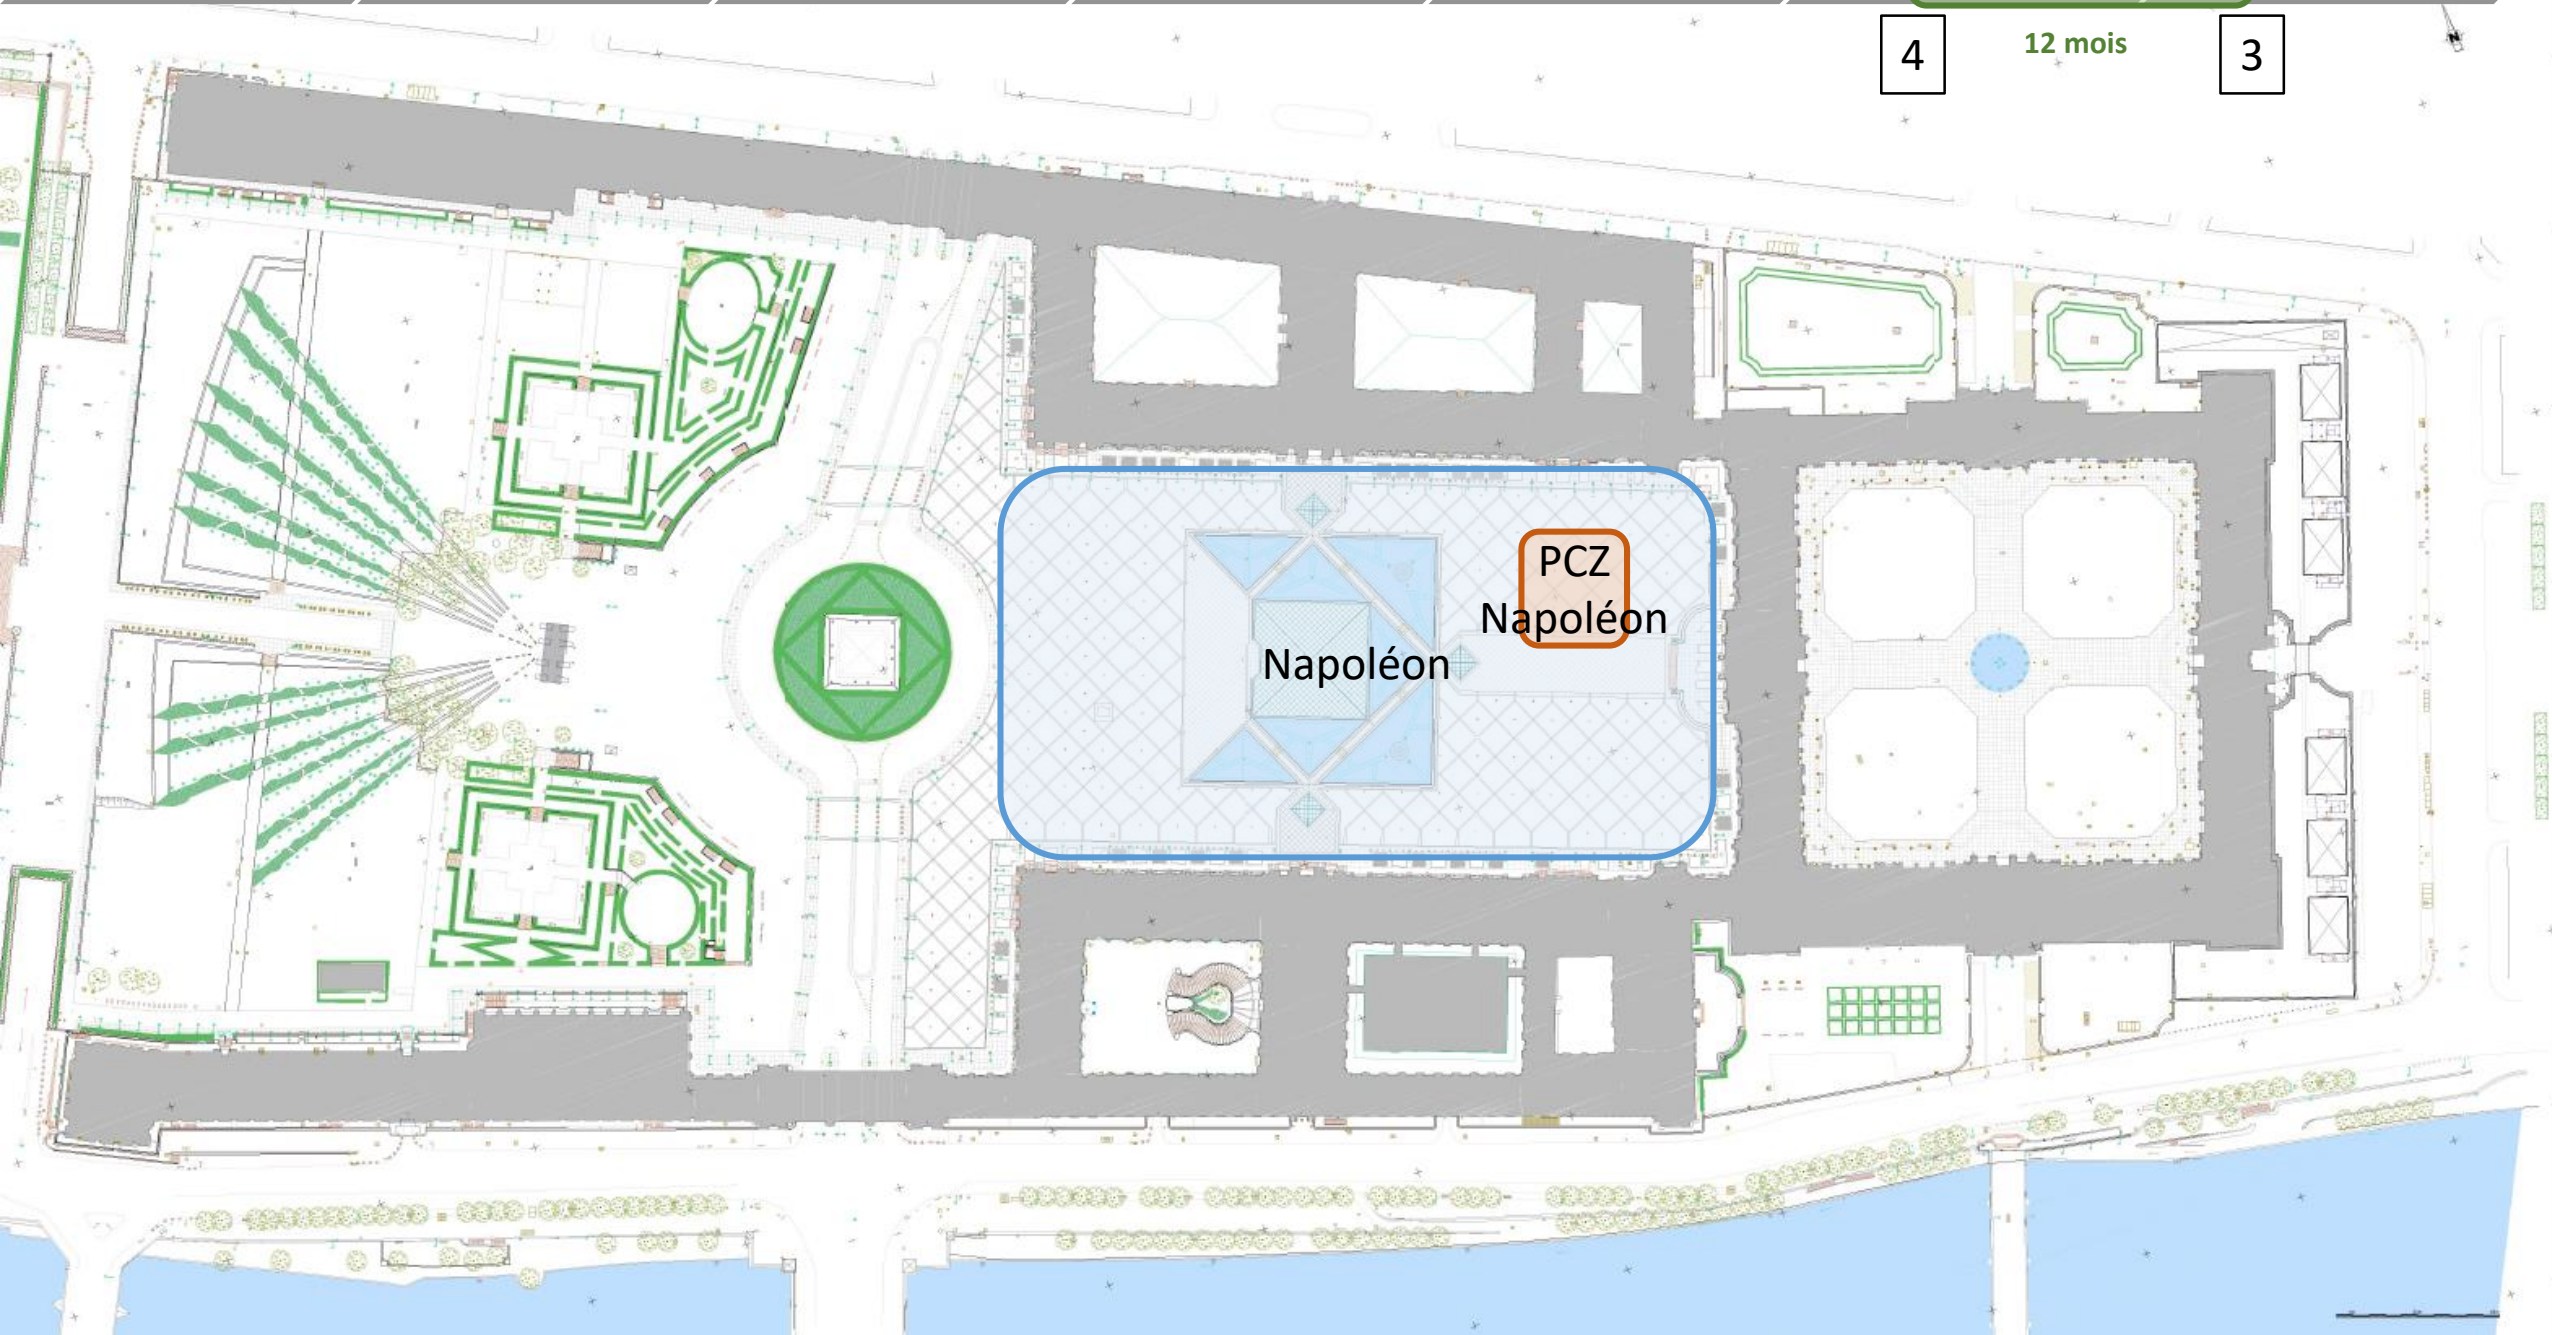

2025

2026

2027

2028


2029

2030

2031

4

16 mois

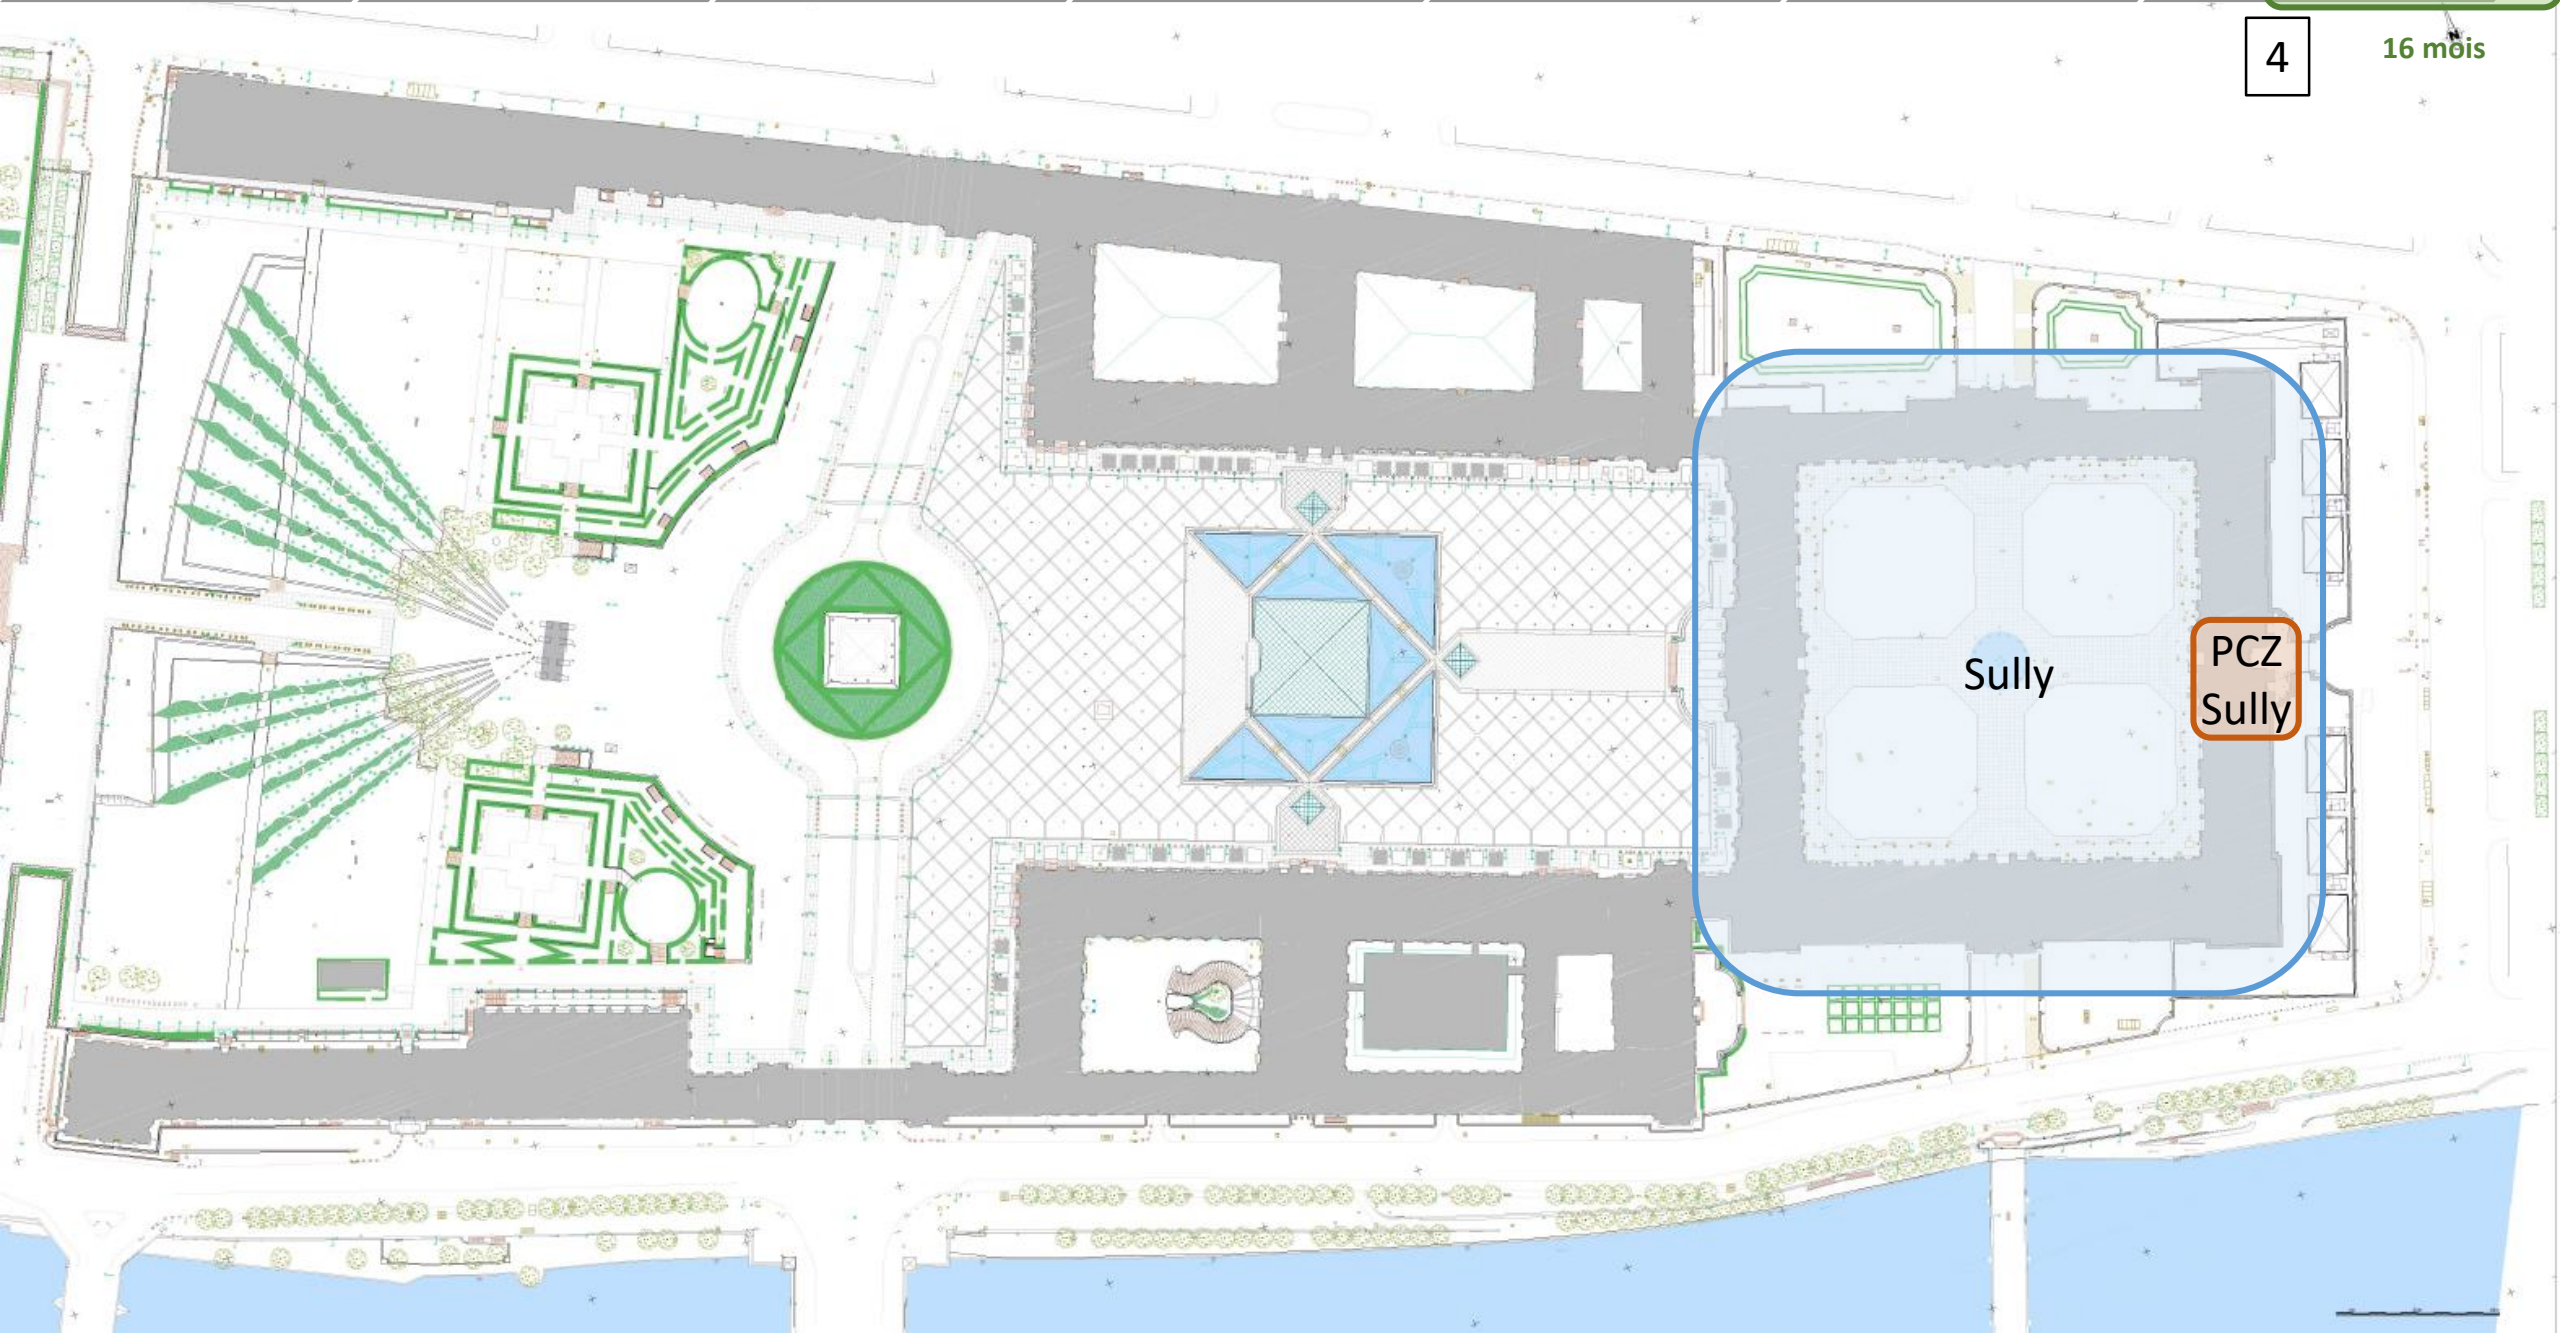

Sully

PCZ
Sully



Direction de l'Architecture, de la Maintenance et des Jardins
Sous Direction Technique

SALAGNON Romain
01 40 20 54 97
Romain.salagnon@louvre.fr
