



ENVIRONNEMENT

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
23, RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW383201
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 31/10/2024
Référence mandataire : CNB_720

DÉSIGNATION DU BIEN

Immeuble - CNB_720
BAT 72 - 23 RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

PROPRIÉTAIRE

CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
23, RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : BAT 72 - 23 RUE DU LOESS 67200 STRASBOURG

Référence client : CNB_720

Désignation : Immeuble - CNB_720

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BARRAO HUGO


Accompagnateur : ROCHEFEUILLE Gilles (CNRS)

Date de repérage : 31/10/2024

Numéro attestation : CPDI5987

Délivré le : 29/04/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
23, RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
23, RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 08/11/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 08/11/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

| Localisation / Désignation | Justification | Investigation complémentaire restant à réaliser |
|----------------------------|---------------|---|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Condamnation de l'accès à la chaufferie et percement de mur extérieur.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Sous-station (016).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Plan d'intervention - 1276EFD6-1715-48CB-AE0D-9BA32231E835[26543].pdf -
CNRS - 31/10/2024

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

| Ouvrage ou composant de la construction inspecté | Plan de l'immeuble | Locaux | Localisation |
|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | |
| Plafond et faux-plafonds | Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | |
| Revêtement de sol | Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | |

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1 : Certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être noyés dans les maçonneries (cales de ferrailage, conduits noyés, écarteurs de banche, etc.) sans qu'il soit possible d'en identifier la présence antérieurement à la phase travaux. Notre responsabilité ne saurait être recherchée en cas de présence de tels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante découverts en cours de travaux.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|----------|---------------------------|
| Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | Murs et cloisons | Enduits ciment | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002EW 38320 1 n°1 - 1 | P1 | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | Murs et cloisons | Enduits ciment | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002EW 38320 1 n°3 - 1 | P3 | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|----------|---------------------------|
| Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | Plafonds | Enduits ciment | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002EW 38320 1 n°4 - 1 | P4 | Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|----------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|----------|---------------------------|
| Niveau 0 | Vol 1 (016 Sous-station) | Revêtement de sol | Chape maigre | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002EW 38320 1 n°2 - 1 | P2 | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Vert / Rose | Négatif | Négatif sur analyse |


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|------|----------|--|
| | Niveau 0 | Niveau 0 - Plan de repérage - Actions menées |
| | Niveau 0 | Niveau 0 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées |

Légende



Périmètre d'intervention 1

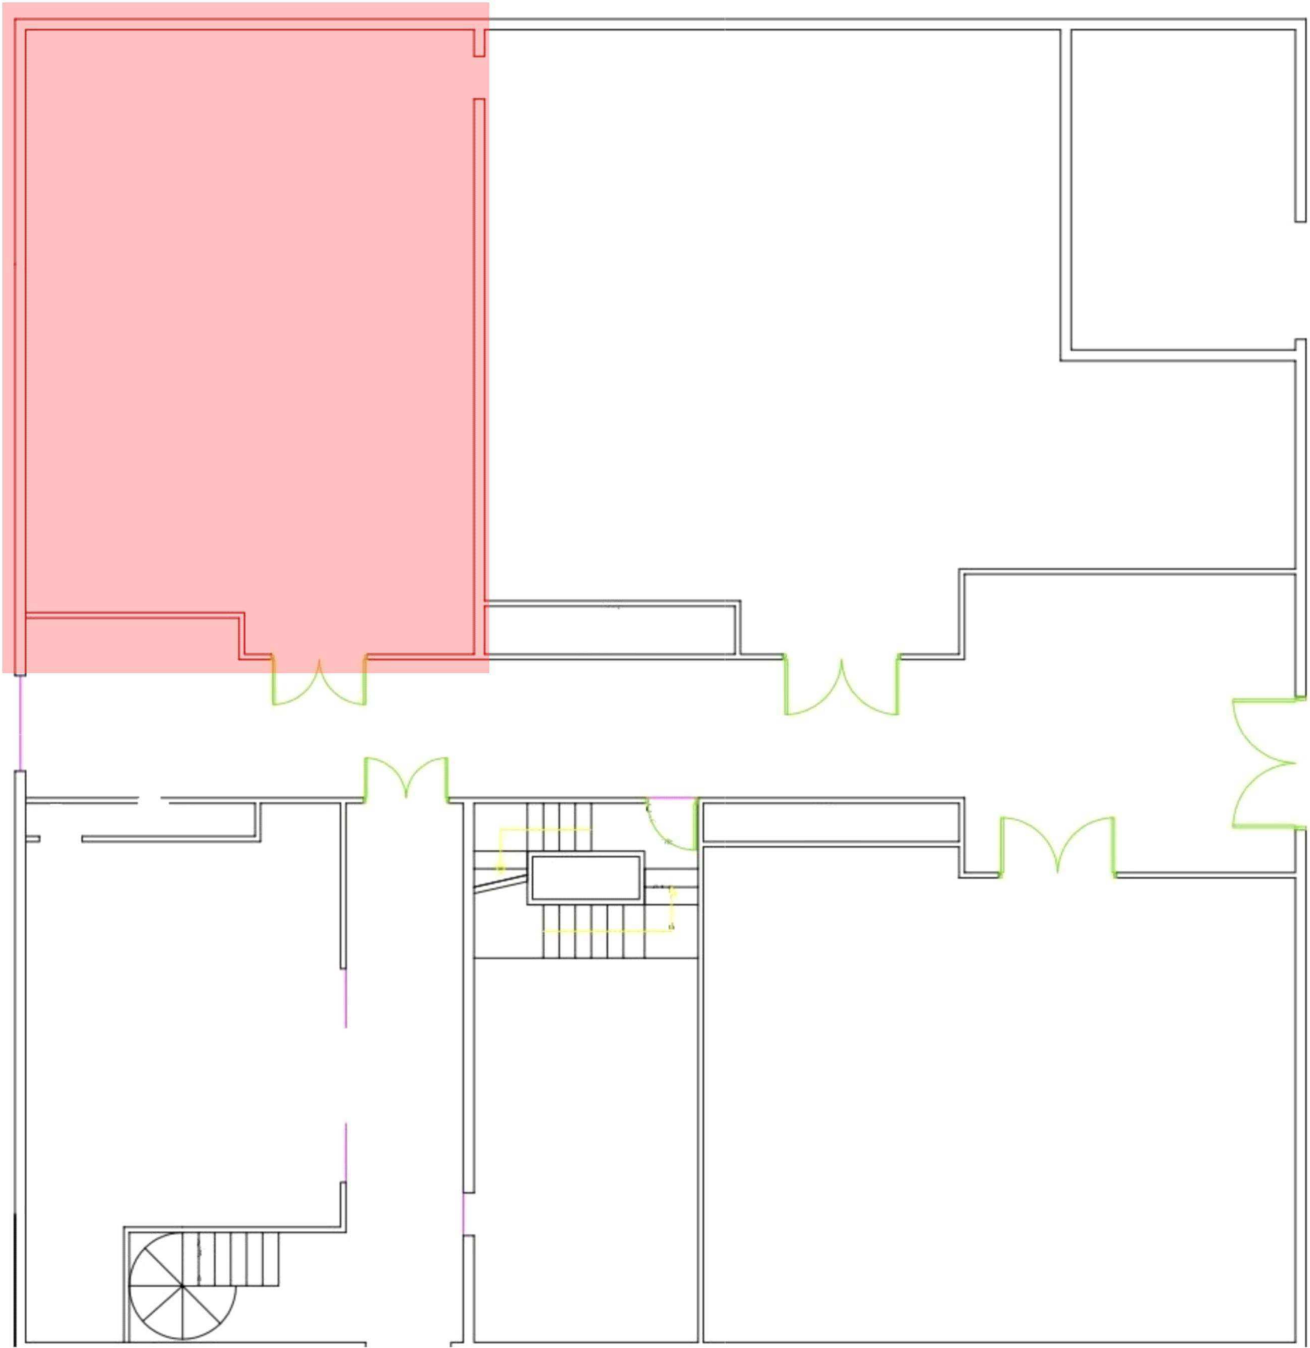

Adresse du bien

BAT 72 - 23 RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

Désignation

Immeuble - CNB_720

Date intervention

31/10/2024

Technicien intervenant

BARRAO HUGO

NIVEAU 0 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW383201

Légende

| |
|--------------------------------------|
| Localisation dun prélèvement négatif |
|--------------------------------------|

Vol 1
(016
Sous-station)

P1, P2, P3, P4

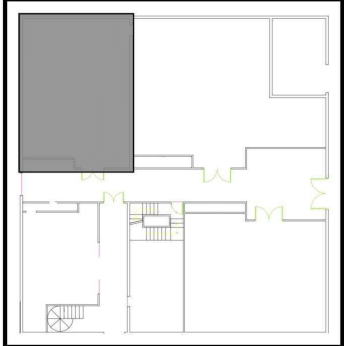[illegible]

Adresse du bien

BAT 72 - 23 RUE DU LOESS
67200 STRASBOURG

| Désignation |
|-------------|
|-------------|

| |
|--------------------|
| Immeuble - CNB_720 |
|--------------------|


| Date intervention |
|-------------------|
|-------------------|

| | |
|--|------------|
| | 31/10/2024 |
|--|------------|

| Techniciens intervenant | |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| |
|-------------|
| BARRAO HUGO |
|-------------|

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|--------------------------|---|---------------------|
| 002EW383201 n°1 - 1 (P1) | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | Prélèvement négatif |
| 002EW383201 n°2 - 1 (P2) | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | Prélèvement négatif |
| 002EW383201 n°3 - 1 (P3) | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | Prélèvement négatif |
| 002EW383201 n°4 - 1 (P4) | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | Prélèvement négatif |



002EW383201 n°1 - 1 (P1) - Niveau 0 - Vol 1 (016
Sous-station)



002EW383201 n°2 - 1 (P2) - Niveau 0 - Vol 1 (016
Sous-station)



002EW383201 n°3 - 1 (P3) - Niveau 0 - Vol 1 (016
Sous-station)



002EW383201 n°4 - 1 (P4) - Niveau 0 - Vol 1 (016
Sous-station)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

| Ref action | Categorie | Composant | Materiau | Localisation | Observation |
|------------|---|-------------------|--|---|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | |
| P2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Vert / Rose | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | |
| P4 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris | Niveau 0 - Vol 1 (016 Sous-station) | |



CHANTIER

| | |
|-----------|---|
| Référence | C012024740009 |
| Adresse | Commande : 002EW383201 Affaire : CNB_720 BAT 72 - 23 RUE DU LOESS 67200 STRASBOURG |

COORDONNÉES DESTINATAIRE

| |
|---|
| AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES |
|---|

Arcueil, le 08/11/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024740009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

| | |
|----------------------------------|--|
| Laboratoire d'analyse | AC LAB |
| Normes et techniques analytiques | HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) |
| Texte réglementaire | Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses |
| Méthodes internes | Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1 |
| Préparation des échantillons | Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique |

Référence échantillon : 002EW383201_001

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| Référence labo | PM06603212 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 31/10/2024 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | HUGO BARRAO | Date d'analyse | 08/11/2024 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment | | |
| Zone de prélèvement | Immeuble - CNB_720 - Vol 1 (016 Sous-station) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Phase | Couche | Description | MOLP | | | MET | | | Résultat |
|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| | | | Nb de préparations | Lame explorées(**) | Analyste | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | |
| | | Aspect, Texture, Couleur | | | | | | | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Gris | - | - | - | | | | Non détecté |
| | 2 | Mortier Dur Gris | - | - | - | | | | |
| Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | | | 0 MOLP | | | 1 MET | | | |

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW383201_002

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| Référence labo | PM06603213 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 31/10/2024 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | HUGO BARRAO | Date d'analyse | 08/11/2024 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre | | |
| Zone de prélèvement | Immeuble - CNB_720 - Vol 1 (016 Sous-station) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Phase | Couche | Description | MOLP | | | MET | | | Résultat |
|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| | | | Nb de préparations | Lame explorées(**) | Analyste | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | |
| | | Aspect, Texture, Couleur | | | | | | | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Vert | - | - | - | | | | Non détecté |
| | 2 | Mortier Dur Rose | - | - | - | | | | |
| Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | | | 0 MOLP | | | 1 MET | | | |

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW383201_003

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| Référence labo | PM06603214 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 31/10/2024 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | HUGO BARRAO | Date d'analyse | 08/11/2024 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment | | |
| Zone de prélèvement | Immeuble - CNB_720 - Vol 1 (016 Sous-station) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Phase | Couche | Description | MOLP | | | MET | | | Résultat |
|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lame explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Gris | - | - | - | Acétone | 1 | 2 | NNG |
| | 2 | Mortier Dur Gris | - | - | - | | | | |
| Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | | | 0 MOLP | | | 1 MET | | | |

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW383201_004

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| Référence labo | PM06603215 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 31/10/2024 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | HUGO BARRAO | Date d'analyse | 08/11/2024 |
| Type de prélèvement | Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment | | |
| Zone de prélèvement | Immeuble - CNB_720 - Vol 1 (016 Sous-station) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Phase | Couche | Description | MOLP | | | MET | | | Résultat |
|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lame explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Gris | - | - | - | Acétone | 1 | 2 | NNG |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | |
| | 3 | Mortier Dur Gris | - | - | - | | | | |
| Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | | | 0 MOLP | | | 1 MET | | | |

Remarque concernant l'analyse La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012024740009

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 4/4

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpvTgurqpuclngGswkrg
Jonathan Marchal





Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 3 / 3

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assurance additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERMT ou ESIRS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de réaffectation en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tontien Lue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph
Becker, Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemminger, David
Hufn, Dr. Thomas Huber, Claire McDonald

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 06




- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

| RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION | MONTANT DES GARANTIES | |
|---|-----------------------|---|
| Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels) | 7 500 000 EUR | par sinistre |
| Dont | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre |
| • Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle | 2 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale) | 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Dommages aux Biens confiés | 30 000 EUR | par sinistre |
| RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE | | |
| Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels) | 3 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |
| Dont | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 - VU/CPM



HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tontien Lue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph
Becker, Dr. Muhammad Enbomez, Dr. Christian Hemminger, David
Hufn, Dr. Thomas Huber, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Decollated by:
Dominique BISAGA
00E2B4040B6C469

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5987

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI5987 Version 007



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BARRAO Hugo

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/04/2023 - Date d'expiration : 28/04/2028 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/04/2023 - Date d'expiration : 28/04/2028 |
| DPE tous types de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/10/2023 - Date d'expiration : 11/10/2028 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 11/10/2023 - Date d'expiration : 11/10/2028 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 11/10/2023 - Date d'expiration : 11/10/2028 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19
