


## RDC HAUT


## RDC BAS

# RDCOUR


**PHASE 1A**

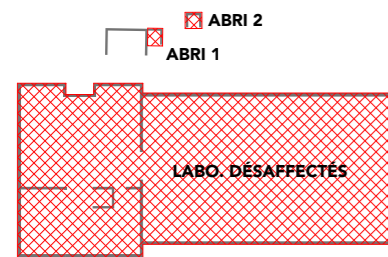











**PHASE 1B**

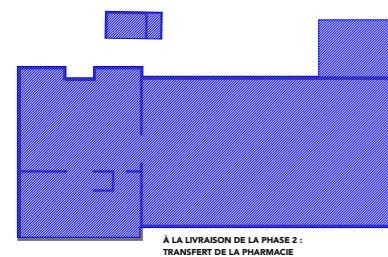

## PHASE 2A



**PHASE 2B**



### Phasage de l'opération


Afin de permettre à la pharmacie de continuer son activité pendant les travaux, ceux-ci vont se dérouler **en 2 phases**, après la période de préparation de chantier d'une durée de **4 semaines**.

La phase 1 concernera le RDC Haut dans sa totalité et une partie du RDC Bas (zone escalier) et le RDCour concerné par l'opération ainsi que les locaux extérieurs (locaux déchets et stock. O<sup>2</sup>). La pharmacie existante doit conserver la totalité de ses moyens (accessibilité, fluides, Réseaux) pour assurer son activité. Cette phase 1 se déroulera en 2 temps :

- La phase 1A, d'une durée globale de **3 semaines**, comprend un confinement de la zone escalier du RDC Bas et l'aménagement provisoire d'un bureau 2 postes dans le vestiaire homme avant la réalisation du désamiantage.
- La phase 1B, d'une durée globale de **31 semaines**, comprend la réalisation des travaux proprement dit du même périmètre sur les 3 niveaux. Elle fera l'objet d'une réception et d'une mise en service pour permettre le déménagement de la pharmacie et la reprise de son activité avec la totalité de ses moyens.

La phase 2 concernera le RDC Bas après le déménagement de la pharmacie. Elle se déroulera aussi en 2 temps :

- La phase 2A, d'une durée globale de **3 semaines**, comprend le désamiantage.
- La phase 2B, d'une durée globale de **28 semaines**, comprend la réalisation des travaux proprement dit du même périmètre du niveau RDC bas. Elle fera l'objet d'une réception et d'une mise en service pour permettre l'aménagement de l'administration.

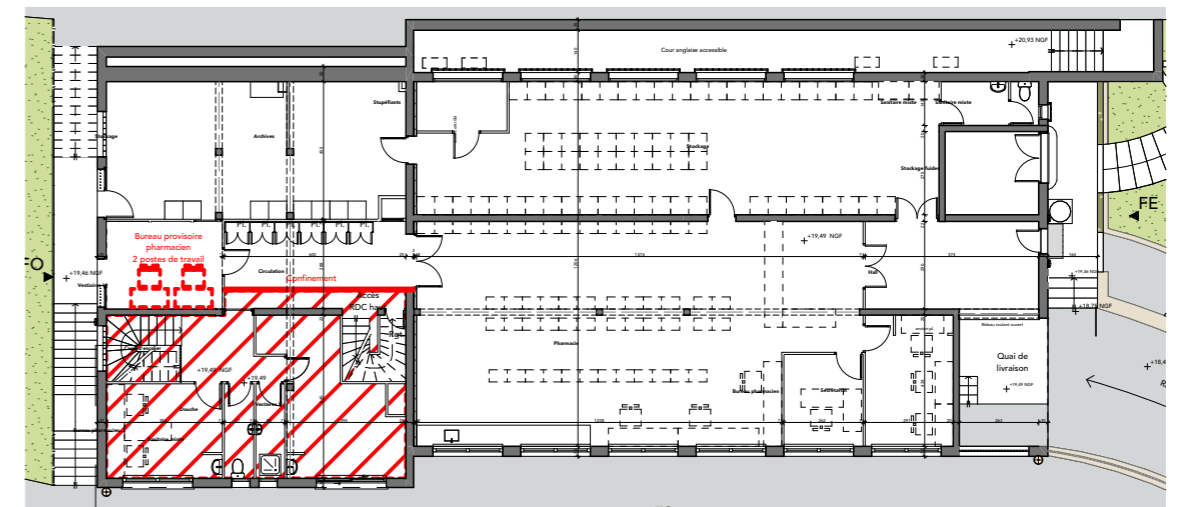

## Confinement RDC bas Phase 1A
