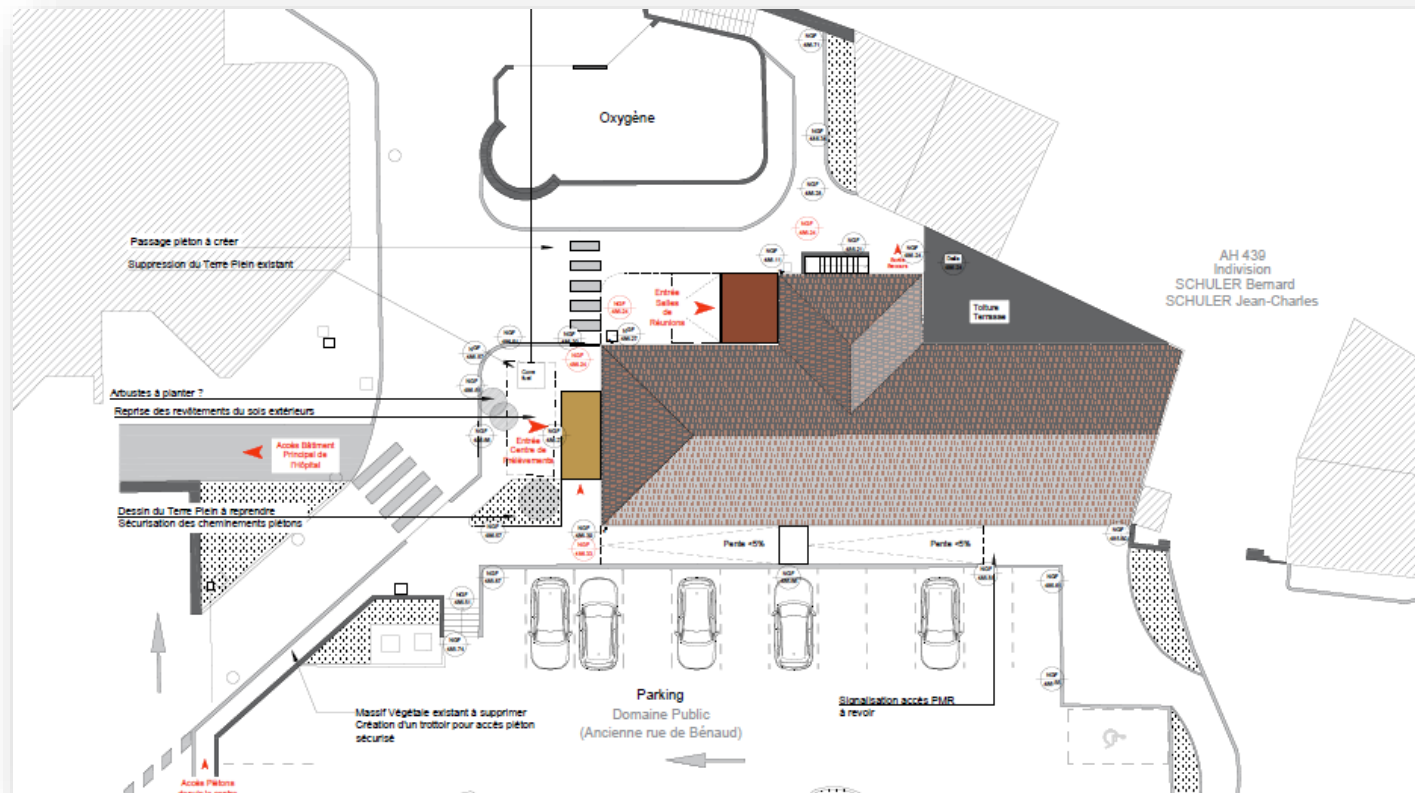


CARNET DE PHASAGE – Document annexe au planning DCE

**CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY (42)**

RESTRUCTURATION DU BATIMENT S DU CENTRE HOSPITALIER
DE FIRMINY

ARCHITECTE

L. Aydstian Architecte

BUREAUX D'ÉTUDES

OPC : Gba&co

ECONOMISTE : SF Fournier

BUREAU STRUCTURE : Bost Ingénierie

BUREAU FLUIDES : DB Ingénierie

BUREAU DE CONTROLE : Socotec

CSPS : Apave


PREPATATION DE CHANTIER et INSTALLATION DE CHANTIER :

Installation de chantier

Durée : **2 mois**

Description :

- . Mise en place de l'installation de chantier.
- Mise en place des cloisons de confinement, si besoin*
- . **Pendant cette durée de préparation, le désamiantage du conduit amianté, la démolition et le curage seront réalisés.**
- . Remise des documents et plans techniques par les entreprises à la MOE, pour VISA et validation.
- . Commande des entreprises.
Le délai de commande sera obligatoirement de 8 à 10 semaines à compter de la deuxième semaine de préparation (Menuiseries ext/int, CTA, matériel nécessaire au chantier, etc....)
- . Demande de voirie pour les places de parking mobilisées, à faire auprès de la mairie de Firminy

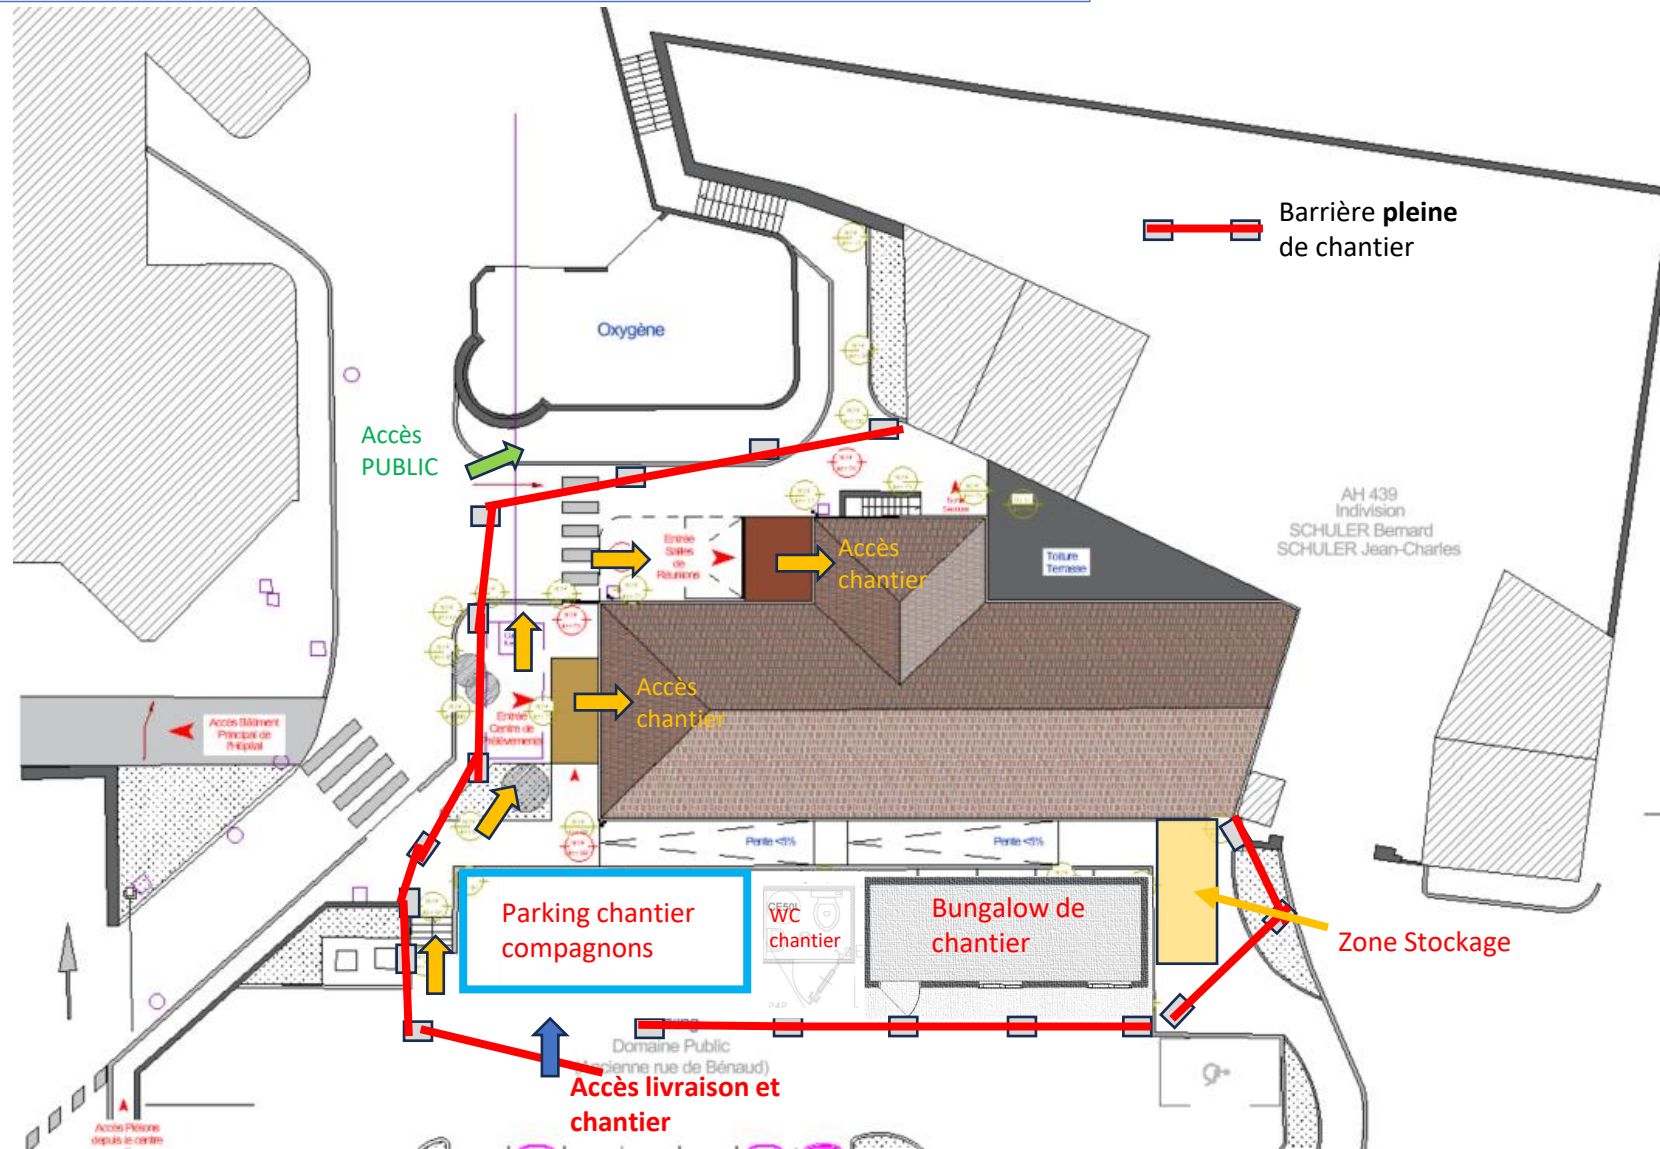

PHASE TRAVAUX :

Aménagement du centre de formation, du centre de prélèvement, du local technique et réalisation des travaux extérieurs

Durée : 6 mois


Localisation des travaux:

Ensemble du programme des travaux à réaliser :

- Lot 1 démolition / maçonnerie / VRD / espaces verts
- Lot 2 désamiantage / charpente / Couverture
- Lot 3 Etanchéité
- Lot 4 façades
- Lot 5 Menuiseries extérieures alu / occultations / Métallerie
- Lot 6 menuiseries intérieures bois
- Lot 7 plâtrerie peinture plafond
- Lot 8 chape / Carrelage / Faïence / Sols souples

L'ensemble des lots extérieurs sont également réalisés dans cette phase (Façades, VRD, aménagement de voirie, etc...)

A noter : Tous les essais et mises en services des lots techniques seront réalisés sur 15 à 20 jours avant les OPR, réception et commission de sécurité

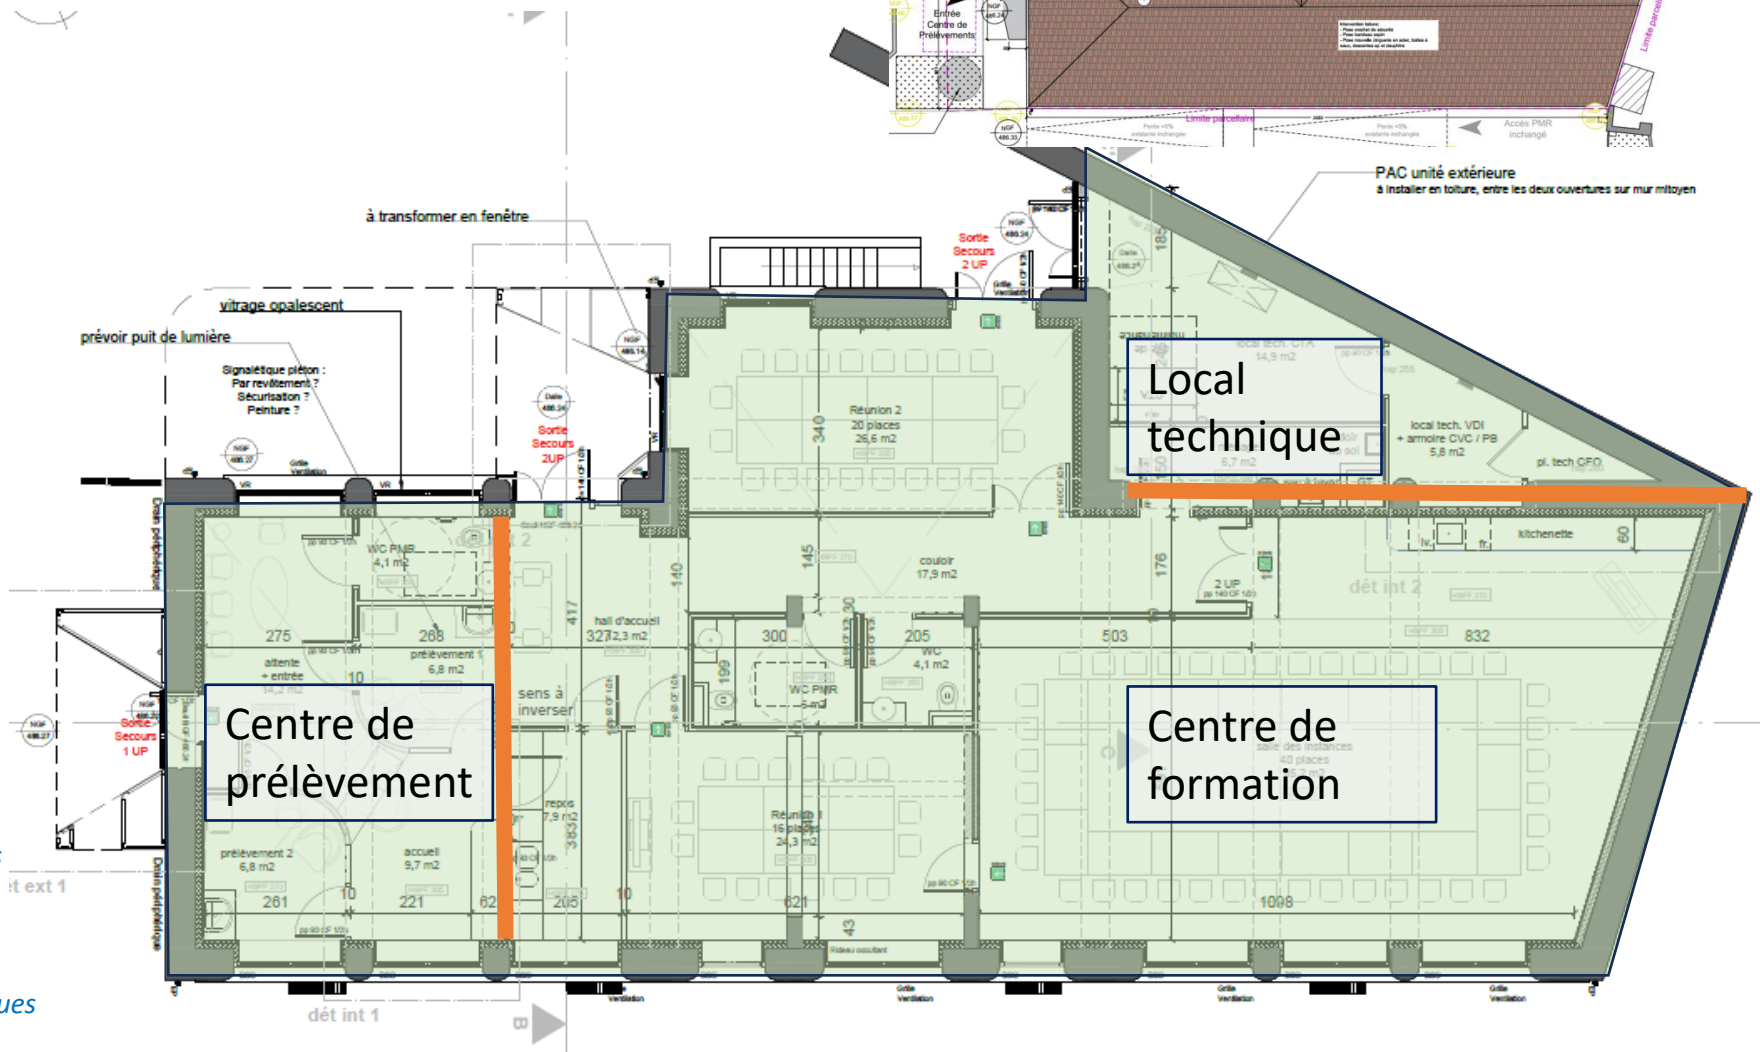

. La base vie et l'installation de chantier, seront déposées avant la réception des travaux et la commission de sécurité.
