

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **01/03/2023**
Heure d'arrivée : **14 h 00**
Date émission : **16/03/2023**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Bâtiment CHAMBRE MORTUAIRE - Ascenseur - N°V10, 3 niveaux : NTJ36, 9 niveaux : N°V11, 3 niveaux : NTJ37, 9 niveaux**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**
Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2023**

Opérateur(s) et signataire(s)

| | NOM Prénom | Fonction | Organisme certification | Détail de la certification |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage | MEYNARD Quentin | Diagnostiqueur | LA CERTIFICATION DE PERSONNES | Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594 |
| Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport | MEYNARD Quentin | Diagnostiqueur | LA CERTIFICATION DE PERSONNES | Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594 |

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

| | | |
|----|---|----|
| A. | Conditions de réalisation du repérage..... | 2 |
| B. | Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses..... | 2 |
| C. | Conclusions du rapport..... | 4 |
| D. | Résultats détaillés du repérage..... | 5 |
| | D.1. Listes des locaux visités..... | 5 |
| | D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante..... | 6 |
| | D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse..... | 7 |
| | D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante..... | 8 |
| | D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 8 | |
| | D.6. Zones non visitées..... | 9 |
| E. | Annexes au rapport..... | 10 |
| | E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements..... | 10 |
| | E.2. Planches de repérage..... | 13 |
| | E.3. Résultats d'analyses..... | 19 |

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **01/03/2023**

Type de bâtiment : **Hôpital**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **M. Philippe ROCHEFORT**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | Non |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | Non |
| Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | Non |

Constatations diverses :

Dû à une quantité insuffisante (P17) un deuxième prélèvement a été réalisé (P17bis)

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **80 - 84 Rue des Meuniers - Bâtiment A
92220 BAGNEUX**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-1592**

Programme de travaux

Remplacement de la machinerie

- Remplacement des câbles de traction
- Remplacement des portes cabine
- Remplacement des portes palières
- Mise en place de détecteurs toute hauteur sur les portes
- Réfection complète des cabines avec habillage inox



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

| | |
|---|---|
| Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation |
| Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 |
| Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | |

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C
- ❖ Bât Chambre Mortuaire - Cabine d'ascenseur
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / RDC - 206_201 M.C
- ❖ Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

| Localisation | Description du matériau ⁽¹⁾ | Conclusion |
|---|---|---|
| Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Identifiant : M003 Description : Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur | Après analyse en laboratoire (P003) |
| Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Identifiant : M005 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage | Après analyse en laboratoire (P005) |
| Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Identifiant : M016 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage | Après analyse en laboratoire (P016) |
| Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Identifiant : M017 Description : Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) | Après analyse en laboratoire (P017) |
| Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Identifiant : M019 Description : Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) | Après analyse en laboratoire (P017bis) |



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation | Description du matériau |
|--|--|
| Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Identifiant : M001 (P001) Description : Revêtements de sols - Dalle béton |
| Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Identifiant : M002 (P002) Description : Revêtements de sols - Socle béton |
| Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Identifiant : M004 (P004) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage |
| Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Identifiant : M006 (P006) Description : Murs - Peinture + Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / RDC - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Identifiant : M007 (P007) Description : Murs trémie - Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / RDC - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Identifiant : M008 (P008) Description : Murs trémie - Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Identifiant : M009 (P009) Description : Plafonds - Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C | Identifiant : M010 (P010) Description : Revêtements de sols trémie - Dalle béton |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / RDC - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Identifiant : M011 (P011) Description : Murs trémie - Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / RDC - 206_201 M.C; Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Identifiant : M012 (P012) Description : Murs trémie - Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation | Identifiant : M013 (P013) Description : Revêtements de sols - Dalle béton |
| Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation | Identifiant : M014 (P014) Description : Murs - Peinture + Enduit ciment |
| Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Identifiant : M015 (P015) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage |
| Bât Chambre Mortuaire - Cabine d'ascenseur | Identifiant : M018 (P018) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle |



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

| Localisation | Description du matériau |
|--------------|-------------------------|
| Néant | - |

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

| Localisation | Description du matériau | Justification de non prélèvement |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| Néant | - | - |

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

| Localisation | Parties du local | Justification |
|--------------|------------------|---------------|
| Néant | - | - |

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.









Fait à **BOULOGNE BILLANCOURT**, le **16/03/2023**

Par : **MEYNARD Quentin**






E. Annexes au rapport


E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


| Identifiant du prélèvement | Description du matériau | Localisation du prélèvement | Photo |
|----------------------------|---|---|---|
| P001 | Revêtements de sols - Dalle béton | Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie |  |
| P002 | Revêtements de sols - Socle béton | Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie |  |
| P003 | Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur | Bât Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie |  |
| P004 | Revêtements de sols - Colle de carrelage | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation |  |
| P005 | Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation |  |
| P006 | Murs - Peinture + Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation |  |
| P007 | Murs trémie - Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C |  |
| P008 | Murs trémie - Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau | Localisation du prélèvement | Photo |
|----------------------------|---|--|---|
| P009 | Plafonds - Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C |  |
| P010 | Revêtements de sols trémie - Dalle béton | Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C |  |
| P011 | Murs trémie - Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C |  |
| P012 | Murs trémie - Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C |  |
| P013 | Revêtements de sols - Dalle béton | Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation |  |
| P014 | Murs - Peinture + Enduit ciment | Bât Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation |  |
| P015 | Revêtements de sols - Colle de carrelage | Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 |  |
| P016 | Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage | Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 |  |

| Identifiant du prélèvement | Description du matériau | Localisation du prélèvement | Photo |
|----------------------------|---|---|---|
| P017 | Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) | Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 |  |
| P018 | Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle | Bât Chambre Mortuaire - Cabine d'ascenseur |  |
| P017bis | Murs - Peinture (A) + Enduit ciment (A) | Bât Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 |  |

E.2. Planches de repérage

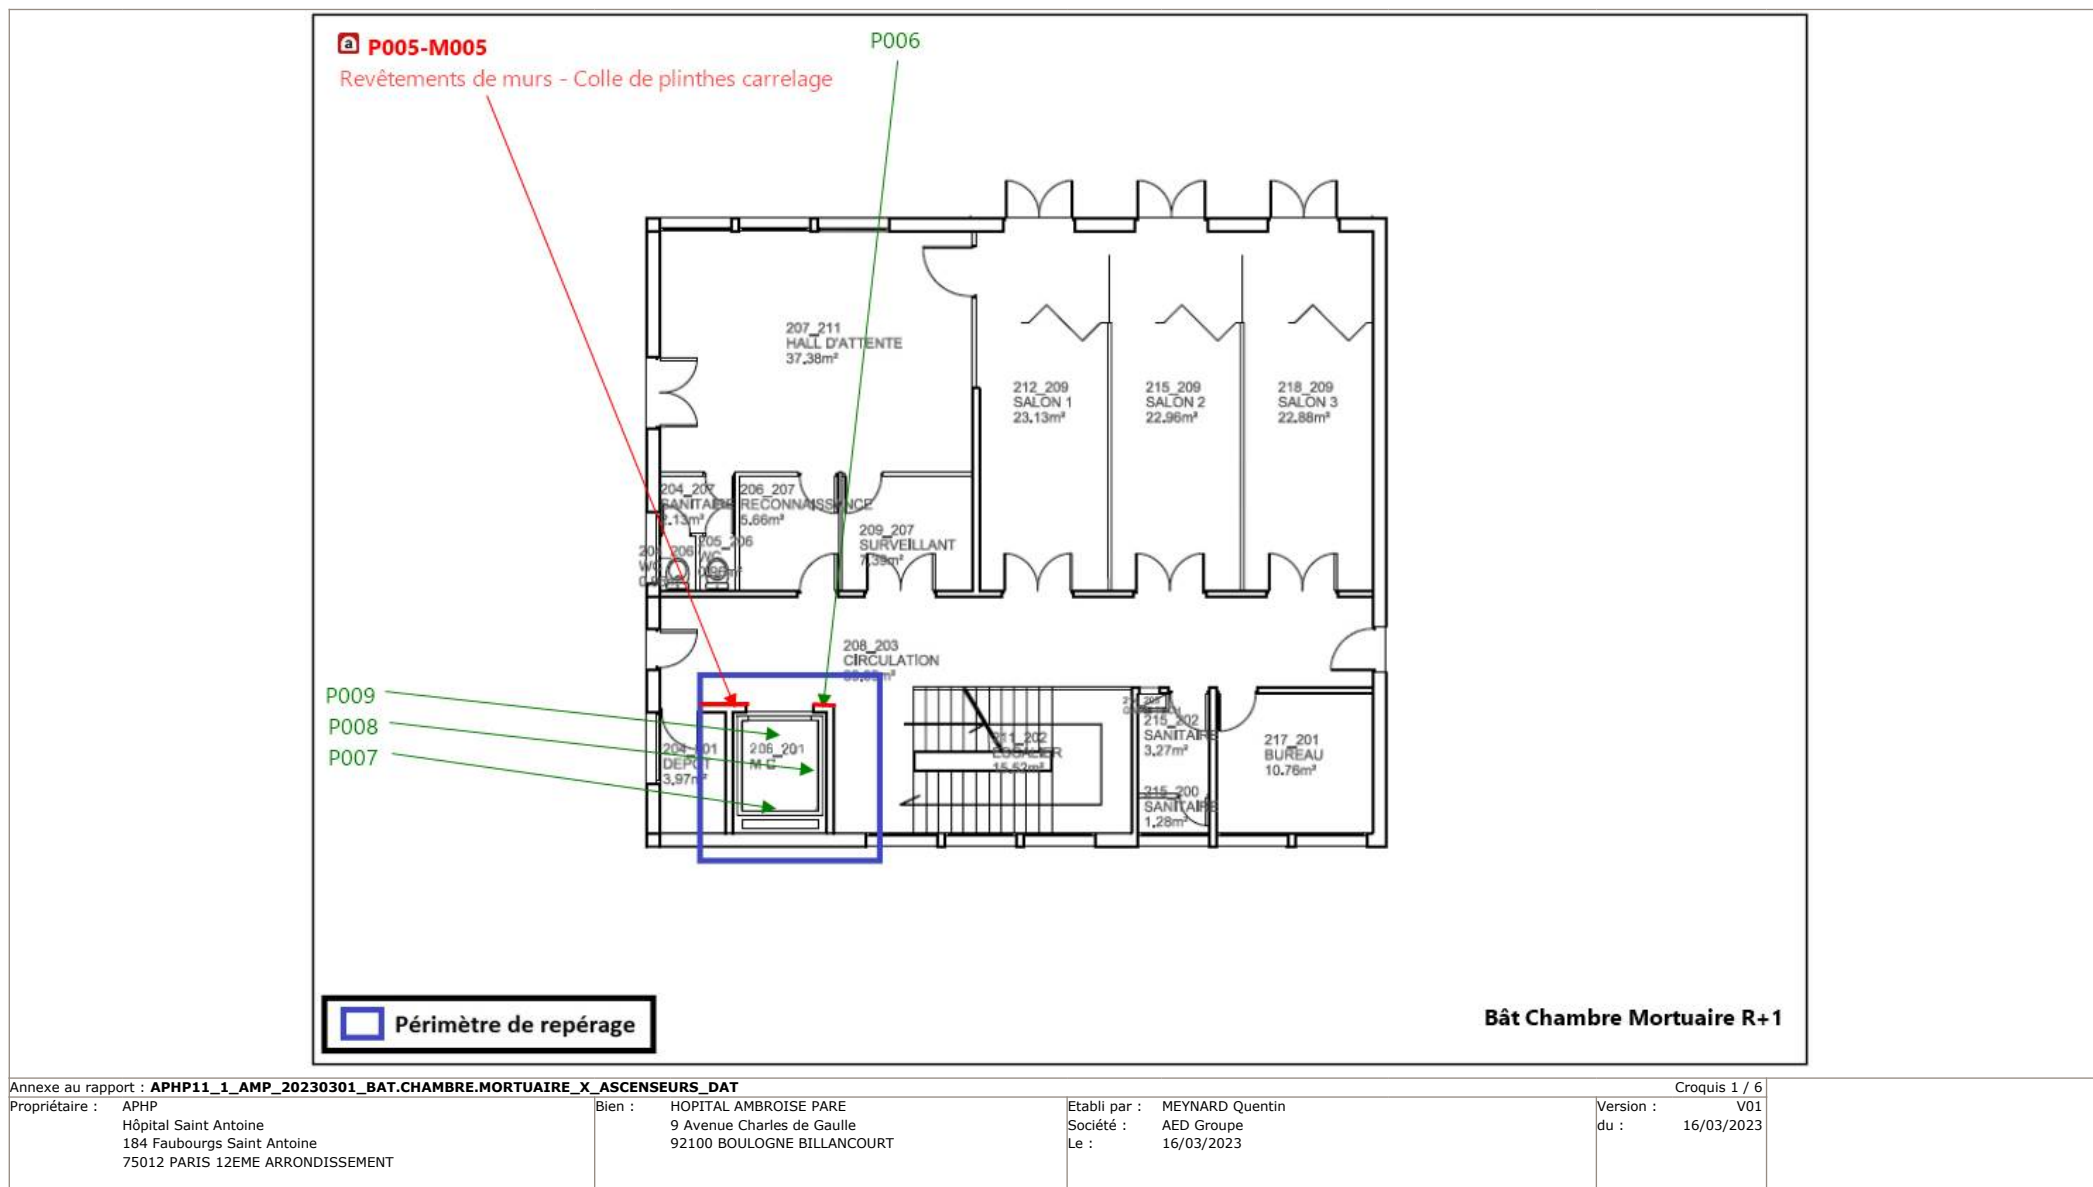

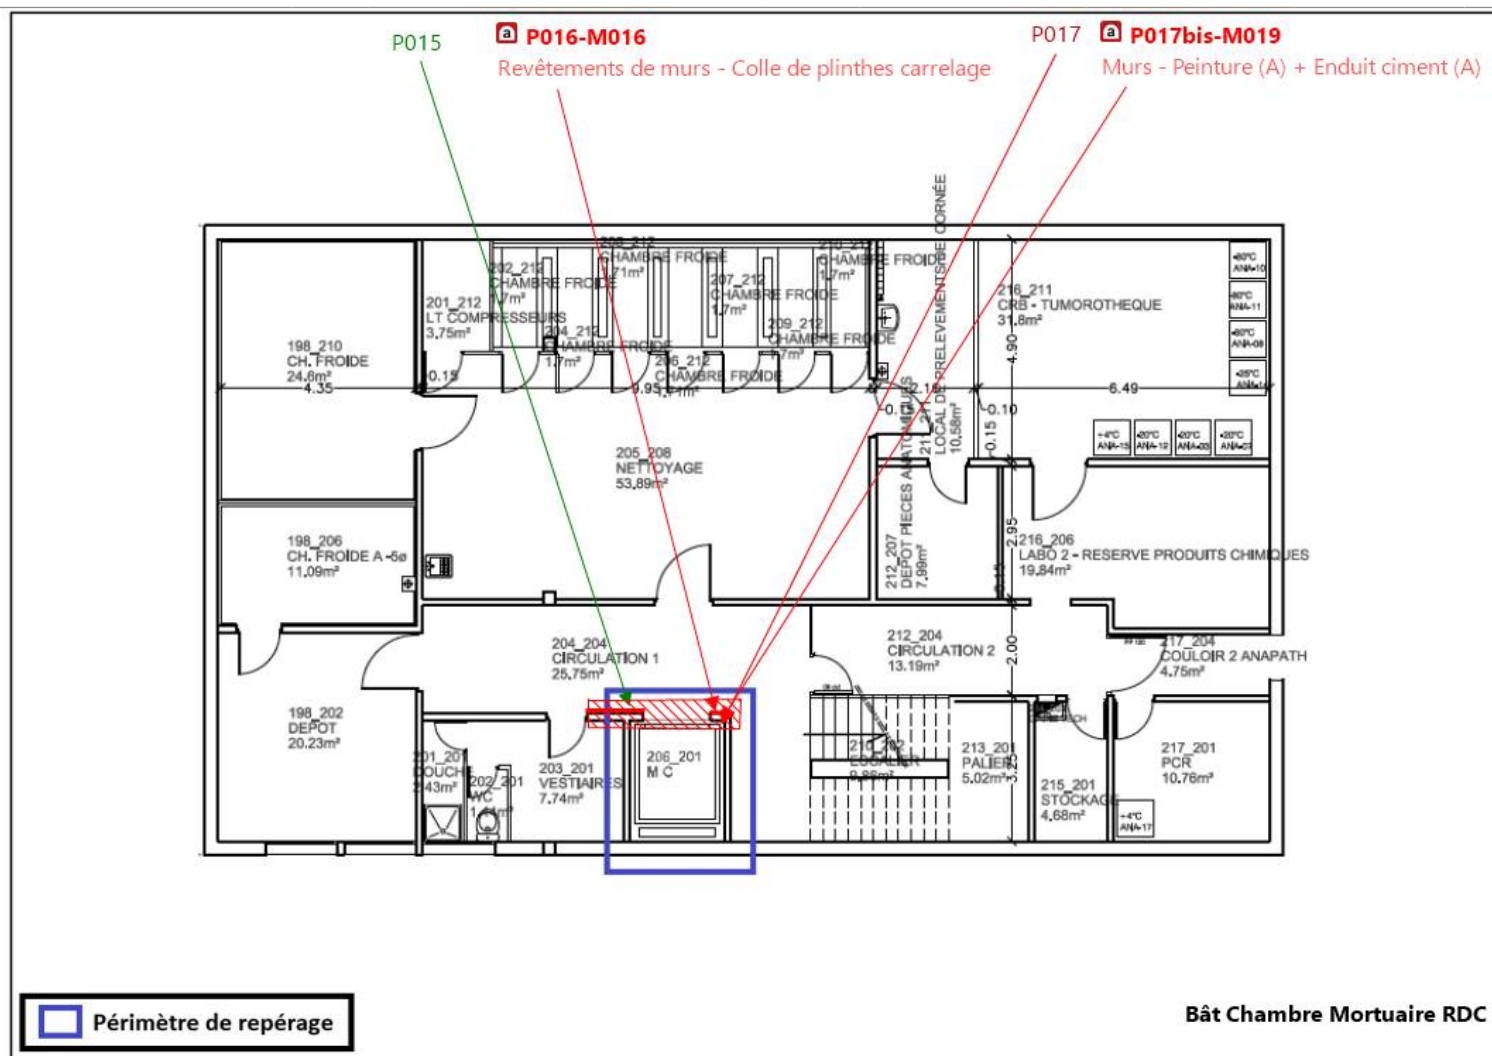

Annexe au rapport : **APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT**


Annexe du rapport : Annexe 11 - Annexe 20200601 - DAV
 Propriétaire : APHP
 Hôpital Saint Antoine
 184 Faubourgs Saint Antoine
 75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

| | |
|--------------|-----------------|
| Etabli par : | MEYNARD Quentin |
| Société : | AED Groupe |
| Le : | 16/03/2023 |

Croquis 2 / 6

| | |
|-----------|------------|
| Version : | V01 |
| du : | 16/03/2023 |

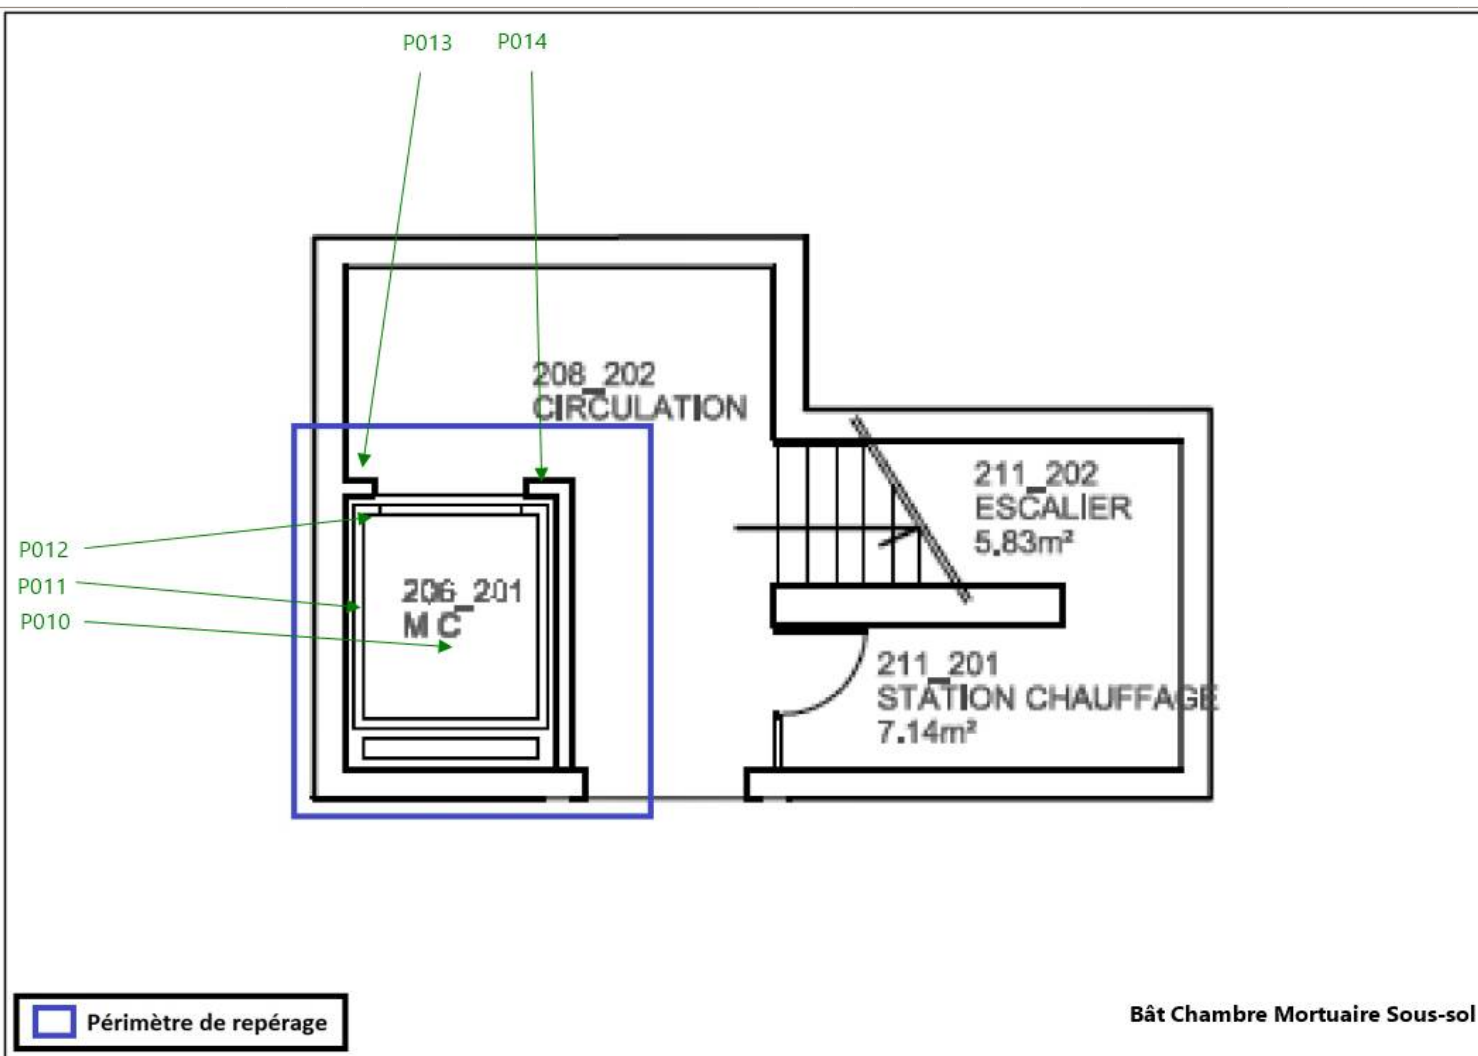


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 16/03/2023

Croquis 3 / 6
Version : V01
du : 16/03/2023

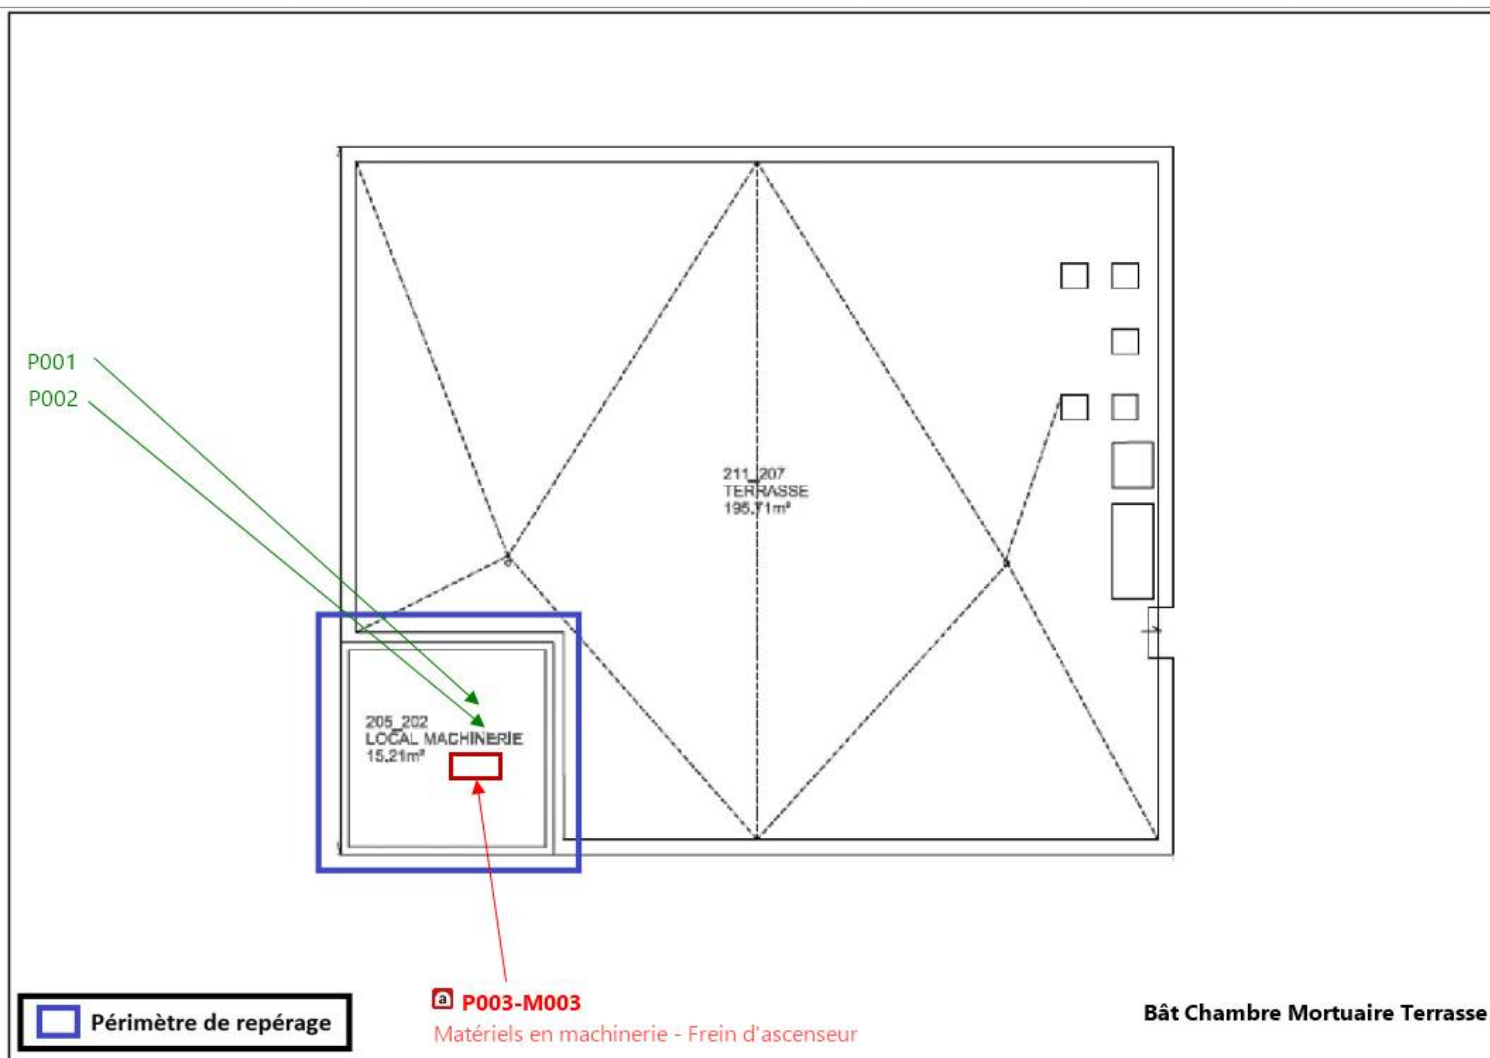


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 16/03/2023

Croquis 4 / 6
Version : V01
du : 16/03/2023

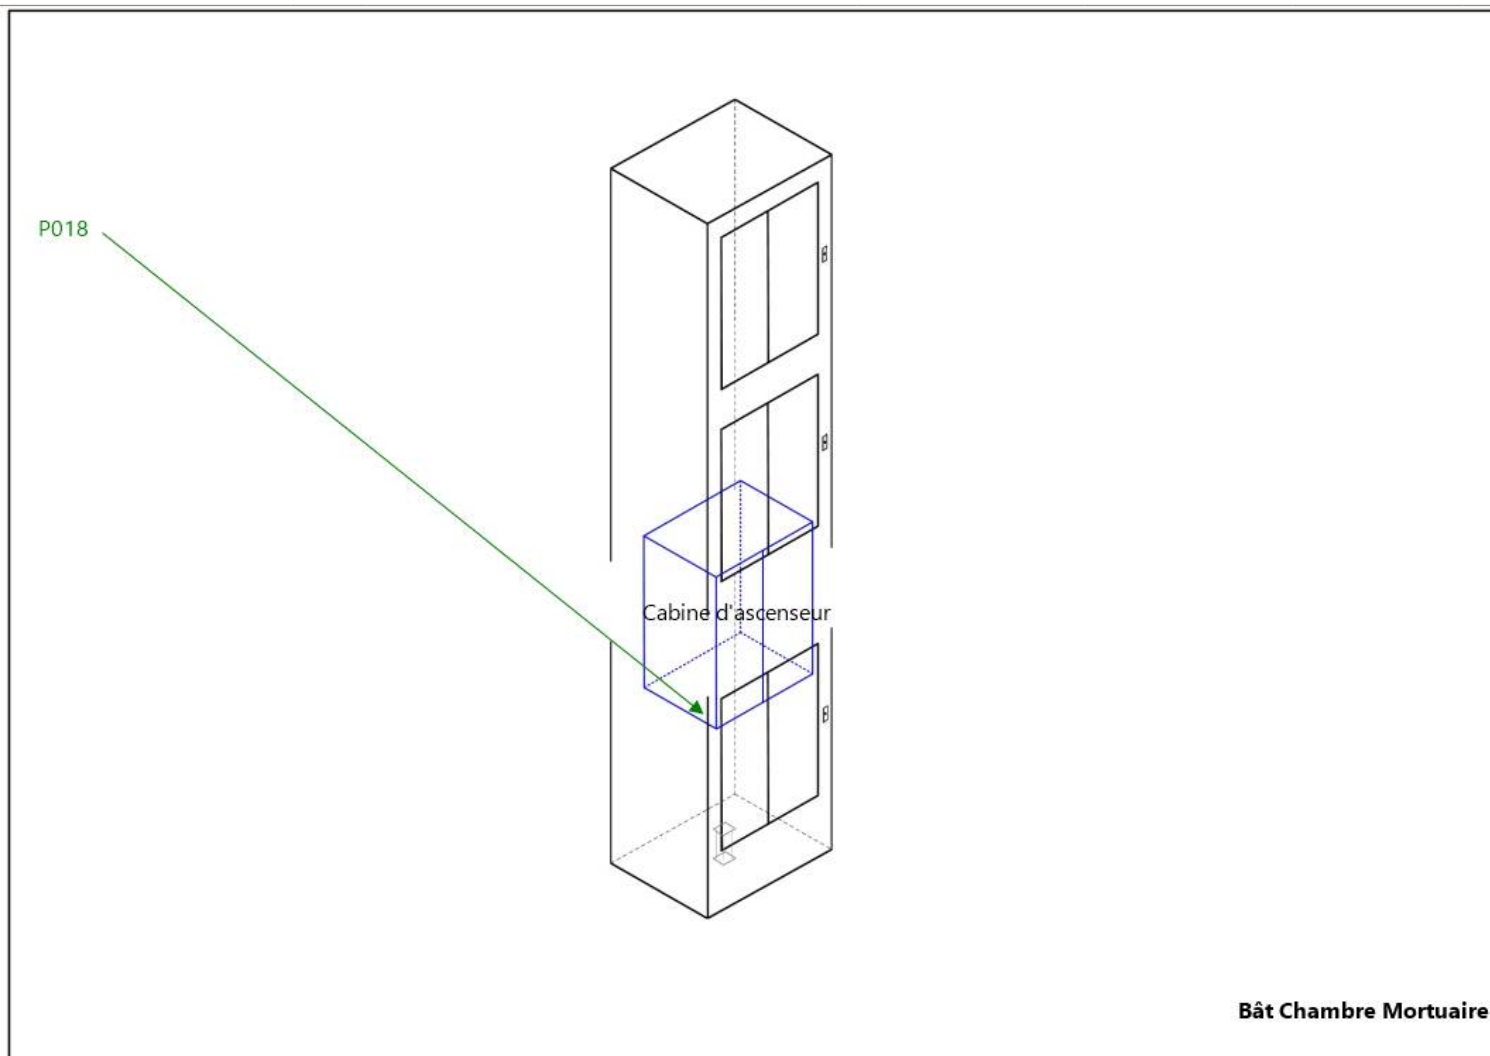

Bât Chambre Mortuaire

Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT





Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 16/03/2023

Croquis 5 / 6
Version : V01
du : 16/03/2023

LEGENDES RECHERCHE D'AMIANTE

| | |
|---|--|
|  | Matériaux contenant de l'amiante |
|  | Matériel en machinerie – Freins d'ascenseur |
|  | Revêtement de murs – Colle de plinthes carrelage |
|  | Mur – Peinture +Enduit ciment |

Annexe au rapport : APHP11_1 AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 16/03/2023

Croquis 6 / 6
Version : V01
du : 16/03/2023



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Quentin MEYNARDZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-011389-01

Numéro de dossier : 23H005259**Référence de dossier : Dossier:****APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23H005259-001 - Référence *P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-002 - Référence *P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Socle beton - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-003 - Référence *P003 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - - Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-004 - Référence *P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-005 - Référence *P005 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-006 - Référence *P006 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-007 - Référence *P007* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-008 - Référence *P008* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-009 - Référence *P009* - 4 - *Plafonds et faux plafonds* - - *Plafonds* - *Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-010 - Référence *P010* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols tremie* - *Dalle beton* - *Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-011 - Référence *P011* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-012 - Référence *P012* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-013 - Référence *P013* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Dalle beton* - *Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-014 - Référence *P014* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs* - *Peinture + Enduit ciment* - *Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-015 - Référence *P015* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Colle de carrelage* - *Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-016 - Référence *P016* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-017 - Référence *P017* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005259-018 - Référence *P018* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols - Revêtement souple + Colle - Bat Chambre Mortuaire - Cabine d'ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
117 Quai de Valmy
75010 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02 Page 1/6
Référence laboratoire N° : 23RB006577 Référence de suivi du dossier N° : 23H005259
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:
APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 (1) | 23H005259-001 - P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 23H005259-002 - P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Socle beton - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 23H005259-003 - P003 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - - Materiels en machinerie - Frein d'ascenseur - Bat Chambre Mortuaire / Toiture - Machinerie | Matériau semi-dur (fibreux) (noir) | MOLP / TJM3 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02 Page 2/6
 Référence laboratoire N° : 23RB006577 Référence de suivi du dossier N° : 23H005259
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
 Date d'analyse : 08/03/2023
 Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:
 APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004 | 23H005259-004 - P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 23H005259-005 - P005 - 3 - Parois verticales intérieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur (gris) en traces | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 006 (1) | 23H005259-006 - P006 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 208_203 Circulation | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 (1) | 23H005259-007 - P007 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02 Page3/6
Référence laboratoire N° : 23RB006577 Référence de suivi du dossier N° : 23H005259
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:
APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008 | 23H005259-008 - P008 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 23H005259-009 - P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - - Plafonds - Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / R+1 - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 (1) | 23H005259-010 - P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols tremie - Dalle beton - Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011 (1) | 23H005259-011 - P011 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012 (1) | 23H005259-012 - P012 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 206_201 M.C | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02 Page 4/6
 Référence laboratoire N° : 23RB006577 Référence de suivi du dossier N° : 23H005259
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
 Date d'analyse : 08/03/2023
 Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:
 APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013 (1) | 23H005259-013 - P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation | Matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 (1) | 23H005259-014 - P014 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / Sous-sol - 208_202 Circulation | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 23H005259-015 - P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016 (2) | 23H005259-016 - P016 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | MET / WU7Z | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02 Page 5/6
Référence laboratoire N° : 23RB006577 Référence de suivi du dossier N° : 23H005259
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:
APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 017 (3) | 23H005259-017 - P017 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris) | MOLP / R8MC | 1 / 1 | - | Quantité insuffisante |
| 018 | 23H005259-018 - P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle - Bat Chambre Mortuaire - Cabine d'ascenseur | Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibres) (marron) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008546-01

Référence laboratoire N° : 23RB006577

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client: 23H005259 - Dossier:

APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

Date d'émission de rapport : 09/03/2023 6:02

Référence de suivi du dossier N° : 23H005259

Date de réception : 06/03/2023

Page 6/6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Sef serviciu -

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Quentin MEYNARD

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-012560-01

Numéro de dossier : 23H005903

Référence de dossier : Dossier:

APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 23H005903-001 - Référence *P017bis - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
 EUROFINS EABIDF
 80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
 92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

| | | |
|--|--|----------|
| N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-014152-01 | Date d'émission de rapport : 16/03/2023 4:30 | Page 1/2 |
| Référence laboratoire N° : 23RI013201 | Référence de suivi du dossier N° : 23H005903 | |
| Reçu au laboratoire le : 14/03/2023 | Date de réception : 13/03/2023 | |
| Date d'analyse : 14/03/2023 | | |
| Référence dossier Client: 23H005903 - Dossier: | | |
| APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT | | |

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 (1) | 23H005903-001 - P017bis - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat Chambre Mortuaire / RDC - 204_204 Circulation 1 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) | MET / NN4R | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante |

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-014152-01

Date d'émission de rapport : 16/03/2023 4:30

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 23RI013201

Référence de suivi du dossier N° : 23H005903

Reçu au laboratoire le : 14/03/2023

Date de réception : 13/03/2023

Date d'analyse : 14/03/2023

Référence dossier Client: 23H005903 - Dossier:

APHP11_1_AMP_20230301_BAT.CHAMBRE.MORTUAIRE_X_ASCENSEURS_DAT

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Adriana Kerlin
Chef d'équipe



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°594

Monsieur MEYNARD Quentin

Amiante sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Amiante
Date d'effet : 03/12/2021 - Date d'expiration : 02/12/2028

Amiante avec mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 02/12/2028

Plomb sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Termes métropole
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 19/12/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles de formation : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V012 du 19-12-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Ecosais
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Archier - 92227 Nanterre Cedex
Siren 775 099 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 bis - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
 - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
 - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
 - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** Locatifs « Loi SCELIER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.
 Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
 - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
 - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
 - Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
 - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

Montant des garanties


| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|---|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties' ci-après) | 10 000 000 € par année d'assurance |
| Dont : | |
| Dommages corporels | 10 000 000 € par année d'assurance |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 2 000 000 € par année d'assurance |
| AUTRES GARANTIES | |
| Faute inexcusable (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales] | 2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales] | 885 000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | 1 500 000 € par année d'assurance |
| Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance [article 3.2 des conditions générales] | 500 000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150 000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 35 000 € par sinistre |
| Défense [Art 5 des conditions générales] | Inclus dans la garantie mise en jeu |
| Recours [Art 5 des conditions générales] | 25 000 € par litige |

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 14 juin 2022

Pour la société :



AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers

L'entreprise régie par le Code des Assurances - 313, Terrasse de l'Esche - 92727 Nanterre Cedex

Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261 C. G.R. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances
