

PLANS DE PHASAGE TRAVAUX

Extension du terminal ferry à
Ouistreham



Direction des Équipements Portuaires




Version initiale : Décembre 2024

Phasage

Phase 1

Terrassements de la zone périphérique extérieure
Pose mur de soutènement et clôture périphérique
Reprise de la piste cyclable existante
Dépose de la clôture périphérique existante
Rabotage de revêtement et dépose de bordure à l'intérieur du site

--- Dépose clôture
— Pose clôture

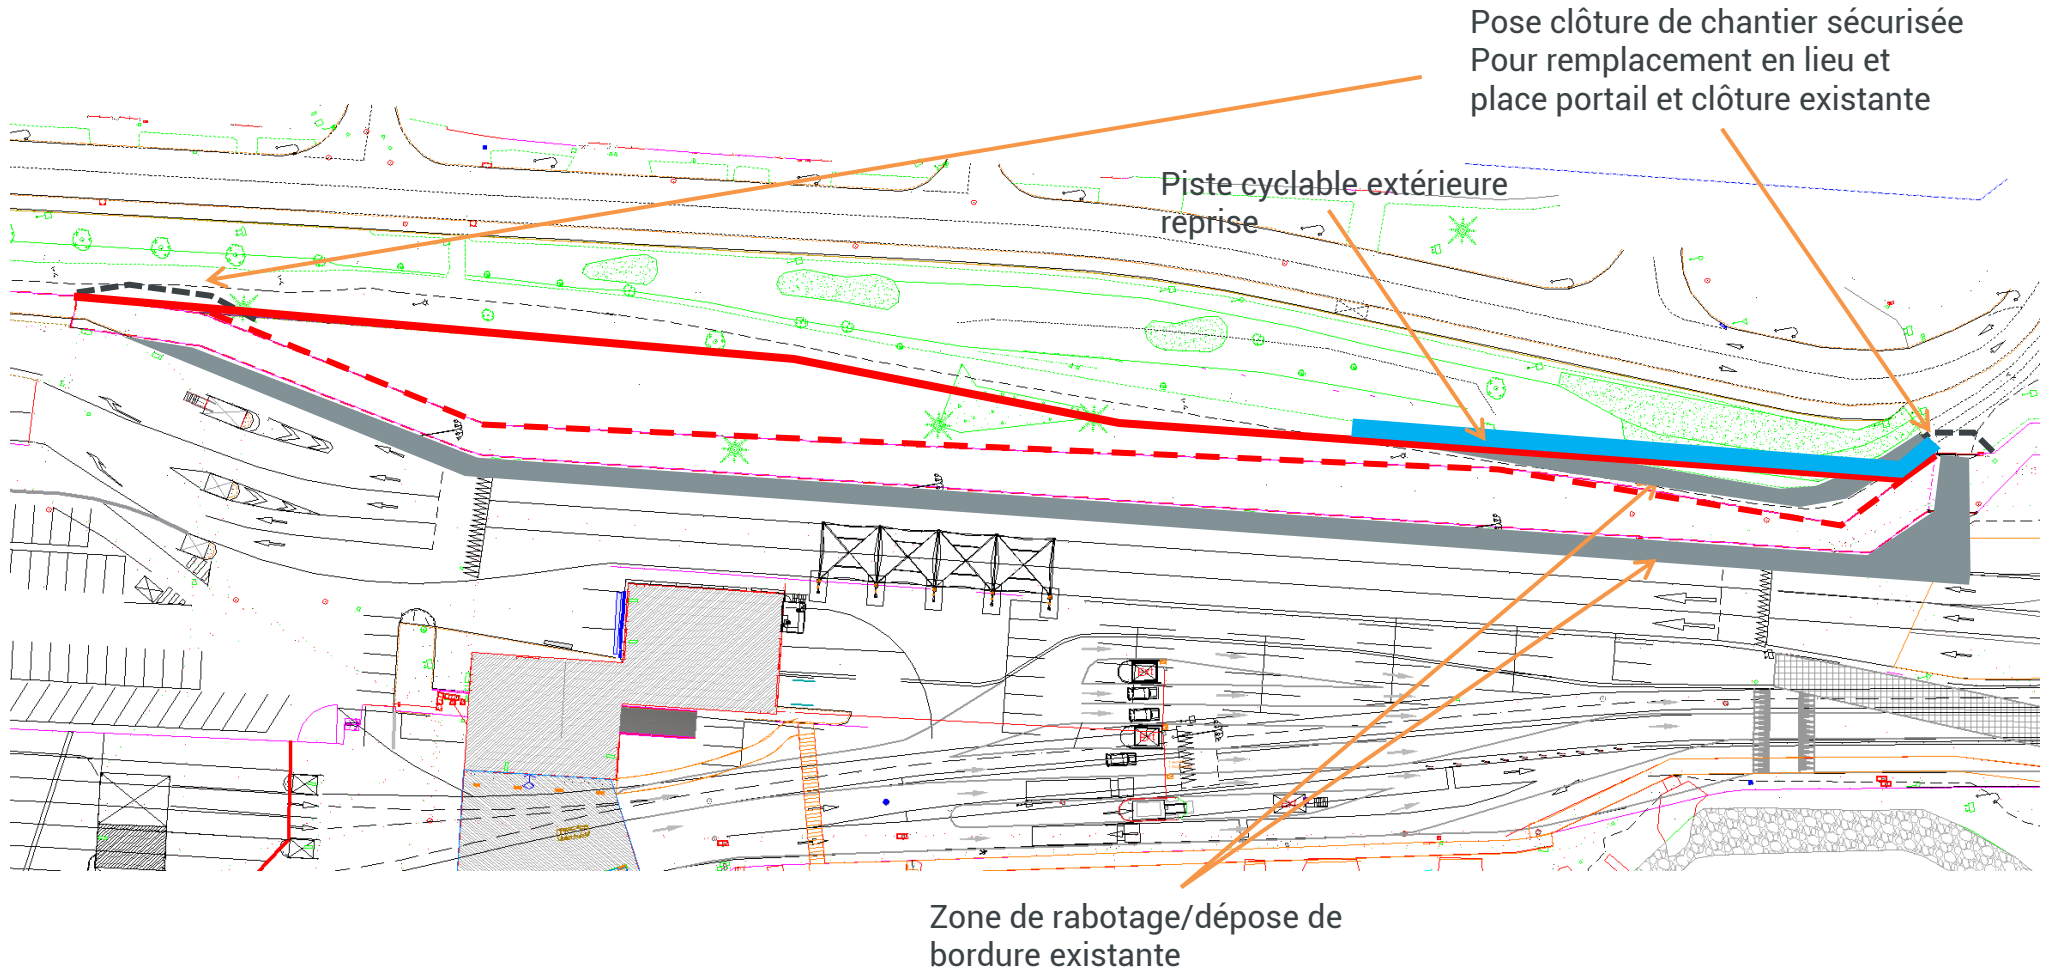


Phasage

Phase 2

Dépose partielle de la clôture intérieure existante
Terrassement / empierrement dans l'emprise
Clôture intérieure existante/clôture extérieure projet

- Equipement de détection à conserver/protéger
- Dépose clôture

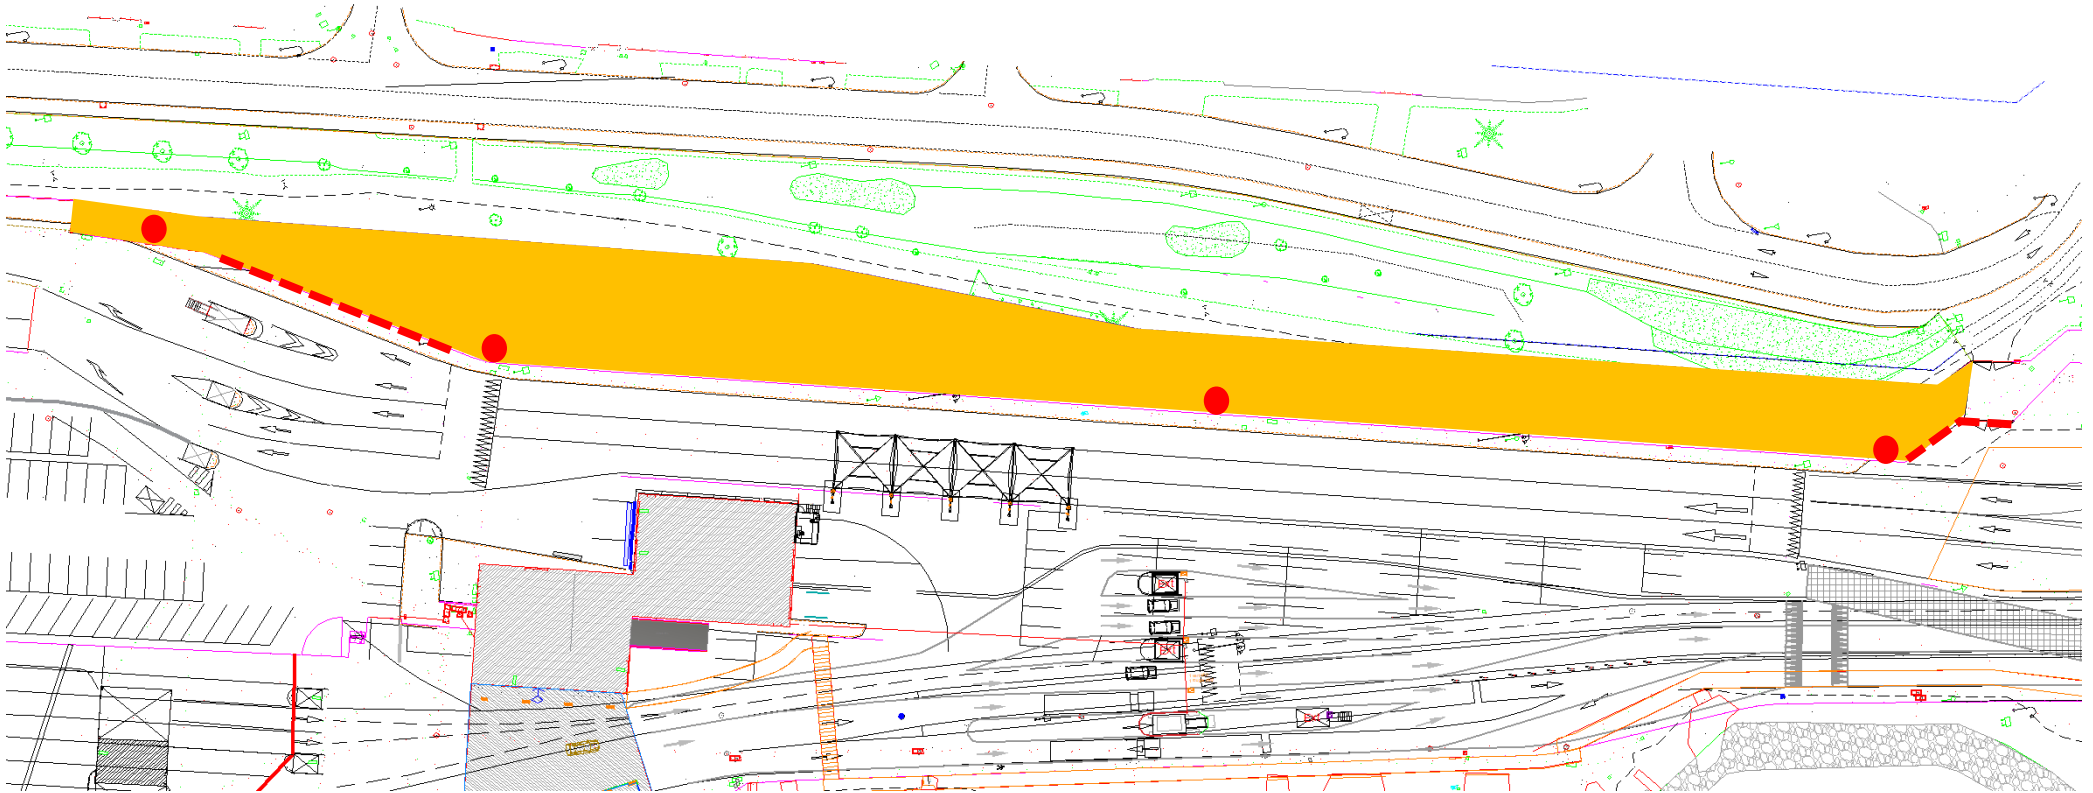


Phasage

Phase 3

Pose du génie civil projeté et des fondations équipements
Pose des réseaux de liaison périphérique


- Equipement de détection à conserver/protéger
- Massifs candélabres projetés
- > Liaison réseaux

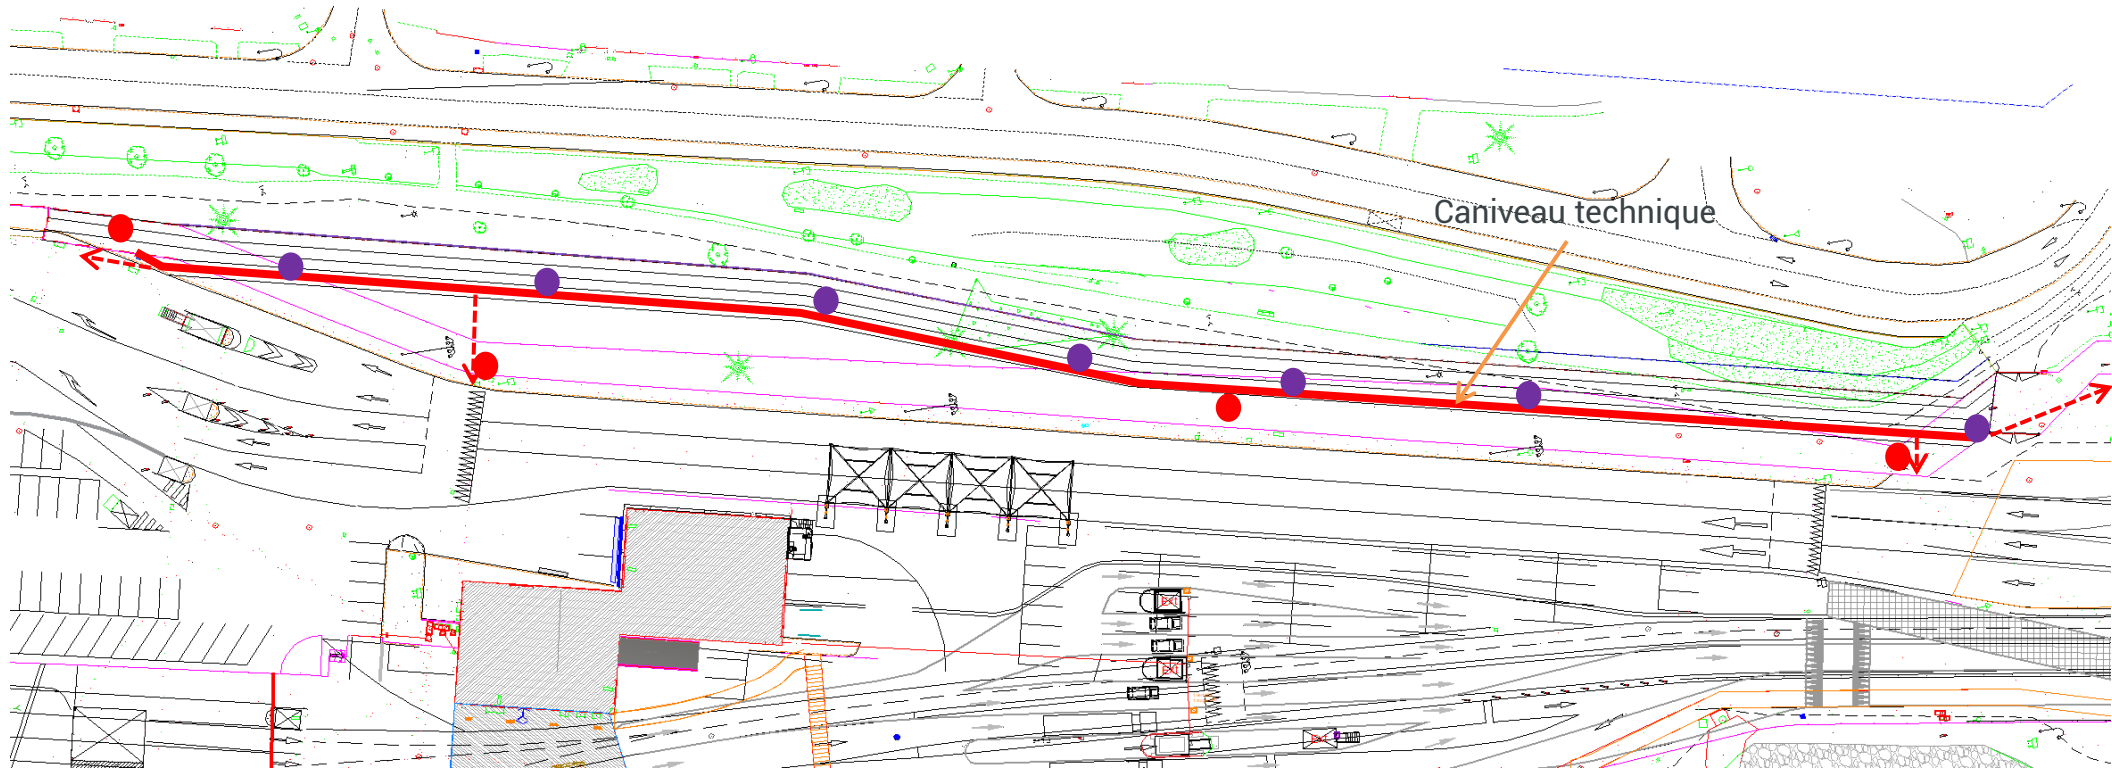

Phasage

Phase 4 Câblage réseau de surveillance projeté et réseau d'éclairage projeté
Pose des équipements de surveillance projetés
Pose des mats d'éclairage

- Poteau avec caméra de surveillance
- Mâts d'éclairage

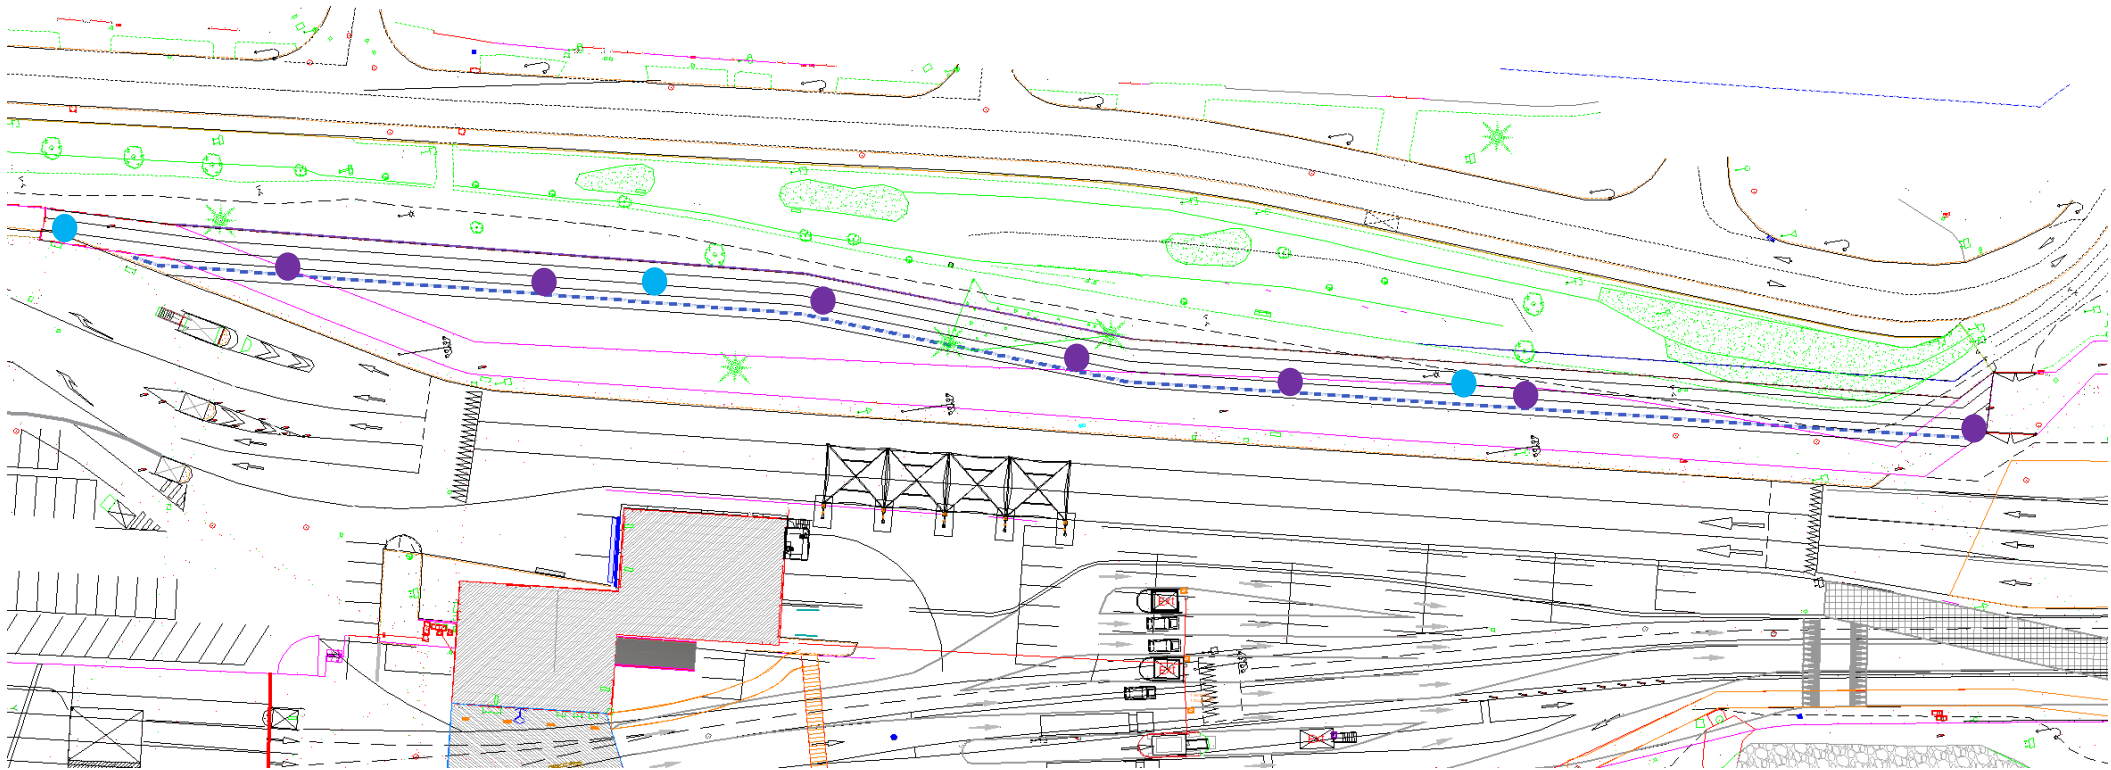


Phasage

Phase 5

Dépose de la clôture existante restante
 Dépose des mâts d'éclairage existant et massifs
 Dépose des équipements de surveillance existant (cameras, mâts, massifs)
 Terrassement et empiérement de la partie intérieure

- Mâts de surveillance à déposer
- Mâts d'éclairage à déposer
- Dépose clôture

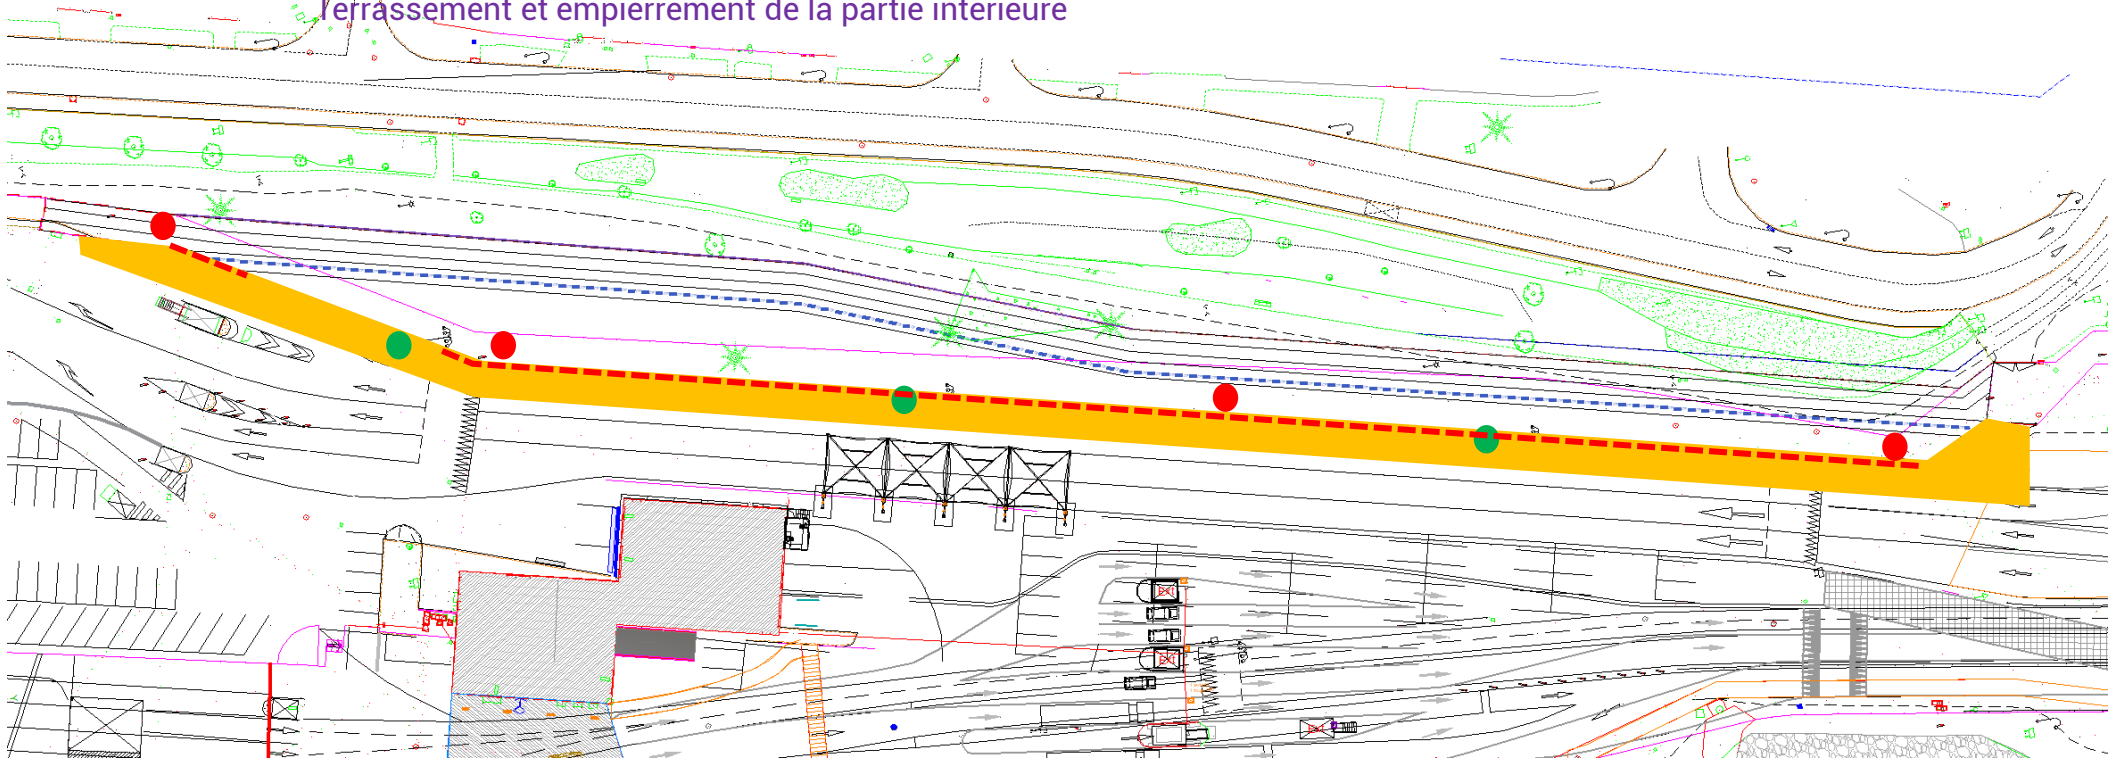


Phasage

Phase 6

Mise en œuvre structure de voirie et trottoirs
Pose clôture et portail intérieur
Pose borduration

— Pose clôture
— Pose bordures

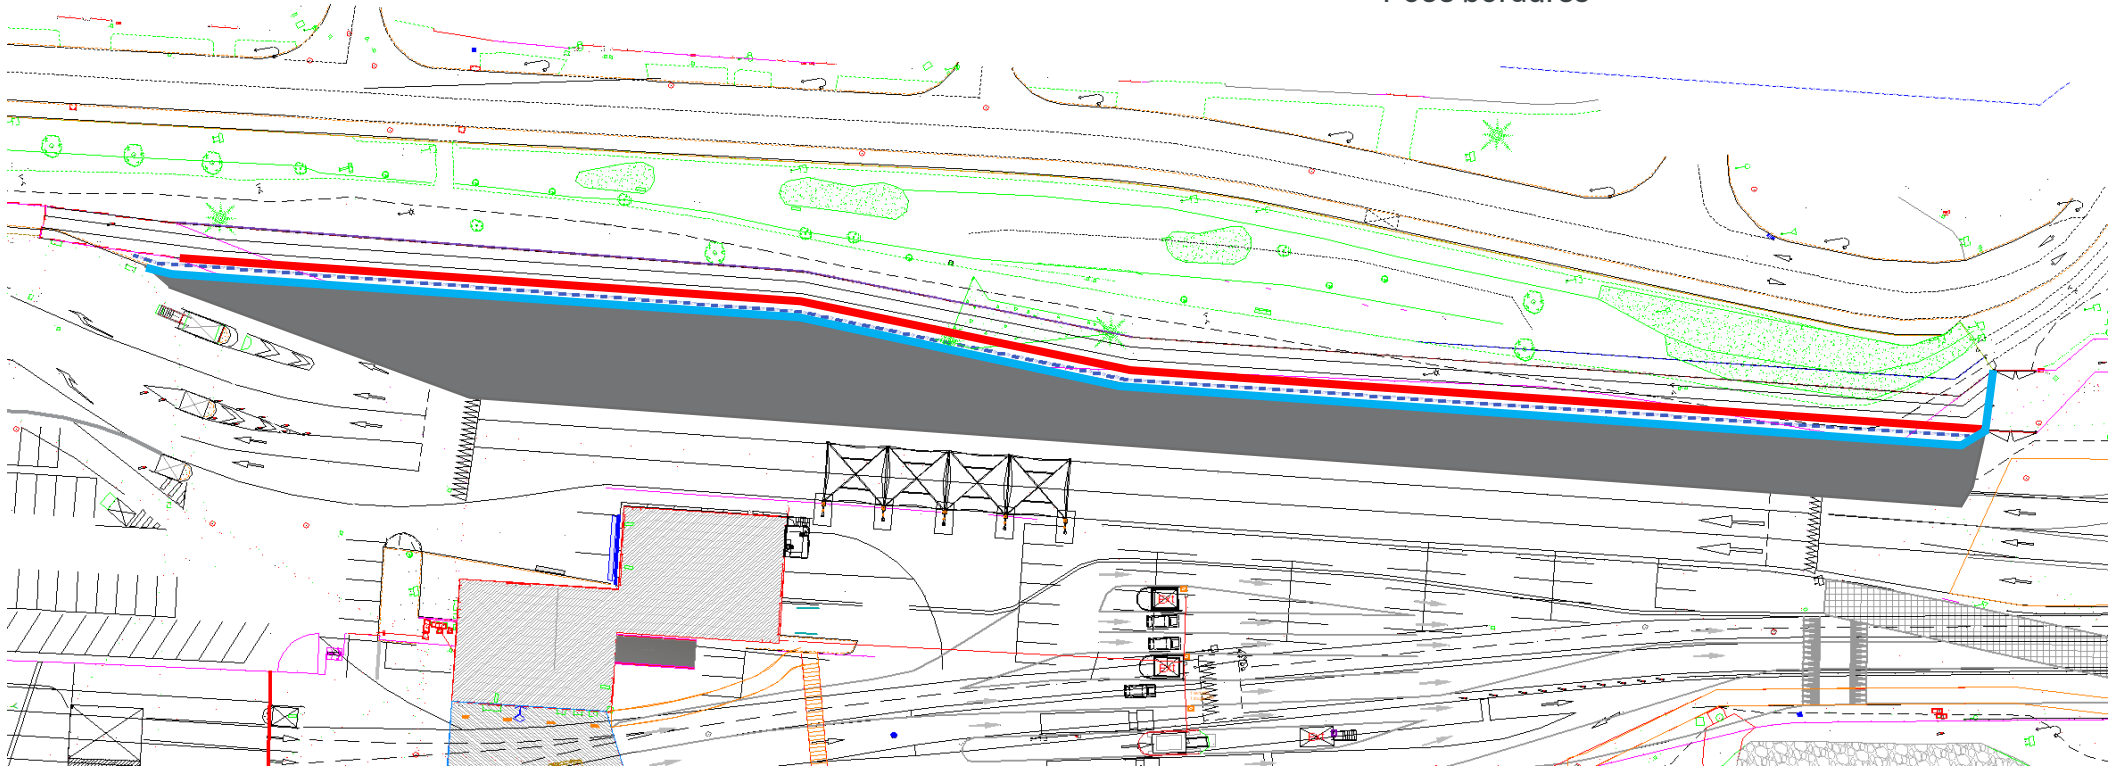

Phasage

Phase 7

Mise en œuvre revêtements
Pose bordure de séparation de voie
Finitions/signalisation

Bande engazonnée no man's land
Bande paillage no mans land
Enrobé noir sur trottoir
Enrobé noir sur voirie lourde
Pose bordure DBA

