

Chef de projet	
Dates du projet	8 sept. 2025 - 27 sept. 2025
Avancée	0%
Tâches	10
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Arrêt Bloc01	08/09/2025	26/09/2025
Arrêt tous Blocs	19/09/2025	19/09/2025
Dépose CTA + réseaux existants	08/09/2025	10/09/2025
Livraison CTA	11/09/2025	11/09/2025
Pose CTA	11/09/2025	12/09/2025
Electricité / Régulation	15/09/2025	23/09/2025
Tuyauteries hydrauliques	15/09/2025	17/09/2025
Gaines ventilation	18/09/2025	24/09/2025
Mise en service	25/09/2025	26/09/2025
Pose écrans blocs	19/09/2025	19/09/2025

Diagramme de Gantt

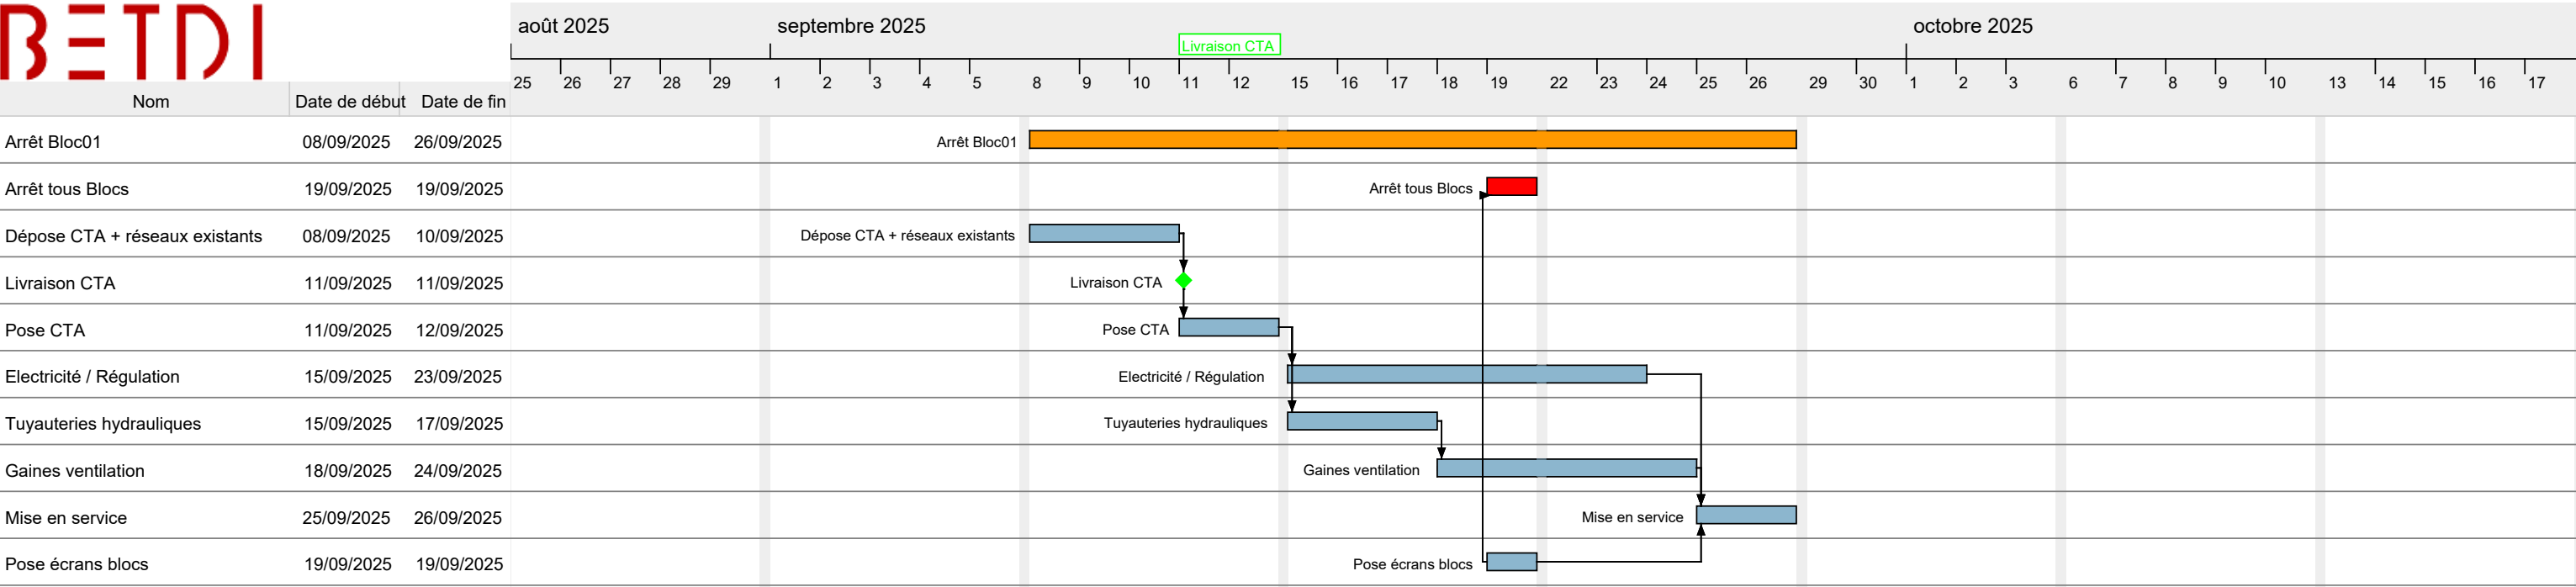


Diagramme des Ressources

