


TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRINCIPES DE PHASAGE ET DES MODES D'EXPLOITATION ASSOCIES:

| Phases | Mode d'exploitation | Travaux | Mise en place de SMV + K5d ou K5a (en ml) | sens de circulation (*) | PR origine | PR fin | Durée estimée |
|---|---|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| TF (tranche ferme) – Phase n°1c (Piles OA + ITPC du PR 69+000 + ITPC provisoire + DR) | Neutralisation voie rapide Est et Ouest | Pile Ouest + ITPC définitif Ouest | 660 | Sens 1 | 69+000 | 68+340 | 3 mois |
| | | Pile Est + ITPC définitif Est | 740 | Sens 2 | 69+100 | 68+360 | |
| | | ITPC provisoire (Ouest) | 160 | Sens 1 | 69+160 | 69+320 | |
| | | ITPC provisoire (Est) | 160 | Sens 2 | 69+280 | 69+120 | |
| TF – Phase de transition de la phase 1c vers la phase 1d | Basculement | Déplacement des SMV sens 2 + travaux divers ITPC | Néant | Sens 1 ou 2 | 70-450 (ITPC Anjouinière) | 68-400 (ITPC définitif) | 2 jours |
| TF – Phase n°1d (Culée + amorce des bretelles + DR) Est | Neutralisation voie lente Est | Culée Est | 360 | Sens 2 | 69+000 | 68+660 | 3 mois |
| | | Amorce bretelle d'entrée 4 Est | 300 | Sens 2 | 68+620 | 68+160 | |
| | | Amorce bretelle de sortie 3 Est | 320 | Sens 2 | 69+260 | 69+050 | |
| TF – Phase n°1d (Culée + amorce des bretelles) Ouest | Neutralisation voie lente Ouest | Culée Ouest | 160 | Sens 1 | 68+700 | 68+840 | 3 mois |
| | | Amorce bretelle de sortie 1 Ouest | 300 | Sens 1 | 68+380 | 68+650 | |
| | | Amorce bretelle d'entrée 2 Ouest | 460 | Sens 1 | 68+900 | 69+300 | |
| TF – Phase n°1e : (tablier OA Est et Ouest) + Traversée en Ø600 RN10 | Basculement | Tablier + canalisation sous chaussée Ø600 (Ouest ou Est) | Néant | Sens 1 ou 2 | 69+200 (ITPC provisoire) | 68+400 (ITPC définitif) | 15 jours |
| | Basculement | Tablier + canalisation sous chaussée Ø600 (Ouest ou Est) | | | | | 15 jours |
| TF – Phase n°1f : Fermeture TPC Corneboeuf | Neutralisation voie rapide Est et Ouest | ITPC Corneboeuf | 450 | Sens 1 | 67+250 | 67+700 | 1 mois |
| | | | 460 | Sens 2 | 67+850 | 67+400 | |
| | Neutralisation voie lente Est et Ouest | Branches carrefours Corneboeuf | 300 | Sens 1 | 67+300 | 67+600 | 1 mois |
| | | | 350 | Sens 2 | 67+850 | 67+500 | |
| TO (tranche optionnelle) - Bretelle l'Anjouinière et ITPC | Neutralisation voie lente Est | Branche Anjouinière | 450 | Sens 1 | 70+200 | 70+650 | 15 jours |
| | Neutralisation voie rapide Est et Ouest | ITPC Anjouinière | 450 | Sens 1 | 70+200 | 70+650 | 1 mois |
| | | | 450 | Sens 2 | 70+800 | 70+350 | |
| | Neutralisation voie lente Est | DBA | 220 | Sens 2 | 70+260 | 70+040 | 15 jours |
| | Neutralisation voie lente ou rapide Ouest | Travaux diverses finitions | 450 | Sens 1 ou 2 | A définir | A définir | A définir |

(*) Sens 1 : Poitiers vers Angoulême ; Sens 2 : Angoulême vers Poitiers

Mode d'exploitation : Neutralisation de voie rapide
Travaux : Pile de l'OA – création d'ITPC définitif au PR 68+400 et d'un ITPC provisoire au PR 69+000 – Glissières TPC

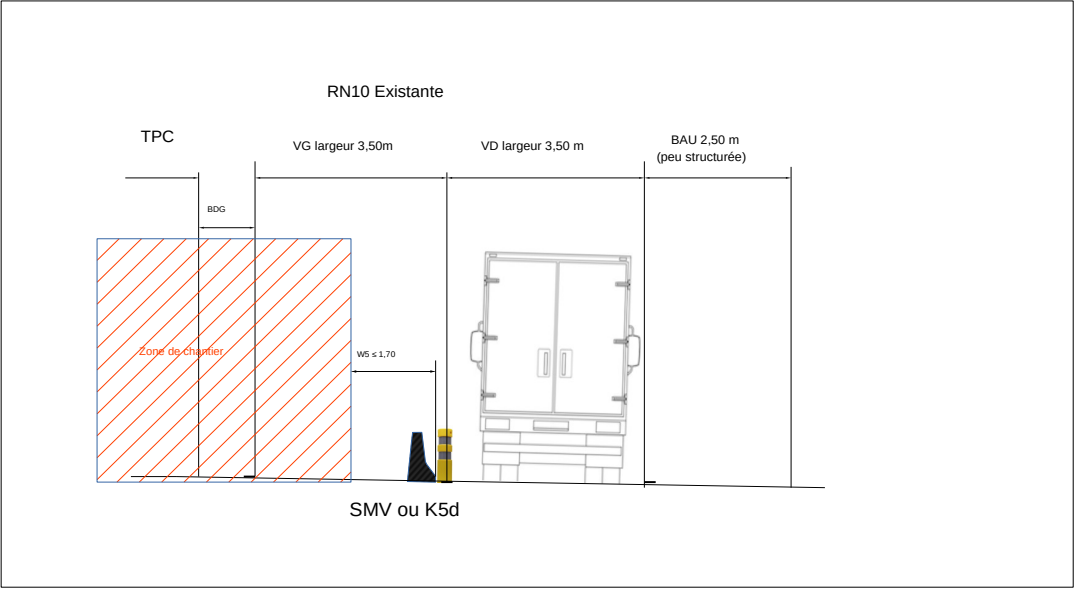

Mode d'exploitation : Neutralisation de voie lente
Travaux : Culées de l'OA - Amorces d'entrée et de sortie de bretelle - Branche carrefours existants (glissières, démolition de chaussée)

