

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	CAF DE TARBES 70651 10.06.22 A
Propriétaire	CAF DE TARBES
Donneur d'ordre	CAF DE TARBES
Adresse de l'immeuble	boulevard du Garigliano 65000 TARBES
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	03/06/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	10/06/2022
Date d'émission du rapport de repérage	17/06/2022
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



Opérateur de repérage :

RUIZ Quentin
CABINET BARRERE
Le 17/06/2022

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Aucune

Amiante

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	3
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	4
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	4
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	4
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	4
RESULTATS DU REPERAGE	5
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	5
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	6
COMMENTAIRE SUR LA MISSION.....	6
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	6
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	15
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	17
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	20
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	21

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **CAF DE TARBES 70651 10.06.22**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CAF DE TARBES
Demeurant :	
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	CAF DE TARBES
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur RUIZ Quentin
Nom et adresse de l'entreprise :	CABINET BARRERE 8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU
N° de Siret :	47925940000022
RCP-compagnie-n° de police :	AXA france IARD -10729879904

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	boulevard du Garigliano 65000 TARBES
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiqué	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Suppression de la cage d'escalier + Création d'ouverture dans le mur

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Hall	1er	Concernée
Placard ménage	1er	Concernée
Placard n°1	1er	Concernée
Placard n°2	1er	Concernée
Salle d'attente	1er	Concernée

Amiante

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 - Faïence murale : Faïence murale Colle blanche Carrelage blanc 10x10 (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Placard ménage	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	
Placard n°1	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	
Placard n°2	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	

Z002 - Sol Carrelage gris 15x15 : Plancher Colle blanche Carrelage gris 15x15 (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Placard ménage	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	
Placard n°1	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	
Placard n°2	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	

Z003 - Murs : Murs Béton Enduit peint/PP (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Hall	Murs	Béton - Enduit peint/PP	
Placard ménage	Murs	Béton - Enduit peint/PP	
Placard n°1	Murs	Béton - Enduit peint/PP	
Placard n°2	Murs	Béton - Enduit peint/PP	
Salle d'attente	Murs	Béton - Enduit peint/PP	

Z004 - Plafonds : Plafond Béton Enduit peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Placard ménage	Plafond	Béton - Enduit peint	
Placard n°1	Plafond	Béton - Enduit peint	
Placard n°2	Plafond	Béton - Enduit peint	
Salle d'attente	Plafond	Béton - Enduit peint	

Z005 - Cloisons : Cloisons Placoplâtre Enduit peint/PP (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Placard ménage	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	
Placard n°1	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	
Placard n°2	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	

5 Résultats du repérage
5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Hall	1er	Murs	Murs	Béton - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Toutes zones	Socle de garde-corps	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	
Placard ménage	1er	Murs	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Murs	Béton - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Enduit peint	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
Placard n°1	1er	Murs	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		Murs	Murs	Béton - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Enduit peint	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	Résultat d'analyse (P003)	Non	
Placard n°2	1er	Murs	Cloisons	Placoplâtre - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Murs	Faïence murale	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Murs	Béton - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Enduit peint	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Sol	Plancher	Colle blanche - Carrelage gris 15x15	Résultat d'analyse	Non	
Salle d'attente	1er	Murs	Murs	Béton - Enduit peint/PP	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Enduit peint	Résultat d'analyse	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

Amiante

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Hall Garde-corps - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Métal - Peinture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Métal / Peinture
Support :

Taille :
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC-034440-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Hall Socle de garde-corps - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Béton - Peinture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton / Peinture

Support :

Taille :

0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC-034440-01	Matériau de type peinture (blanc) + (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement

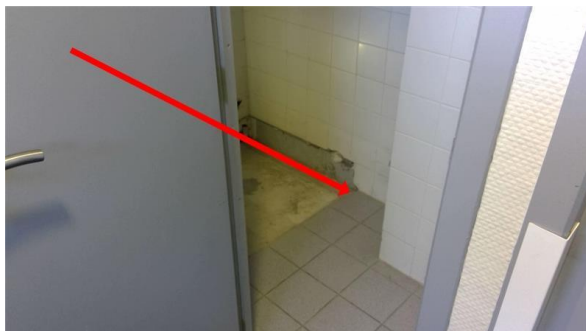

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Placard n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Colle blanche - Carrelage gris 15x15

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle blanche / Carrelage gris 15x15

Support :

Taille :

0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-KC-034440-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-KC-034440-01	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement

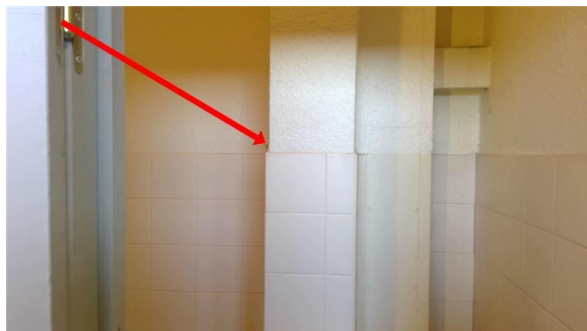

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Placard n°1 Murs - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Béton - Enduit peint/PP

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton / Enduit peint/PP

Support :

Taille :

0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC- 034440-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement

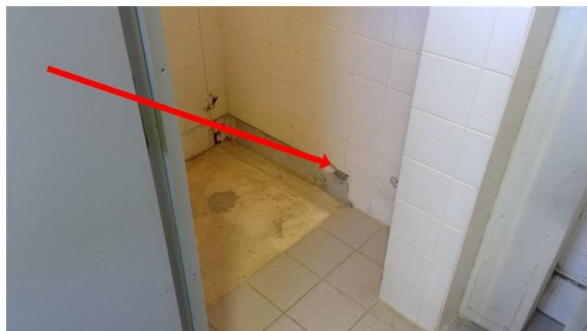

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Placard n°1 Faïence murale - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Colle blanche - Carrelage blanc 10x10

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle blanche / Carrelage blanc 10x10

Support :

Taille :

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC- 034440-01	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Placard n°2 Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Placoplâtre - Enduit peint/PP

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Placoplâtre / Enduit peint/PP

Support :

Taille :

0 cm




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC-034440-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement

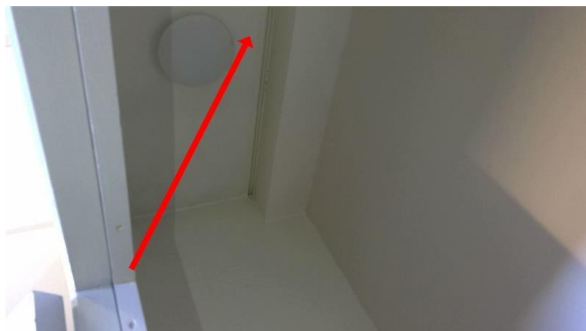

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAF DE TARBES	CAF DE TARBES 70651 10.06.22	1er - Placard n°2 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
RUIZ Quentin	10/06/2022	Béton - Enduit peint

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Enduit peint

Support :

Taille :
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-KC-034440-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720220600836236



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

CABINET BARRERE
Monsieur Quentin RUIZ
8 bis avenue lasbordes
64420 SOUMOULOU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-034440-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2022 12:54 Page 1/3
Dossier N° : 22K016481 Date de réception : 15/06/2022 Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client:
CAF DE TARBES 70651 10.06.22 A - boulevard du Garigliano 65000 TARBES - CAF DE TARBES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-1er - Hall - Toute: zones - Garde-corps - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-1er - Hall - Toute: zones - Socle de garde-corps - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-1er - Placard n°1 - Sol - Plancher - Colle blanche - Carrelage gris 15x15	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)(I)	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-1er - Placard n°1 - Murs - Murs - Béton - Enduit peint/PP	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest:

4 Chemin des Maures, CS 80134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 951 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
3-3540
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-034440-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2022 12:54 Page 2/3
Dossier N° : 22K016481 Date de réception : 15/06/2022 Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client :
CAF DE TARBES 70651 10.06.22 A - boulevard du Garigliano 65000 TARBES - CAF DE TARBES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-1er - Placard n°1 - Murs - Faïence murale - Colle blanche - Carrelage blanc 10x10	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-1er - Placard n°2 - Murs - Cloisons - Placoplâtre - Enduit peint/PP	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-1er - Placard n°2 - Plafond - Plafond - Béton - Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZL6A *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole " ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

3- 5540

Partie disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-034440-01 Date d'émission de rapport : 16/06/2022 12:54 Page 3/3
 Dossier N° : 22K016481 Date de réception : 15/06/2022 Date d'analyse : 15/06/2022

Référence dossier Client:

CAF DE TARBES 70651 10.06.22 A - boulevard du Garigliano 65000 TARBES - CAF DE TARBES

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 246 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat concluant.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Océane Melle
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE


Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
3-3540
Partie disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence




Certificat N° C3226

Monsieur Quentin RUIZ

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.


dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention	Certificat valable Du 09/03/2020 au 08/03/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 10/06/2020 au 09/06/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 09/03/2020 au 08/03/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 10/06/2020 au 09/06/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 10/06/2020 au 09/06/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 09/03/2020 au 08/03/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 10 juin 2020

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
 Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version M 250119 version N 010120

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES

COURTIER

CAPE - LC2

46 RUE TAUZIA

33800 BORDEAUX

Portefeuille : 0201549484



Assurance et Banque

SARL CABINET BARRERE
8 Bis AV LASBORDES
64420 SOUMOULOU FR

Vos références :

Contrat n° 10729879904

Client n° 0706762420

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que : **SARL CABINET BARRERE, 8 bis AV LASBORDES 64420 SOUMOULOU** est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10729879904 ayant pris effet le 01/10/2020 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités suivantes :

Diagnostics techniques immobilières:

- ☐ Diagnostic technique plomb :
- ☐ Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- ☐ L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- ☐ L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- ☐ L'état des risques naturels et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- ☐ Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'établissement des certificats de surface (Loi Carrez) prévu par la Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application n°97-532 du 23 mai 1997.
- ☐ L'établissement des états de conformité de la sécurité des piscines conformément à la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret d'application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 (art. L. 128-1 à 3 et R. 128-1 à 4 du code de la construction et de l'habitation)
- ☐ États des lieux locatifs (des parties privatives) selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- ☐ Etat parasite
- ☐ Mise en copropriété notamment rédaction du règlement de copropriété, calcul des tantièmes, plans de la copropriété, calcul des charges,
- ☐ Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Repérage amiante avant travaux ou avant démolition
- ☐ Diagnostic « accessibilité handicapés »
- ☐ Diagnostic technique global des copropriétés prévues par la Loi ALUR du 24/03/2014.

Le montant de la garantie responsabilité Professionnelles s'élève à 500.000 € par sinistre et 1.500.000 € par année d'assurance.

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du 01/10/2021 au 01/10/2022 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 24 septembre 2021

Pour la société

AXA France IARD SA

Societate anonimă cu capital de 214 799 030 Euro

Símbol social: 315. Terrazas de l'Arxíu - 92727 Nanterre Cedex 722 057 480 R.C.S. Nanterre

Entrepriat régie per le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Erro

THE SCIENCE OF

Amiante
