


S2 ANAPATH

Planning PRO-DCE

N°	Texte\Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	OS de démarrage préparation de chantier	1 jr	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25
3	inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS	2 jrs	Ven 04/07/25	Lun 07/07/25
4	préparation chantier TCE (un mois)	22 jrs	Ven 04/07/25	Mar 05/08/25
5	OS de démarrage des travaux TCE	1 jr	Mer 06/08/25	Mer 06/08/25
6	PHASE 2	371 jrs?	Mer 12/06/24	Mer 24/12/25
7				
8	ML01	15 jrs	Jeu 07/08/25	Jeu 28/08/25
9	ML01 Travaux de démolition des murs	1 sem.	Jeu 07/08/25	Mer 13/08/25
10	ML01 Carottage	2 sem.	Mar 12/08/25	Mar 26/08/25
11	ML01 sciage de portes	2 sem.	Jeu 14/08/25	Jeu 28/08/25
12				
13	ML02 ELECTRICITE	85 jrs	Mar 12/08/25	Jeu 11/12/25
14	ML02 Chemin de câble	2 sem.	Mer 01/10/25	Mar 14/10/25
15	ML02 Courant fort et faible	40 jrs	Mer 15/10/25	Jeu 11/12/25
16	ML02 Tirage de câbles	3 sem.	Mer 15/10/25	Mar 04/11/25
17	ML02 Goulottes/appareillage	4 sem.	Mer 05/11/25	Jeu 04/12/25
18	ML02 Luminaires	2 sem.	Jeu 27/11/25	Mer 10/12/25
19	Installation armoire électrique	5 jrs	Ven 05/12/25	Jeu 11/12/25
20	ML02 Détection incendie	84 jrs	Mar 12/08/25	Mer 10/12/25
21	ML02 detection fumée par aspiration	2 sem.	Mar 12/08/25	Mar 26/08/25
22	ML02 DI électrique	3 sem.	Jeu 20/11/25	Mer 10/12/25
23				
24	ML03 CVC PLOMBERIE	371 jrs?	Mer 12/06/24	Mer 24/12/25
25	ML03 mise au point avec fournisseur - élaboration FAM	2 sem.	Ven 04/07/25	Ven 18/07/25
26	CHU validation FAM	2 sem.	Lun 21/07/25	Ven 01/08/25
27	ML03 Approvisionnement CTA	10 sem.	Lun 04/08/25	Lun 13/10/25
28	ML03 CTA n°12B (PATIO S3)	4 sem.	Mar 14/10/25	Mer 12/11/25
29	ML03 Remplacement à neuf des caissons d'extractions spécifique	5 jrs	Mar 14/10/25	Lun 20/10/25
30	ML03 Ajout Extracteur spécifique 20 S40m3/h (N9)	1 sem.	Mar 14/10/25	Lun 20/10/25
31	ML03 Extracteur du local azote (N1)	1 sem.	Mar 14/10/25	Lun 20/10/25
32	ML03 Réseaux aérauliques	61 jrs	Jeu 21/08/25	Mar 18/11/25
33	ML03 Dépose et évacuation de gaine de ventilation circulaire existante	1 sem.	Jeu 21/08/25	Jeu 28/08/25
34	ML03 Gaines neuves	17 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 02/10/25
35	zone macro CTA12B	3 sem.	Mer 10/09/25	Mar 30/09/25
36	reste de la zone	3 sem.	Ven 12/09/25	Jeu 02/10/25
37	ML03 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation	2 sem.	Ven 31/10/25	Mar 18/11/25
38	ML03 registres de réglage	2 jrs	Ven 31/10/25	Lun 03/11/25
39	ML03 boîtes à débit variable	1 sem.	Mer 01/10/25	Mar 07/10/25
40	ML03 boîtes de détente	5 jrs	Ven 19/09/25	Jeu 25/09/25
41	ML03 Evacuation hottes	22 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 30/10/25
42	ML03 Gaines circulaires PVC yc accessoires	17 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 23/10/25
43	ML03 Zone macro	3 sem.	Mer 01/10/25	Mar 21/10/25
44	ML03 reste de la zone	3 sem.	Ven 03/10/25	Jeu 23/10/25
45	ML03 boîtes à débit variable - registres d'isolement manuel	2 sem.	Ven 17/10/25	Jeu 30/10/25
46	ML03 Bouches	5 jrs	Jeu 27/11/25	Mer 03/12/25
47	ML03 bouches de soufflage	5 jrs	Jeu 27/11/25	Mer 03/12/25
48	ML03 bouches de reprise	5 jrs	Jeu 27/11/25	Mer 03/12/25
49	ML03 Réseau EC/EG	68 jrs	Jeu 07/08/25	Jeu 13/11/25
50	ML03 RACCORDEMENT Eau Glacée dans le pater noster	0 jr	Mer 01/10/25	Mer 01/10/25
51	ML03 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires	3 sem.	Mer 22/10/25	Jeu 13/11/25
52	ML03 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires	2 sem.	Mer 17/09/25	Mer 01/10/25
53	ML03 Dépose et évacuation du réseau d'eau glacée inutilisé	2 sem.	Jeu 07/08/25	Jeu 21/08/25
54	ML03 Cassettes de climatisation	2 sem.	Jeu 04/12/25	Mer 17/12/25
55	ML03 dont cassettes de clim zone macroscopie -2D6à10	1 sem.	Jeu 04/12/25	Mer 10/12/25
56	ML03 Electricité CVC	20 jrs	Jeu 27/11/25	Mer 24/12/25
57	ML03 Alimentations électriques des équipements CVC	4 sem.	Jeu 27/11/25	Mer 24/12/25
58	ML03 dont Alim. Électriques des équipements CVC zone macroscopie -2D6à10	(2) sem.	Ven 28/11/25	Jeu 11/12/25
59	ML03 Fourniture et raccordement du gyrophare, buzzer, capteur et extracteurs depuis TD Dräger	2 jrs	Ven 12/12/25	Lun 15/12/25
60	ML03 Plomberie Appareillages sanitaires	367 jrs?	Mer 12/06/24	Jeu 18/12/25
61	ML03 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires	1 sem.	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25
62	ML03 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires	1 sem.	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25
63	ML03 Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats, yc accessoires AU SOUS SOL 3	3 sem.	Lun 18/08/25	Lun 08/09/25
64	ML03 Réseaux d'évacuation des effluents, yc accessoires AU SOUS SOL 3	3 sem.	Lun 08/09/25	Ven 26/09/25
65	ML03 bâti support WC suspendu	1 sem.	Jeu 25/09/25	Mer 01/10/25
66	ML03 Appareillages sanitaires	1 sem.	Ven 12/12/25	Jeu 18/12/25
67	ML03 Lave mains	1 sem.	Ven 12/12/25	Jeu 18/12/25
68				
69	ML04 ML04 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE	1 jr?	Mer 12/06/24	Mer 12/06/24
70	ML04 Retrait des dalles	1 sem.	Mar 30/09/25	Mar 07/10/25
71	ML04 mise en place de la charpente	3 jrs	Jeu 13/11/25	Lun 17/11/25
72	ML04 couverture	5 jrs	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25
73	ML04 bardage double peau	4 jrs	Mar 25/11/25	Ven 28/11/25
74	ML04 portes extérieures	2 jrs	Lun 01/12/25	Mar 02/12/25
75	ML04 DEP et finitions	4 jrs	Mer 03/12/25	Lun 08/12/25
76				
77	ML05 ML05 PARTITIONS FINITIONS	116 jrs	Ven 04/07/25	Jeu 18/12/25
78	ML05 DOUBLAGE CLOISONS	77 jrs	Jeu 31/07/25	Mer 19/11/25
79	ML05 INSTALLATION DE CHANTIER	1 sem.	Jeu 31/07/25	Mer 06/08/25
80	ML05 CLOISONNEMENTS PROVISOIRES	5 jrs	Jeu 07/08/25	Mer 13/08/25
81	ML05 Protection en film polyane polyane de chantier (provision)	1 sem.	Jeu 07/08/25	Mer 13/08/25
82	ML05 Confinement PLACO	1 sem.	Jeu 07/08/25	Mer 13/08/25
83	ML05 MODIFICATIONS DE BAIES	3 jrs	Jeu 14/08/25	Mar 19/08/25
84	ML05 Bouchement de baies dans cloisons légères	3 jrs	Jeu 14/08/25	Mar 19/08/25
85	ML05 implantation des cloisons	3 jrs	Jeu 07/08/25	Lun 11/08/25
86	ML05 CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H	20 jrs	Jeu 28/08/25	Mer 24/09/25
87	ML05 Zone Macroscopie	9 jrs	Jeu 28/08/25	Mar 09/09/25
88	ML05 railage et placo	4 jrs	Jeu 28/08/25	Mar 02/09/25
89	ML05 préparation murs	5 jrs	Mer 03/09/25	Mar 09/09/25
90	ML05 Zone Coupe	10 jrs	Mer 03/09/25	Mar 16/09/25

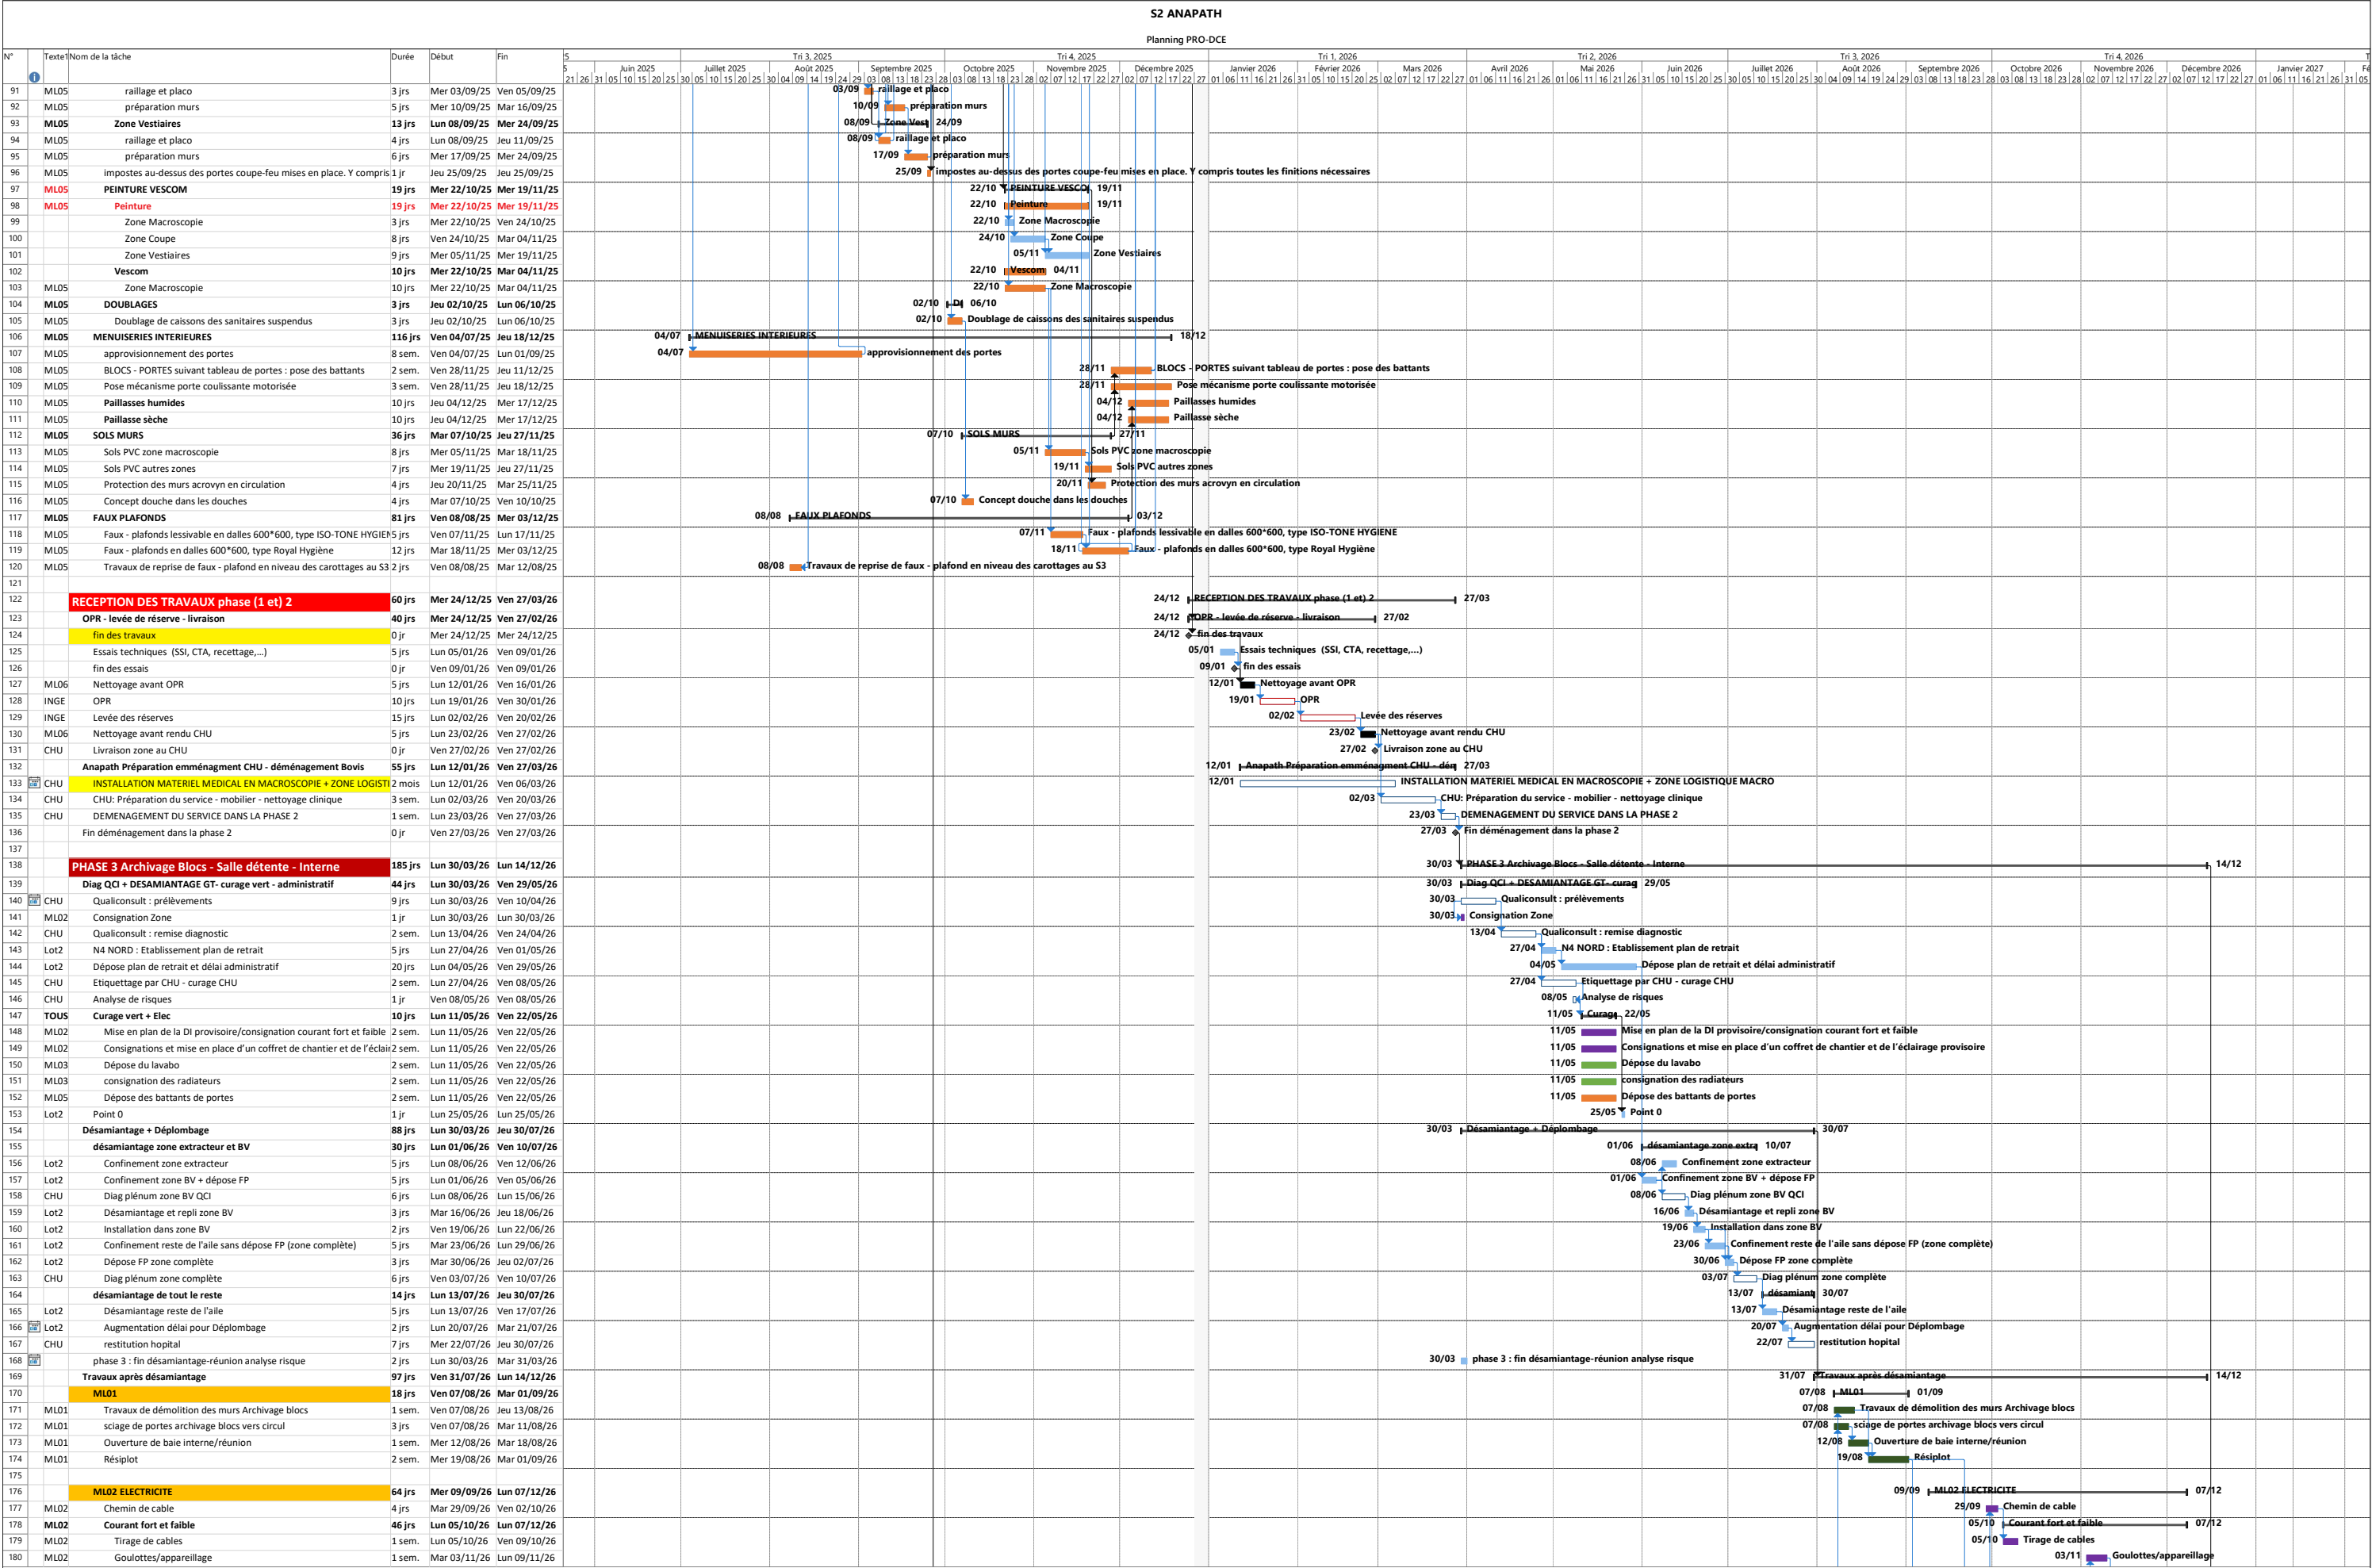

[illegible]
