

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Identification du dossier	
Numéro de dossier	17510
Référence client	Commande n°053 00383
Périmètre de travaux	RAAT Sols SAS et salle principale. <i>A noter que les dalles de sol et la colle bitumineuse ont été utilisées en plinthe sur les murs et contiennent elles aussi de l'amiante.</i>

Identification du bien objet de la mission	
Propriétaire	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées
Donneur d'ordre	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées
Adresse de l'immeuble	chemin du Pont-Long - 64230 POEY-DE-LESCAR
Bâtiment	Maison individuelle
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	12/07/2023

Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Signataire du rapport	
Signature et visa 2CS Conseil Coordination Sécurité 24, rue Maubec 64230 LESCAR 05 59 71 24 61 - Fax : 05 59 77 97 12 RCS Pau 43505448100039 APE 7490B	Opérateur de repérage : NARBEBURY Cédric 2CS Rapport émis le 12/07/2023

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Matériaux ou produits	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
Colles bitumineuses	SAS	RDC	Z001
Dalles de sol et colles bitumineuses	Salle principale	RDC	Z003
Colle bitumineuse			Z004

Exclusions

Aucune

Liste des visites :

Date	Objet
12/07/2023	RAAT Sols SAS et salle principale

SOMMAIRE

CONCLUSIONS.....	1
SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
LOCAUX CONCERNES	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	5
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	5
RESULTATS DU REPERAGE	6
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	6
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	7
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	11
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	13
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	18
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	19

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées
Demeurant :	Aéroport - 64230 UZEIN
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur NARBEBURY Cédric
Nom et adresse de l'entreprise :	2CS 24 rue Maubec - 64230 LESCAR
N° de Siret :	43505448100039
RCP-compagnie-n° de police :	GROUPAMA D'OC -31505920 - 2021

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	chemin du Pont-Long - 64230 POEY-DE-LESCAR
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Maison individuelle	Habitation
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
RAAT Sols SAS et salle principale.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux concernés (zone d'intervention) :

Locaux concernés

Locaux visités	Etage	Travaux
SAS	RDC	Concernée
Salle principale	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	Dalles de sol et colles bitumineuses
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.2 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.3 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Revêtements de sols Colles bitumineuses (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
SAS	Revêtements de sols	Colles bitumineuses	S001

Z002 : Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle principale	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S002

Z003 : Revêtements de sols Dalles de sol et colles bitumineuses (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle principale	Revêtements de sols	Dalles de sol et colles bitumineuses	S003

Z004 : Revêtements de sols Colle bitumineuse (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle principale	Revêtements de sols	Colle bitumineuse	S004

Z005 : Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle principale	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S005

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation indicative de la quantité d'amiante
SAS	RDC	Revêtements de sols	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse (P001)	Oui	20 m²
		Revêtements de sols	Dalles de sol	Résultat d'analyse (P001)	Non	
Salle principale	RDC	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Revêtements de sols	Dalles de sol et colles bitumineuses	Résultat d'analyse (P003)	Oui	1100 m²
		Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Résultat d'analyse (P004)	Oui	1100 m²
		Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse (P005)	Non	

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

5.3	Commentaire sur la mission
A noter que les dalles de sol et la colle bitumineuse ont été utilisées en plinthe sur les murs et contiennent elles aussi de l'amiante.	

5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage
------------	---

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Date de prélèvement	Matériau	Localisation
12/07/2023	Colles bitumineuses	RDC - SAS - Revêtements de sols

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Dalles de sol et colles bitumineuses		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1		Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Date de prélèvement	Matériau	Localisation
12/07/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	RDC - Salle principale - Revêtements de sols

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1		Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

PRELEVEMENT : P003				
Emplacement				
				
Date de prélèvement	Matériau	Localisation		
12/07/2023	Dalles de sol et colles bitumineuses	RDC - Salle principale - Revêtements de sols		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet	Support	Taille		
Dalles de sol et colles bitumineuses		0 cm		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1		Dalle dure cassante rouge	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004				
Emplacement				
				
Date de prélèvement	Matériau	Localisation		
12/07/2023	Colle bitumineuse	RDC - Salle principale - Revêtements de sols		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet	Support	Taille		
Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)		0 cm		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1		Non analysé	0	
Fr2		Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr3		Ragréage rose	0	Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

PRELEVEMENT : P005				
Emplacement				
				
Date de prélèvement	Matériau		Localisation	
12/07/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage		RDC - Salle principale - Revêtements de sols	
Résultat amiante				
Absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1		Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

Planche de repérage

Client :	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées	Titre :	Croquis N°1
N° dossier :	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510	Adresse :	chemin du Pont-Long 64230 POEY-DE-LESCAR
N° planche :	1/1		
Type :	Croquis		
Date :	12/07/2023	Localisation :	/
Intervenant :	NARBEBURY Cédric	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Legende :

- Colle bitumineuse amiantée
- Dalles de sol et colle bitumineuse amiantées

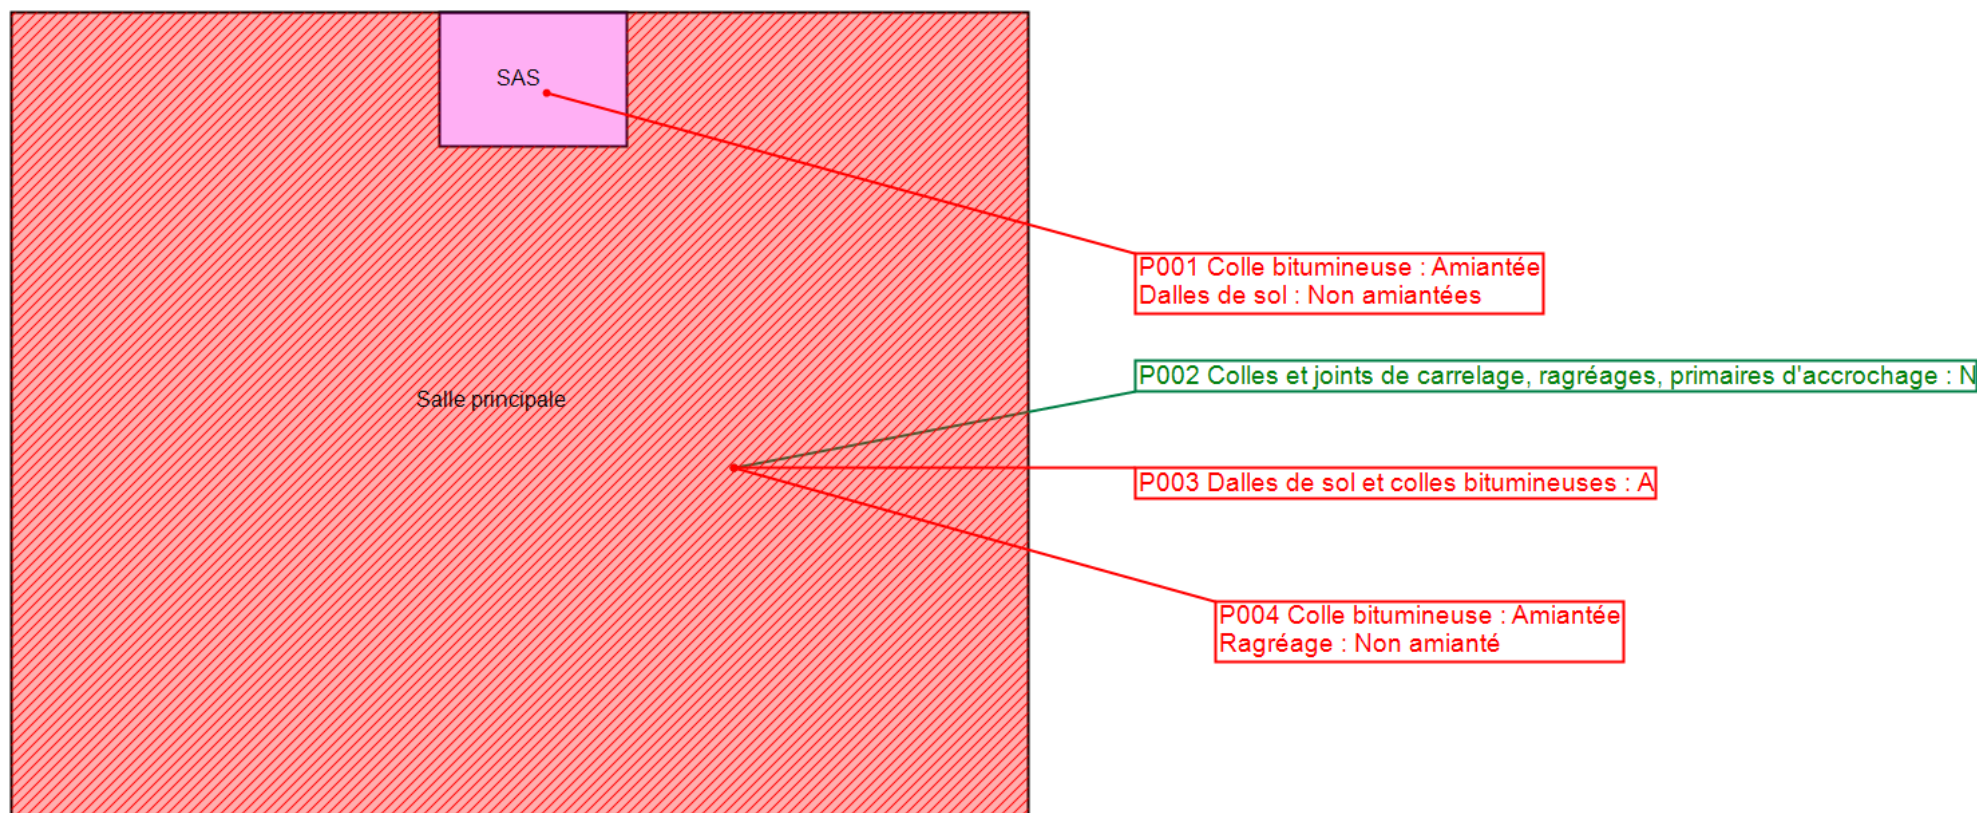

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

E.21761060.0.PDF



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052307-5379 EN DATE DU 19/07/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

2CS
Cédric NARBEBURY
24 rue Maubec
64230 LESCAR

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0523-8245
Echantillon ITGA : IT052307-5379
Reçu au laboratoire le : 17/07/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510-17526-23343-696-071330399
Dossier client	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées + - chemin du Pont-Long - 64230 - POEY-DE-LESCAR
Echantillon	P001 - Dalles de sol et colles bitumineuses - RDC - SAS - - Revêtements de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ECS
► Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CMO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052307-5380 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

2CS
Cédric NARBEBURY
24 rue Maubec
64230 LESCAR

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0523-8245
Echantillon ITGA : IT052307-5380
Reçu au laboratoire le : 17/07/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510-17526-23343-696-071330399
Dossier client	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées + - chemin du Pont-Long - 64230 - POEY-DE-LESCAR
Echantillon	P002 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - RDC - Salle principale - - Revêtements de sols
Description ITGA	Colle grise

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle grise	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TDL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT052307-5381 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

2CS
Cédric NARBEBURY
24 rue Maubec
64230 LESCAR

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0523-8245
Echantillon ITGA : IT052307-5381
Reçu au laboratoire le : 17/07/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510-17526-23343-696-071330399
Dossier client	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées + - chemin du Pont-Long - 64230 - POEY-DE-LESCAR
Echantillon	P003 - Dalles de sol et colles bitumineuses - RDC - Salle principale - - Revêtements de sols
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Dalle dure cassante rouge	META (B) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : ECS
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CMO

Validé par : Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052307-5382 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

2CS
Cédric NARBEBURY
24 rue Maubec
64230 LESCAR

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0523-8245
Echantillon ITGA : IT052307-5382
Reçu au laboratoire le : 17/07/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510-17526-23343-696-071330399
Dossier client	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées + - chemin du Pont-Long - 64230 - POEY-DE-LESCAR
Echantillon	P004 - Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) - RDC - Salle principale - - Revêtements de sols
Description ITGA	Carrelage / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage		Non analysé		
► Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CMO
► Ragréage rose	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TDL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052307-5383 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

2CS
Cédric NARBEBURY
24 rue Maubec
64230 LESCAR

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0523-8245
Echantillon ITGA : IT052307-5383
Reçu au laboratoire le : 17/07/2023

Réf. Cliant :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	Ancienne Aérogare_RAAT Sols Hall_Air'Py_Uzein_17510-17526-23343-696-071330399
Dossier cliant	AIR'PY Aéroport Pau Pyrénées + - chemin du Pont-Long - 64230 - POEY-DE-LESCAR
Echantillon	P005 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - RDC - Salle principale - - Revêtements de sols
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TDL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3546 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur NARBEBURY Cédric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention**
	Date d'effet : 06/08/2020 - Date d'expiration : 05/08/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 06/08/2020 - Date d'expiration : 05/08/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 31/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0122
PORTÉE
CERTIFICATION DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

ANNEXE : Attestation d'assurance



Groupama

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Je soussigné Olivier LARCHER - Directeur Général de Groupama d'Oc

atteste que 2CS

demeurant

24 RUE MAUBEC
64230 LESCAR

est garanti par police d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle du contrat ASSURANCE MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS N° 31505920 - 2021

ACTIVITE EXERCEE : 7120B02 - EXPERT EN DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Les garanties accordées par le contrat sont les suivantes sous réserve de leur souscription aux Conditions Personnelles :

1/RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION : GARANTIE

Tous dommages confondus, corporels matériels et immatériels dont :

- ☐ Dommages matériels et immatériels consécutifs à dommages matériels
- ☐ Vol du fait des préposés
- ☐ Faute inexcusable de l'employeur

2/RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLES : GARANTIE

Tous dommages confondus dont :

- ☐ Dommages matériels et immatériels consécutifs à dommages matériels
- ☐ Frais de remboursement des mesures conservatoires

3/RESPONSABILITE CIVILE APRES MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS OU ACHEVEMENT DE TRAVAUX : GARANTIE

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs dont :

- ☐ Dommages matériels et immatériels consécutifs
- ☐ RC USA/Canada

4/RESPONSABILITE CIVILE ETUDES, CONSEILS, PROFESSIONS LIBERALES : GARANTIE

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs dont :

- ☐ Pertes ou destruction de pièces ou documents confiés
- ☐ RC USA /Canada

5/ FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE : NON GARANTIE

6/ FRAIS DE RETRAIT : NON GARANTIE

Groupama d'Oc - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE – Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09



Groupama

ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE

La garantie s'exerce dans les Pays de l'Union Européenne ainsi que les Pays membres de l'Association Européenne de Libre Echange (A.E.L.E.).

Pour la garantie Responsabilité civile Atteintes à l'Environnement, la garantie s'exerce en France Métropolitaine, dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer ainsi que dans la Principauté de Monaco.

Le souscripteur du contrat est avisé que les garanties du présent contrat ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux garanties qu'il serait dans l'obligation de souscrire localement dans un pays en application de la législation qui lui est propre en matière d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus, sous réserve que les garanties soient en vigueur.

Elle a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

Fait à Balma, le 19 décembre 2022.

Pour la Caisse Locale, par délégation :
Le Directeur Général de la Caisse Régionale

Groupama d'Oc - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE – Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09
