

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 25676413/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 14/03/2025

Référence au programme de travaux :

N°PPR- Intervention 07/03/2025 réalisé le 06/03/2025 par
C. RAYNAL

DONNEUR D'ORDRE

CPAM

AUDREY CHAUCHARD

AVENUE DE BAMBERG

12000 RODEZ

SITE D'INTERVENTION

CPAM RODEZ

AVENUE DE BAMBERG

12000 RODEZ

DAAT SALLE INFORMATIQUE


Latitude : 44.361100 / Longitude : 2.589600

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE


Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Clément RAYNAL	DIAGNOSTIQUEUR	CPDI 3787	Clément RAYNAL
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	7
2.3. Obligations réglementaires	8
2.4. Remarque(s) complémentaire(s)	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	15
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	15
7.2. Photos prélèvements	16
7.3. Photos inaccessibilités	20
7.4. Photos observations	21
7.5. Attestation d'assurance	23
7.6. Certificat de compétence	25
7.7. Croquis de repérage	26
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	30

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<p>Les travaux se réaliseront dans la salle informatique du rez-de-chaussée, d'une surface de 50m². Il est prévu un curage des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faux-plafonds - Sols souples - CVC (dépose des bouches de soufflage, gaines, VMC) <ul style="list-style-type: none"> - Câblage et prises CFO/CFA, SSI <p>Ensuite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une cloison avec une porte sera montée pour cloisonner le local en 2 parties. <ul style="list-style-type: none"> - Le faux-plancher technique sera agrandi

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	

Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Salle informatique du rez-de-chaussée, d'une surface de 50m².

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
7	CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc
7	CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Beige
4	CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris
4	CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune

2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CPAM (IC 1)	9- Fondations et soubassements - Ensemble des réseaux, parois verticales, et, horizontales enterrées.	Inaccessible avant démolition de la superstructure et travaux de terrassement	Démolir la superstructure et faire réaliser des travaux de terrassement
CPAM (IC 2)	8- Equipements divers et accessoires - Ensemble du réseau, et, équipement électrique.	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.4. Remarque(s) complémentaire(s)

Nous pouvons nous prononcer uniquement au niveau des points de prélèvement ou de sondage. Tout MPSCA non référencé dans le présent rapport découvert en phase travaux devra faire l'objet d'une Investigation complémentaire. La présence de conduits/coffrages ancrés dans la maçonnerie à démolir, non visibles à l'heure du contrôle en fibre-ciment contenant de l'amiante n'est pas à exclure.. En phase travaux, l'attention devra être portée à tout nouvel élément non investigué dans le présent rapport.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CPAM RODEZ
AVENUE DE BAMBERG
12000 RODEZ

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CPAM RODEZ	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
AUDREY CHAUCHARD	Donneur d'ordre	CPAM	AVENUE DE BAMBERG 12000 RODEZ	/
Audrey CHAUCHARD	Accompagnateur	CPAM	AVENUE DE BAMBERG 12000 RODEZ	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 07/03/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / MAIL 06/03/2025 CR & 25/02/2025 AUDREY CHAUCHARD	C. RAYNAL	06/03/2025	PPR- Intervention 07/03/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	11	P17* N	/	AN	Ancien	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	12	P18* N	/	AN	Trous	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	13	P19* N	/	AN	texture	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	7	P10* P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Beige	7	P10* P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	7	P11 P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Beige	7	P11 P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Fibreux, Lé	Beige, Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	1	P1* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact	Gris, Orange	1	P1* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Fibreux, Lé	Beige, Blanc	1	P2 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	1	P2 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact	Gris, Orange	1	P2 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	2	P3* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact	Gris, Orange	2	P3* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	2	P4 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact	Gris, Orange	2	P4 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Dalles de sol	Epais	Marron	5	P8* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris	4	P7* P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	4	P7* P	/	AN	/	Oui
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Semi-dur	Blanc	3	P5* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Semi-dur	Blanc	3	P6 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	8	P12* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	Fin	Beige	8	P12* N	/	AN	/	Non

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	8	P13 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Beige	8	P13 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	Beige, Marron	14	P14* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Plâtre	Beige	10	P15* N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Plâtre	Beige	10	P16 N	/	AN	/	Non
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	Revêtements de sol	Nez de marche	Plastique	Gris	6	P9* N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	80 m ²
7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	80 m ²
4	Revêtements de sol	Dalles de sol	16 m ²
4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	16 m ²


7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CPAM	/
CPAM -> RDC	/
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	/


7.2. Photos prélèvements

P17	ZPSO 11
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P18	ZPSO 12
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P19	ZPSO 13
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

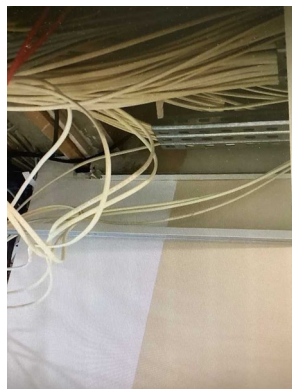P10	ZPSO 7
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P11	ZPSO 7
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P1	ZPSO 1
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P2	ZPSO 1
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P3	ZPSO 2
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	


P4	ZPSO 2
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	


P8	ZPSO 5
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	


P7	ZPSO 4
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P5	ZPSO 3
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P6	ZPSO 3
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P12	ZPSO 8
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P13	ZPSO 8
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

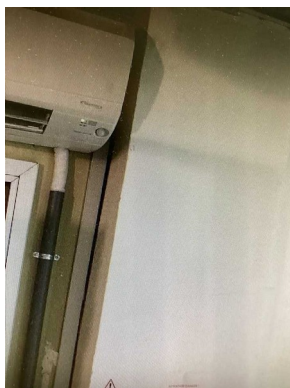
P14	ZPSO 14
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P15	ZPSO 10
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P16	ZPSO 10
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P9	ZPSO 6
CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	


CPAM		IC 1
9- Fondations et soubassements		
Inaccessible avant démolition de la superstructure et travaux de terrassement		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	<p>Ensemble des réseaux, parois verticales, et, horizontales enterrées. Démolir la superstructure et faire réaliser des travaux de terrassement</p>	

CPAM		IC 2
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	<p>Ensemble du réseau, et, équipement électrique. Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

7.4. Photos observations

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011		OBS 1
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	Observation :	
	Visite du Plénum pas de MPSCA. Plafond hourdis béton.	

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011		OBS 2
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	Observation :	
	Visite du Plénum pas de MPSCA. Plafond hourdis béton.	

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011		OBS 3
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	Observation :	
	Visite du Plénum pas de MPSCA. Plafond hourdis béton.	

CPAM -> RDC -> LOCAL SERVEUR 011

OBS 4

04 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds



Observation :

Visite du Plénum pas de MPSCA. Plafond hourdis
béton.

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 9/01/2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3787 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RAYNAL Clément

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 23/10/2017 - Date d'expiration : 22/10/2022
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 08/09/2020 - Date d'expiration : 07/09/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 08/09/2020 - Date d'expiration : 07/09/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 26/10/2017 - Date d'expiration : 25/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 17/06/2022.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des conseils après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des conseils après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2010 relatif aux compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des conseils après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 15 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'hydraulique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Du Arrêté du 7 juillet 2010 modifié définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Du Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofruc
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRUC.FR

CPE DI FR 11 nov18


7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM RODEZ AVENUE DE BAMBERG 12000 RODEZ	
Localisation CPAM > RDC > LOCAL SERVEUR 011	Date visite	Le 07/03/2025
	Auteur	Clément RAYNAL
	N° dossier	25676413/S1/1
	Planche	1 / 3
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

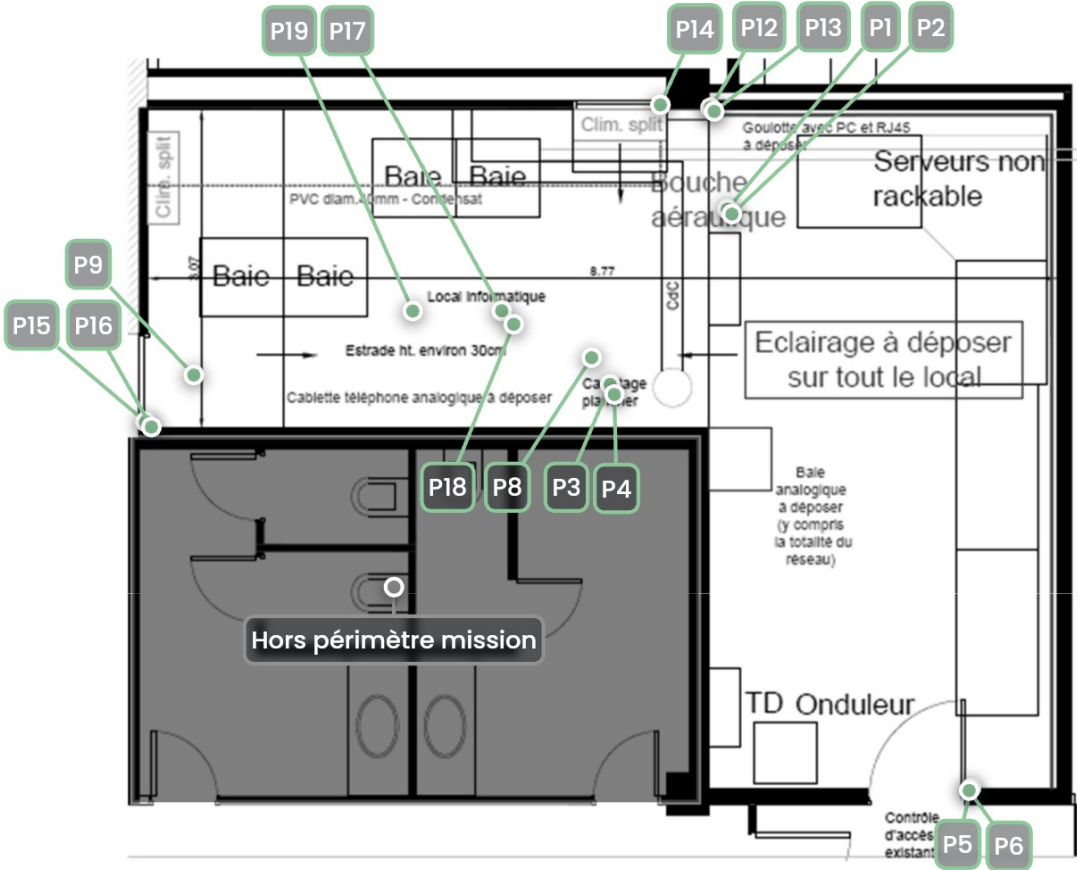


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM RODEZ AVENUE DE BAMBERG 12000 RODEZ	
Localisation CPAM > RDC > LOCAL SERVEUR 011	Date visite	Le 07/03/2025
	Auteur	Clément RAYNAL
	N° dossier	25676413/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Bandes calicot ■ Dalles de sol (Liste B)		

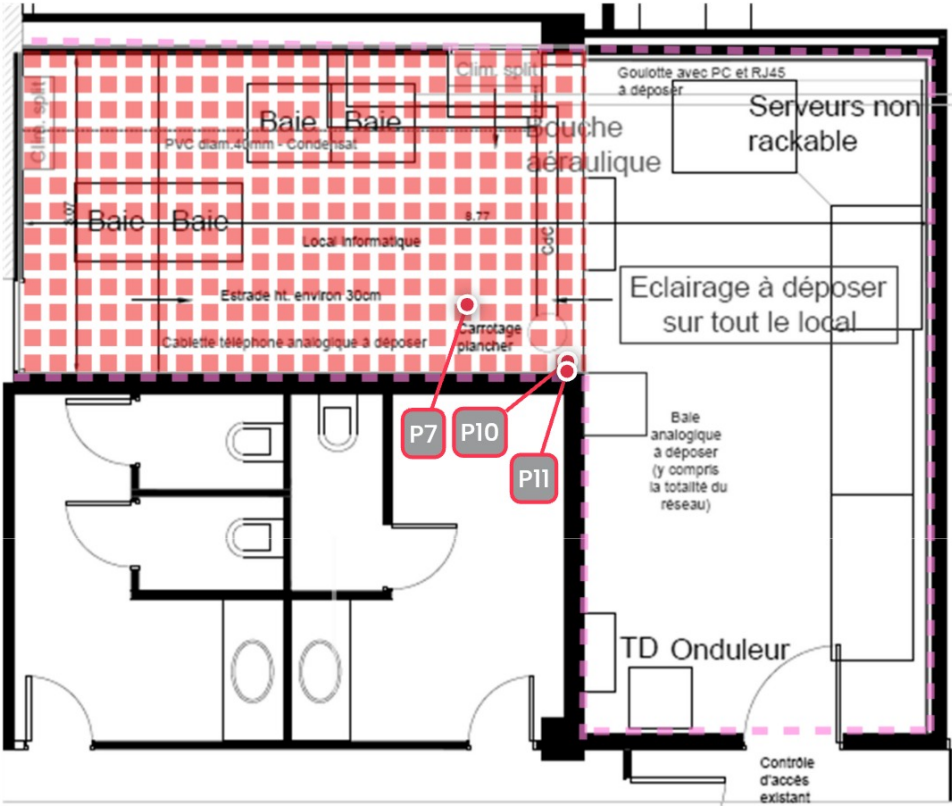

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM RODEZ AVENUE DE BAMBERG 12000 RODEZ	
Localisation CPAM > RDC > LOCAL SERVEUR 011	Date visite	Le 07/03/2025
	Auteur	Clément RAYNAL
	N° dossier	25676413/S1/1
	Planche	3 / 3
<div>Vue utilisée :</div> <div>Inaccessibilité</div> <div>Observation</div>		
<div>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</div>		

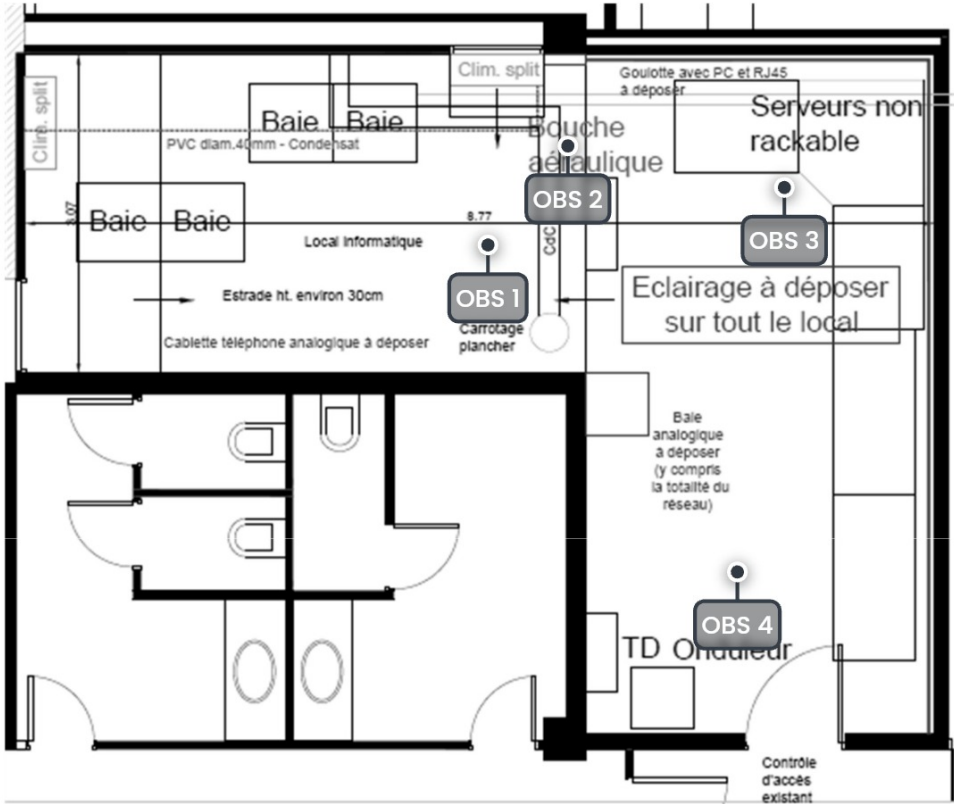

LEGENDE

● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

● Sondage

● Inaccessibilité

● Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-3813 EN DATE DU 13/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - ONET LE CHATEAU Résidence WAGNER 87 Rue Saint-Firmin 12850 Onet-le-Château	Réf. Commande ITGA :	IT0525-3813
		Réf. Commande Client :	1510797812/25676413/S1/1/1_25676413/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction

ou électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2953	
Réf échantillon client : ITM-AHSQL-1842839 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P12 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier	
▶ Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2954	
Réf échantillon client : ITM-AXEEO-1842850 - [Revêtements de sol] - [rel : P4 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-3813 EN DATE DU 13/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2955	
Réf échantillon client : ITM-BMWVZ-1842846 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P11 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2956	
Réf échantillon client : ITM-FYVEY-1842837 - [Revêtements de sol] - [rel : P2 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement cassant gris avec couche en toile	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2957	
Réf échantillon client : ITM-GBTRS-1842849 - [Revêtements de sol] - [rel : P3 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2958	
Réf échantillon client : ITM-GEPPM-1842847 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P6 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Matériau souple blanc / Bois massif en faible quantité	
Matériau souple blanc	META (B) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-3813 EN DATE DU 13/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2959	
Réf échantillon client : ITM-LJFZG-1842845 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P10 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2960	
Réf échantillon client : ITM-MGCFA-1842853 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P16 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2961	
Réf échantillon client : ITM-MXEGJ-1842844 - [Faux plafonds] - [rel : P19 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Faux plafonds]		Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2962	
Réf échantillon client : ITM-PVFBK-1841580 - [Revêtements de sol] - [rel : P8 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Bois aggloméré
Bois aggloméré	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2963	
Réf échantillon client : ITM-PVMJM-1842848 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P5 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Matériau souple blanc / Bois massif en faible quantité
Matériau souple blanc	META (B) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-3813 EN DATE DU 13/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2964	
Réf échantillon client : ITM-OTLYV-1842840 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P13 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2965	
Réf échantillon client : ITM-RZNHU-1842841 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P14 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche souple / Bois aggloméré	
▶ Toile fibreuse blanche avec couche souple non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2966	
Réf échantillon client : ITM-SGOCH-1842842 - [Faux plafonds] - [rel : P17 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux marron	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2967	
Réf échantillon client : ITM-THUWH-1842442 - [Revêtements de sol] - [rel : P1 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▶ Revêtement cassant gris avec couche en toile	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2968	
Réf échantillon client : ITM-VJSOO-1842851 - [Revêtements de sol] - [rel : P7 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune en faible quantité	
▶ Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HZH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-3813 EN DATE DU 13/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2969	
Réf échantillon client : ITM-WHAFZ-1842854 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige avec couche en toile	
▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2970	
Réf échantillon client : ITM-YREBE-1842843 - [Faux plafonds] - [rel : P18 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 25676413		Réf échantillon ITGA : IT052503-2971	
Réf échantillon client : ITM-ZQNFS-1842852 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P15 CPAM - RDC - LOCAL SERVEUR 011 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Dylan DUBOIS Analyste
