



BUREAU
VERITAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP NORMANDIE

190 rue François Jacob

CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

A l'attention du donneur d'ordre : Mme Langlois DIR Nord-Ouest

97 boulevard de l'Europe

76175 ROUEN CEDEX

**Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**



Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

Référence du rapport : 21255697/S1/4/AM-RTV/1-9TXC9-39

Identification de l'immeuble bâti :

CEI GONFREVILLE - GEP

Lieu dit les Paturages

76700 GONFREVILLE L ORCHER

Bâtiment : CEI GONFREVILLE GEP



Rédigé le : 26/02/2024

Date d'émission du rapport : 26/02/2024

Date(s) de(s) visite(s) :
Le 14/02/2024

Référence du programme de travaux :

N° réalisé le par

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

| Nom | Prénom | Fonction | Compétence |
|-------|------------|---------------------------|---|
| MOREL | Christophe | Diagnosticteur immobilier | Certificat de compétence n°13237637 obtenu le 25 mars 2022 établi par Bureau Veritas Certification 9 cours du triangle 92937 PARIS LA DEFENCE CEDEX valable jusqu'au 24 mars 2029 |

Signataire(s) du rapport:

| Nom | Prénom | Fonction | Compétence | Signature |
|-------|------------|---------------------------|---|-----------|
| MOREL | Christophe | Diagnosticteur immobilier | Certificat de compétence n°13237637 obtenu le 25 mars 2022 établi par Bureau Veritas Certification 9 cours du triangle 92937 PARIS LA DEFENCE CEDEX valable jusqu'au 24 mars 2029 | |

Ce document comporte 8 page(s) d'annexe.

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION | 3 |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre | 3 |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage | 3 |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage | 3 |
| 2. CONCLUSIONS | 4 |
| 2.1. Obligations réglementaires | 5 |
| 3. INFORMATIONS GENERALES | 6 |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission | 6 |
| 3.2. Parties prenantes | 6 |
| 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE | 6 |
| 4.1. Références réglementaires | 6 |
| 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 7 |
| 5.1. Date(s) de visite(s) | 7 |
| 5.2. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite | 7 |
| 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| 6.1. Matériaux et produits repérés | 8 |
| 7. ANNEXES | 10 |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées | 10 |
| 7.2. Croquis de repérage | 11 |
| 7.3. Reportage Photos | 12 |
| 7.4. Attestation d'assurance | 15 |
| 7.5. Certificat de compétence | 17 |
| 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire | 18 |

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux |
|--|
| Rénovation Sanitaire et Vestiaire Atelier |

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

| Ouvrages de la construction | Parties d'ouvrages |
|---|--|
| 03 - Parois verticales intérieures | |
| Cloisons sèches (assemblées - préfabriquées) | , Bandes calicot |
| Revêtements de murs | , Colles de faïence, Colles de plinthe, Peintures décoratives, |
| 04 - Plafonds et faux plafonds | |
| Faux plafonds | Plaques, |
| 05 - Planchers et planchers techniques | |
| Revêtements de sol | Colles de carrelage, Ragrèages, |
| | |

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

Vestiaire Atelier et sanitaire

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CEI GONFREVILLE - GEP
Lieu dit les Paturages
76700 GONFREVILLE L ORCHER

| Bâtiment | Fonction principale | Classement | Date du permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| CEI GONFREVILLE - GEP | Industrie | Bâtiment industriel | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non communiqué |

3.2. Parties prenantes

| Intervenant | Qualité | Société | Adresse | Coordonnées |
|-----------------------------|-----------------|---------|--|-------------------|
| Mme Langlois DIR Nord-Ouest | Donneur d'ordre | / | 97 boulevard de l'Europe 76175 ROUEN CEDEX | +33 2 76 00 04 31 |
| / | Propriétaire | DIRNO | / | / |
| Eric Vicquelin | Accompagnateur | DIRNO | A 131, Lieu dit Les Pâturages 76700 GONFREVILLE L'ORCHER | 0235477701 |

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 14/02/2024

5.2. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Référence | Nom du document | Auteur | Date | Objet du repérage | Conclusions (si rapport de repérage) |
|-------------------|---|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Rdc Batiment A | Plan interieur | SARL Géomètres-Experts | 01/09/2000 | Plans | / |
| 18609751/S1.1.4.R | Rapport de repérage amiante avant travaux | Florent PIERRAIN | 27/02/2023 | Repérage amiante avant travaux | Présence d'amiante |
| 6301740/290/2/1 | Dossier technique amiante | Florent PIERRAIN | 09/10/2015 | DTA | Présence d'amiante |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

| Localisation | Famille | Ouvrage | Matériaux | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 05 - Planchers et planchers techniques | Revêtements de sol | Colles de carrelage | ciment | Gris | 6 | 9 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Colles de plinthe | ciment | Gris | 2 | 10 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Colles de faïence | ciment | Gris | 3 | 11 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Peintures décoratives | peinture | Blanc | 7* | 12 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Peintures décoratives | peinture | Blanc | 7 | 13 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Bandes calicot | bande | Blanc | 8* | 14 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 03 - Parois verticales intérieures | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Bandes calicot | bande | Blanc | 8 | 15 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Sanitaire | 04 - Plafonds et faux plafonds | Faux plafonds | Plaques | fibreux | Jaune | 5 | / | 1 | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 05 - Planchers et planchers techniques | Revêtements de sol | Colles de carrelage | ciment | Gris | 1* | 1 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Colles de plinthe | ciment | Gris | 2* | 2 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Colles de faïence | ciment | Gris | 3* | 3 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Peintures décoratives | peinture | Blanc | 4* | 4 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Peintures décoratives | peinture | Blanc | 4 | 5 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 04 - Plafonds et faux plafonds | Faux plafonds | Plaques | fibreux | Jaune | 5* | 6 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 05 - Planchers et planchers techniques | Revêtements de sol | Colles de carrelage | ciment | Gris | 1 | 7 | / | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 05 - Planchers et planchers techniques | Revêtements de sol | Colles de carrelage | ciment | Gris | 6* | 8 | / | Analyse | / | Non |

| Localisation | Famille | Ouvrage | Matériaux | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|------------------------|---------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 05 - Planchers et planchers techniques | Revêtements de sol | Colles de carrelage | ciment | Gris | 6 | idem 9 | 2 | Analyse | / | Non |
| Rez de Chaussée -> Vestiaire Atelier | 03 - Parois verticales intérieures | Revêtements de murs | Colles de plinthe | ciment | Gris | 2 | idem 10 | 3 | Analyse | / | Non |

7. ANNEXES






7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation | Descriptif sol/mur/plafond |
|--------------------------------------|----------------------------|
| | |
| 21255697 | / |
| 21255697 -> S1/4_1-9TXC9-39_AM-RTV | / |
| | |
| Rez de Chaussez | / |
| Rez de Chaussez -> Sanitaire | / |
| Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier | / |

7.2. Croquis de repérage

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ADRESSE | CEI GONFREVILLE - GEP Lieu dit les Paturages 76700 GONFREVILLE L ORCHER | | | |
| | Date visite | Le 14/02/2024 | | |
| | Auteur | Christophe MOREL | | |
| Rez de Chaussée | N° dossier | 21255697/S1/4/AM-RTV/I-9TXC9-39 | | |
| | Planche | 1 / 1 | | |
| | Plans | Indice | 1 | |
| LEGENDE | | | | |
| Px |  | Prélèvement n°X contenant de l'amiante | | |
| Px |  | Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante | | |
| S |  | Sondage | | |
| |  | Investigation approfondie / Moyen d'accès / | | |
| | | Investigation complémentaire | | |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante : | | | | |
| SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE | | | | |
|  | | | | |

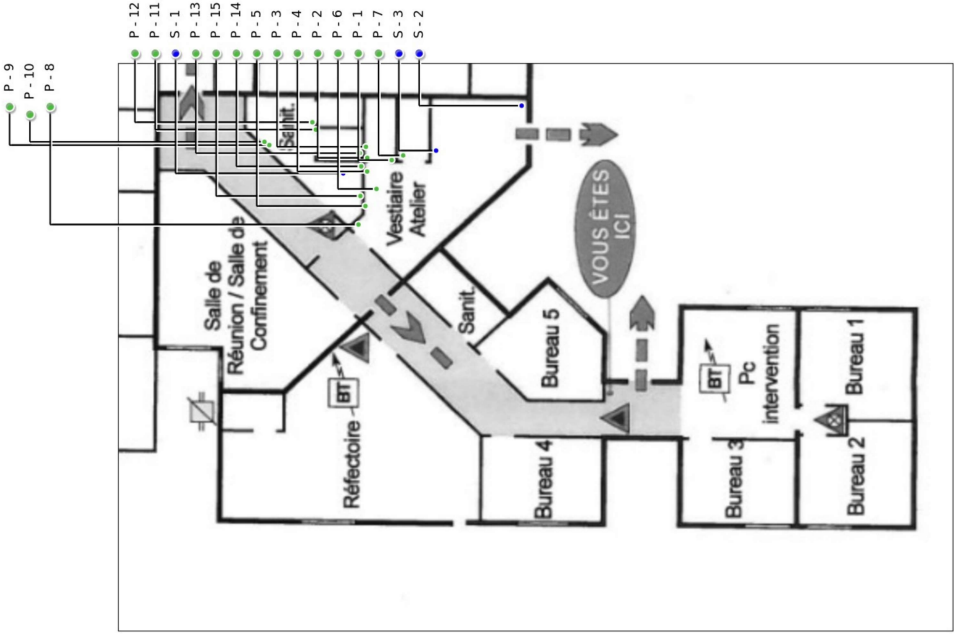

7.3. Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 9 Colles de carrelage

Localisation : Rez de Chaussée -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 10 Colles de plinthe

Localisation : Rez de Chaussée -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 11 Colles de faïence

Localisation : Rez de Chaussée -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 12 Peintures décoratives

Localisation : Rez de Chaussée -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 13 Peintures décoratives

Localisation : Rez de Chaussez -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8 Prélèvement 14 Bandes calicot


Localisation : Rez de Chaussez -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8 Prélèvement 15 Bandes calicot

Localisation : Rez de Chaussez -> Sanitaire



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 1 Colles de carrelage

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 2 Colles de plinthe


Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 3 Colles de faïence

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4

Prélèvement 4

Peintures décoratives

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4

Prélèvement 5

Peintures décoratives

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5

Prélèvement 6

Plaques

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1

Prélèvement 7

Colles de carrelage

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6

Prélèvement 8

Colles de carrelage

Localisation : Rez de Chaussez -> Vestiaire Atelier

7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mэрule (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic mэрule (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millimètres de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
 - 4) Conseil en performance énergétique.
 - 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
 - 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
 - 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
 - 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
 - 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
 - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024


MSIG Insurance Europe AG
85, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 85 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
85 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification




Certificat
Attribué à
Christophe MOREL


Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

| | Références des arrêtés | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/03/2022 | 24/03/2029 |
| Amiante avec mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/03/2022 | 24/03/2029 |

Date :29/03/2022
Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 13237637



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Christophe MOREL
190 Rue François Jacob - CS 80534
76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-24-HB-020116-01

Numéro de dossier : 24N006640

Référence de dossier : 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N006640-001 - Référence BV3JW5148 Réf. Prel : P - 1 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N006640-002 - Référence BV3JW5149 Réf. Prel : P - 2 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N006640-003 - Référence BV3JW5150 Réf. Prel : P - 3 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N006640-004 - Référence BV3JW5151 Réf. Prel : P - 4 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N006640-005 - Référence BV3JW5152 Réf. Prel : P - 5 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N006640-006 - Référence BV3JW5153 Réf. Prel : P - 6 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Faux plafonds - (fibres/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-007 - Référence BV3JW5154 Réf. Prel : P - 7 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-008 - Référence BV3JW5155 Réf. Prel : P - 8 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-009 - Référence BV3JW5156 Réf. Prel : P - 9 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-010 - Référence BV3JW5157 Réf. Prel : P - 10 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-011 - Référence BV3JW5158 Réf. Prel : P - 11 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-012 - Référence BV3JW5159 Réf. Prel : P - 12 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-013 - Référence BV3JW5160 Réf. Prel : P - 13 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (peinture/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-014 - Référence BV3JW5161 Réf. Prel : P - 14 Rez de Chaussez - Sanitaire/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N006640-015 - Référence BV3JW5162 Réf. Prel : P - 15 Rez de Chaussez - Sanitaire/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

| | | |
|--|--|---------|
| N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-010035-01 | Date d'émission de rapport : 23/02/2024 4:34 | Page1/5 |
| Référence laboratoire N° : 24RI010179 | Référence de suivi du dossier N° : 24N006640 | |
| Reçu au laboratoire le : 19/02/2024 | Date de réception :16/02/2024 | |
| Date d'analyse : 22/02/2024 | | |
| Référence dossier Client:24N006640 - 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2 | | |

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 24N006640-001 - BV3JW5148 Réf. Prel : P - 1 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 24N006640-002 - BV3JW5149 Réf. Prel : P - 2 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 24N006640-003 - BV3JW5150 Réf. Prel : P - 3 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (bleu) en traces | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | | | | |

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-010035-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 4:34

Page2/5

Référence laboratoire N° : 24RI010179

Référence de suivi du dossier N° : 24N006640

Reçu au laboratoire le : 19/02/2024

Date de réception : 16/02/2024

Date d'analyse : 22/02/2024

Référence dossier Client:24N006640 - 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004 | 24N006640-004 - BV3JW5151 Réf. Prel : P - 4 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (peinture/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 24N006640-005 - BV3JW5152 Réf. Prel : P - 5 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de murs - (peinture/Blanc) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 24N006640-006 - BV3JW5153 Réf. Prel : P - 6 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Faux plafonds - (fibreuse/Jaune) | Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (fibreux) (blanc) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP / Q5HR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 | 24N006640-007 - BV3JW5154 Réf. Prel : P - 7 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-010035-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 4:34

Page3/5

Référence laboratoire N° : 24RI010179

Référence de suivi du dossier N° : 24N006640

Reçu au laboratoire le : 19/02/2024

Date de réception : 16/02/2024

Date d'analyse : 22/02/2024

Référence dossier Client:24N006640 - 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008 | 24N006640-008 - BV3JW5155 Réf. Prel : P - 8 Rez de Chaussez - Vestiaire Atelier/Revêtements de sol - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 (1) | 24N006640-009 - BV3JW5156 Réf. Prel : P - 9 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de sol - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 | 24N006640-010 - BV3JW5157 Réf. Prel : P - 10 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011 | 24N006640-011 - BV3JW5158 Réf. Prel : P - 11 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (ciment/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012 | 24N006640-012 - BV3JW5159 Réf. Prel : P - 12 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (peinture/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-010035-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 4:34

Page4/5

Référence laboratoire N° : 24RI010179

Référence de suivi du dossier N° : 24N006640

Reçu au laboratoire le : 19/02/2024

Date de réception : 16/02/2024

Date d'analyse : 22/02/2024

Référence dossier Client: 24N006640 - 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013 | 24N006640-013 - BV3JW5160 Réf. Prel : P - 13 Rez de Chaussez - Sanitaire/Revêtements de murs - (peinture/Blanc) | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 | 24N006640-014 - BV3JW5161 Réf. Prel : P - 14 Rez de Chaussez - Sanitaire/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / Q5HR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 24N006640-015 - BV3JW5162 Réf. Prel : P - 15 Rez de Chaussez - Sanitaire/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / BOH4 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP / Q5HR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-010035-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 4:34

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 24RI010179

Référence de suivi du dossier N° : 24N006640

Reçu au laboratoire le : 19/02/2024

Date de réception : 16/02/2024

Date d'analyse : 22/02/2024

Référence dossier Client: 24N006640 - 1510797868/21255697/S1/4/1_21255697/2/2

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe
