

PASA1

CMC Ouèndé-Kènèma

Liste des travaux à finaliser 2025



RÔLE		ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
1	Maître d'ouvrage - MOA	SNIEM - MSHP	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry	Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com	Port. : 628282812
				Mr Mustapha Camara camaram135@gmail.com	Port. : 622784079
2	Maître d'ouvrage délégué - MOD	BACUE - MPC	Conakry	Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com	Port. : 626404915
				Mr Isaac Tadjidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr	Port. : 621321330
3	Bailleur	Délégation de l'Union européenne	Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry	Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu	Tél. : 622 35 20 71 Port. : 628 31 40 43
				Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu	Tél. : 622 35 20 71 Port. : 626 52 67 25
4	AMO	Expertise France	immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry	Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr	Port. : 626456610
				Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr	Port. : 610 10 79 95
5	MOE	BAEC+	Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry	Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com	Port. : 620579940
				Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com	Port. : 623389726
				Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com	Port. : 628017102
6	Exploitant	CMC Ouèndé-Kénéma	Ouèndé-Kénéma	Mr Fodé Kondiano Surveillant général fkondiano59@gmail.com	Port. : 622876483
		SRM N'zérékoré - MSHP	N'zérékoré	Mr Maurice Sewadouno Maintenancier sewadounosaamaurice31@gmail.com	Port. : 626963275
				Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com	Tél. : 620046971

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.1. Généralités

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
165	X	Généralités : finition clôture - reprise enduits et peinture aux endroits nécessaires	À corriger
170	X	Généralité : remontées d'eau à la base de la clôture, revers d'eau à réaliser	À corriger
191	X	Parking véhicule à réaliser (cf. PTP)	À corriger
195		Généralités : signalétique à poser sur l'ensemble des pièces des bâtiments	À corriger
196		Généralités : Vérification du réseau plomberie : adduction et EUEV – corrections si nécessaires	À corriger
197		Paratonnerre à installer	À corriger
198		Panneau d'enseigne à réaliser	À corriger
Peinture extérieur et intérieur des bâtiments du laboratoire, imagerie, urgences, bloc opératoire, maternité, logements et tour d'énergie à reprendre suivant couleurs du MSHP et après validation des teintes par le MOE (cf. PTP)			À corriger

Photographies de certaines non-conformités



Finition clôture - reprise enduit
(valable pour l'ensemble de la
clôture)

165



Remontées d'eau à la base de la
clôture (valable pour l'ensemble
de la clôture)


170



Parking véhicule à réaliser

191

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.1. Généralités

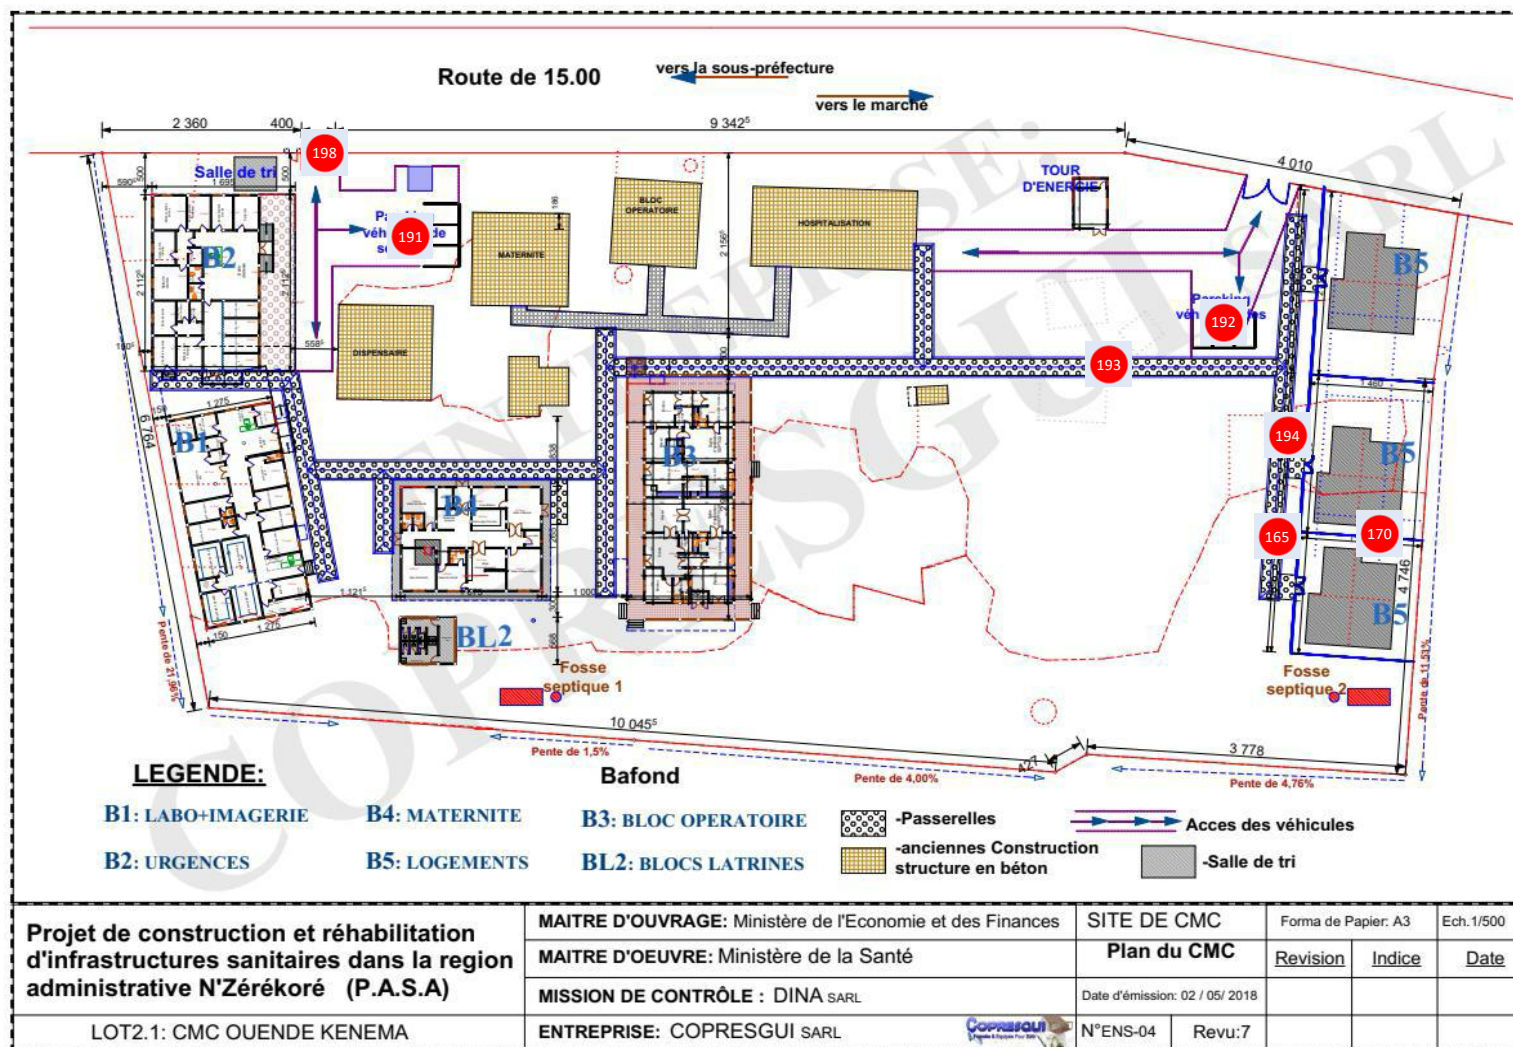

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC OK_labo+imagerie_façades

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
54		Généralités : condensat climatiseurs à reprendre	À corriger
55		Généralités : joints gouttières à reprendre	À corriger
59	X	Généralités : poser grille ventilation des combles sur les façades	À corriger
61	X	Généralités : appuis fenêtres à finaliser	À corriger
62	X	Généralités : seuil à reprendre	À corriger
182		Mise à la terre du bâtiment à réaliser	À corriger

Photographies des non-conformités




56

Alimentation eau non enterrée
et pas de grillage avertisseur



57

Finaliser évacuation d'eau



58

Finaliser évacuation d'eau



59

Fermer trou d'homme



61


Généralités : rejingots à finaliser



62

Seuil à reprendre

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma /2.2. Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_façades

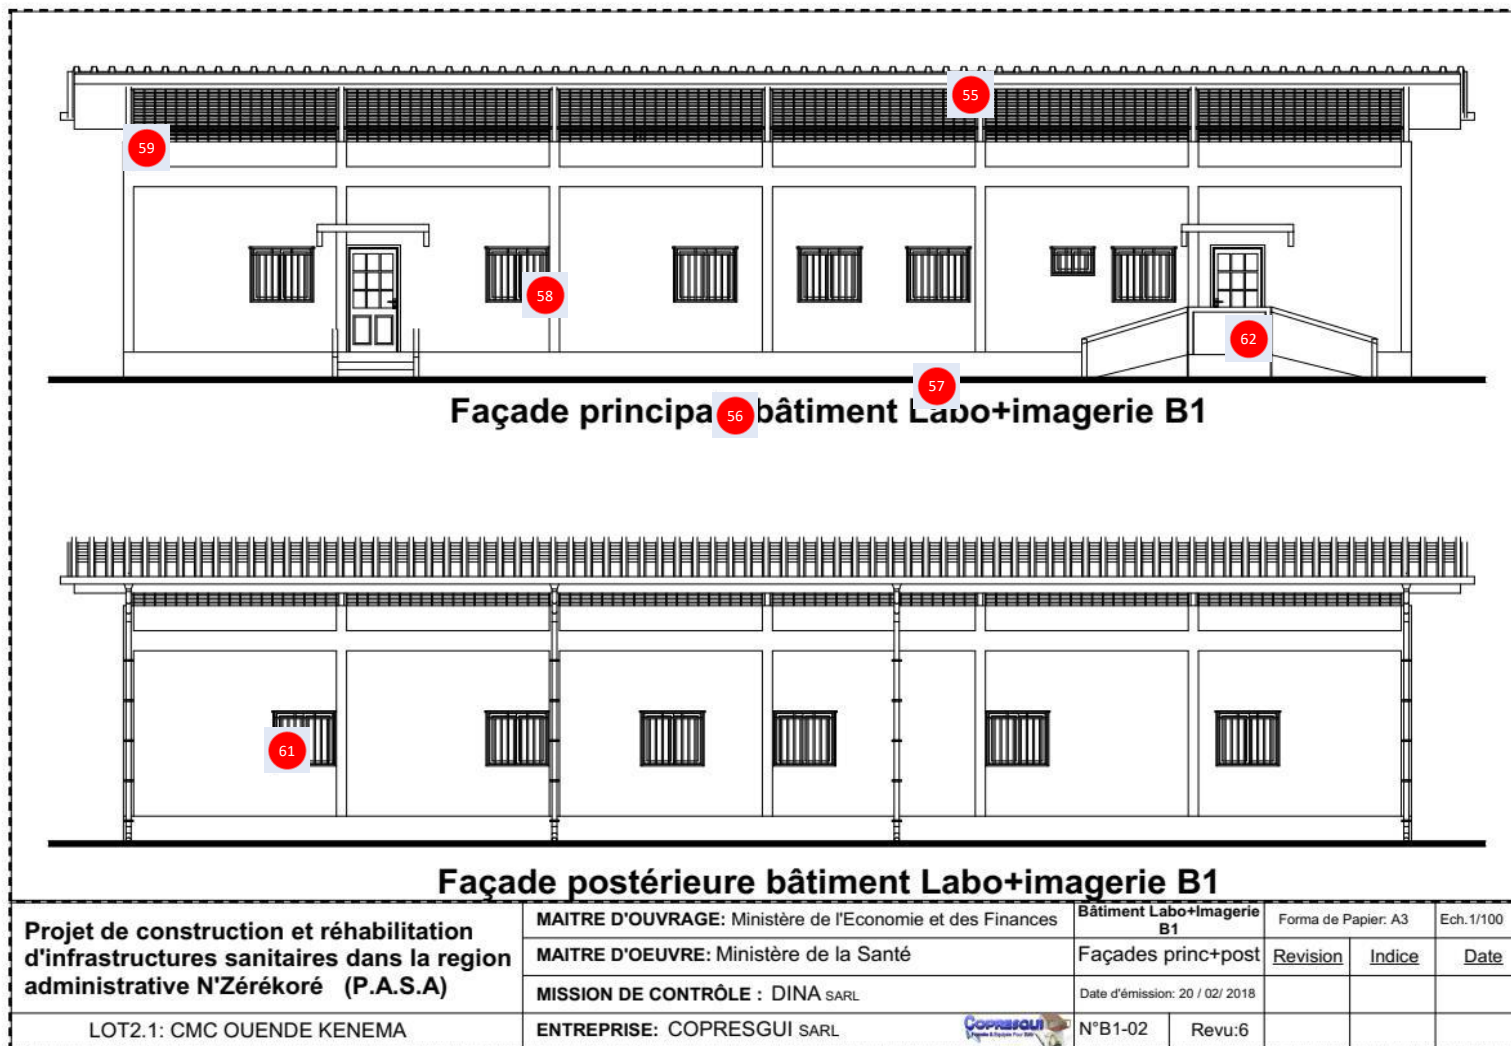













PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
63	X	Poignée à reprendre	À corriger
64		Généralités : alimentation d'eau à vérifier	À corriger
65		Infiltrations d'eau par la porte d'entrée	À corriger
66	X	Finition mur	À corriger
67	X	Bois à déposer	À corriger
68		Généralités : finitions enduits et peinture et fissure à corriger	À corriger
71	X	Mur bombé à corriger	À corriger
72		Généralités : faïence à poser au-dessus des paillasses	À corriger
73	X	Finition évacuation évier	À corriger
74		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
75	X	Finition pièce et ventilation	À corriger
77	X	Finition évacuation évier	À corriger
78	X	Finition pièce et ventilation	À corriger
80	X	Correction pose couvre joint et fermeture fenêtre	À corriger
81	X	Pose des interrupteurs à reprendre	À corriger
83	X	Fissure à reprendre	À corriger
84	X	Fissure à reprendre	À corriger
85	X	Réservation PVC à supprimer	À corriger
87	X	Dalle béton à fermer	À corriger
88		Ventilateurs manquants x20	À corriger
211		Protection d'angle manquantes x6	À corriger
215		Généralités : nettoyage coulures peinture	À corriger


Photographies des non-conformités

 <p>63 Poignée à reprendre</p>	 <p>66 Finition mur</p>	 <p>67 Bois à déposer</p>
 <p>69 Fissure à reprendre</p>	 <p>71 Mur bombé</p>	 <p>73 Finition évacuation évier</p>
 <p>75 Finition pièce et ventilation</p>	 <p>77 Finition évacuation évier</p>	 <p>78 Finition pièce et ventilation /</p>
 <p>80 Correction pose couvre joint et fermeture fenêtre</p>	 <p>81 Pose des interrupteurs à reprendre</p>	 <p>83 Fissure à reprendre</p>




84

Fissure à reprendre



85

Réservation PVC à supprimer



86


Poignée à fixer



87

Dalle béton à fermer

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

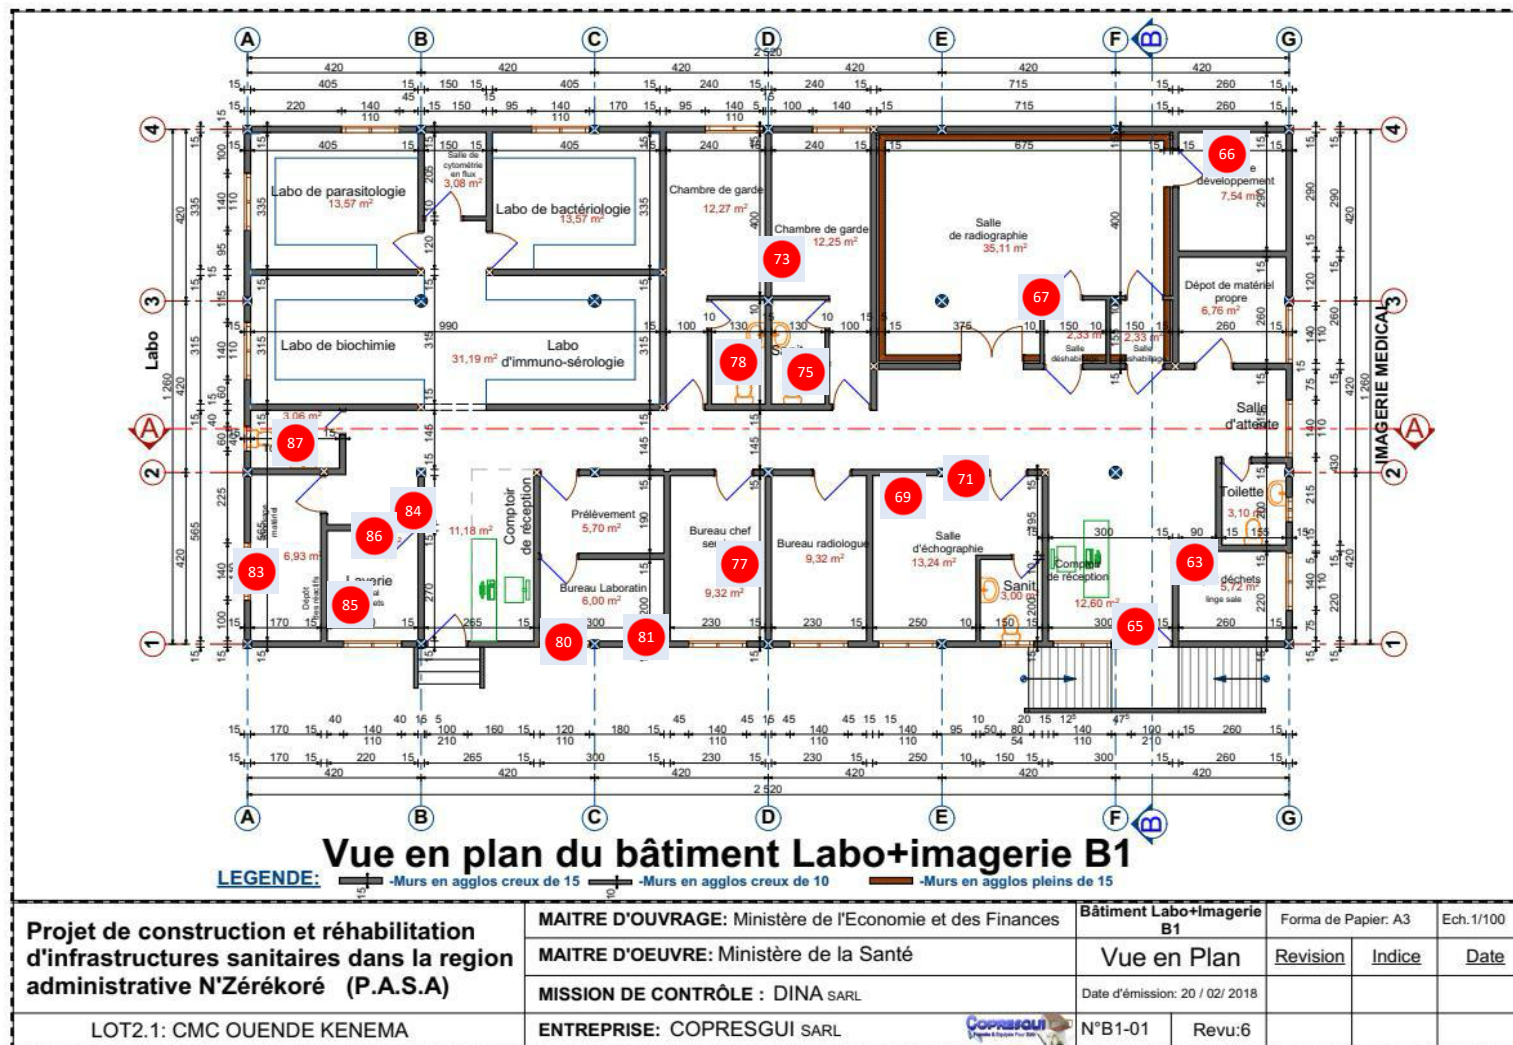

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_façades

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
89	X	Reprise pose cadre métallique	À corriger
92	X	Fissure à traiter	À corriger
93	X	Généralités : rejingots à finaliser	À corriger
94	X	Fissure à traiter	À corriger
95		Soudures gouttières à reprendre	À corriger

Photographies des non-conformités



89

Reprise pose cadre métallique



92

Fissure à traiter



93


Généralités : rejingots à finaliser




94

Fissure à traiter

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_façades

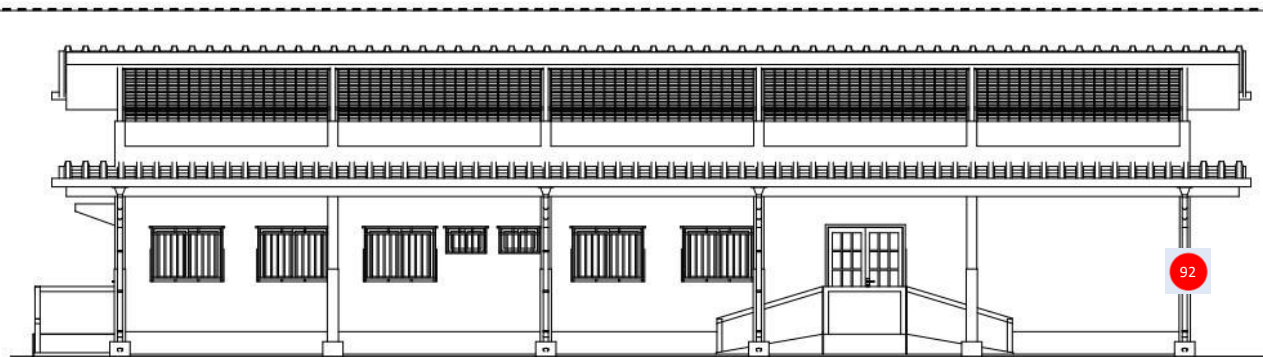

Façade principale du bâtiment B2 (urgences)

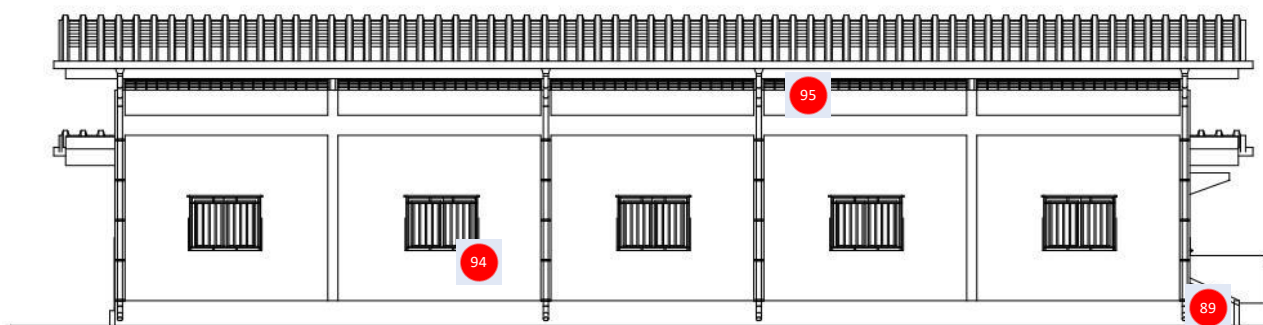

Façade postérieure du bâtiment B2 (urgences)













Projet de construction et réhabilitation d'infrastructures sanitaires dans la region administrative N'Zérékoré (P.A.S.A) LOT2.1: CMC OUENDE KENEMA	MAITRE D'OUVRAGE: Ministère de l'Economie et des Finances		Bâtiment B2 Urgences		Forma de Papier: A3		Ech.1/75	
	MAITRE D'OEUVRE: Ministère de la Santé		Façades princ+post		Revision	Indice	Date	
	MISSION DE CONTRÔLE : DINA SARL		Date d'émission: 20 / 02 / 2018					
	ENTREPRISE: COPRESGUI SARL		N°B2-02		Revu:6			

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan


Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
90		Joint cadre alu à faire	À corriger
91	X	Redresser gouttières	À corriger
97	X	Interrupteur à fixer	À corriger
98	X	Réservation à fermer avec cadre alu + verticalité à reprendre	À corriger
99		Généralités : alimentation en eau non fonctionnelle	À corriger
100	X	Boîte de dérivation à poser	À corriger
101	X	Infiltrations d'eau sous fenêtre	À corriger
102	X	Finition	À corriger
103		Généralités : finition enduit et peinture à finaliser et reprendre	À corriger
104		Généralités : joints cadre alu à réaliser sur l'ensemble des fenêtres	À corriger
105	X	Finition	À corriger
106	X	Finition	À corriger
107		Généralités : nettoyage coulures peintures dans l'ensemble des bâtiments	À corriger
108	X	Enduit à refaire	À corriger
109	X	Finition sous paillasse	À corriger
110	X	Reprise linteau porte	À corriger
111	X	Poignée à poser	À corriger
216		Mise à la terre du bâtiment à reprendre	À corriger
217		Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses	À corriger
218		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
219		Généralités : réglage ouverture et fermeture portes	À corriger
220		Généralités : finitions pose interrupteurs	À corriger


Photographies des non-conformités

 <p>91 Redresser gouttières</p>	 <p>97 Interrupteur à fixer</p>	 <p>98 Réserve à fermer avec cadre alu + verticalité à reprendre</p>
 <p>100 Boîte de dérivation à poser</p>	 <p>101 Infiltrations d'eau sous fenêtre</p>	 <p>102 Finition</p>
 <p>105 Finition</p>	 <p>106 Finition</p>	 <p>108 Enduit à refaire</p>
 <p>109 Finition sous paillasse</p>	 <p>110 Reprise linteau porte</p>	 <p>111 Poignée à poser</p>

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan

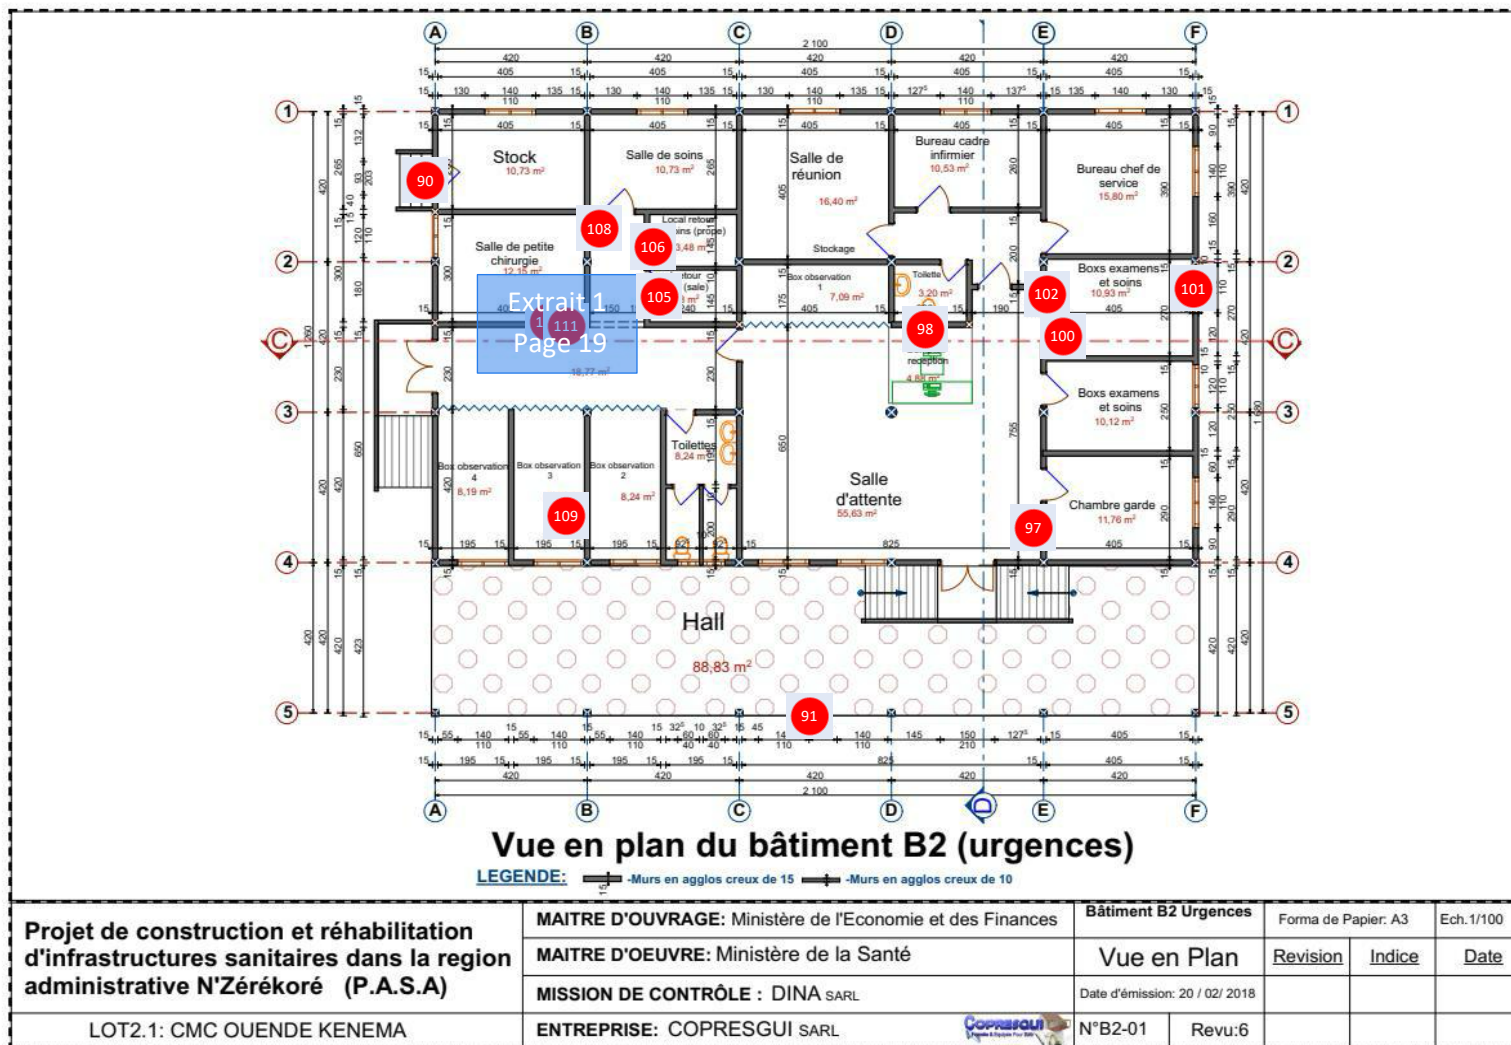

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan
- Extrait 1

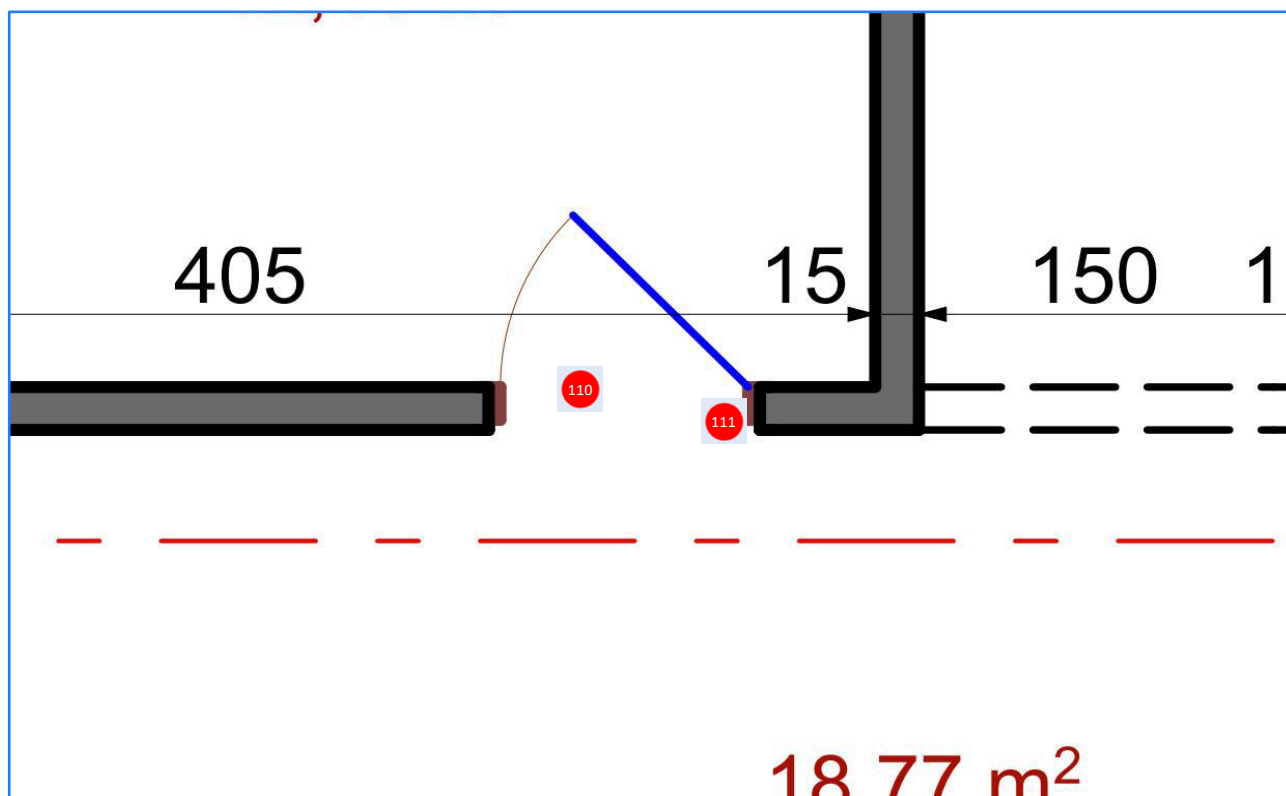













PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
118	X	Joint et fixation porte	À corriger
120		Généralités : non alimentation du bâtiment en eau	À corriger
121	X	Cadre alu manquant	À corriger
122	X	Alimentation électrique à finaliser	À corriger
123	X	Généralités : finitions interrupteurs	À corriger
124		Généralités : réglage ouverture et fermeture portes et fenêtres	À corriger
125	X	Faïence à poser correctement : non verticalité et nombreux éclats	À corriger
126	X	Finition antivol	À corriger
127	X	Joint cadre alu	À corriger
128	X	Finition faïence	À corriger
129	X	Cadre alu manquant	À corriger
130	X	Cadre alu manquant	À corriger
131		Bonde de sol manquante	À corriger
132	X	Finition mur	À corriger
133		Aucune installation prévue pour la distribution d'oxygène	À corriger
134	X	Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes	À corriger
136	X	Évacuation à fermer	À corriger
137	X	Trappe faux plafond à fermer	À corriger
144		Ventilateurs manquants x5	À corriger
199		Unité de puisard pour vidange autoclave manquante	À corriger
210		Hottes autoclaves non réalisées x2	À corriger
212		Main courante 25 ml manquante	À corriger
213		Protections d'angle manquantes x7	À corriger
222		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
224		Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses	À corriger

Photographies des non-conformités

 <p>118 Joint et fixation porte</p>	 <p>121 Cadre alu manquant</p>	 <p>122 Alimentation électrique à finaliser</p>
 <p>123 Généralités : finitions interrupteurs</p>	 <p>125 Faïence à poser correctement : non verticalité et nombreux éclats</p>	 <p>126 Finition antivol</p>
 <p>127 Joint cadre alu</p>	 <p>128 Finition faïence</p>	 <p>129 Cadre alu manquant</p>
 <p>130 Cadre alu manquant</p>	 <p>132 Finition mur</p>	 <p>134 Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes</p>



135

Généralités : qualité faïence non conforme



136


Évacuation à fermer



137

Trappe faux plafond à fermer

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan

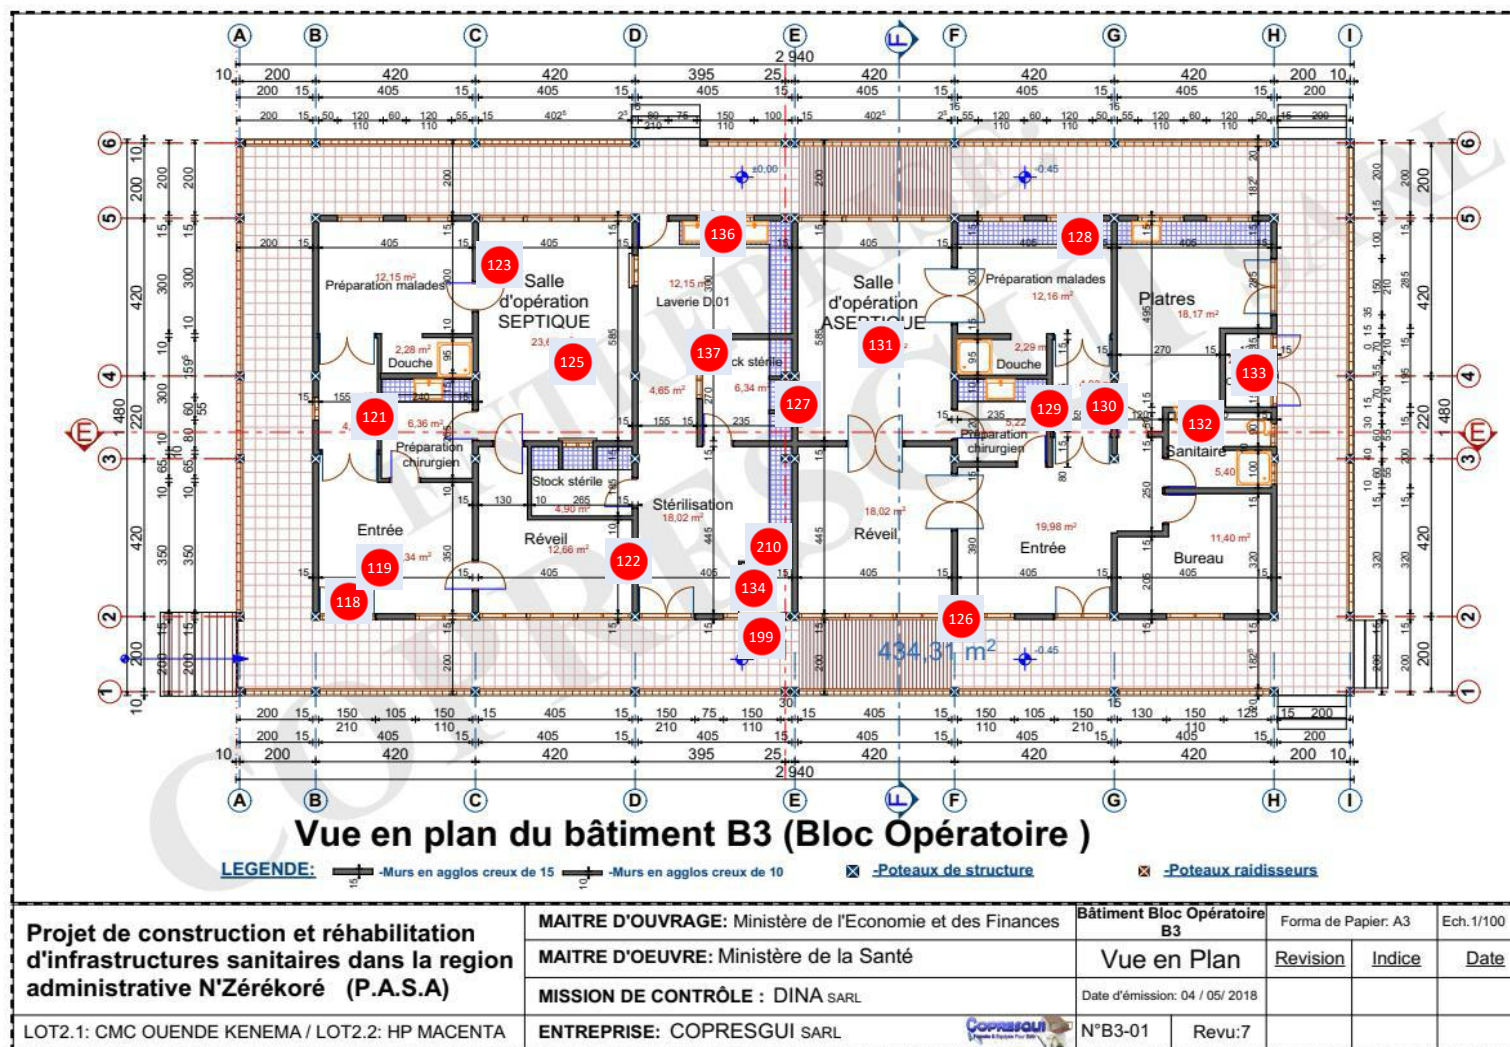

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Façades

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
114	X	Gouttières à redresser	À corriger
115	X	Fissure revers d'eau à traiter	À corriger
116	X	Descente EP à prolonger au sol	À corriger
117	X	Regard à finaliser	À corriger
221		Généralités : mise à la terre à réaliser	À corriger

Photographies des non-conformités



114

Gouttières à redresser



115

Fissure revers d'eau à traiter



116


Descente EP à prolonger au sol



117

Regard à finaliser

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Façades


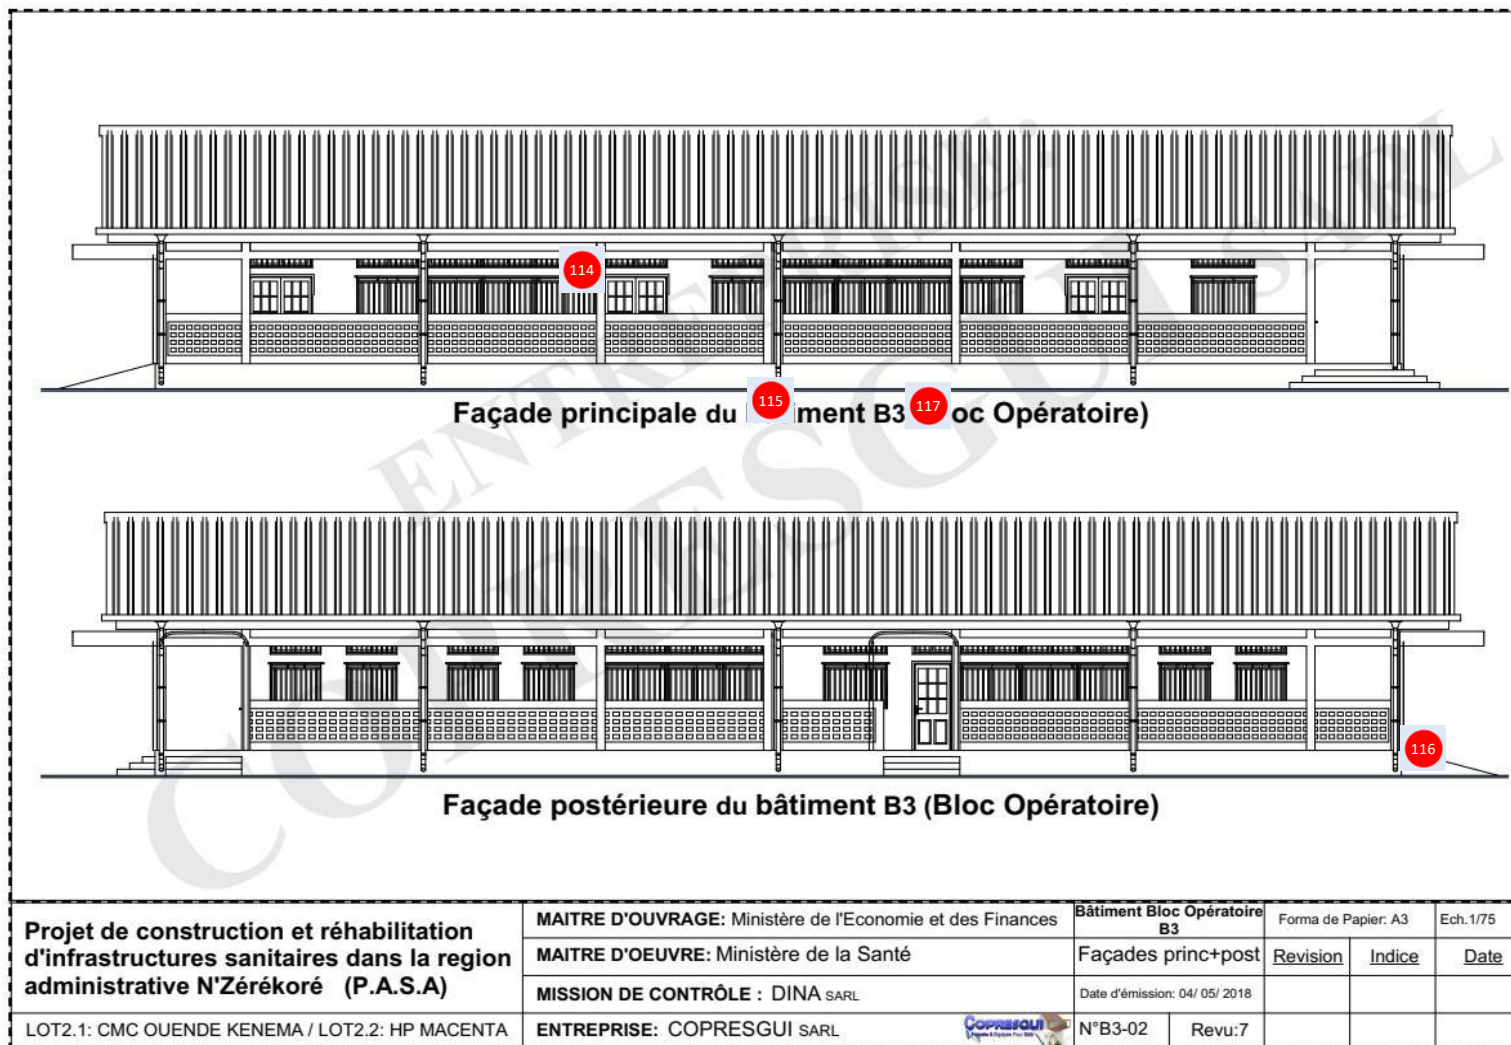


PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_façades


Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
3	X	Finition enduit à reprendre	À corriger
4	X	Finition soudures gouttière à reprendre	À corriger
5	X	Finition enduit à reprendre	À corriger
6	X	Reprise revers d'eau	À corriger
7	X	Alimentation d'eau non enterrée et pose grillage avertisseur	À corriger
8	X	Redresser gouttière	À corriger
226		Généralités : mise à la terre à réaliser	À corriger

Photographies des non-conformités

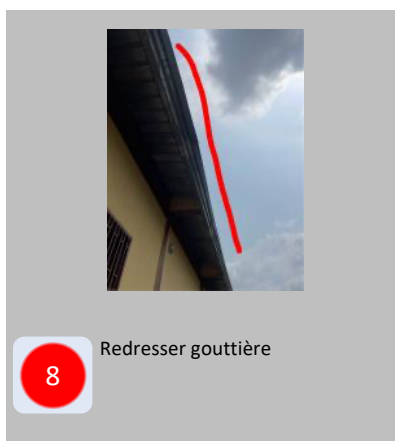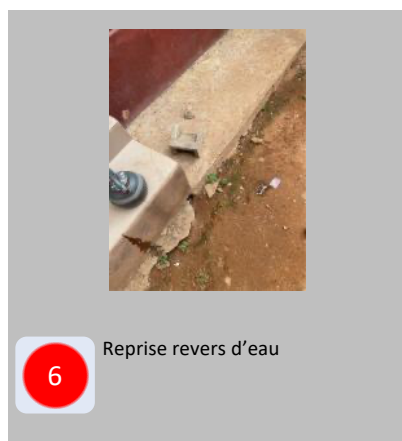

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_façades

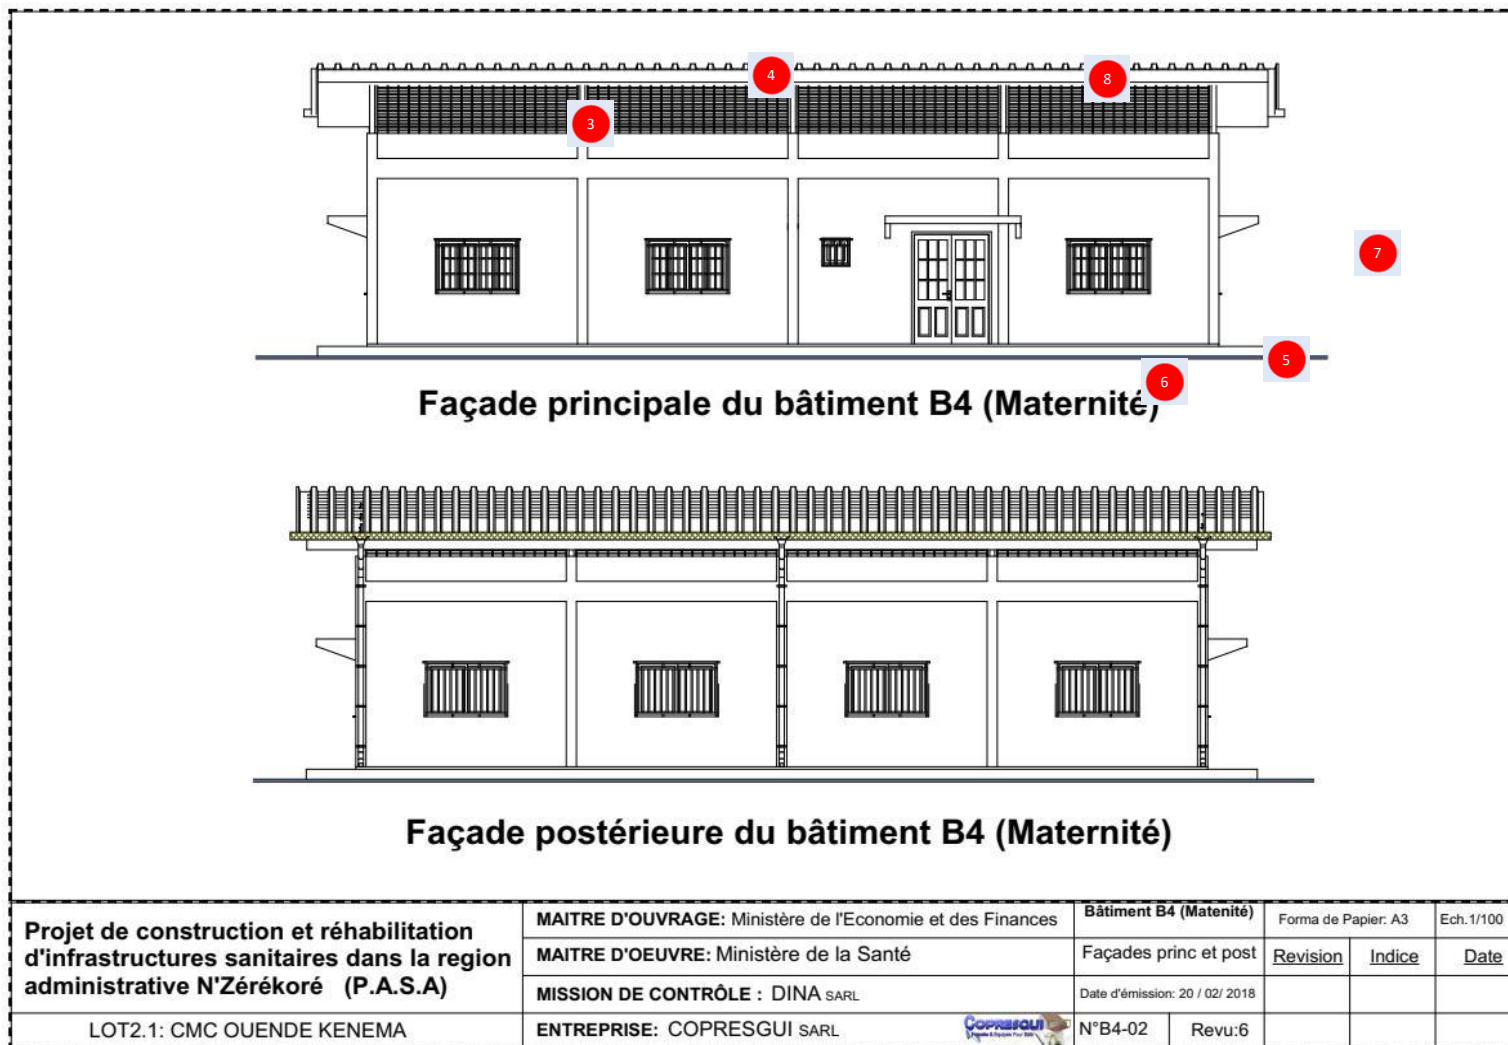













PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
24	X	Ventilateur manquant	À corriger
25		Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre	À corriger
26	X	Poignée à reprendre	À corriger
27	X	Poignée à reprendre	À corriger
28		WC non fonctionnel	À corriger
29		Généralités : réalisation joints cadre alu	À corriger
30	X	Infiltrations d'eau	À corriger
31		Climatiseur manquant	À corriger
32	X	Porte manquante	À corriger
33	X	Paillasse à rallonger	À corriger
34	X	Faïence manquante	À corriger
35		Ventilateur non fonctionnel	À corriger
36		Généralités : faïence au-dessus des paillasses manquante	À corriger
37	X	Reprise interrupteur	À corriger
38	X	Finition ventilation	À corriger
39	X	Ouverture non conforme aux plans	À corriger
40	X	Climatiseur manquant	À corriger
41		Ventilateur non fonctionnel	À corriger
42	X	Lavabo à installer correctement	À corriger
43	X	Finition porte	À corriger
44	X	Pose porte à reprendre	À corriger
45	X	Porte manquante	À corriger
46	X	Cadre bois à reprendre	À corriger
47	X	Cadre porte à reprendre	À corriger
48	X	Finition interrupteur	À corriger
49		Lavabo non alimenté	À corriger
50	X	Alu vitré manquant	À corriger
51	X	Finition faïence	À corriger
53		Ventilateurs manquants x3	À corriger
214		Main courante 3ml manquantes	À corriger
227		Généralités : finitions pose interrupteurs	À corriger
228		Généralités : réglage ouverture et fermeture portes	À corriger
229		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
230		Généralités : nettoyage coulures peinture	À corriger

Photographies des non-conformités

 <p>24 Ventilateur manquant</p>	 <p>26 Poignée à reprendre</p>	 <p>27 Poignée à reprendre</p>
 <p>30 Infiltrations d'eau</p>	 <p>32 Porte manquante</p>	 <p>33 Paillasse à rallonger</p>
 <p>34 Faïence manquante</p>	 <p>37 Reprise interrupteur</p>	 <p>38 Finition ventilation</p>
 <p>39 Ouverture non conforme aux plans</p>	 <p>40 Climatiseur manquant</p>	 <p>42 Lavabo à installer correctement</p>



43

Finition porte



44

Pose porte à reprendre



45

Porte manquante




46

Cadre bois à reprendre



47

Cadre porte à reprendre



48

Finition interrupteur



50


Alu vitré manquant



51

Finition faïence

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan


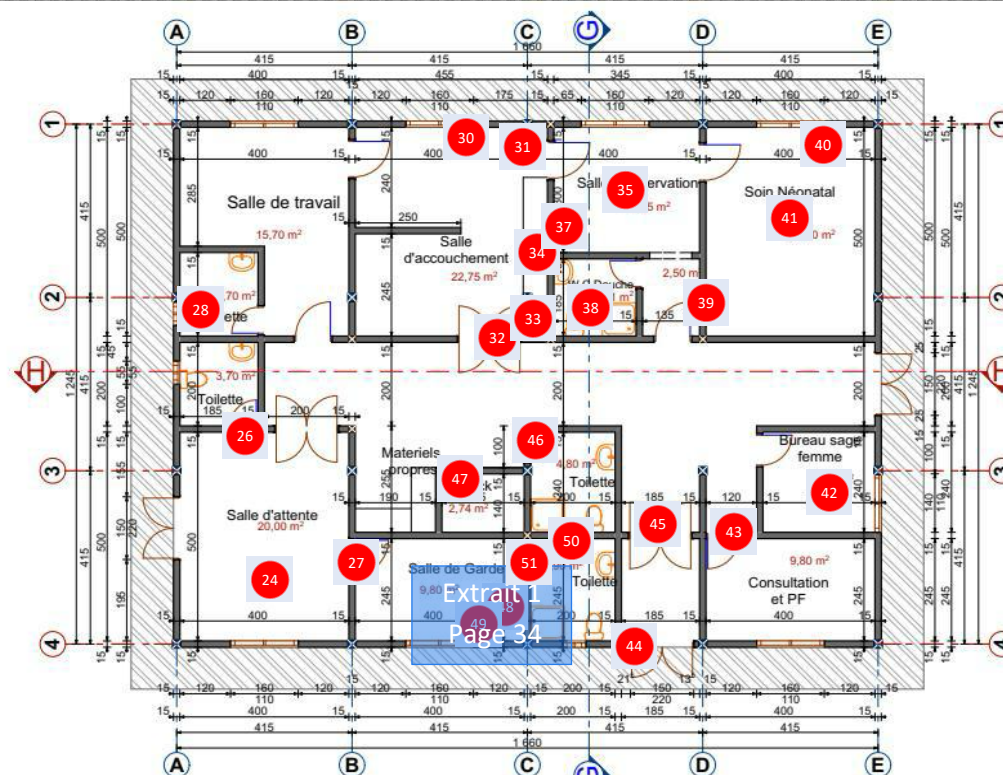


Vue en plan du bâtiment B4 (Maternité)

LEGENDE: — Murs en agglos creux de 15 — Murs en agglos creux de 10

Projet de construction et réhabilitation d'infrastructures sanitaires dans la region administrative N'Zérékoré (P.A.S.A) LOT2.1: CMC OUENDE KENEMA	MAITRE D'OUVRAGE: Ministère de l'Economie et des Finances		Bâtiment B4 (Maternité)		Forma de Papier: A3	Ech.1/100
	MAITRE D'OEUVRE: Ministère de la Santé		Vue en Plan		Revision	Indice
	MISSION DE CONTRÔLE : DINA SARL		Date d'émission: 20 / 02 / 2018			
	ENTREPRISE: COPRESGUI SARL		N°B4-01	Revu:6		

Plan - PASA1_Ouëndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan - Extrait 1

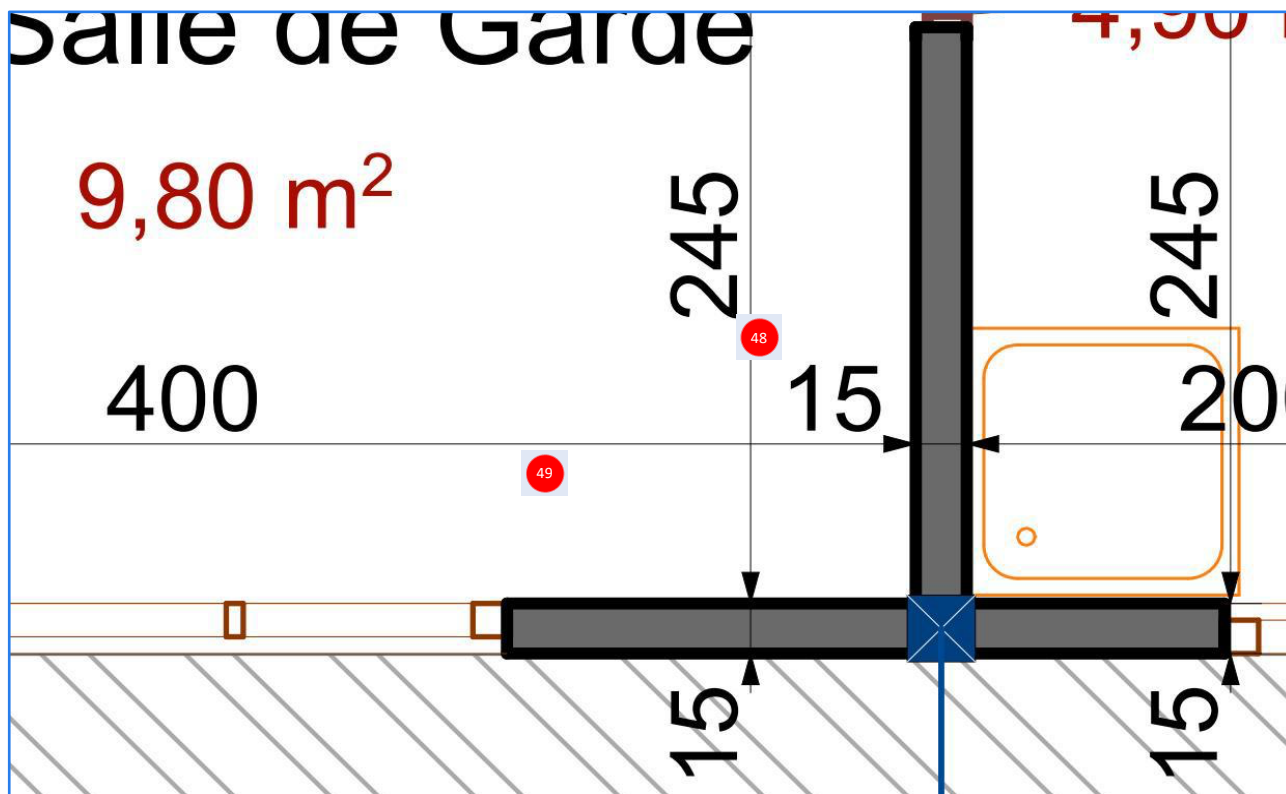

PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_façades

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
157		Ventilateurs manquants x2	À corriger
169	X	Fissure revers d'eau à fermer	À corriger
171	X	Généralités : rejingots à reprendre	À corriger
172	X	Finition regard à finaliser	À corriger
180		Généralités : redresser gouttières et points de soudure à reprendre	À corriger
181		Mise à la terre du bâtiment à réaliser	À corriger
231		Généralités : reprise finitions enduits et peinture	À corriger
232		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
233		Généralités : réglage ouverture et fermeture portes	À corriger
234		Généralités : finitions pose interrupteurs	À corriger

Photographies des non-conformités




169

Fissure revers d'eau à fermer



171


Généralités : rejets à reprendre



172

Finition regard à finaliser

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_façades

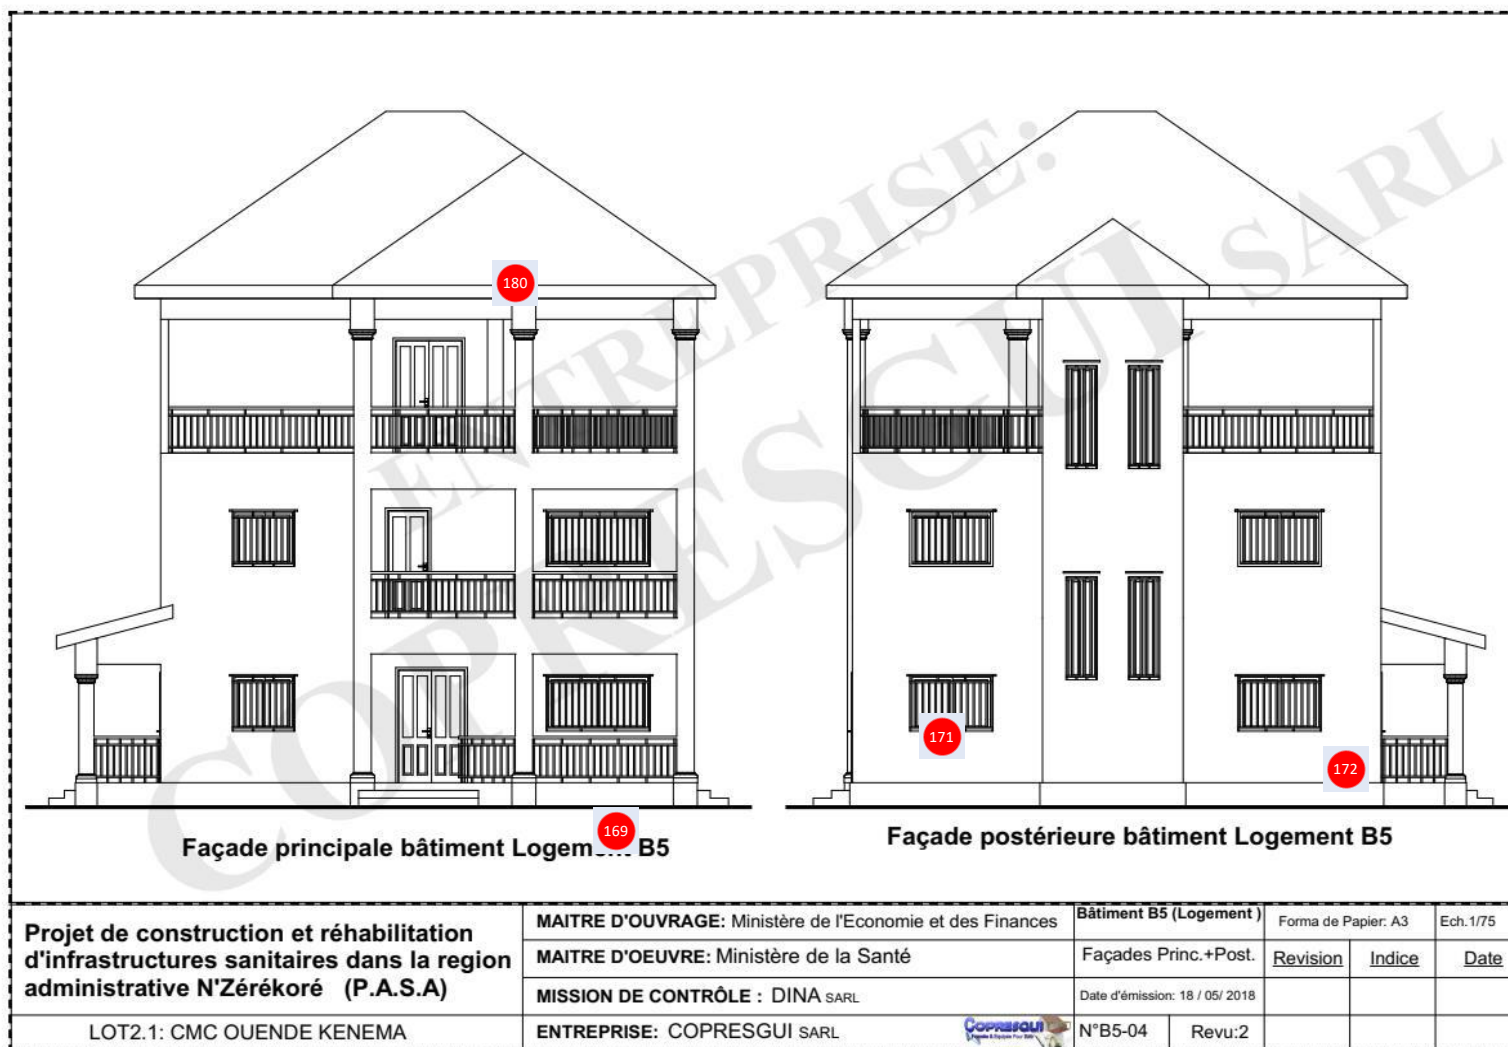

PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
155	X	Pose carreaux à reprendre	À corriger
156	X	Fuite d'eau faux plafond	À corriger
158	X	Hauteur porte non conforme	À corriger
159	X	Fermeture cadre alu	À corriger
160		Hauteur porte non conforme	À corriger
161		Hauteur porte non conforme	À corriger
162	X	Cadre alu manquant	À corriger
163	X	Boîte de dérivation manquante	À corriger
164	X	Boîte de dérivation manquante	À corriger
177	X	Logement SF : fuite d'eau plafond	À corriger
178		Ventilateur non fonctionnel	À corriger
185	X	Logement CS : fuite d'eau plafond	À corriger

Photographies des non-conformités



155

Pose carreaux à reprendre



156

Fuite d'eau faux plafond



158

Hauteur porte non conforme



159

Fermeture cadre alu



162

Cadre alu manquant



163

Boîte de dérivation manquante




164

Boîte de dérivation manquante



177


Logement SF : fuite d'eau
plafond



185

Logement CS : fuite d'eau
plafond

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1

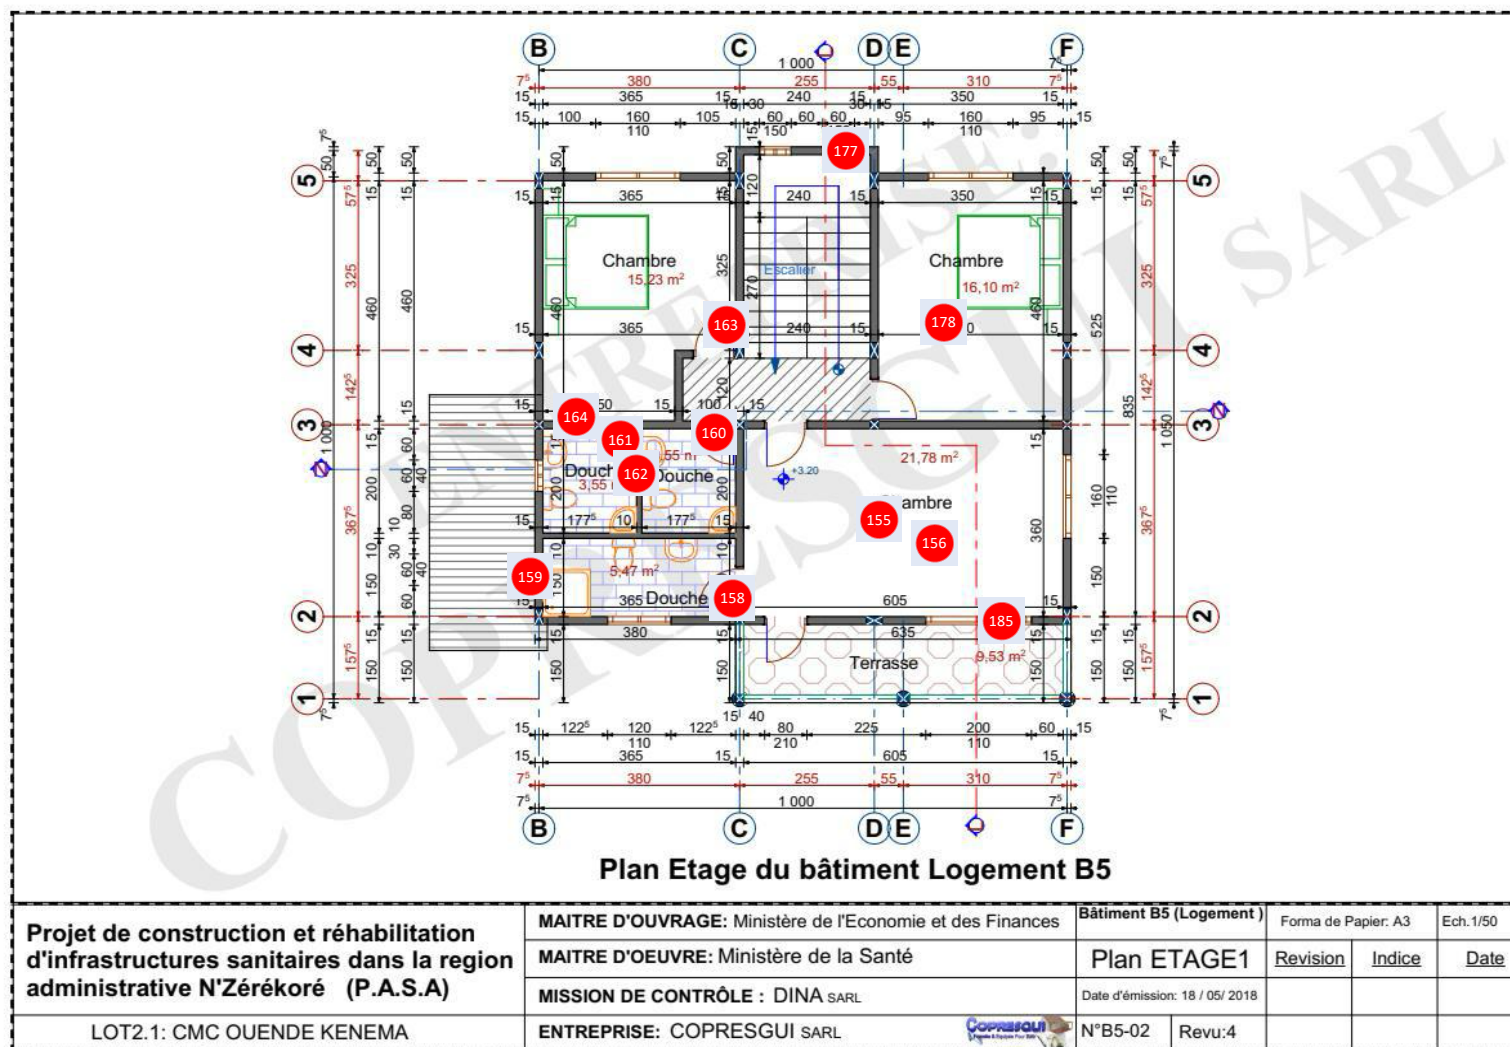

PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
146	X	Seuil porte	À corriger
147	X	Fuite d'eau depuis l'étage	À corriger
148		Généralités : alimentation électrique non fonctionnelle	À corriger
149	X	Finition faïence	À corriger
150		Généralités : reprise et fin enduits et peinture	À corriger
151	X	Interrupteur manquant	À corriger
153	X	Infiltrations d'eau	À corriger
154		Généralités : joints cadre alu à faire pour l'ensemble des fenêtres	À corriger
173	X	Seuil à finaliser	À corriger
174		Généralités : réglage ouverture et fermeture toutes les portes et fenêtres	À corriger
175	X	Gaine tuyaux manquante	À corriger
176	X	Logement SF : pose interrupteur	À corriger
183		Logement CS : porte montée à l'inverse	À corriger
184	X	Logement CS : fuite d'eau	À corriger

Photographies des non-conformités



146

Seuil porte




147

Fuite d'eau depuis l'étage



149

Finition faïence



151

Interrupteur manquant



153

Infiltrations d'eau



173

Seuil à finaliser



175

Gaine tuyaux manquante



176


Logement SF : pose interrupteur





184

Logement CS : fuite d'eau



Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC

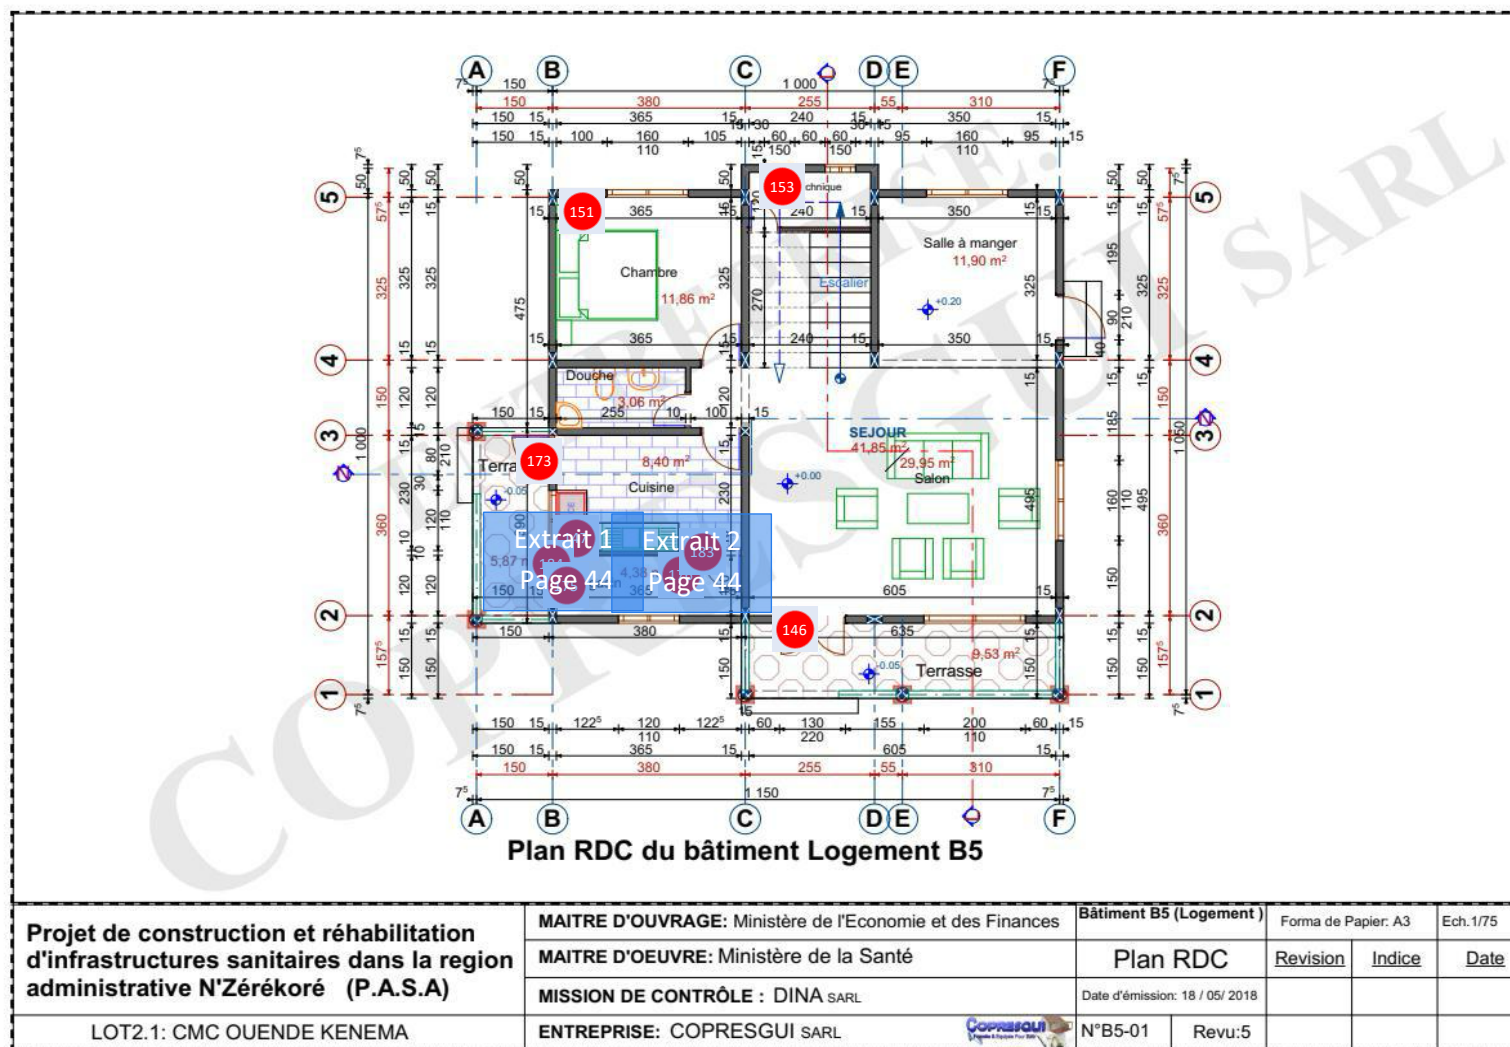

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC
- Extrait 1

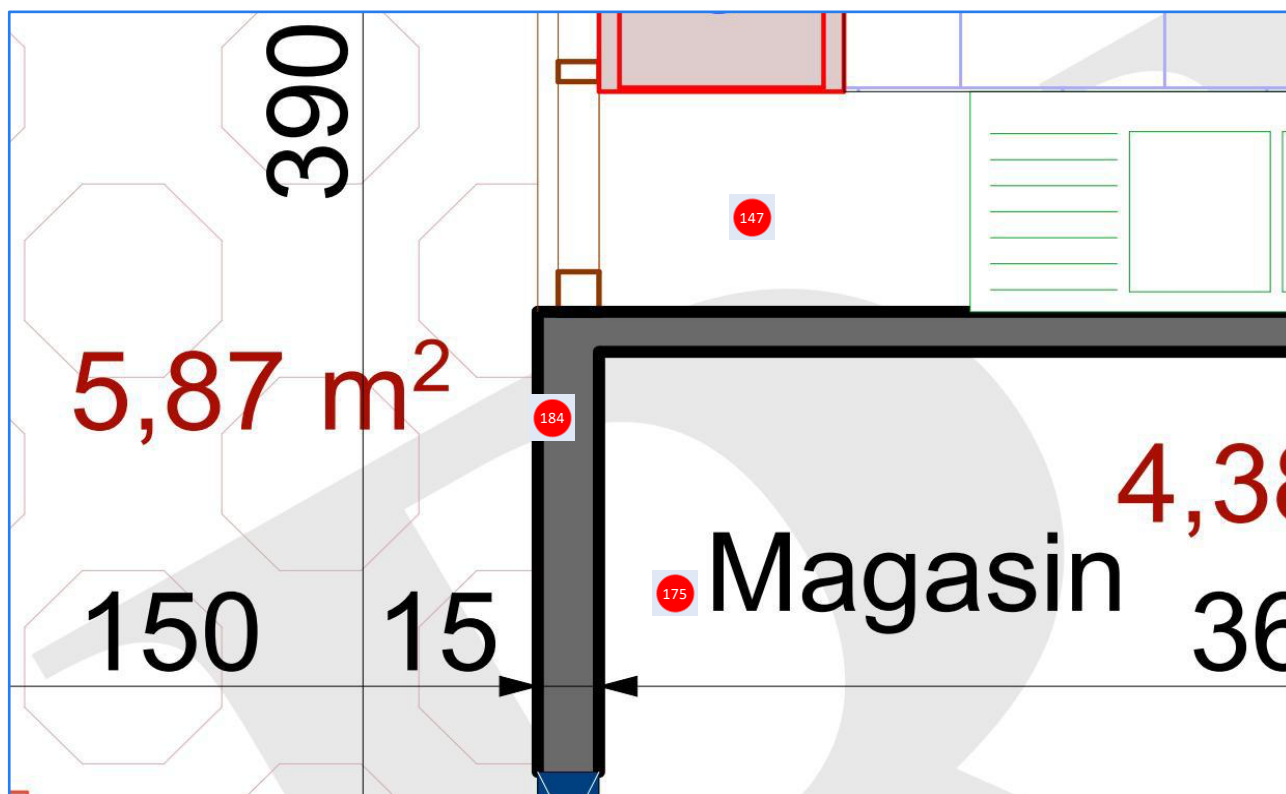

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_logements_RDC -
Extrait 2

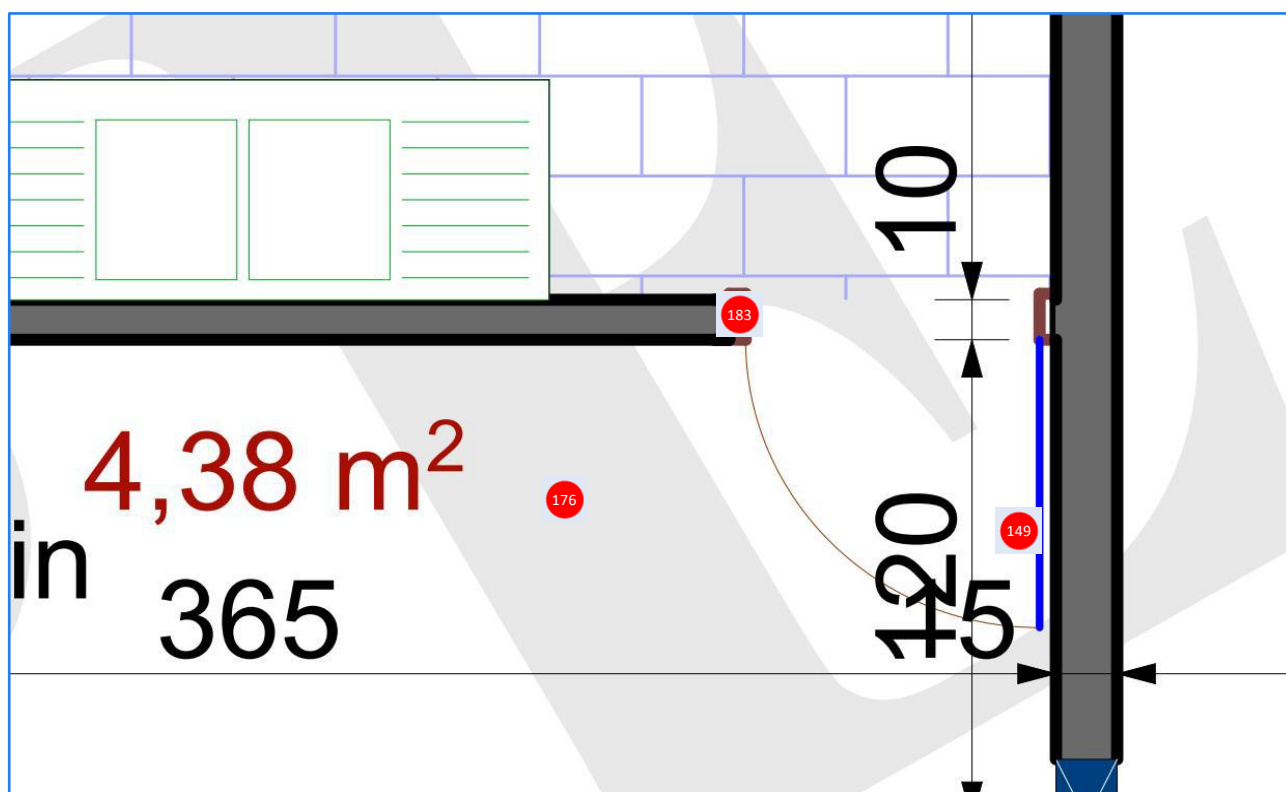

PASA1_Ouèndé-Kènèma / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
9		Installation plomberie non fonctionnelle	À corriger
10	X	Bac collectif manquant	À corriger
12		Généralités : appareillage plomberie non raccordé	À corriger
14	X	Finition cadre bois	À corriger
15	X	Installation électrique à reprendre	À corriger
16		Bac collectif manquant	À corriger
17	X	Finition	À corriger
18		Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre	À corriger
20	X	Finition	À corriger
235		Généralités : mise à la terre à réaliser	À corriger
236		Généralités : nettoyage coulures peinture	À corriger
237		Généralités : réglage ouverture et fermeture portes	À corriger
238		Alimentation électrique étanche non posée	À corriger

Photographies des non-conformités



10

Bac collectif manquant



11

Largeur porte non conforme



14

Finition cadre bois



15

Installation électrique à reprendre



17

Finition



19


Claustres manquants



20

Finition

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan

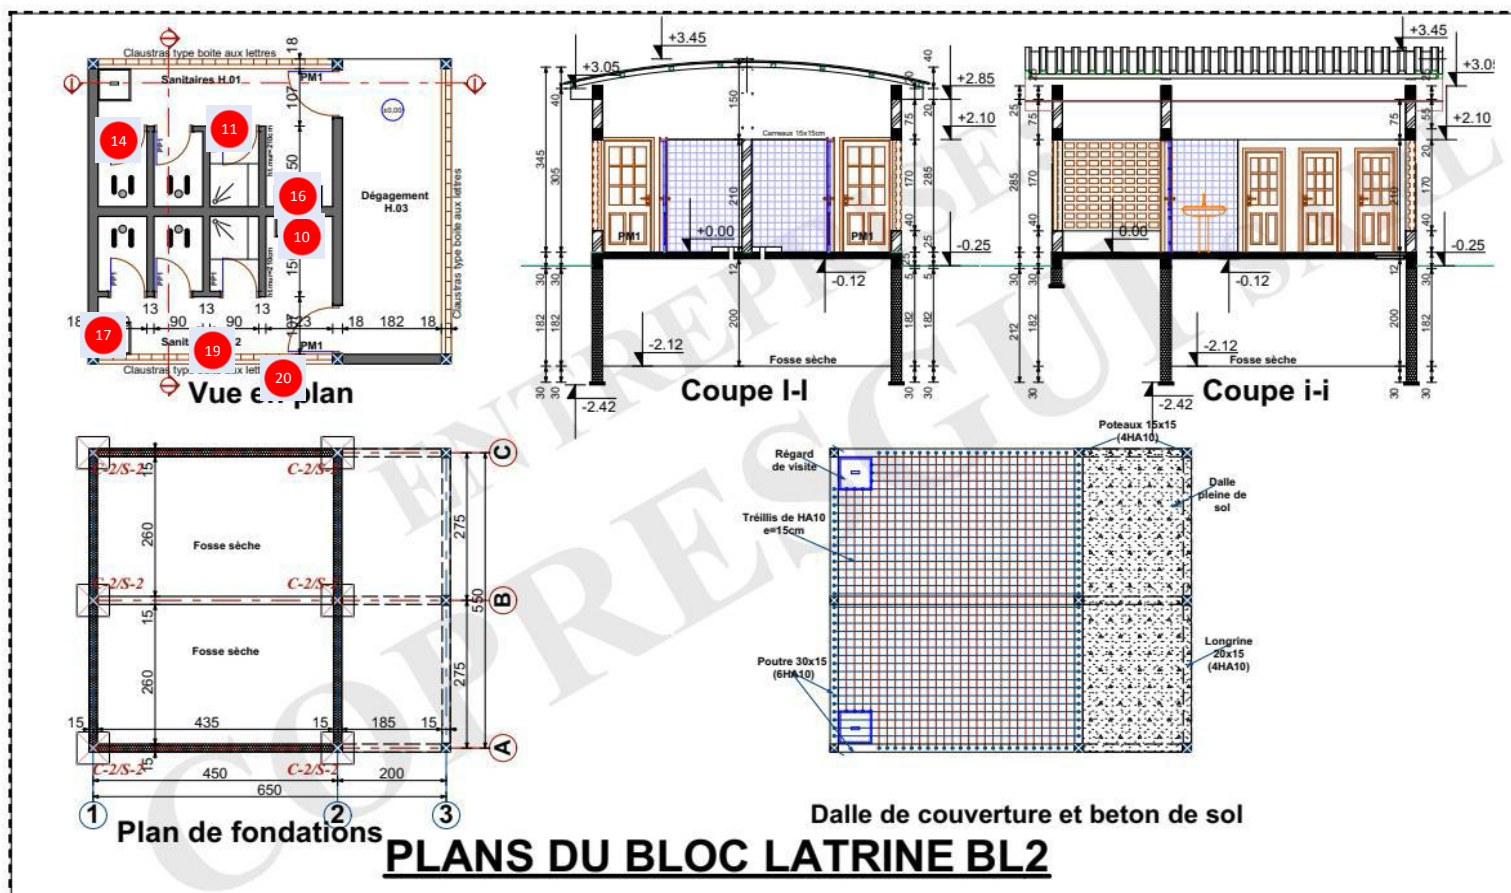

Projet de construction et réhabilitation
d'infrastructures sanitaires dans la région
administrative N'Zérékoré (P.A.S.A)

LOT2.1: CMC OUENDE KENEMA

MAITRE D'OUVRAGE: Ministère de l'Economie et des Finances

MAITRE D'OEUVRE: Ministère de la Santé

MISSION DE CONTRÔLE : DINA SARL

ENTREPRISE: COPRESGUI SARL

Bloc Latrines BL2

Plans et coupes

Date d'émission: 20 / 02 / 2018

N°BL2-01

Revu:7

Forma de Papier: A3

Revision

Indice

Date

Ech.1/75

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.8. Fosse septique

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
21	X	Ventilation manquante	À corriger
22	X	Trappe d'accès manquante	À corriger
23	X	Raccordement fosse puisard à reprendre	À corriger
166	X	Raccordement fosse puisard et réseau EUEV	À corriger
167	X	Ventilations manquantes	À corriger
168	X	Trappe à refaire ne bouche pas le trou	À corriger

Photographies des non-conformités



21

Ventilation manquante



22

Trappe d'accès manquante



23

Raccordement fosse puisard à reprendre



166

Raccordement fosse puisard



167

Ventilations manquantes



168

Trappe à refaire ne bouche pas le trou

VUE EN PLAN

COUPE A-A

Disposition des matériaux pour le préfiltre

- Gravier fin Ø8mm ép=20cm
- Gravier Ø16mm ép=20cm
- Gravier Ø25mm ép=30cm
- Plancher perforé de Ø15mm ép=15cm

Disposition des matériaux pour le puits filtrant

- Sable grossier ép=20cm
- Gravier ép=45cm

PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.9. Tour d'énergie

Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
138	X	Plancher métallique château manquant	À corriger
139	X	Seuil manquant	À corriger
140	X	Finition enduit dalle haute	À corriger
143	X	Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site : installation, raccordement et formation utilisateurs	À corriger
145	X	Finition porte	À corriger
239		Extincteurs manquants	À corriger
240		Étanchéité sur dalle tour d'énergie à réaliser	À corriger

Photographies des non-conformités



138

Plancher métallique château manquant



139

Seuil manquant



140

Finition enduit dalle haute



141

Alimentation en eau non enterrée et grillage avertisseur manquant



143

Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site



145

Finition porte

Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.9. Tour d'énergie

