












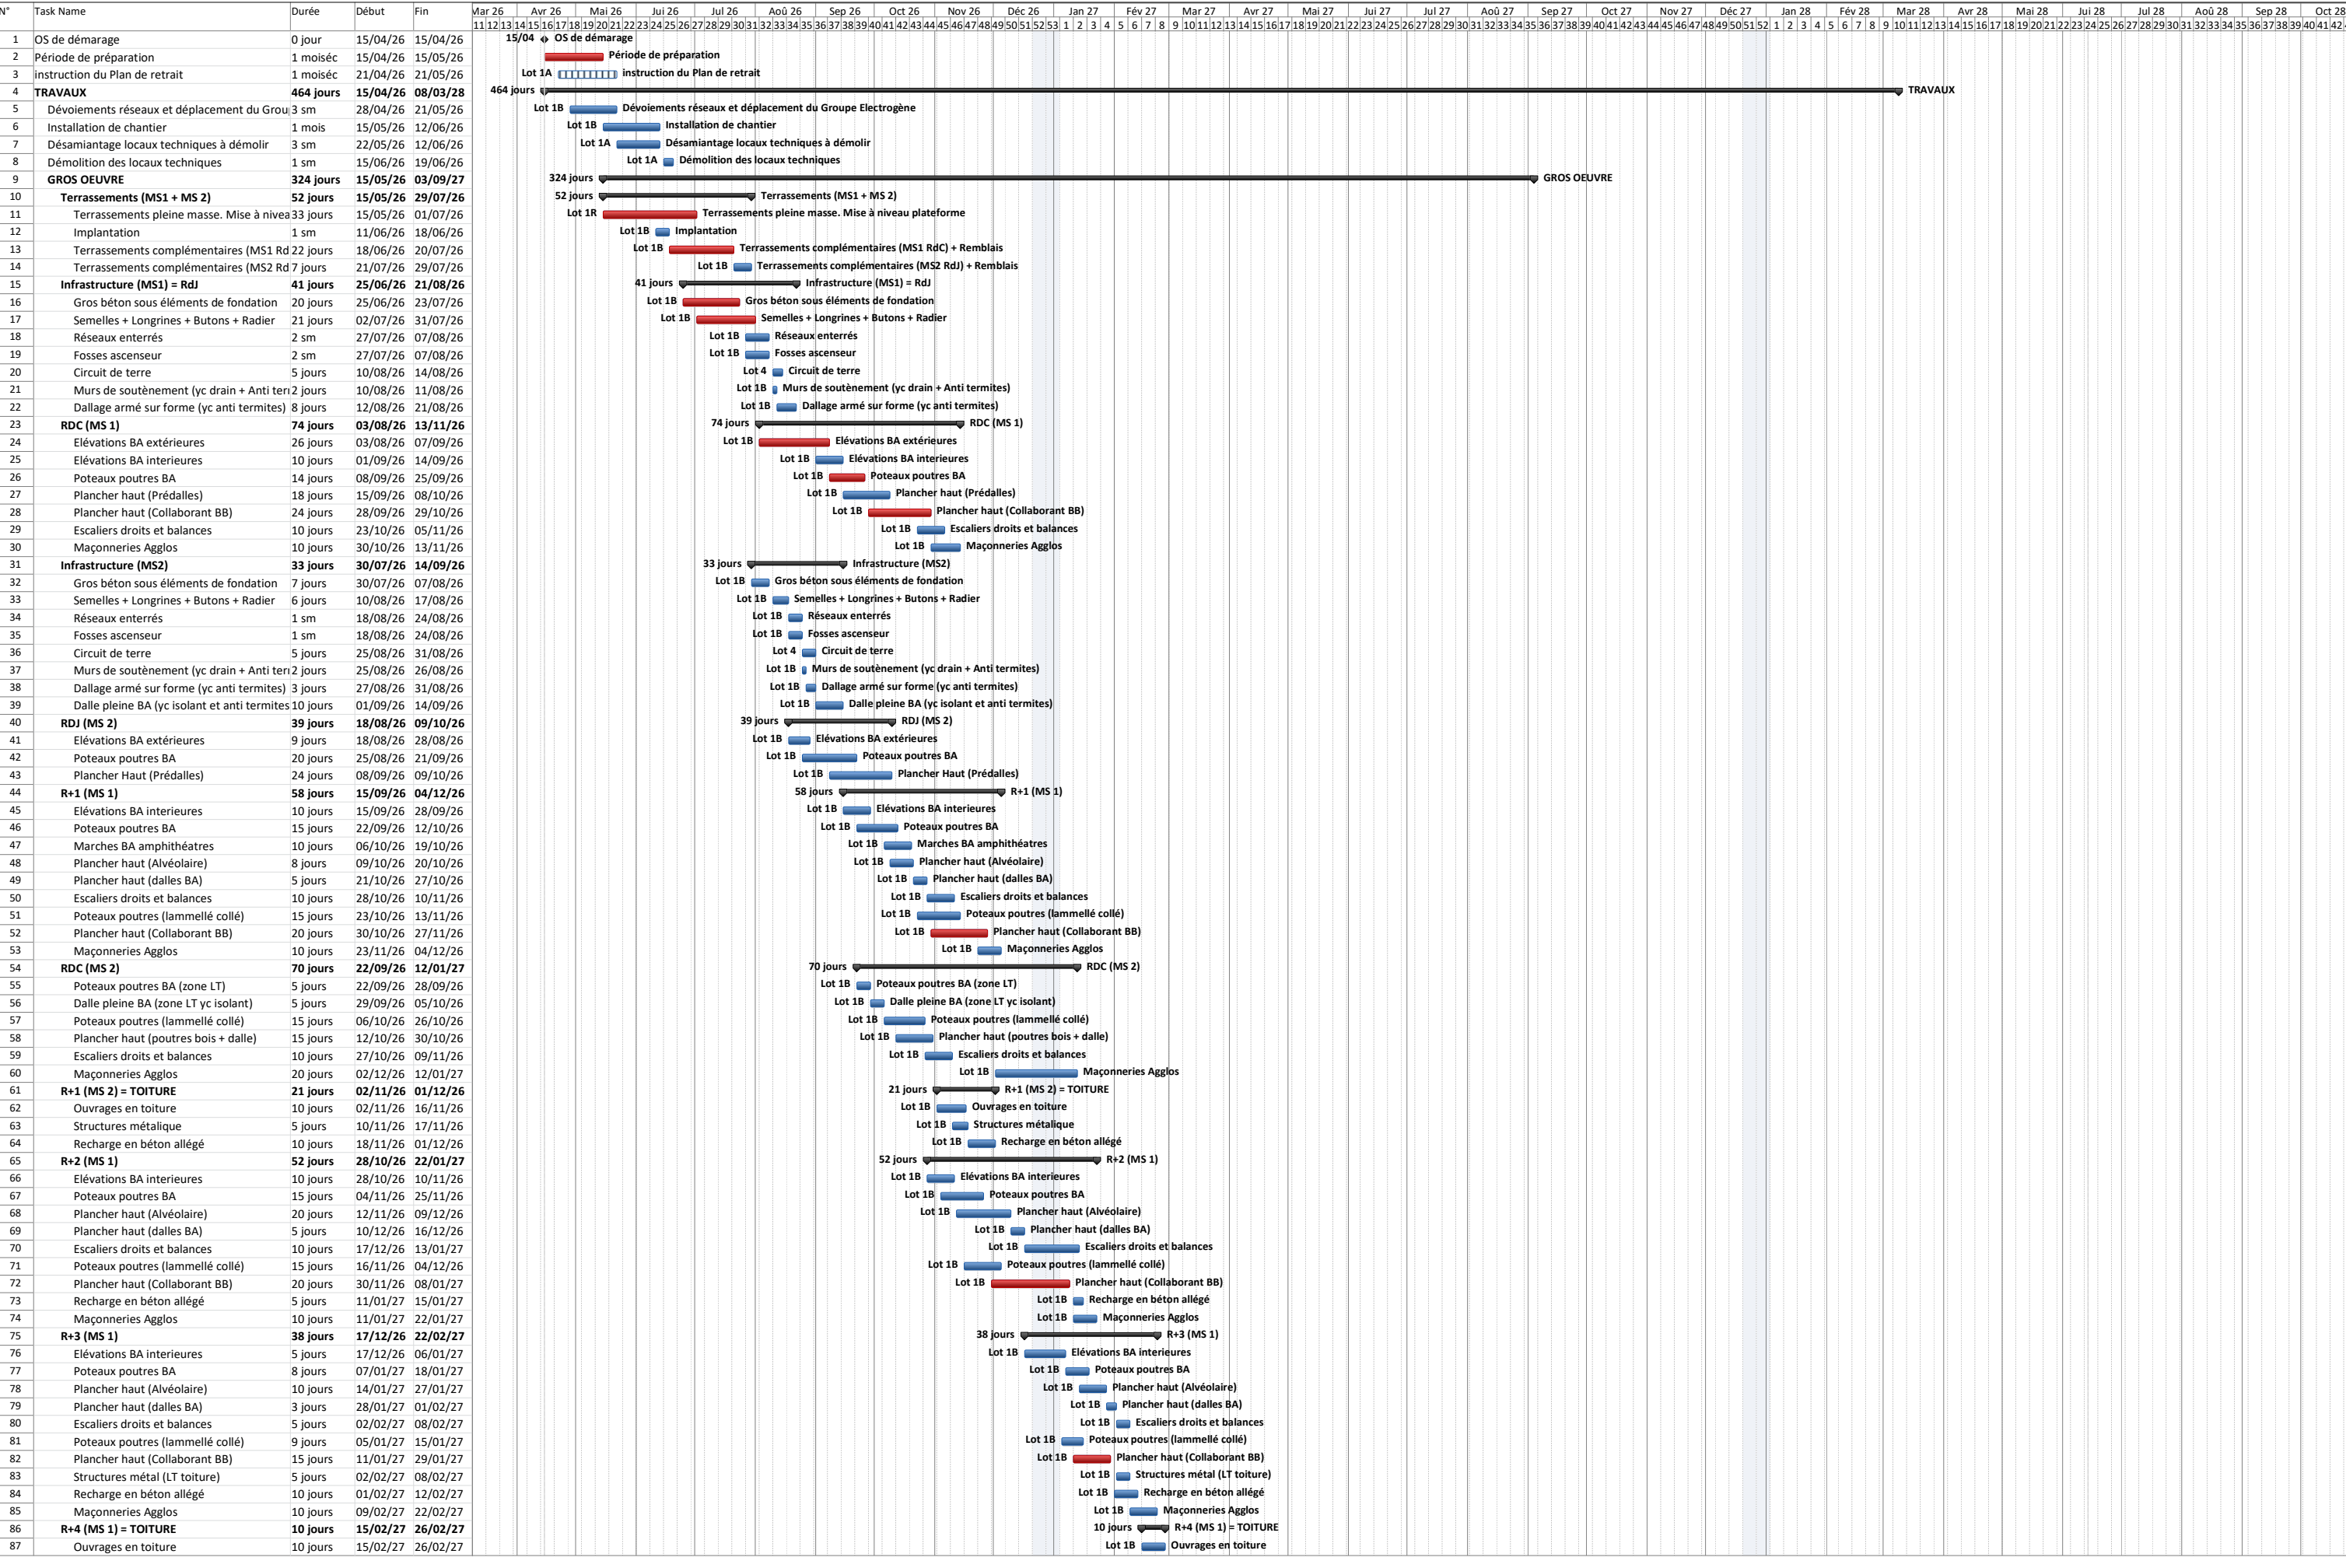



PARAMED
DCE





NOM / QUALITE		ADRESSE	CONTACT
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE Maître d'ouvrage		58 bd Charles Livon, 13284 Marseille	Tél: 04 91 39 66 09 06 43 07 04 87
QUALICONSLT Bureau de contrôle		9 rue Jean Mermoz, 13008 Marseille	Tél: 06 67 18 34 43
SCAU Architectes		35 rue Tournefort, 75005 Paris	Tél: 01 40 78 84 00
ATELIER PEREZ-PRADO Architectes associés		73-75 La Canebière, 13001 Marseille	Tél: 04 91 57 09 10
TPFI Bureau d'etudes structure et fluides		360 rue Louis de Broglie, 13856 Aix-en-Provence	Tél: 06 18 37 55 17
INDDIGO Bureau d'études HQE		11 rue Montgrand, 13006 Marseille	Tél: 04 95 09 31 00
VINCENT LION PAYSAGE Paysagiste		140 rue Victor Hugo, 92300 Levallois	Tél: 06 22 48 42 34
AUDITORI-HOME Bureau d'etudes acoustique		250 rue Maryam Mirzakhani, 34000 Montpellier	Tél: 06 51 99 65 20
ARCHEMED Economie de la construction		70 allée Alma Malher, 34000 Montpellier	Tél: 04 67 66 53 00
CHEMIN CRITIQUE OPC		8 traverse Beaufort, 13100 Aix-en-Provence	Tél: 06 95 58 83 99
STUDIO FAHRENHEIT Preventionniste		163 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris	Tél: 06 88 21 48 72
AC2R Bureau d'etudes Cuisine		3bis rue du Petit Robinson, 78350 Jouy-en-Josas	Tél: 01 30 70 60 60
C3 Bureau d'études Façades		40 rue du Caire 75002 PARIS	Tél: 05 64 11 51 27

PLANNING ETUDE TRAVAUX								
PROJET PARAMED	EMETTEUR CHCR	PHASE DCE	TYPE ECR	ETAGE TN	NUMERO -	INDICE 0	EHELLE -	DATE 07/11/2025



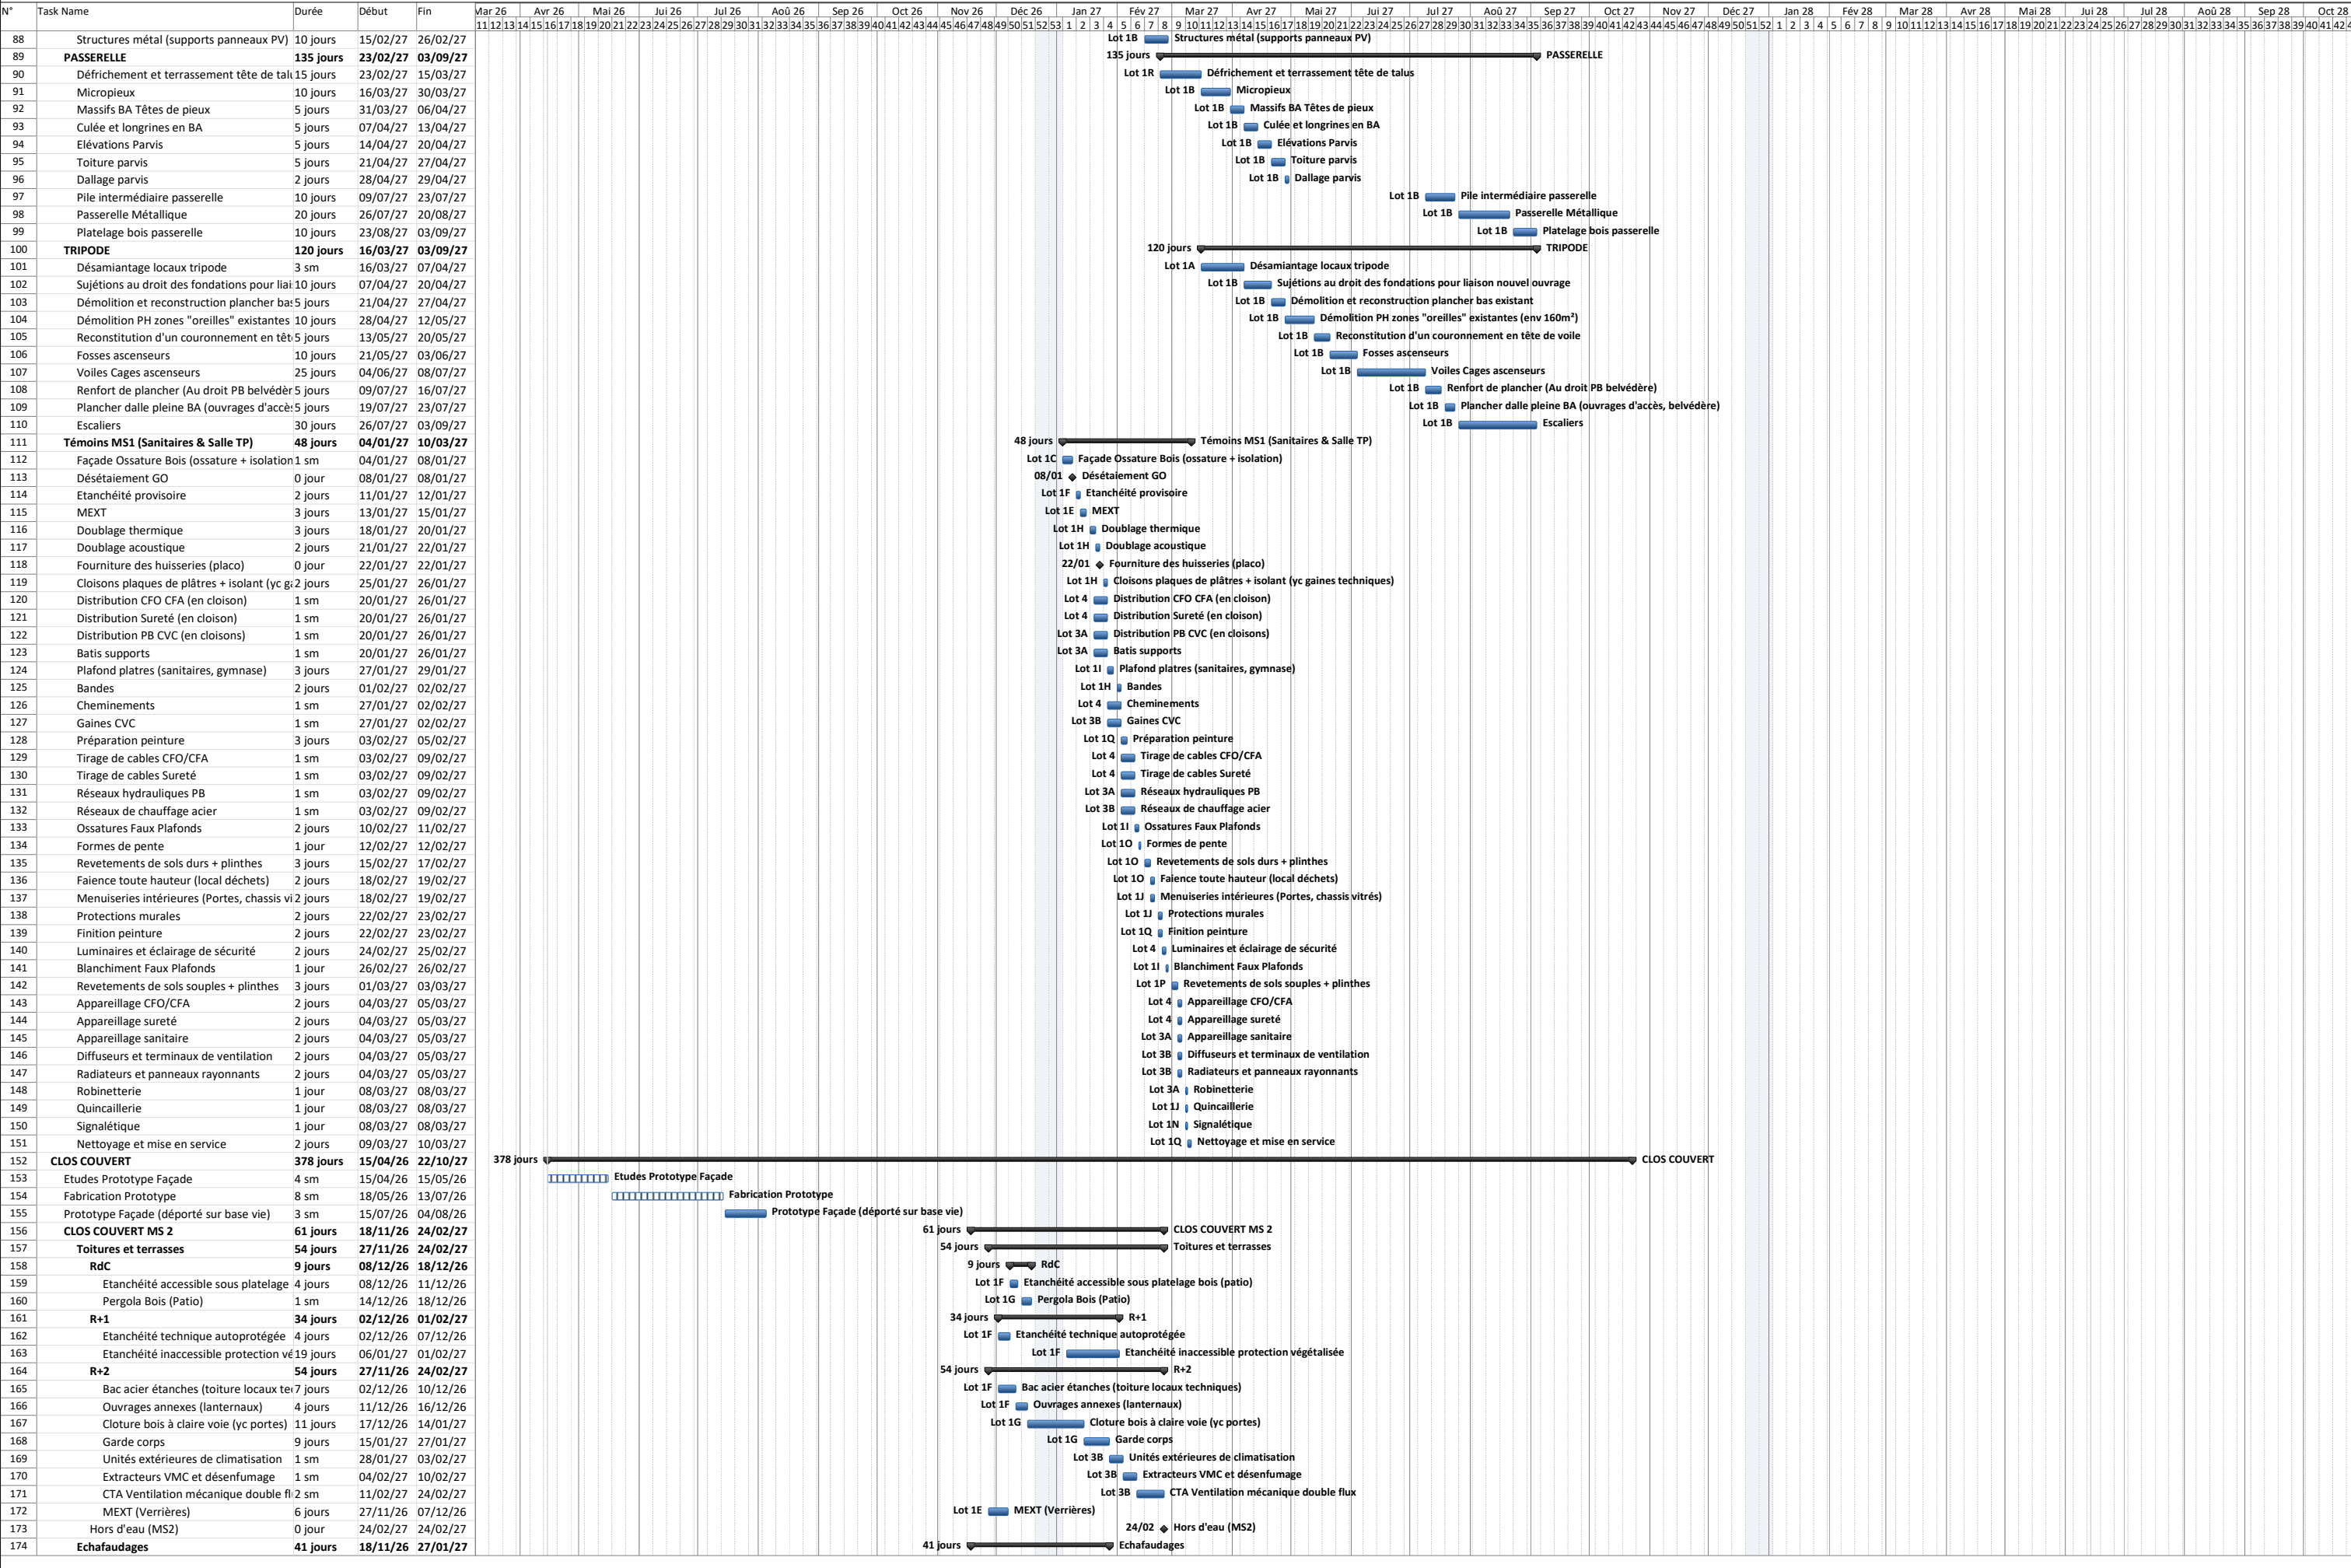

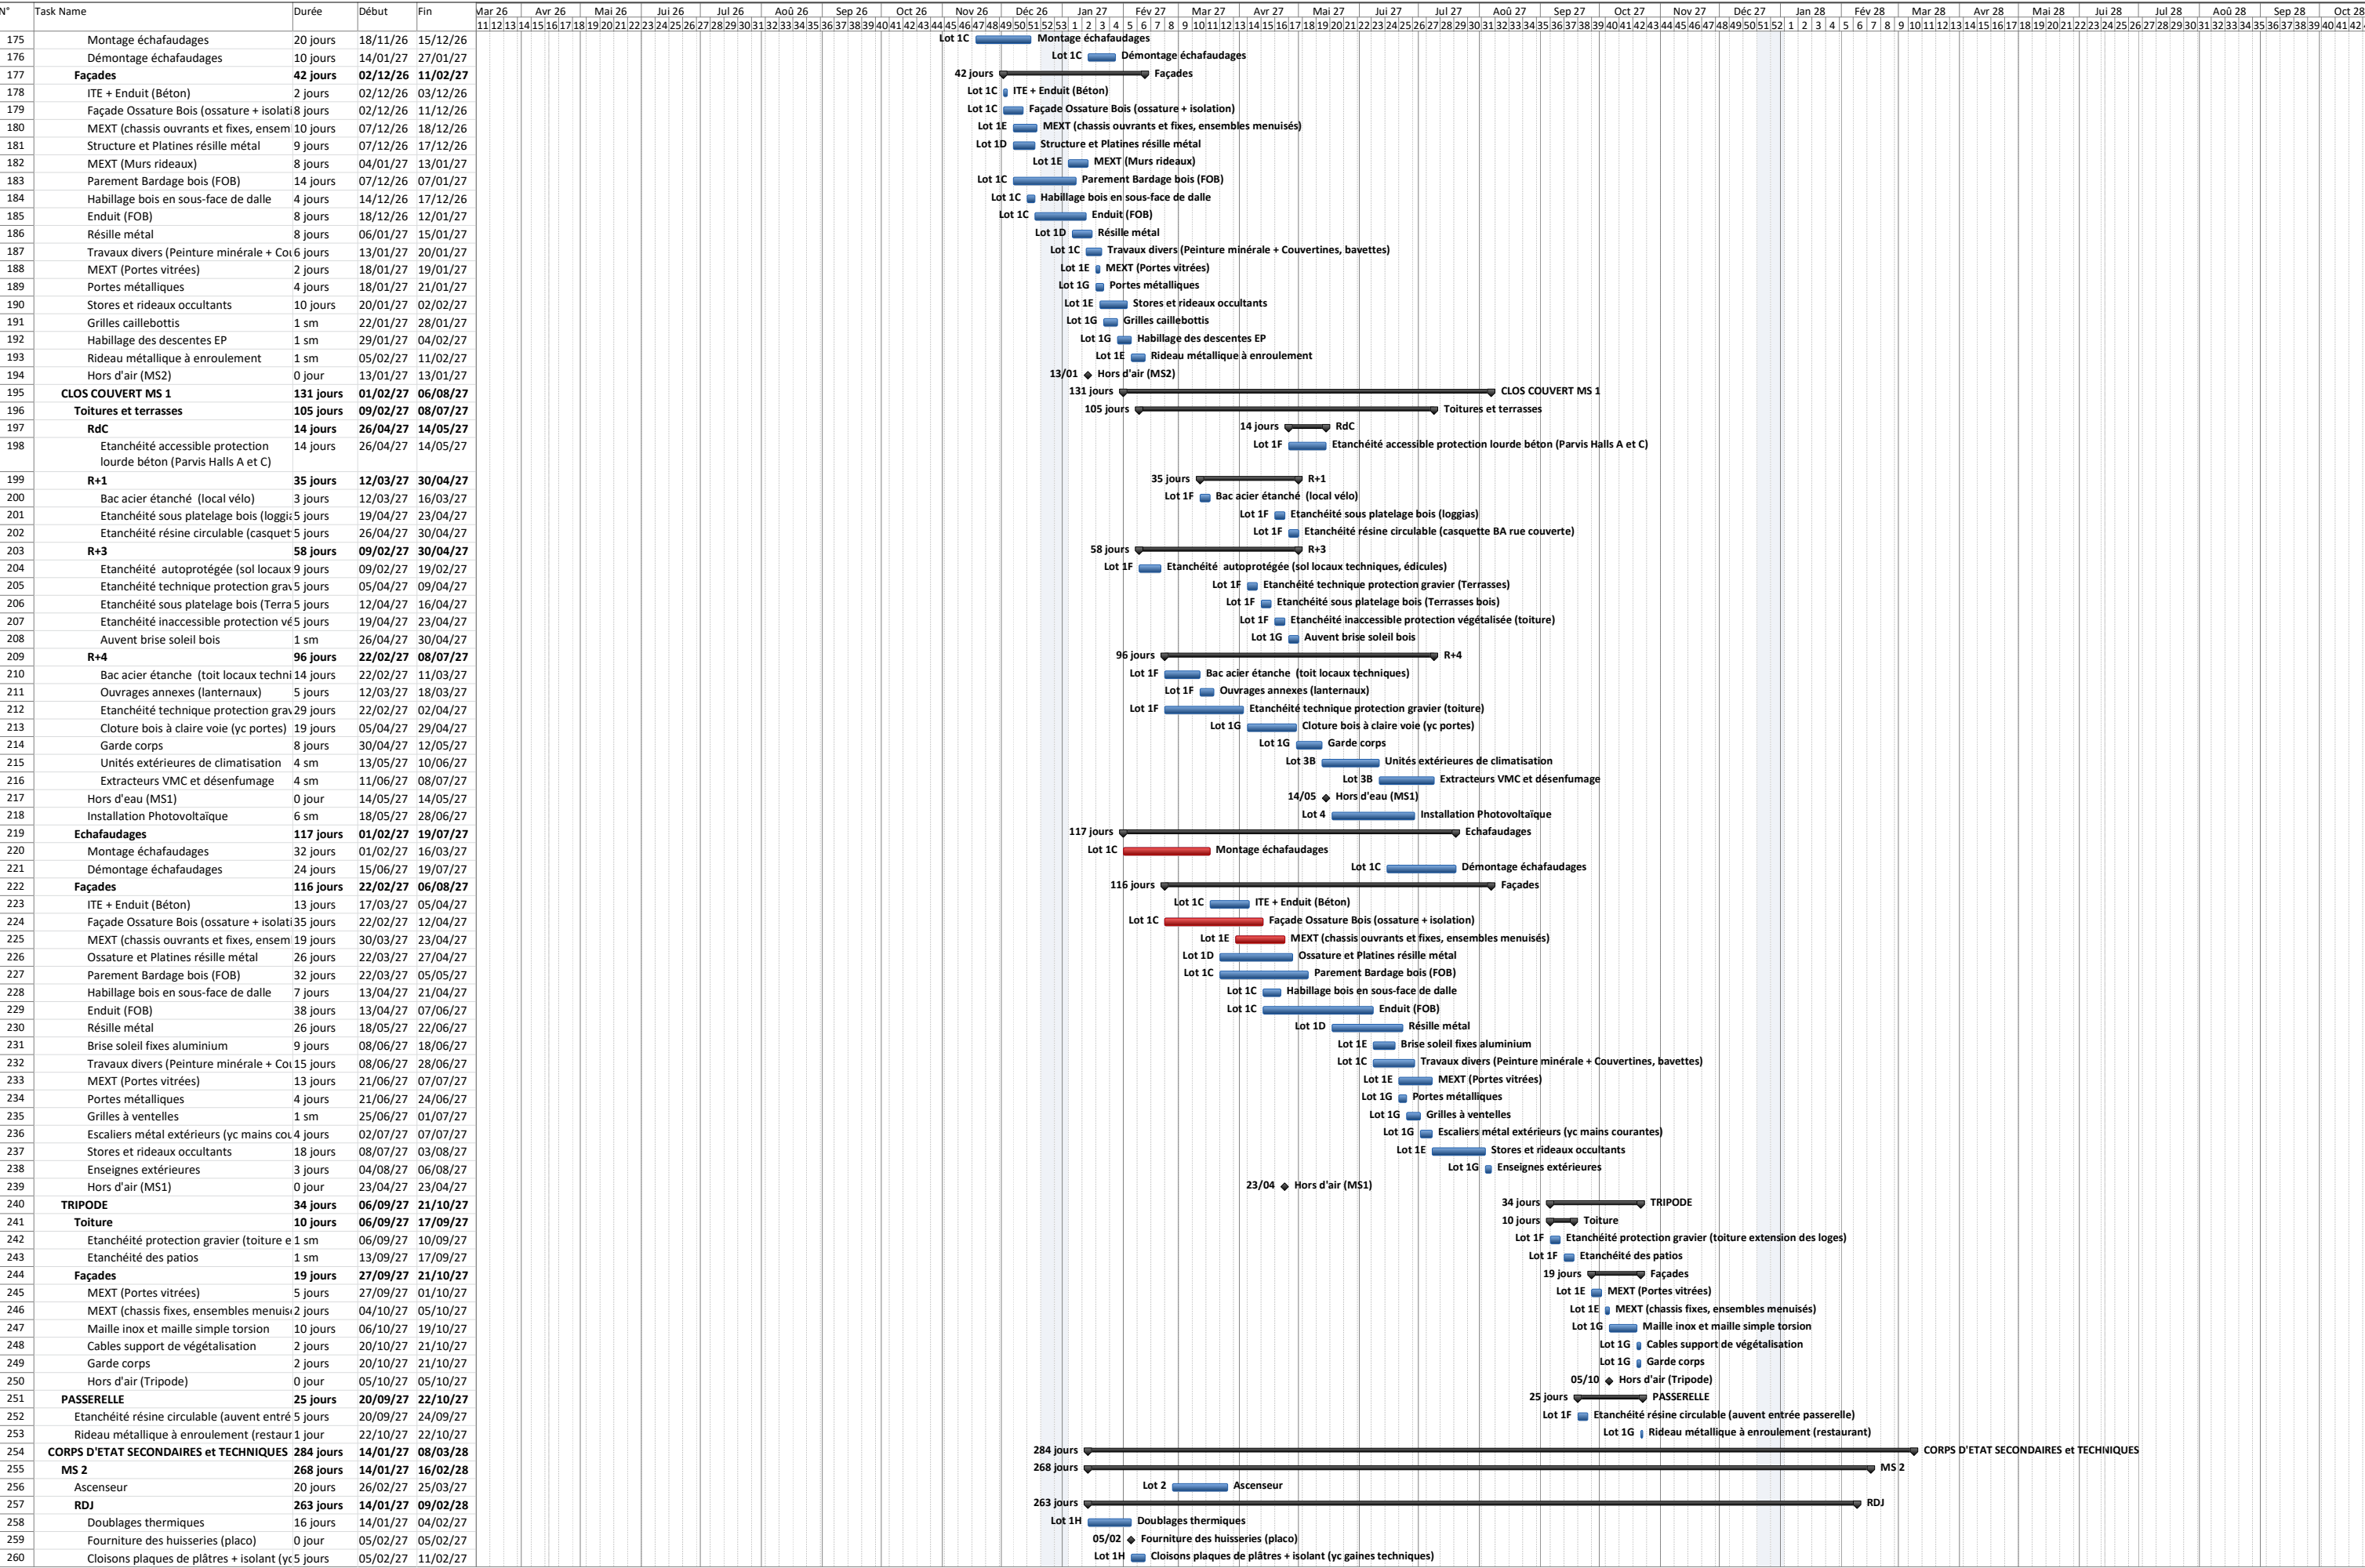

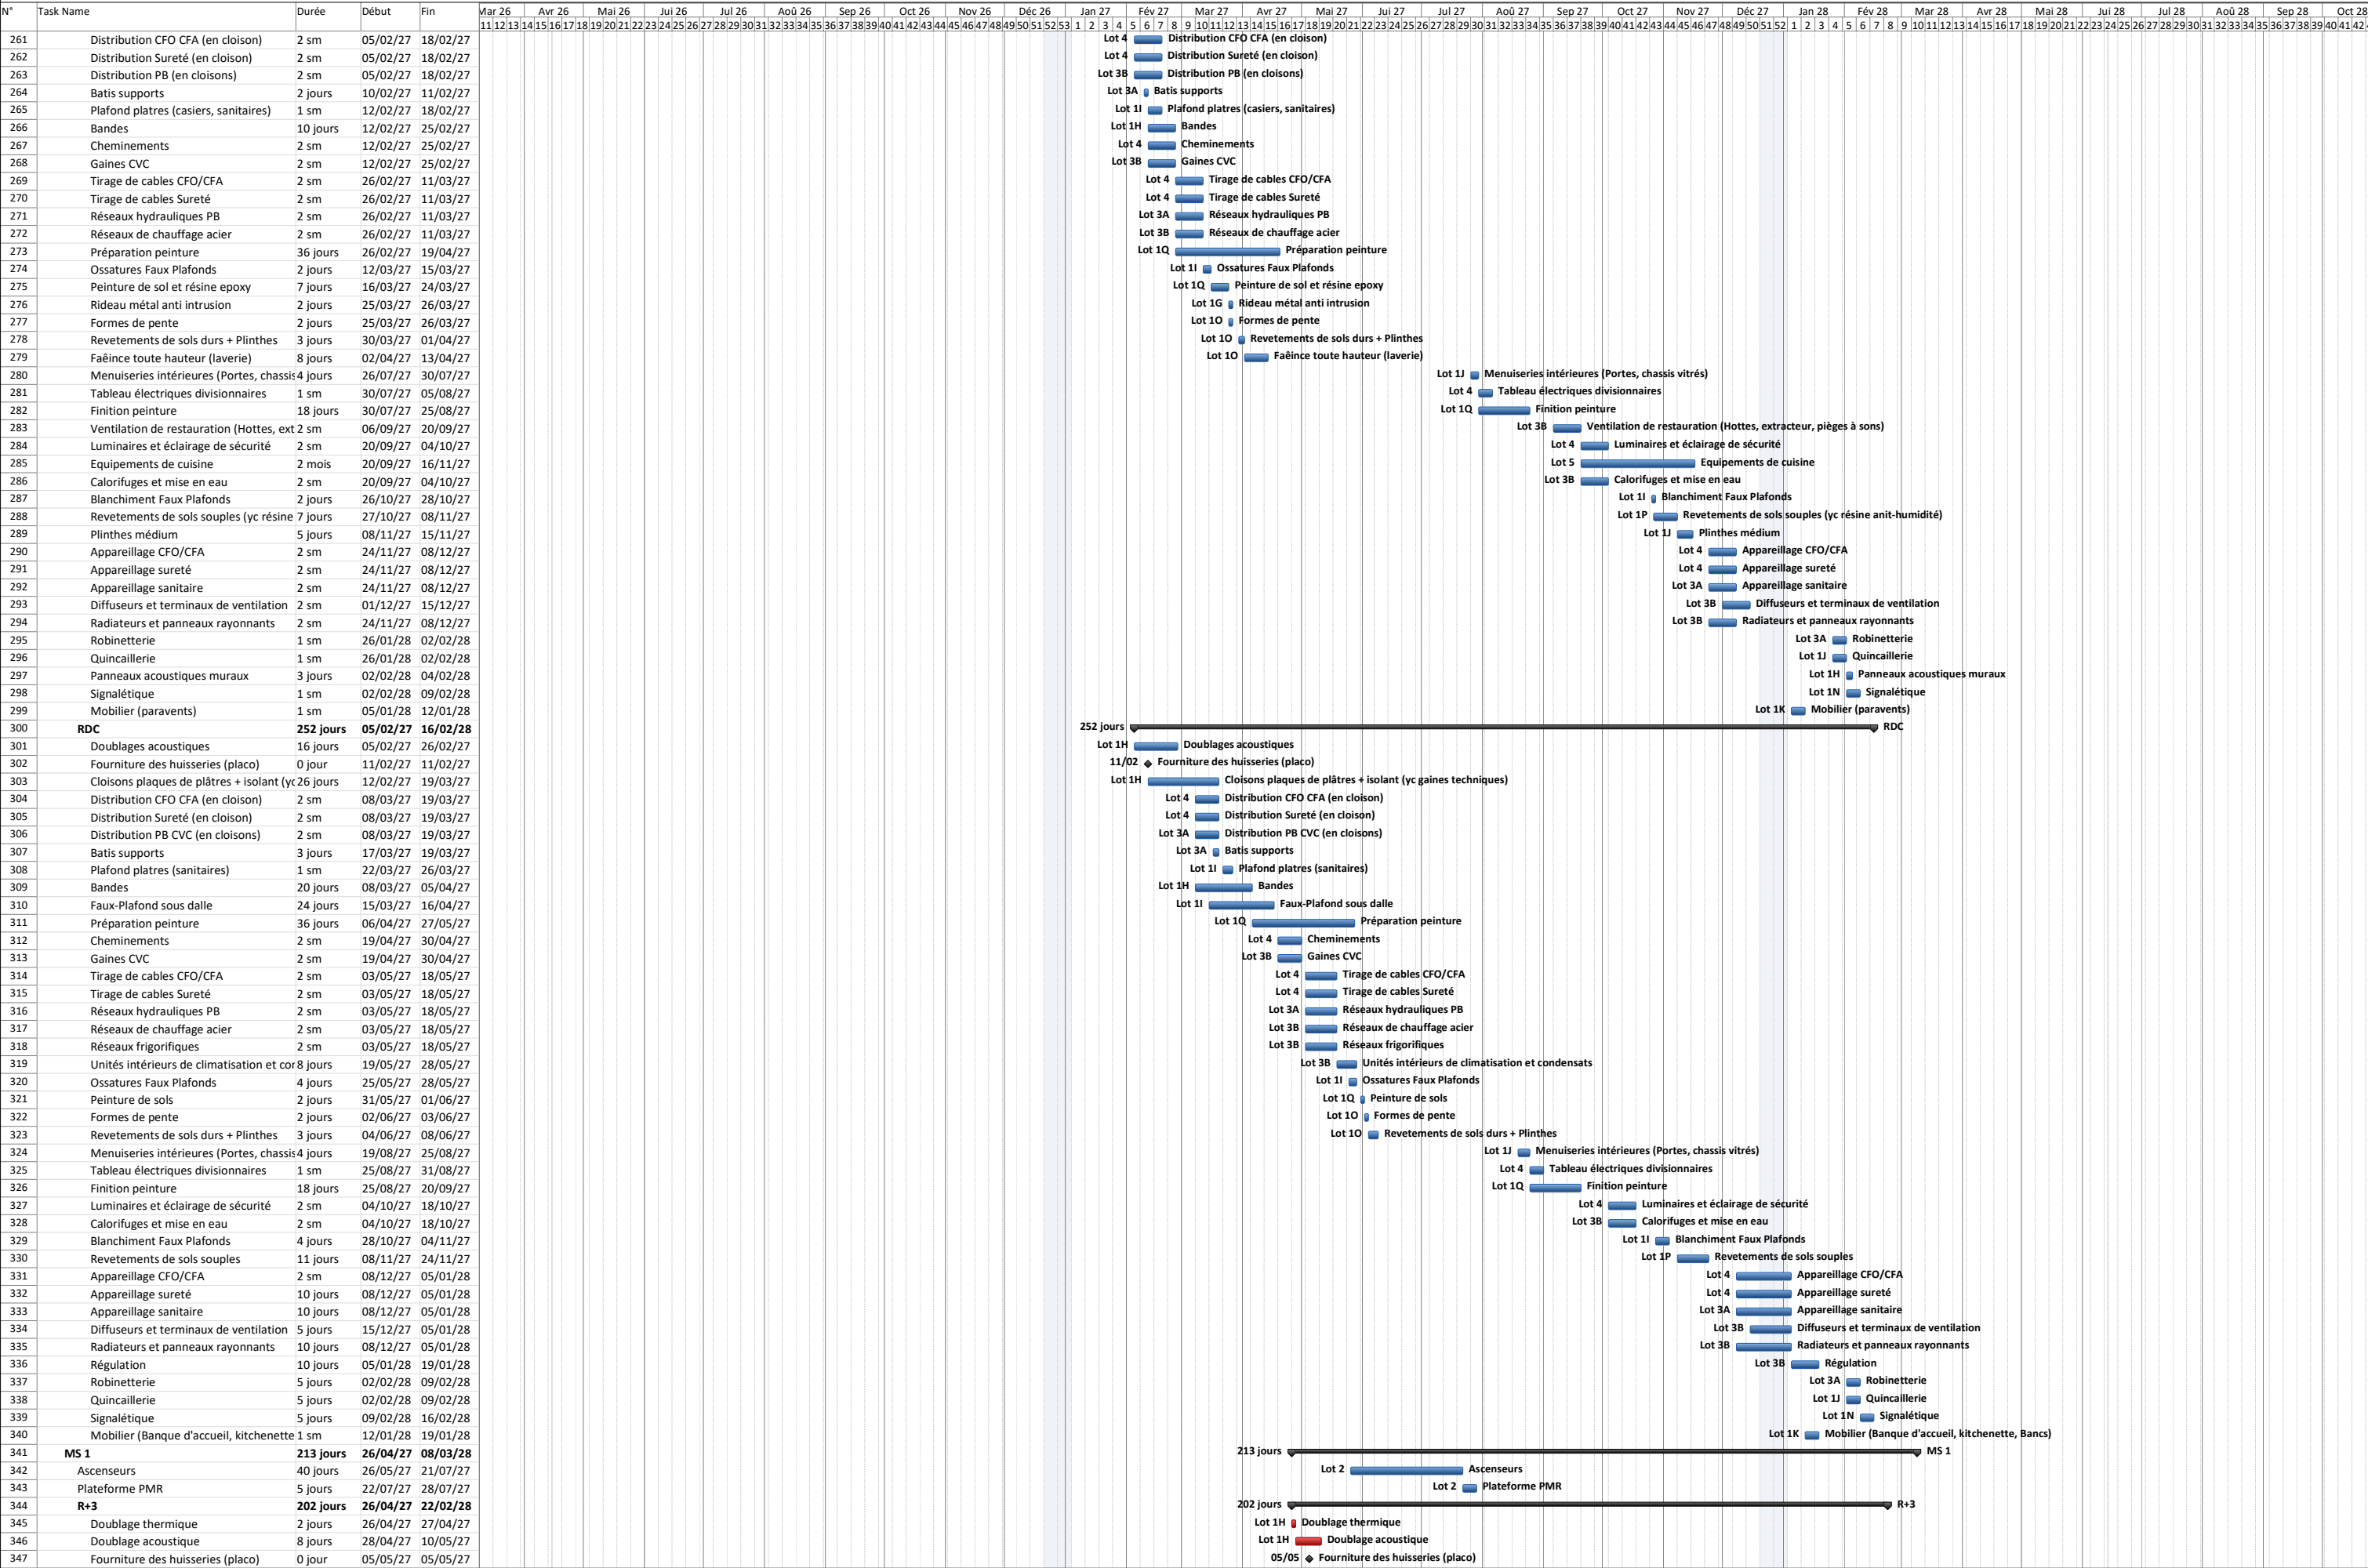

[illegible]

Task Name	Durée	Début	Fin
435 Distribution Sureté (en cloison)	4 sm	28/06/27	26/07/27
436 Distribution PB CVC (en cloisons)	4 sm	28/06/27	26/07/27
437 Batis supports	1 sm	20/07/27	26/07/27
438 Plafond plâtres (sanitaires)	1 sm	27/07/27	02/08/27
439 Projection enduit acoustique (LT Amphi	1 sm	03/08/27	09/08/27
440 Bandes	15 jours	20/07/27	09/08/27
441 Cheminements	4 sm	27/07/27	23/08/27
442 Gaines CVC	4 sm	27/07/27	23/08/27
443 Préparation peinture	40 jours	10/08/27	04/10/27
444 Tirage de cables CFO/CFA	4 sm	24/08/27	20/09/27
445 Tirage de cables Sureté	4 sm	24/08/27	20/09/27
446 Réseaux hydrauliques PB	4 sm	24/08/27	20/09/27
447 Réseaux de chauffage acier	4 sm	24/08/27	20/09/27
448 Ossatures Faux Plafonds	11 jours	14/09/27	28/09/27
449 Pose rails cloisons mobiles	2 jours	27/09/27	28/09/27
450 Peinture de sols	4 jours	29/09/27	04/10/27
451 Formes de pente	2 jours	29/09/27	30/09/27
452 Revêtements de sols durs + plinthes	6 jours	01/10/27	08/10/27
453 Menuiseries intérieures (Portes, chassiss	10 jours	11/10/27	22/10/27
454 Tableau électriques divisionnaires	2 sm	25/10/27	08/11/27
455 Protections murales	7 jours	25/10/27	03/11/27
456 Finition peinture	30 jours	25/10/27	07/12/27
457 Luminaires et éclairage de sécurité	4 sm	09/11/27	07/12/27
458 Calorifuges et mise en eau	4 sm	09/11/27	07/12/27
459 Blanchiment Faux Plafonds	10 jours	01/12/27	14/12/27
460 Revêtements de sols souples + plinthes	20 jours	08/12/27	18/01/28
461 Cloisons mobiles (panneaux)	2 jours	19/01/28	20/01/28
462 Cloison mince stratifiée	1 jour	19/01/28	19/01/28
463 Appareillage CFO/CFA	20 jours	19/01/28	15/02/28
464 Appareillage sureté	20 jours	19/01/28	15/02/28
465 Appareillage sanitaire	20 jours	19/01/28	15/02/28
466 Diffuseurs et terminaux de ventilation	20 jours	19/01/28	15/02/28
467 Radiateurs et panneaux rayonnants	20 jours	19/01/28	15/02/28
468 Robinetterie	10 jours	16/02/28	29/02/28
469 Quincaillerie	10 jours	16/02/28	29/02/28
470 Signalétique	10 jours	16/02/28	29/02/28
471 Mobilier amphis	2 sm	16/02/28	29/02/28
472 Mobilier (kitchenette, encadrements bc	1 sm	23/02/28	29/02/28
473 RDC	171 jours	25/06/27	08/03/28
474 Doublage thermique	3 jours	25/06/27	29/06/27
475 Doublage acoustique	8 jours	30/06/27	09/07/27
476 Fourniture des huisseries (placo)	0 jour	26/07/27	26/07/27
477 Cloisons plaques de plâtres + isolant (yc	22 jours	12/07/27	11/08/27
478 Distribution CFO CFA (en cloison)	4 sm	15/07/27	11/08/27
479 Distribution Sureté (en cloison)	4 sm	15/07/27	11/08/27
480 Distribution PB CVC (en cloisons)	4 sm	15/07/27	11/08/27
481 Batis supports	1 sm	05/08/27	11/08/27
482 Plafond plâtres (sanitaires, gymnase)	1 sm	12/08/27	18/08/27
483 Flocage thermique (sous face RDC Haut	10 jours	19/08/27	01/09/27
484 Bandes	15 jours	05/08/27	25/08/27
485 Cheminements	4 sm	12/08/27	08/09/27
486 Gaines CVC	4 sm	12/08/27	08/09/27
487 Préparation peinture	45 jours	26/08/27	27/10/27
488 Tirage de cables CFO/CFA	4 sm	09/09/27	06/10/27
489 Tirage de cables Sureté	4 sm	09/09/27	06/10/27
490 Réseaux hydrauliques PB	4 sm	09/09/27	06/10/27
491 Réseaux de chauffage acier	4 sm	09/09/27	06/10/27
492 Ossatures Faux Plafonds	8 jours	30/09/27	11/10/27
493 Peinture de sols	3 jours	12/10/27	14/10/27
494 Formes de pente	3 jours	15/10/27	19/10/27
495 Revêtements de sols durs + plinthes	15 jours	12/10/27	02/11/27
496 Faïence toute hauteur (local déchets)	3 jours	03/11/27	05/11/27
497 Menuiseries intérieures (Portes, chassiss	10 jours	03/11/27	17/11/27
498 Tableau électriques divisionnaires	2 sm	18/11/27	01/12/27
499 Protections murales	7 jours	18/11/27	26/11/27
500 Finition peinture	30 jours	18/11/27	12/01/28
501 Luminaires et éclairage de sécurité	20 jours	02/12/27	12/01/28
502 Calorifuges et mise en eau	4 sm	02/12/27	12/01/28
503 Blanchiment Faux Plafonds	7 jours	06/01/28	14/01/28
504 Revêtements de sols souples + plinthes	10 jours	13/01/28	26/01/28
505 Revêtements sols sport	5 jours	27/01/28	02/02/28
506 Appareillage CFO/CFA	20 jours	27/01/28	23/02/28
507 Appareillage sureté	20 jours	27/01/28	23/02/28
508 Appareillage sanitaire	20 jours	27/01/28	23/02/28
509 Diffuseurs et terminaux de ventilation	20 jours	27/01/28	23/02/28
510 Radiateurs et panneaux rayonnants	20 jours	27/01/28	23/02/28
511 Robinetterie	10 jours	24/02/28	08/03/28
512 Quincaillerie	10 jours	24/02/28	08/03/28
513 Signalétique	10 jours	24/02/28	08/03/28</

