

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011	du 26 juin 2013
Code de la Santé Publique :	n°2012-639 du 4 mai 2012	du 25 juillet 2016
Articles L.1334-12-1 à L.1334-17	n°2013-594 du 5 juillet 2013	du 16 juillet 2019
Articles R.1334-19, R.1334-22	n°2015-789 du 29 juin 2015	
Articles R.1334-29-6	n°2017-899 du 9 mai 2017	
Norme :	n°2019-251 du 27 mars 2019	
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : lieu dit "LA PETITE MASURE"
53500 ERNÉE

Complément d'adresse

Bât : Entrée :
Esc. :

Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Habitation

Type de bien : Maison

Catégorie du bâtiment :

Date du permis de construire :



N° de dossier

4756366

Date de la commande

06/03/2024

Date du repérage

07/03/2024

Accompagnateur

Aucun

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Auteur du repérage : LEMAILLE Xavier

LEMAILLE Xavier

Compétence
Certifié par N° CPDI3124

Depuis le 30/11/2023

Adresse : 6b, rue Volta - BP 708
44470 CARQUEFOU

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241

Date de validité : 31/12/2024

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11

Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

REVISION

Version 01

DATE

10/04/2024

OBJET

Création du document

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE	3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS.....	6
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE	6
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE	6
2. PREAMBULE	6
3. BUT DE LA MISSION	6
4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	8
4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	8
4.2. PHASE DE REPERAGE	8
4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON	9
5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES	9
6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE.....	9
6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	10
6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	10
6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	11
1.	16
7. OBSERVATIONS & RESERVES.....	17
8. ANNEXES	17
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	18
PLANCHE(S) DE REPERAGE	20
PLANCHE PHOTO(S)	35
PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE	93
DOCUMENT(S) REMI(S)	102
ATTESTATION D'ASSURANCE	103
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	104

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

**DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE
REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE**

Local	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
Entrée	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002)	15 ml
Chambre n°1	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	20 ml
Cuisine	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P009)	20 ml
		Mur	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P012)	10 m²
Chambre n°2	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	20 ml
Salle de Bains	RDC	Mur	Colle Faïence Murale Ancienne	Résultat d'analyse (P015)	20 m²
Sanitaire	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017)	10 ml
WC n°1	RDC	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	5 ml
Buanderie	RDC	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	10 ml
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P023)	1 u
Salon/Salle à Manger	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	35 ml
Chaufferie	1er SS	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	
Palier	1er	Mur n°2	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026)	20 ml
Grenier	1er	Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030)	20 m²
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031)	20 m²
Chambre n°3	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Chambre n°4	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Chambre n°5	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Salle d'eau	1er	Mur n°1	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)	4 m²
		Mur n°2	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°1	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)	4 ml
WC n°2	1er	Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-	20 m²

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
				ZPSO)	
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P033)	4 ml
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P038)	4 m²
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P037)	1 u
Cabanon de Jardin n°1	Ext	Toiture	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P046)	5 m²
Cabanon de Jardin n°2	Ext	Toiture	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P047)	15 m²


Edité
le :
Fait à :

10/04/2024

CARQUEFOU



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

QUALICONSULT IMMOBILIER

6 Bis Rue Alessandro Volta, Bâtiment F9

44481 CARQUEFOU CEDEX

Tél. 02 51 13 12 31 - Fax 02 51 13 99 44

nantes.facilities@qualiconsult.fr

SIRET 490 676 293 00569



1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

	Nom : CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : 35000 RENNES

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

	Nom : CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : 35000 RENNES

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis :**

**lieu dit "LA PETITE MASURE"
53500 ERNÉE**

Date de délivrance du permis de construire :

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Habitation**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIEN REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : **Néant**

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction au regard de la liste C, non exhaustive, de l'annexe 13-09 du code de la santé publique.

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par les arrêtés du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Périmètre du repérage de la démolition : Démolition totale.

Programme de repérage :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22 (non exhaustive)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc...)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projeté ainsi que le périmètre de l'opération.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvement à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisé dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :

- Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

!/!\ Avertissement :

Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupé et meublé, ces revêtements étant encore en place

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sur lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.

En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
Entrée	RDC	OUI	
Chambre n°1	RDC	OUI	
Cuisine	RDC	OUI	
Chambre n°2	RDC	OUI	
Salle de Bains	RDC	OUI	
Sanitaire	RDC	OUI	
WC n°1	RDC	OUI	
Buanderie	RDC	OUI	
Salon/Salle à Manger	RDC	OUI	
Garage	1er SS	OUI	
Pièce	1er SS	OUI	
Bucher	1er SS	OUI	
Cave	1er SS	OUI	
Atelier	1er SS	OUI	
Cuve Fioul	1er SS	OUI	
Chaufferie	1er SS	OUI	
Palier	1er	OUI	
Grenier	1er	OUI	
Chambre n°3	1er	OUI	
Chambre n°4	1er	OUI	
Chambre n°5	1er	OUI	
Salle d'eau	1er	OUI	
WC n°2	1er	OUI	
Façades	Façades	OUI	
Toiture	Couverture	OUI	
Cabanon de Jardin n°1	Ext	OUI	
Cabanon de Jardin n°2	Ext	OUI	
Terrasse	Ext	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
WC n°1	RDC	Conduit de fluide - Eaux Usées	PVC

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
Entrée	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002)	15 ml
Chambre n°1	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	20 ml
Cuisine	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P009)	20 ml
		Mur	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P012)	10 m²
Chambre n°2	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	20 ml
Salle de Bains	RDC	Mur	Colle Faïence Murale Ancienne	Résultat d'analyse (P015)	20 m²
Sanitaire	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017)	10 ml
WC n°1	RDC	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	5 ml
Buanderie	RDC	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	10 ml
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P023)	1 u
Salon/Salle à Manger	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)	35 ml
Chaudière	1er SS	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	
Palier	1er	Mur n°2	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026)	20 ml
Grenier	1er	Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030)	20 m²
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031)	20 m²
Chambre n°3	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Chambre n°4	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Chambre n°5	1er	Mur n°1	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)	15 ml
		Mur n°3	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°3	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
Salle d'eau	1er	Mur n°1	Pare Vapeur sur Isolant	Résultat d'analyse (P030-	20 m²

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
			Jaune	ZPSO)	
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)	4 m²
		Mur n°2	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur n°1	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur n°2	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)	4 ml
WC n°2	1er	Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P030-ZPSO)	20 m²
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	20 m²
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P033)	4 ml
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P038)	4 m²
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P037)	1 u
Cabanon de Jardin n°1	Ext	Toiture	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P046)	5 m²
Cabanon de Jardin n°2	Ext	Toiture	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P047)	15 m²

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
Entrée	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P004)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P006)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P003)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P005)
Chambre n°1	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Revêtement en Lès Souple Marron	Résultat d'analyse (P007)
Cuisine	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P011)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P008)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P010)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P013)
Chambre n°2	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Salle de Bains	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Colle Faïence Murale Récente	Résultat d'analyse (P016)
Sanitaire	RDC	Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P019)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P022)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P018)
		Mur	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P020)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P021)
WC n°1	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Mur n°2	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°3	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P018-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
		Mur n°1	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°1	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
Buanderie	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Mur n°2	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°4	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P018-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
		Mur n°1	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°3	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P024)
Salon/Salle à Manger	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Garage	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
		Plafond	Polystyrène - Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Pièce	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041)
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P040)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042)
Bucher	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Polystyrène - Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Terre battue - Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cave	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Polystyrène - Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Terre battue - Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Atelier	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
Cuve Fioul	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
Chaufferie	1er SS	Conduit de fluide - Calorifugeage	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Plafond	Ourdis Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide - Calorifugeage	Bande Plâtreuse Blanche	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
		Ensemble de la Chaudière		Document consulté
Palier	1er	Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P028)
		Plafond	Plâtre	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025)
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P027)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P029)
Grenier	1er	Plafond	Ardoises Naturelles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Chambre n°3	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur n°2	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Plafond	Plâtre	
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Mur n°2	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Mur n°2	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Chambre n°4	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur n°2	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Mur n°2	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
Chambre n°5	1er	Mur n°2	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur n°2	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	
		Mur n°1	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Mur n°2	Polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Salle d'eau	1er	Mur n°1	Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Mur n°2	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°2	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
		Mur n°2	Plâtre	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
WC n°2	1er	Mur n°2	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur n°2	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P035)
		Mur	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P039)
		Plafond	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P032)
Façades	Façades	Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P034)
		Mur	Colle Faïence Murale	Résultat d'analyse (P036)
		Façade	Enduit Façade	Résultat d'analyse (P044)
Toiture	Couverture	Conduit de fluide - Descente Eau Pluviale	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Façade	Enduit Façade	Résultat d'analyse (P043)
		Toiture	Ardoises Naturelles	Matériau ou produit qui par

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
				nature ne contient pas d'amiante
Cabanon de Jardin n°1	Ext	Sol	Terre Battue	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Plaque de Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cabanon de Jardin n°2	Ext	Sol	Terre Battue	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Plaque de Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Terrasse	Ext	Sol	Colle Carrelage	Résultat d'analyse (P045)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Néant

8. ANNEXES

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P002	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P003	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P004	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P005	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P006	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P007	07/03/2024	Revêtement en Lès Souple Marron	Négatif
P008	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P009	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P010	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P011	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P012	07/03/2024	Colle Faïence Murale	Positif
P013	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P014	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P015	07/03/2024	Colle Faïence Murale Ancienne	Positif
P016	07/03/2024	Colle Faïence Murale Récente	Négatif
P017	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P018	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P019	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P020	07/03/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P021	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P022	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P023	07/03/2024	Amiante ciment	Positif
P024	07/03/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P025	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P026	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P027	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P028	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P029	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P030	07/03/2024	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Positif
P031	07/03/2024	Isolant Jaune	Positif
P032	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P033	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P034	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P035	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P036	07/03/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P037	07/03/2024	Amiante ciment	Positif
P038	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Positif
P039	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P040	07/03/2024	Dalle Béton	Négatif
P041	07/03/2024	Bande Plâtreuse Blanche	Négatif
P042	07/03/2024	Isolant Jaune	Négatif
P043	07/03/2024	Enduit Façade	Négatif
P044	07/03/2024	Enduit Façade	Négatif



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

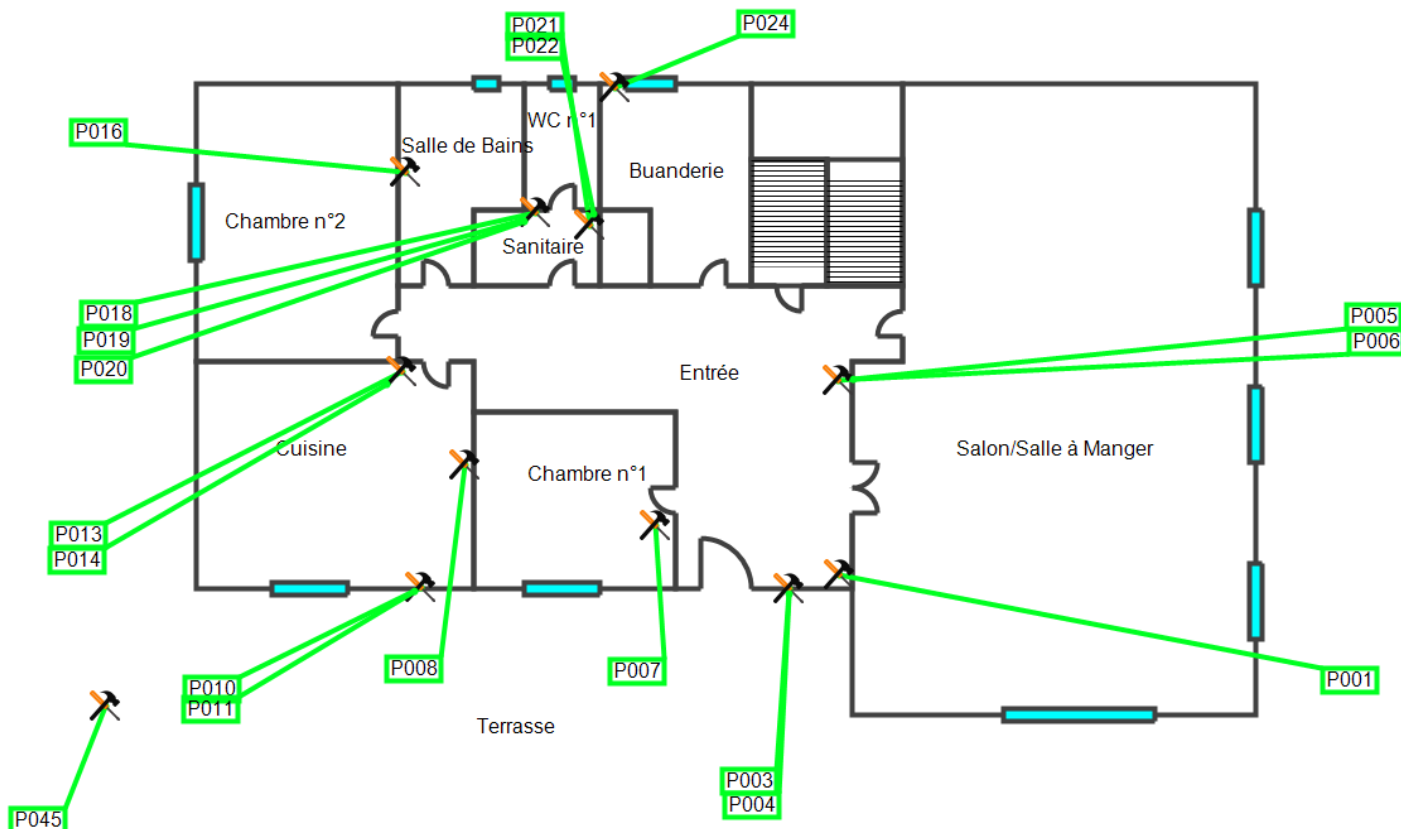
Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P045	07/03/2024	Colle Carrelage	Négatif
P046	07/03/2024	Plaques Ondulées Fibro	Positif
P047	07/03/2024	Plaques Ondulées Fibro	Positif



PLANCHE(S) DE REPERAGE




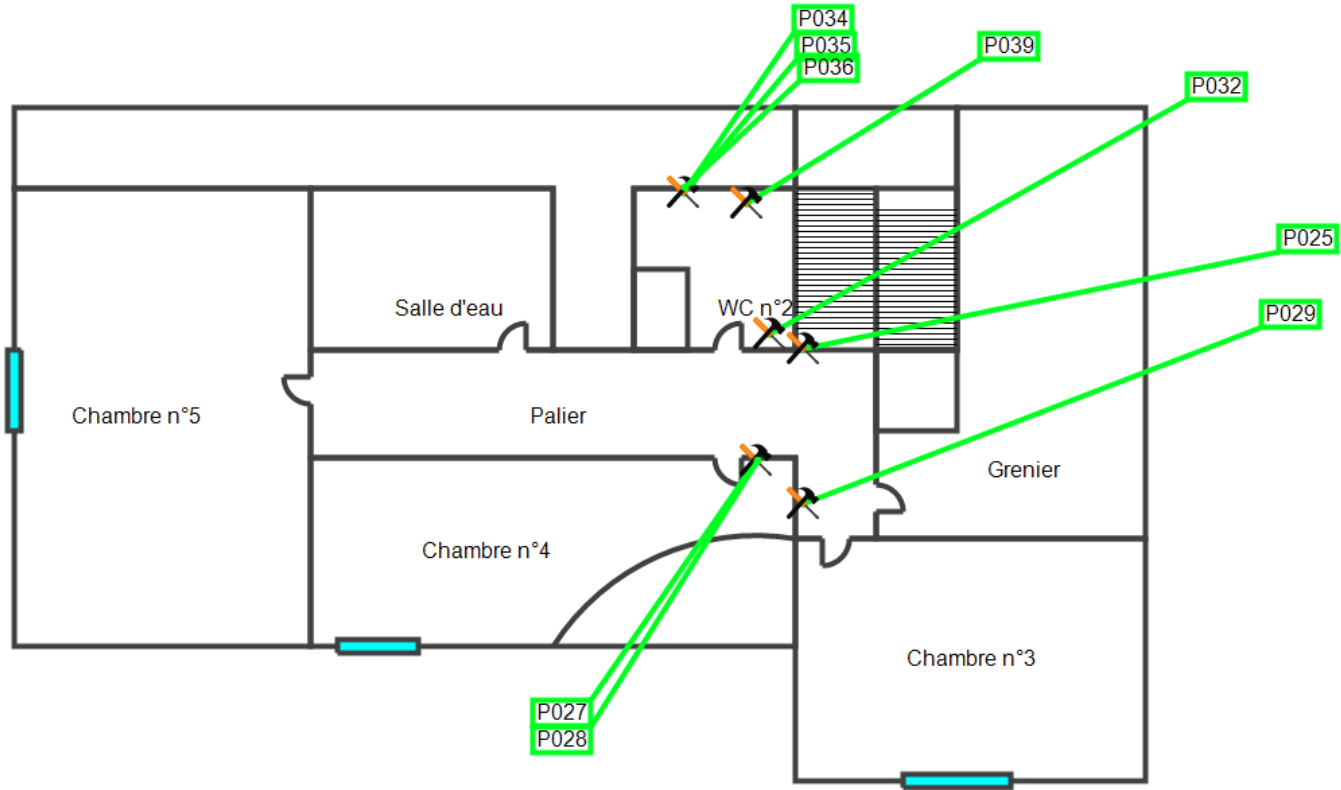
 Qualiconsult®	Planche de repérage			<div><div><u>Légende :</u> Prélèvement</div></div>	
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE		Titre :		Rez de Chaussée
N° dossier :	4756366		Adresse :		lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE
N° planche :	1/8	Version : 0			
Type :	Croquis				
Date :	10/04/2024				
Intervenant :	LEMAILLE Xavier		Localisation / Bâtiment :		
			Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :		



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


Qualiconsult [®]		Planche de repérage		
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE	Titre :	1er Etage	
N° dossier :	4756366	Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE	
N° planche :	2/8			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	10/04/2024	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

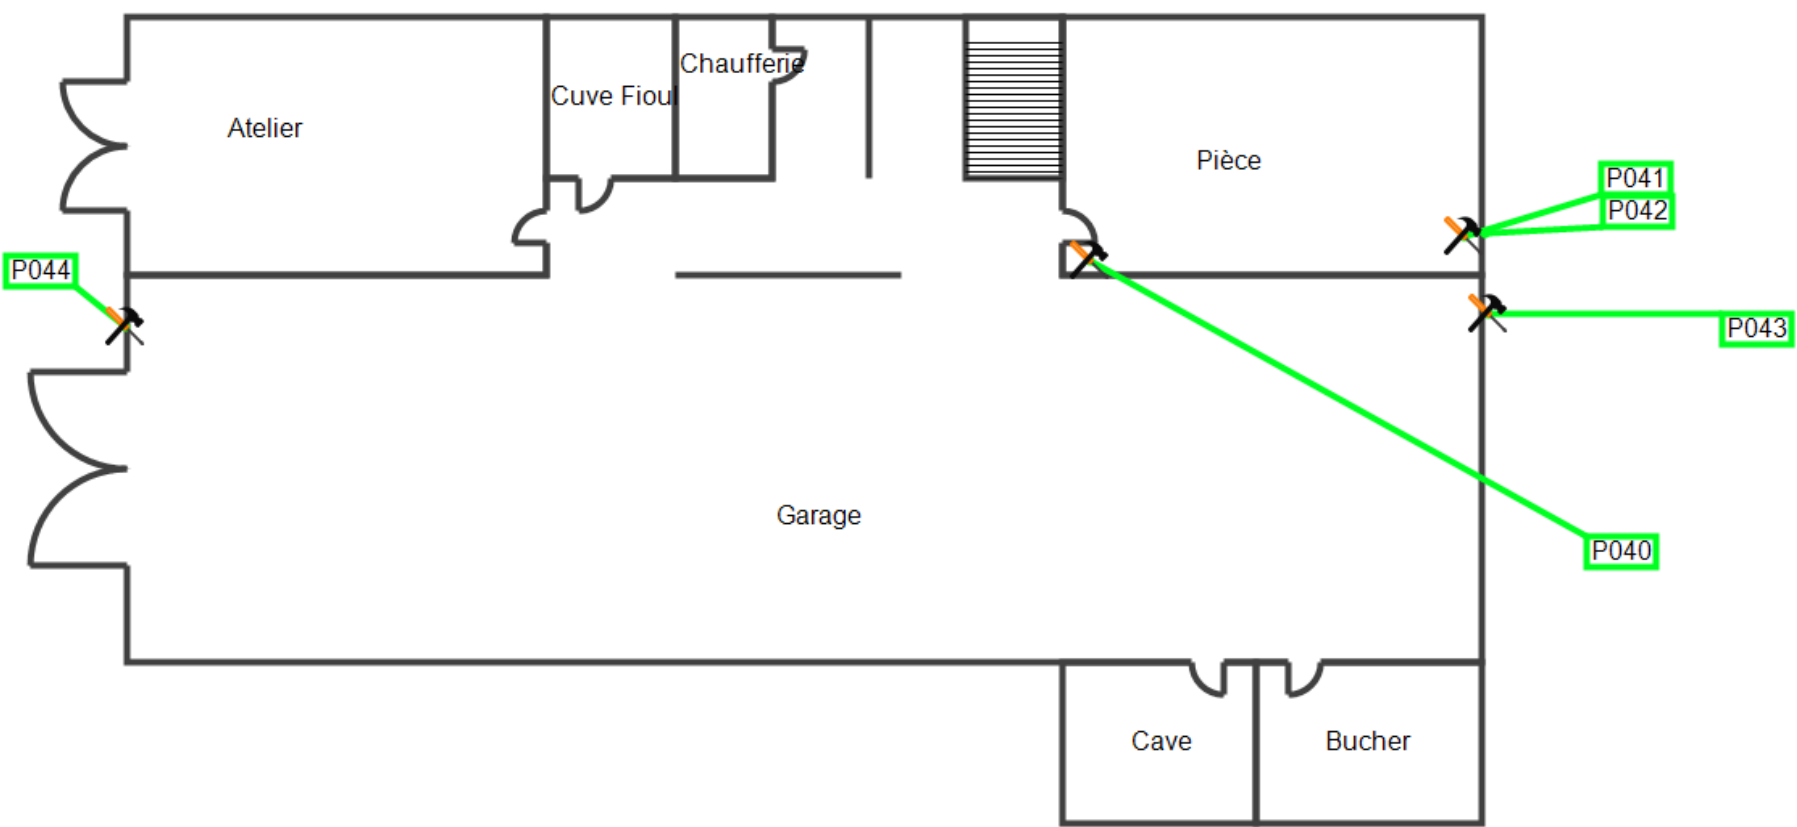
Légende :
 **Prélèvement**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult	Planche de repérage			 Légende : Prélèvement	
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE	Titre :	Sous Sol		
N° dossier :	4756366	Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE		
N° planche :	3/8				Version : 0
Type :	Croquis				
Date :	10/04/2024	Localisation / Bâtiment :			
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :			



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	Planche de repérage			
	Client : CENTRE DE GESTION FINANCIERE		Titre : Dépendances - Localisation des	
	N° dossier : 4756366		Adresse : lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE	
	N° planche : 4/8			
	Version : 0			
	Type : Croquis		Localisation / Bâtiment :	
	Date : 10/04/2024		Niveau :	
	Intervenant : LEMAILLE Xavier		Commentaire :	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				

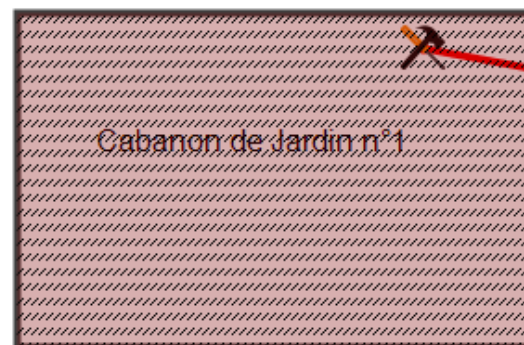
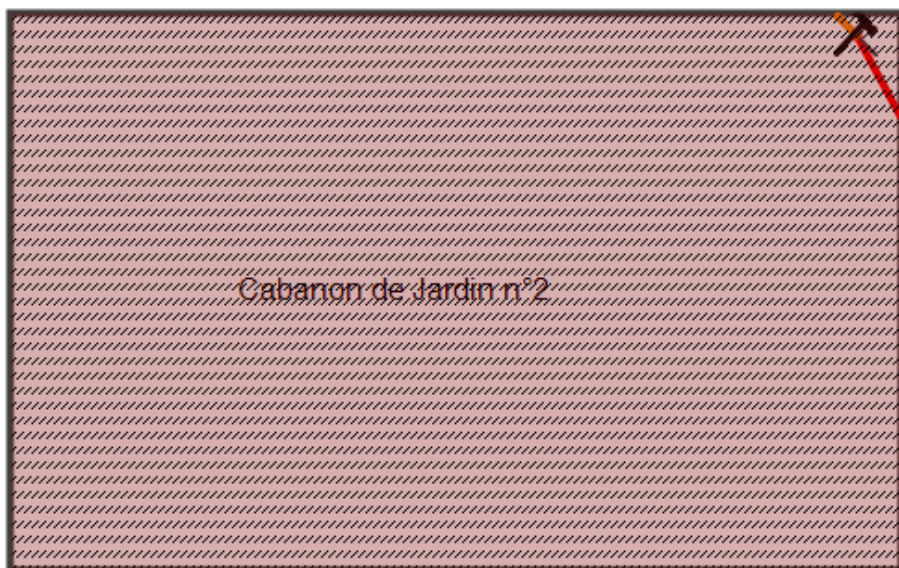
Légende :



Plaques ondulées / fibre-ciment



Prélèvement

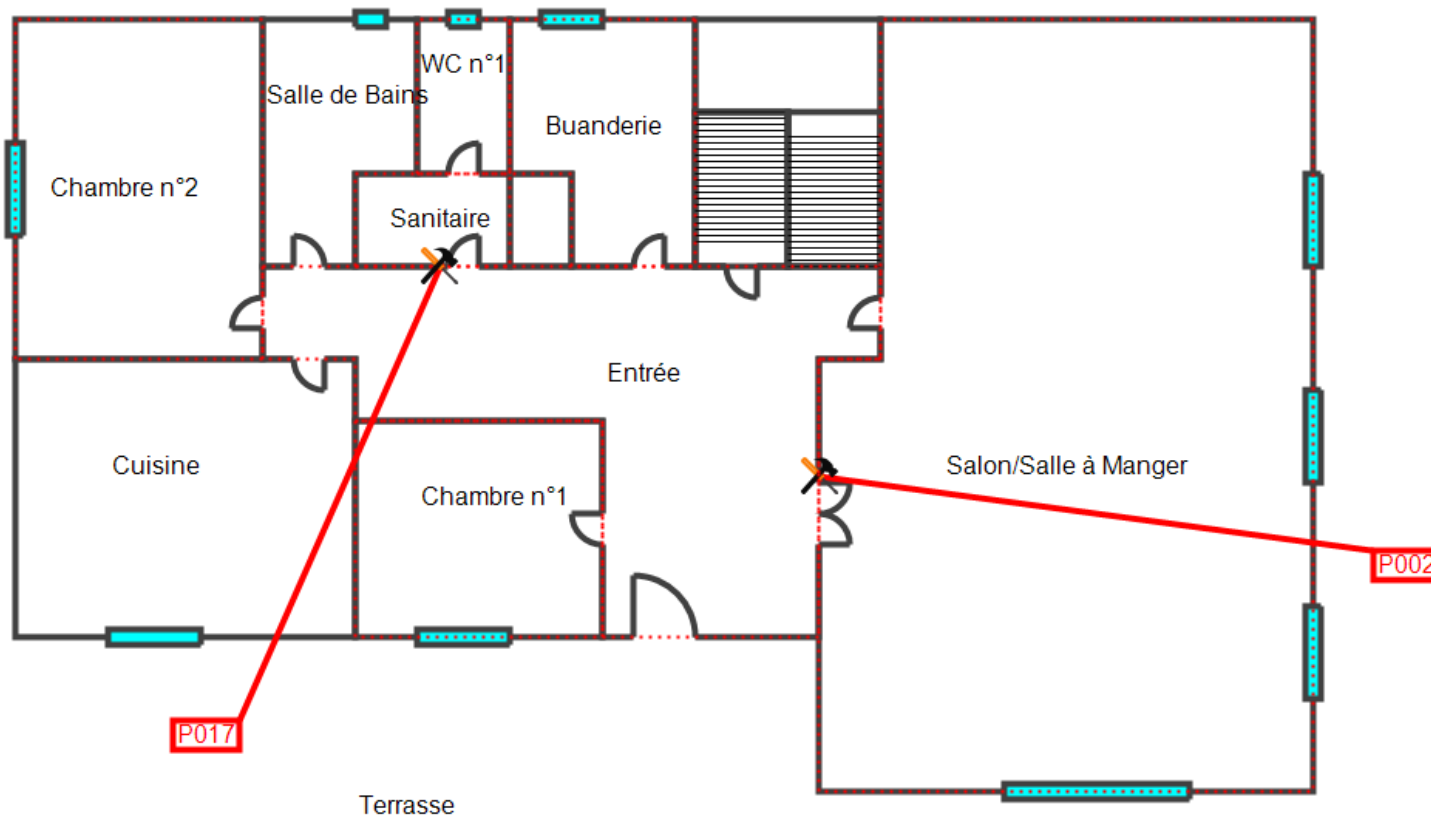



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult	Planche de repérage		
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE	Titre :	Rez de Chaussée - Localisation
N° dossier :	4756366	Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE
N° planche :	5/8		
Type :	Croquis		
Date :	10/04/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :



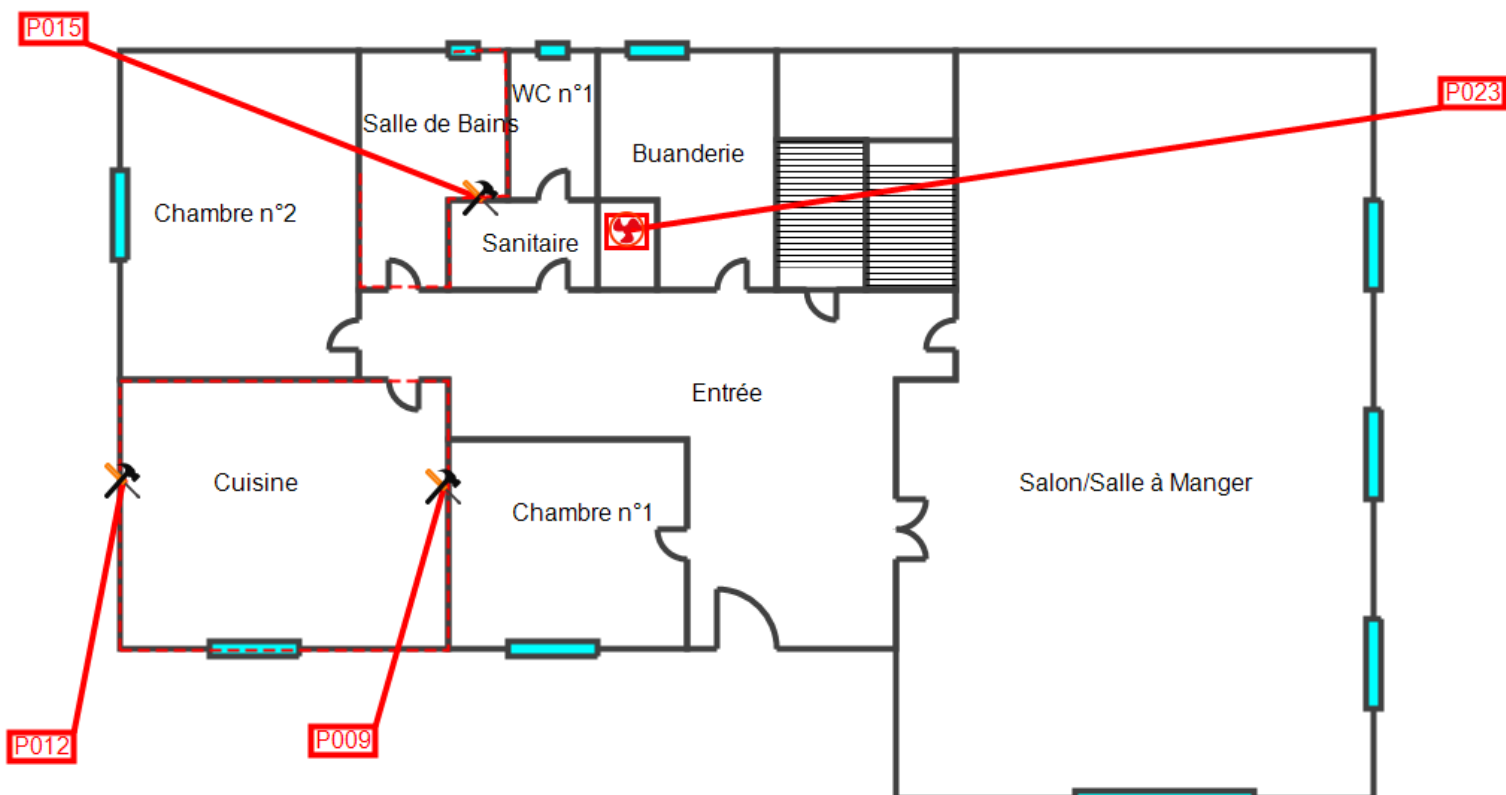
CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult		Planche de repérage		
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE	Titre :	Rez de Chaussée - Localisation	
N° dossier :	4756366	Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE	
N° planche :	6/8			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	10/04/2024	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		


Légende :


- Colle de faïence murale + Colle Plinthe
- Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
- Prélèvement
- Conduit de ventilation




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


 Qualiconsult®	Planche de repérage				<u>Légende :</u>	
Client :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE		Titre :	1er Etage - Localisation des MPCA		
N° dossier :	4756366		Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE		
N° planche :	7/8	Version : 0				
Type :	Croquis					
Date :	10/04/2024		Localisation / Bâtiment :			
Intervenant :	LEMAILLE Xavier		Niveau :			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :			




Colle de plinthe




Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



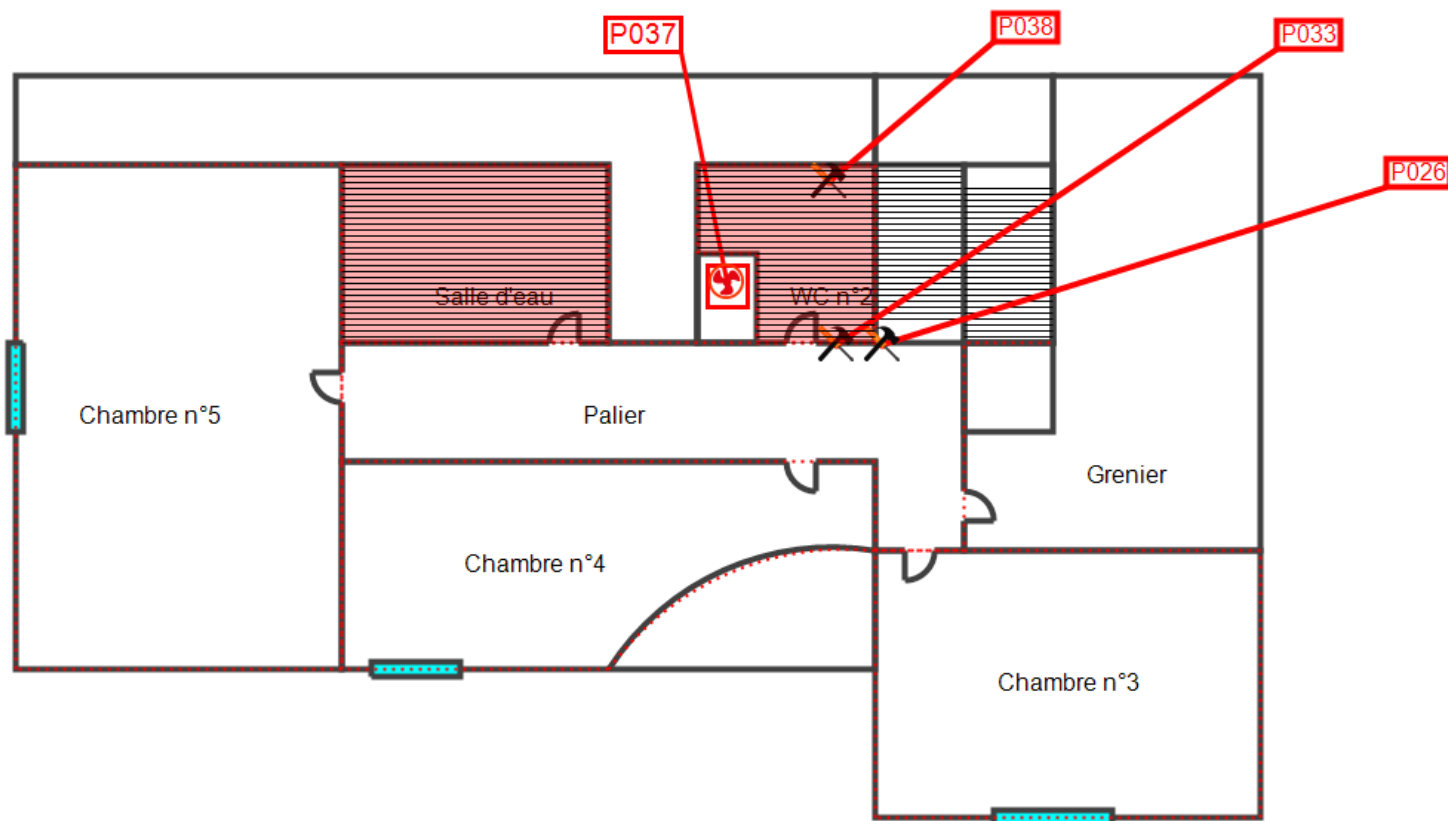
Peinture - Plafond



Prélèvement



Conduit de ventilation





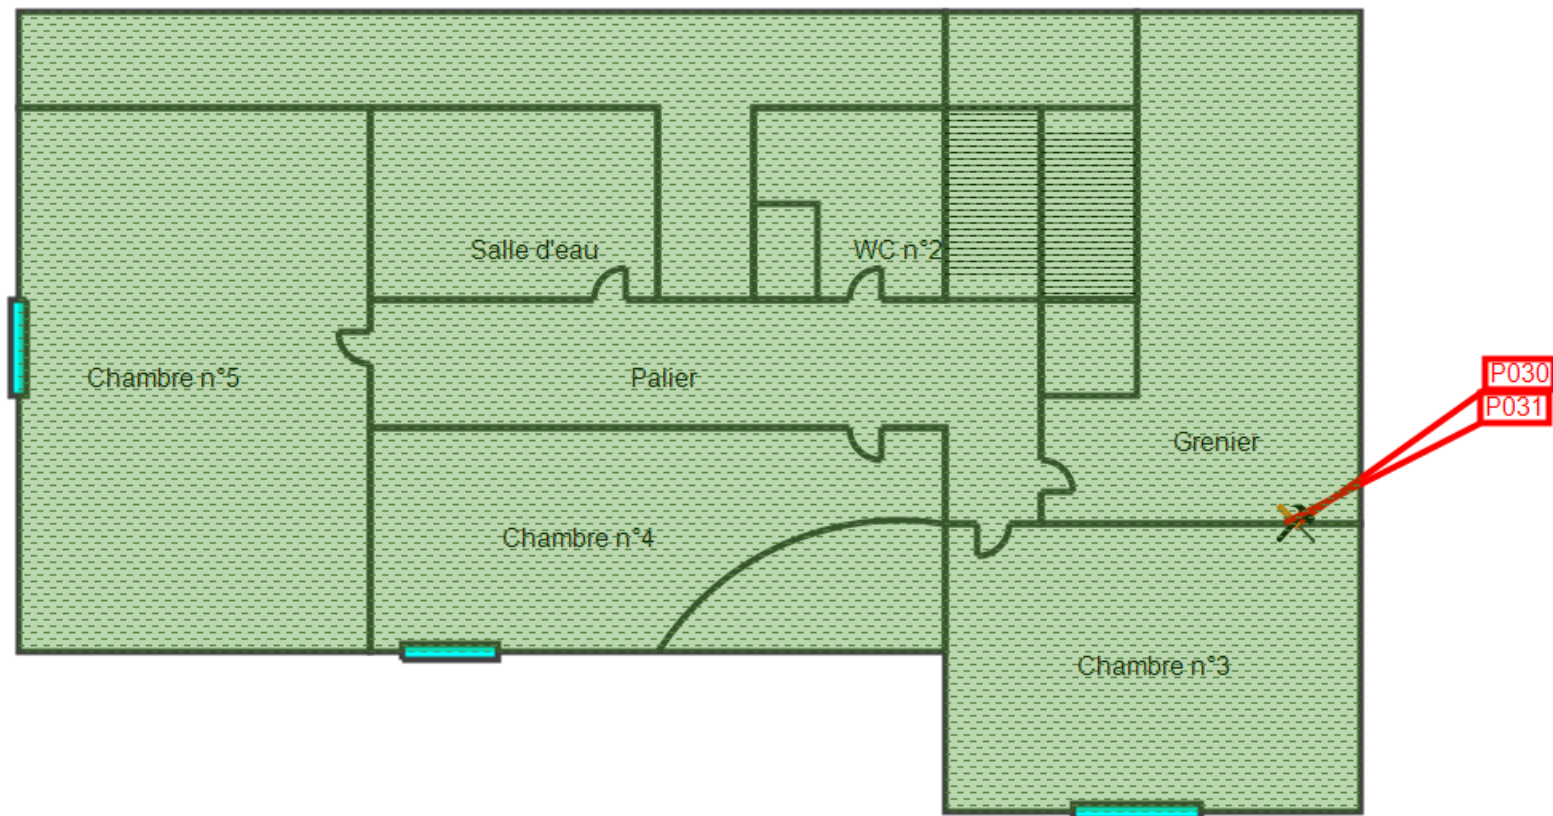
CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult	Planche de repérage		
Cliant :	CENTRE DE GESTION FINANCIERE	Titre :	1er Etage - Localisation des MPCA
N° dossier :	4756366	Adresse :	lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE
N° planche :	8/8		
Type :	Croquis		
Date :	10/04/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

 Pare Vapeur + Isolant
 Prélèvement



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PLANCHE PHOTO(S)


ELEMENT : Mur
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Ext - Cabanon de Jardin n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de Béton		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
PVC		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Conduit de fluide - A Eaux Usées		
Résultat amiante		
Néant		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing Brut		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Polystyrène		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Mur
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises Naturelles		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing Brut		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Mur
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Pièce
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing Brut		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Pièce
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ourdis Brut		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Cave
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Polystyrène - Calorifugeage		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Conduit de ventilation
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Chauffage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Conduit de ventilation - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Mur
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing Brut		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Polystyrène		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble de la Chaudière
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Ensemble de la Chaudière - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Commentaires		
Chaudière Pergé Optitherm installé en 2000		

ELEMENT : Conduit de fluide
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Façades - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Conduit de fluide - A Descente Eau Pluviale		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur
Emplacement

Nom du client

 CENTRE DE GESTION FINANCIERE
BRETAGNE

Numéro de dossier

4756366

Pièce ou local

Ext - Cabanon de Jardin n°1

Matériau

Plaque de Béton

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Plafond
Emplacement

Nom du client

 CENTRE DE GESTION FINANCIERE
BRETAGNE

Numéro de dossier

4756366

Pièce ou local

RDC - Entrée

Matériau

Brique

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur


LEMAILLE Xavier

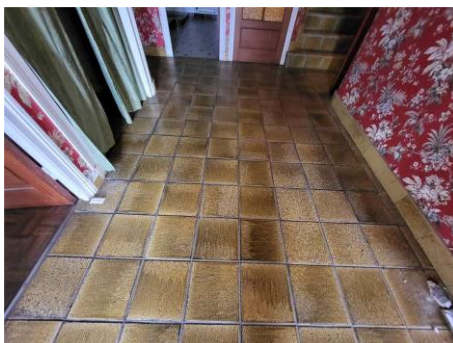
Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

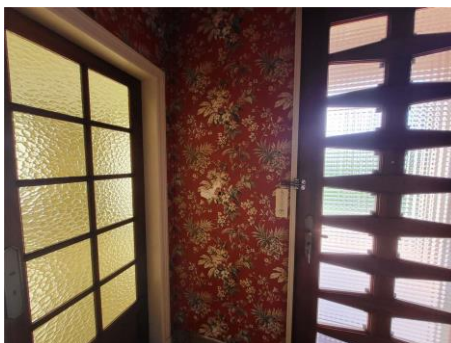
Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

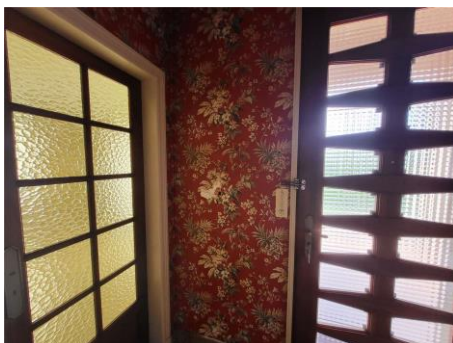
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Revêtement	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) + (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Revêtement	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement en Lès Souple Marron	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

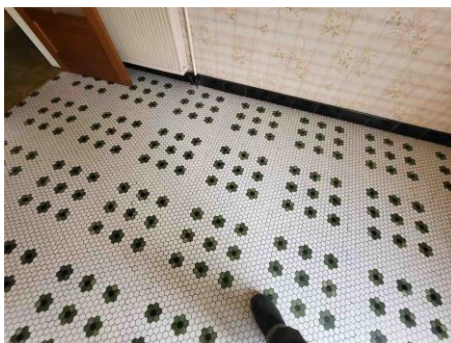
Objet	Support	Taille
Revêtement en Lès Souple Marron		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Revêtement	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

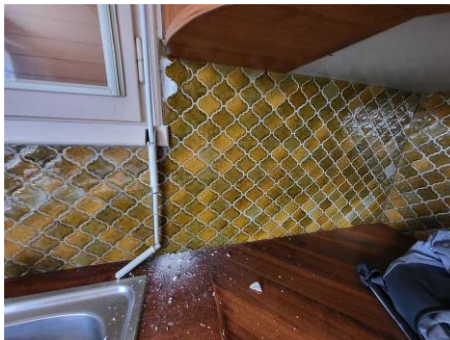
Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

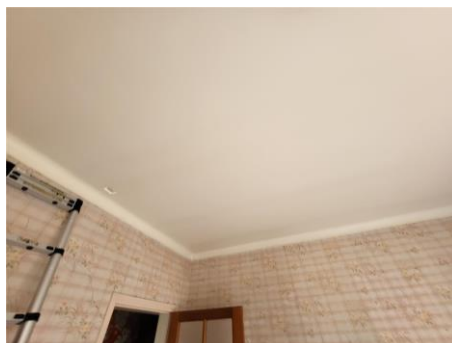
Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

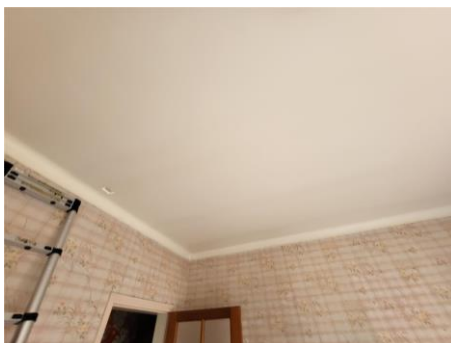
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Peinture	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale Ancienne	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale Ancienne		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale Rescente	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale Rescente		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

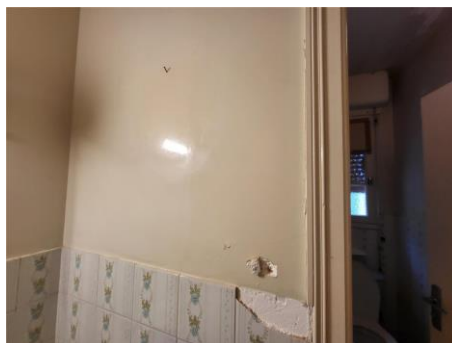
Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

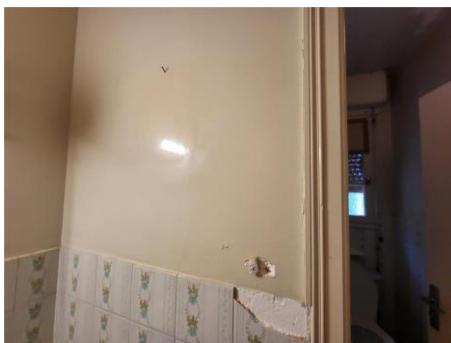
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Peinture	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

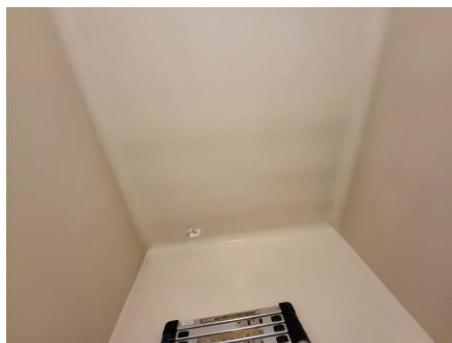
Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

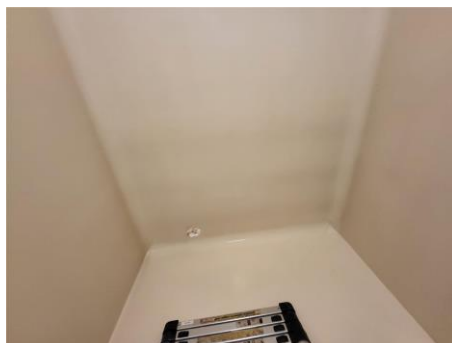
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Peinture	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Buanderie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Amiante ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	RDC - Buanderie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur n°3 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

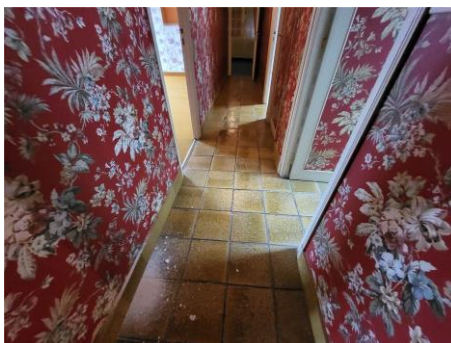
Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Revêtement	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

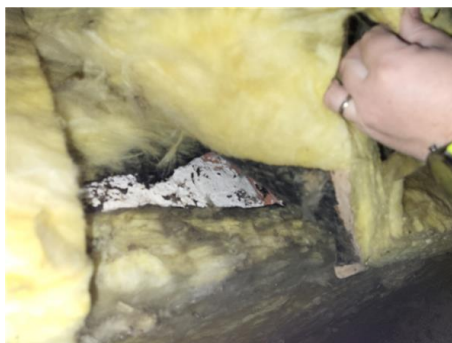
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Peinture	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare Vapeur sur Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

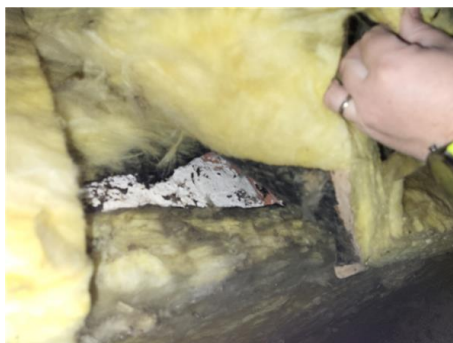
Objet	Support	Taille
Pare Vapeur sur Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

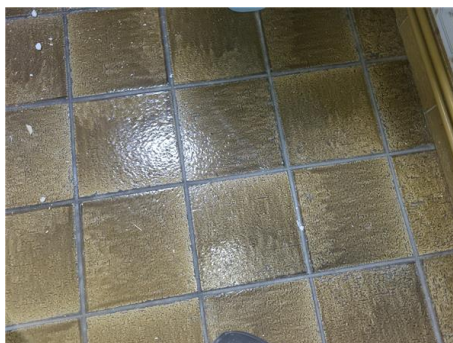
Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple (poudreux) (bitumineux) (noir)	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P034
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Revêtement	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Amiante ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Peinture	0
C2	Plâtre	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-019015-01	
C2	AR-24-NS-019015-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Pièce
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle Béton	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Dalle Béton		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type béton (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Pièce
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande Plâtreuse Blanche	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Conduit de fluide - A Calorifugeage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Bande Plâtreuse Blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	1er SS - Pièce
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Conduit de fluide - A Calorifugeage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Façades - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Façade	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Façade - Façade(s)

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Façade		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Façades - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Façade	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Façade - Façade(s)

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Façade		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Ext - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Carrelage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Ext - Cabanon de Jardin n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques Ondulées Fibro	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plaques Ondulées Fibro		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P047
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CENTRE DE GESTION FINANCIERE BRETAGNE	4756366	Ext - Cabanon de Jardin n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques Ondulées Fibro	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plaques Ondulées Fibro		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-019015-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)



PV_00720240301267047


Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Xavier LEMAILLE
6 B Rue Alessandro Volta
44481 CARQUEFOU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page1/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Entrée - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P003-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) + (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
6b, rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page2/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-RDC - Chambre - Sol - Revêtement en Lès Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / PSN3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-RDC - Cuisine - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / PSN3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / T8CL	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	P010-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser ; Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PSN3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P011-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F2DF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P012-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / F2DF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	P013-RDC - Cuisine - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser ; Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / F2DF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page 3/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-RDC - Cuisine - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Ancienne	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces (i) (ii) (iii)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016 (1)	P016-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Rescente	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Sanitaire - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-RDC - Sanitaire - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - Sanitaire - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M7TY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-RDC - Sanitaire - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page4/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P021-RDC - Sanitaire - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / GR6J	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - Sanitaire - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / GR6J	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Buanderie - A - Conduit de ventilation - Amiante ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NQ5C	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	P024-RDC - Buanderie - Toutes zones - Mur n°3 - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-1er - Palier - Sol Sol - Ragraéage	Matériau semi-dur de type ragraéage (gris)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-1er - Palier - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / GR6J	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	P027-1er - Palier - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page 5/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P028-1er - Palier - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-1er - Palier - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-1er - Grenier - Toutes zones - Mur - Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	P031-1er - Grenier - Toutes zones - Mur - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple (poudreux) (bitumineux) (noir)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / NQ5C	1 / 1 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-1er - WC n°2 - Sol - Sol - Ragraéage	Matériau semi-dur de type ragraéage (gris)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-1er - WC n°2 - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page 6/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034-1er - WC n°2 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-1er - WC n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-1er - WC n°2 - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-1er - WC n°2 - A - Conduit de ventilation - Amiante ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NQ5C	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
038 (2)	P038-1er - WC n°2 - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) en traces(iv)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
039	P039-1er - WC n°2 - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-1er SS - Pièce - Sol - Sol - Dalle Béton	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / PSN3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page 7/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	P041-1er SS - Pièce - A - Conduit de fluide - Bande Platreuse Blanche	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P042-1er SS - Pièce - A - Conduit de fluide - Isolant Jaune	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-Façades - Façades - Façade(s) - Façade - Enduit Façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-Façades - Façades - Façade(s) - Façade - Enduit Façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-Ext - Terrasse - Sol - Sol - Colle Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / F2DF	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-Ext - Cabanon de Jardin n°1 - Toiture - Toiture - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NQ5C	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
047	P047-Ext - Cabanon de Jardin n°2 - Toiture - Toiture - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / YFZ9	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-019015-01 Date d'émission de rapport : 25/03/2024 13:48 Page 8/8
Dossier N° : 24W007995 Date de réception : 20/03/2024 Date d'analyse : 21/03/2024
Référence dossier Client:
4756366 A - lieu dit "LA PETITE MASURE" 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION
ETAT VIA CHORUS PRO

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) La totalité de la colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (iv) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Boudaud
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





DOCUMENT(S) REMI(S)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


ATTESTATION D'ASSURANCE

ENTREPRISE
ATTESTATION D'ASSURANCE
ASSQC11

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 26/12/2023

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 1400 Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9


CERTIFICAT DE QUALIFICATION


Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3124 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 30/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(2) Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ
