


Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice I

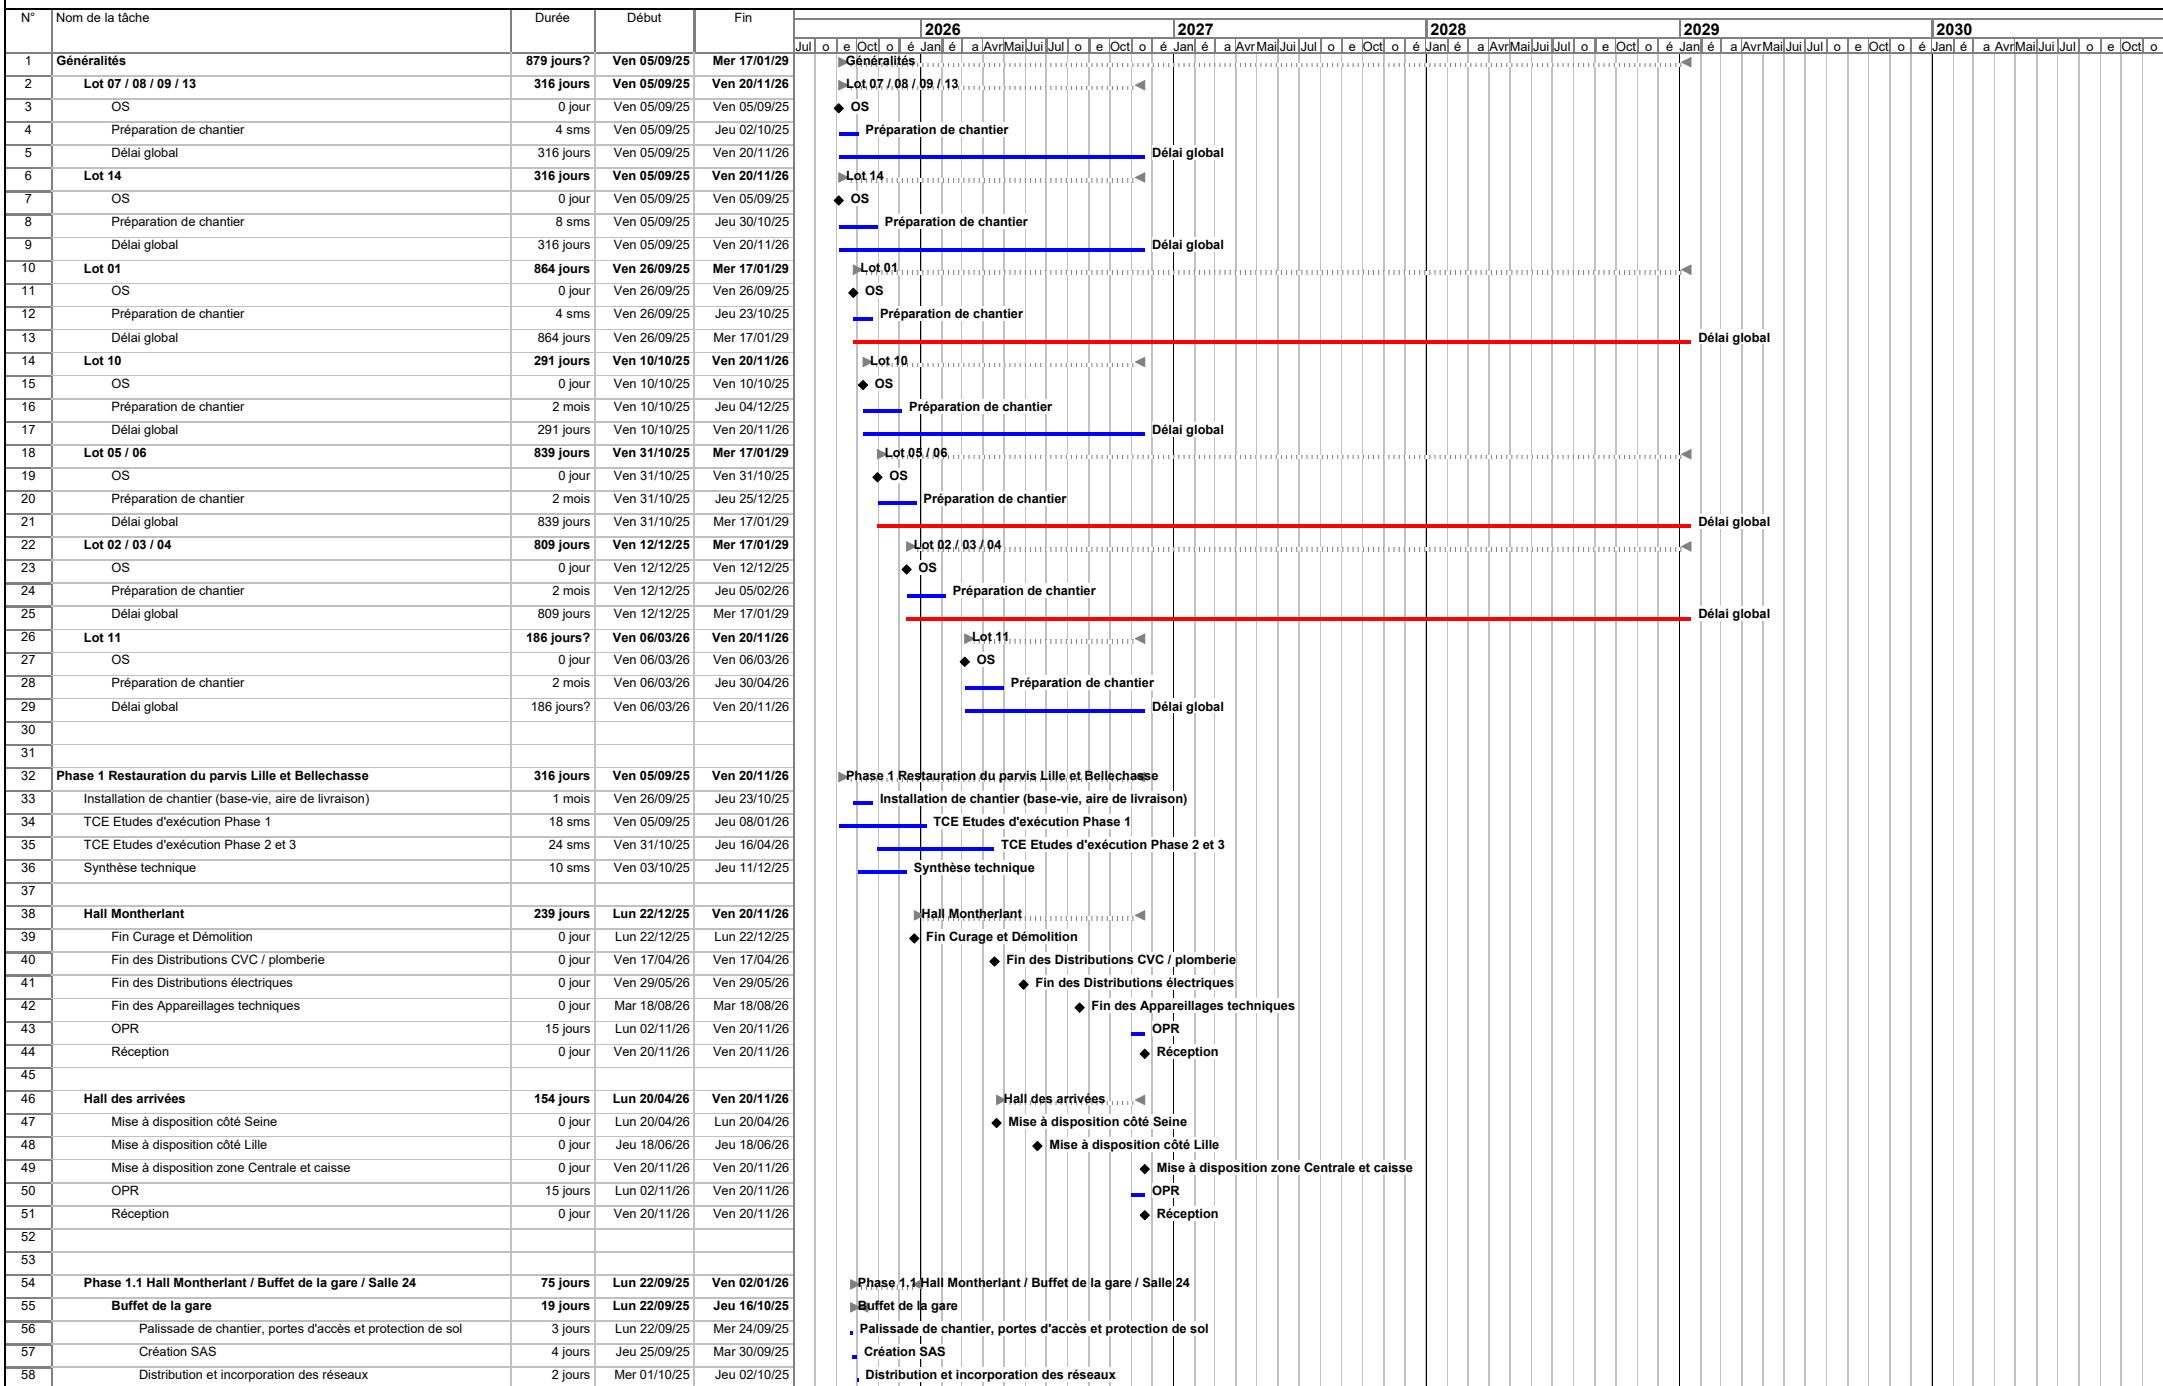

C:\Users\Ludovic\Desktop\O650 Planning DCE indH à date OS.mpp

C:\Users\Ludovic\Desktop\O650_Planning_DCE_indH_à_date_OS.mpp

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice I

[illegible]

5 / 8

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice I

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
2026				
Jul o e Oct o é Jan é a AvrMaiJuiJul o e Oct o é Jan é a AvrMaiJuiJul o e Oct o é Jan é a AvrMaiJuiJul o e Oct o é Jan é a AvrMaiJuiJul o e Oct o é Jan é a AvrMaiJuiJul o e Oct o				
265	Phase 2 Restauration de la marquise	420 jours	Ven 20/11/26	Jeu 29/06/28
266	Marquise	386 jours	Ven 20/11/26	Ven 12/05/28
267	Isolation de la zone par rapport au Hall des arrivées	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26
268	Consignation technique	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26
269	Curage intérieur et dépose du revêtement de sol	15 jours	Ven 27/11/26	Jeu 17/12/26
270	Décapage charpente métallique et traitement structure existante	15 jours	Ven 18/12/26	Jeu 07/01/27
271	Dépose de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 08/01/27	Jeu 21/01/27
272	Dépose des remplissages en verre et menuiserie de la partie hall	10 jours	Ven 22/01/27	Jeu 04/02/27
273	Création des appuis sur façade principale et pignons	10 jours	Ven 05/02/27	Jeu 18/02/27
274	Mise en place de la plateforme étanche avec drainage EP, cis accès par sapines	10 jours	Ven 19/02/27	Jeu 04/03/27
275	Hors d'eau provisoire	0 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27
276	Curage complémentaire et déposes diverses sous et sur la marquise	15 jours	Ven 05/03/27	Jeu 25/03/27
277	Renforcement et adaptation structure métallique	20 jours	Ven 26/03/27	Jeu 22/04/27
278	Réfection des chéneaux	10 jours	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27
279	Couverture en zinc	15 jours	Ven 23/04/27	Jeu 13/05/27
280	Distribution et raccordement des pluviales	5 jours	Ven 07/05/27	Jeu 13/05/27
281	Pose des vitrages verrière	25 jours	Ven 14/05/27	Jeu 17/06/27
282	Mise en peinture de la marquise	15 jours	Ven 11/06/27	Jeu 01/07/27
283	Ouvrages divers sur marquise	10 jours	Ven 02/07/27	Jeu 15/07/27
284	Dépose de la plateforme	7 jours	Ven 16/07/27	Lun 26/07/27
285	Pose de la structure en mur rideau	15 jours	Mar 27/07/27	Lun 16/08/27
286	Complexe isolation thermique, étanchéité et récupération EP	10 jours	Mar 17/08/27	Lun 30/08/27
287	Dalle de protection	10 jours	Mar 31/08/27	Lun 13/09/27
288	Pose des vitrages verticaux compris désenfumage	15 jours	Mar 14/09/27	Lun 04/10/27
289	Cloisonnement intérieur porteur	15 jours	Mar 05/10/27	Lun 25/10/27
290	Distributions électrique	20 jours	Mar 19/10/27	Lun 15/11/27
291	Distribution CVC, plénums, CTA compris raccordement	25 jours	Mar 26/10/27	Lun 29/11/27
292	Pose des structures en coque des ouvrages techniques	10 jours	Mar 30/11/27	Lun 13/12/27
293	Pose des buses CVC	5 jours	Mar 14/12/27	Lun 20/12/27
294	Pose appareillage électrique et raccordement	15 jours	Mar 30/11/27	Lun 20/12/27
295	Pose dalles de sol	20 jours	Mar 21/12/27	Lun 17/01/28
296	Cloisonnement vitré et rangement	10 jours	Mar 18/01/28	Lun 31/01/28
297	Modification et pose des menuiseries, shadow box et portes	15 jours	Mar 01/02/28	Lun 21/02/28
298	Pose et raccordement des tableaux électriques	25 jours	Mar 18/01/28	Lun 21/02/28
299	Câblage électrique et système de pilotage verrière	20 jours	Mar 08/02/28	Lun 06/03/28
300	Pose des plafonds sur accueil	10 jours	Mar 07/03/28	Lun 20/03/28
301	Pose éclairage	15 jours	Mar 07/03/28	Lun 27/03/28
302	Pose des portes tambours et raccordement	10 jours	Mar 21/03/28	Lun 03/04/28
303	Raccordement des rideaux d'air chaud	5 jours	Mar 04/04/28	Lun 10/04/28
304	Pose estrade	5 jours	Mar 28/03/28	Lun 03/04/28
305	Pose bagage X et portique	10 jours	Mar 04/04/28	Lun 17/04/28
306	Pose comptoir en bois pour information et accueil	10 jours	Mar 18/04/28	Lun 01/05/28
307	Essais technique et mise en service	20 jours	Mar 11/04/28	Lun 08/05/28
308	Dépose des installations de chantier et nettoyage	4 jours	Mar 09/05/28	Ven 12/05/28
309				
310	Parvis de Ballechasse côté Lille	349 jours	Ven 20/11/26	Mer 22/03/28
311	Dépose des statues	0 jour	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
312	Installation de chantier	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26
313	Consignation technique	5 jours	Ven 27/11/26	Jeu 03/12/26
314	Dépose des éléments notamment en conservation	10 jours	Ven 04/12/26	Jeu 17/12/26
315	Zone 1 - proche Lille	90 jours	Ven 25/12/26	Jeu 29/04/27
316	Dépose du dallage, dalle de protection placages des pedestaux,	10 jours	Ven 25/12/26	Ven 08/01/27
317	Mise en place du parapluie	10 jours	Ven 08/01/27	Ven 22/01/27
318	Dépose de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 22/01/27	Ven 05/02/27
319	Intervention structurale préparatoire sur dalle porteuse	10 jours	Ven 05/02/27	Ven 19/02/27
320	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Ven 19/02/27	Jeu 11/03/27
321	Dalle de protection	15 jours	Ven 12/03/27	Jeu 01/04/27
322	Distribution électrique	10 jours	Ven 02/04/27	Jeu 15/04/27

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
323	Dépense du parapluie	10 jours	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27
324	Modification emprise de livraison	2 sms	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27
325	Zone 2 - centrale	90 jours	Ven 16/04/27	Jeu 19/08/27
326	Dépense du dallage, dalle de protection placages des pedestaux,	10 jours	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27
327	Mise en place du parapluie	10 jours	Ven 30/04/27	Jeu 13/05/27
328	Dépense de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 14/05/27	Jeu 27/05/27
329	Intervention structurale préparatoire sur dalle porteuse	10 jours	Ven 28/05/27	Jeu 10/06/27
330	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Ven 11/06/27	Jeu 01/07/27
331	Dalle de protection	15 jours	Ven 02/07/27	Jeu 22/07/27
332	Distribution électrique	10 jours	Ven 23/07/27	Jeu 05/08/27
333	Dépense du parapluie	10 jours	Ven 06/08/27	Jeu 19/08/27
334	Zone 3 - proche Seine	90 jours	Ven 06/08/27	Jeu 09/12/27
335	Dépense du dallage, dalle de protection placages des pedestaux,	10 jours	Ven 06/08/27	Jeu 19/08/27
336	Mise en place du parapluie	10 jours	Ven 20/08/27	Jeu 02/09/27
337	Dépense de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 03/09/27	Jeu 16/09/27
338	Intervention structurale préparatoire sur dalle porteuse	10 jours	Ven 17/09/27	Jeu 30/09/27
339	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Ven 01/10/27	Jeu 21/10/27
340	Dalle de protection	15 jours	Ven 22/10/27	Jeu 11/11/27
341	Distribution électrique	10 jours	Ven 12/11/27	Jeu 25/11/27
342	Dépense du parapluie	10 jours	Ven 26/11/27	Jeu 09/12/27
343	Pose des dalles de sol et marches escaliers	45 jours	Ven 10/12/27	Jeu 10/02/28
344	Repose du mobilier urbain, plot d'éclairage, rampe emmarchement, et	10 jours	Ven 11/02/28	Jeu 24/02/28
345	Essais technique et mise en service	15 jours	Ven 25/02/28	Jeu 16/03/28
346	Dépense des installations de chantier	4 jours	Ven 17/03/28	Mer 22/03/28
347				
348	Haut de nef	71 jours	Jeu 23/03/28	Jeu 29/06/28
349	Palissade de chantier, portes d'accès, bâches horizontales et protectio	3 jours	Jeu 23/03/28	Lun 27/03/28
350	Installation électrique et moyen de protection incendie de chantier	2 jours	Mar 28/03/28	Mer 29/03/28
351	Dépense comptoir, estrade accueil, cimaise et mobilier	3 jours	Jeu 30/03/28	Lun 03/04/28
352	Dépense des pierres de buxy et chapes au droit de la cloison	3 jours	Mar 04/04/28	Jeu 06/04/28
353	Création cloison compris baie vitrée et porte	5 jours	Ven 07/04/28	Jeu 13/04/28
354	Relamping éclairage	30 jours	Ven 07/04/28	Jeu 18/05/28
355	Reprise porte historique compris imposte	10 jours	Ven 14/04/28	Jeu 27/04/28
356	Distribution électrique	10 jours	Ven 07/04/28	Jeu 20/04/28
357	Distribution CVC	20 jours	Ven 07/04/28	Jeu 04/05/28
358	Pose plafond	5 jours	Ven 05/05/28	Jeu 11/05/28
359	Mise en peinture murs et plafond	10 jours	Ven 12/05/28	Jeu 25/05/28
360	Appareillage électrique	10 jours	Ven 26/05/28	Jeu 08/06/28
361	Appareillage CVC	10 jours	Ven 26/05/28	Jeu 08/06/28
362	Pose casquette acoustique	10 jours	Ven 02/06/28	Jeu 15/06/28
363	Pose estrade	2 jours	Ven 16/06/28	Lun 19/06/28
364	Pose mobilier audioguide et comptoir, compris habillage et placard	3 jours	Mar 20/06/28	Jeu 22/06/28
365	Appareillage électrique CFA	5 jours	Ven 23/06/28	Jeu 29/06/28
366				

