



P. CALESTREME CS
17 Avenue Albert 1^{er}
64320 BIZANOS
553 rue Bernard Palissy
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél. : 05 59 53 12 95
contact@calestreme-cs.com


MAÎTRE D'OUVRAGE

Préfecture des Landes

**24-26 rue Victor Hugo
40021 Mont-de-Marsan**

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Code du Travail - Articles L 4532-8 et R 4532-42 et suivants.

Rénovation des services d'accueil au public de la préfecture des Landes
Commune de Mont de Marsan (40000)

<u>Indice</u>	<u>Date</u>	<u>Objet de la mise à jour</u>	<u>Rédacteur</u>	<u>Visa</u>
00	23/06/2025	Rédaction initiale	L. PERLIE	

Titulaire : Ludovic Perlié, ludovic.perlie@calestreme-cs.com, 06 31 66 10 90

Suppléant : Michel Fouchet, contact@calestreme-cs.com,

Diffusion

Maître d'Ouvrage	1 exemplaire	<input type="checkbox"/> Courrier <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Autres :
Maître d'Œuvre	1 exemplaire	<input type="checkbox"/> Courrier <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Autres :

Référence : 23243

1	Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier	4
1.1	Présentation du projet	4
1.2	Planning prévisionnel T.C.E.	6
1.3	Cadre réglementaire et contractuel de l'opération	6
1.4	Désignation des lots	7
1.5	Sujétions liées à la configuration et aux caractéristiques du site	10
2	Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le Maître d'Œuvre en concertation avec le Coordonnateur.....	10
2.1	Base de cantonnement.....	10
2.2	Projet de Plan d'Installation de Chantier	11
2.3	Accès et circulations.....	11
2.4	Equipements de protection collective et individuelle.....	12
3	Mesures de coordination prises par le Coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent.....	12
3.1	Conditions de manutention des différents matériaux et matériels.....	12
3.2	Délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage.....	13
3.3	Utilisation des protections collectives.....	13
3.4	Les mesures prises pour les installations communes	14
3.5	Mesures prises en matière d'interaction sur le site.....	15
3.6	Travaux de Désamiantage - LOT 01	16
3.7	VRD.- LOT 02.....	16
3.8	Gros Oeuvre / Démolition / Structure.- LOT 03	17
3.9	Couverture / Bardage / Serrurerie.- LOT 04	18
3.10	Menuiseries extérieures / Fermetures.- LOT 05	18
3.11	Plâtrerie / isolation / Faux Plafond.- LOT 06	19
3.12	Menuiseries intérieures / Cloisons Modulaires.- LOT 07	19
3.13	CVC / ECS.- LOT 08.....	20
3.14	Electricité / SSI / Sureté.- LOT 09.....	20
3.15	Revêtements sols céramiques.- LOT 10	21
3.16	Revêtements Sols souples.- LOT 11.....	21
3.17	Peinture.- LOT 12.....	22
4	Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier	22
5	Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisants	23
6	Organisation des secours.....	25

<i>Secouristes Sauveteur du Travail (S.S.T.)</i>	25
<i>Trousse de 1ers secours</i>	25
<i>Consignes en cas d'accident</i>	25
<i>Appel des secours extérieurs</i>	26
7 Collège Interentreprises de Sécurité, Santé et des Conditions de Travail - CISSCT	26
8 Rôles et attributions	27
8.1 Intervenants	27
9 Annexe – Consignes en cas d'accident	28

Introduction

Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Ouvre et le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ont retenu un certain nombre de dispositions dans l'intérêt de l'ensemble des entrepreneurs. Les dispositions définies dans le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) font partie intégrante du marché des entreprises. De plus suivant l'évolution du chantier la logistique chantier pourra être amené à s'adapter. Dans ce cas, le CSPS et le Maître d'Ouvre se réservent le droit d'y apporter des aménagements, modifications ou compléments. Les frais correspondants seront pris en charge par les entreprises dans le cadre du marché.

L'entrepreneur du lot principal doit remettre au CSPS un P.P.S.P.S. Il dispose de trente jours à compter de la réalisation de la Visite d'Inspection Commune pour établir ce plan.

L'entrepreneur qui fait exécuter en tout ou partie, le contrat conclu avec le Maître d'Ouvrage par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire du P.G.C. et le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Les sous-traitants tiendront compte dans l'élaboration du P.P.S.P.S. des informations fournies par l'entrepreneur et notamment de celles qui sont contenues dans le P.G.C. Ces entrepreneurs disposeront de huit jours à compter de la réalisation de la Visite d'Inspection Commune pour établir le P.P.S.P.S.

Ce délai est valable pour les travaux de second œuvre.

L'entrepreneur doit indiquer dans son PPSPS la liste des salariés autorisés à signer le Registre Journal, la liste des Sauveteurs Secouristes du Travail ainsi que la liste des personnes habilitées à intervenir sur les installations de chantier.


Les dispositions prises par le P.G.C. devront être respectées par l'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier (titulaires, cotraitantes, sous-traitantes (quel que soit le niveau de sous-traitance), tâcherons et travailleurs indépendants).

1 Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier

1.1 Présentation du projet

Type :	Rénovation du rdc d'un bâtiment d'état : la préfecture des landes
Description des travaux :	<p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Désamiantage et curage d'anciens bâtiments - Démolition partielles - VRD - Démolition / maçonnerie - Toiture (Bardage, couverture, étanchéité...) - Menuiseries (int & ext) - Sols (souples et céramiques) - Electricité – SSI - Sureté - CVC - Plomberie - Aménagement intérieur - Peinture

Le chantier est situé au 24-26 rue Victor Hugo, à Mont de Marsan (40000).

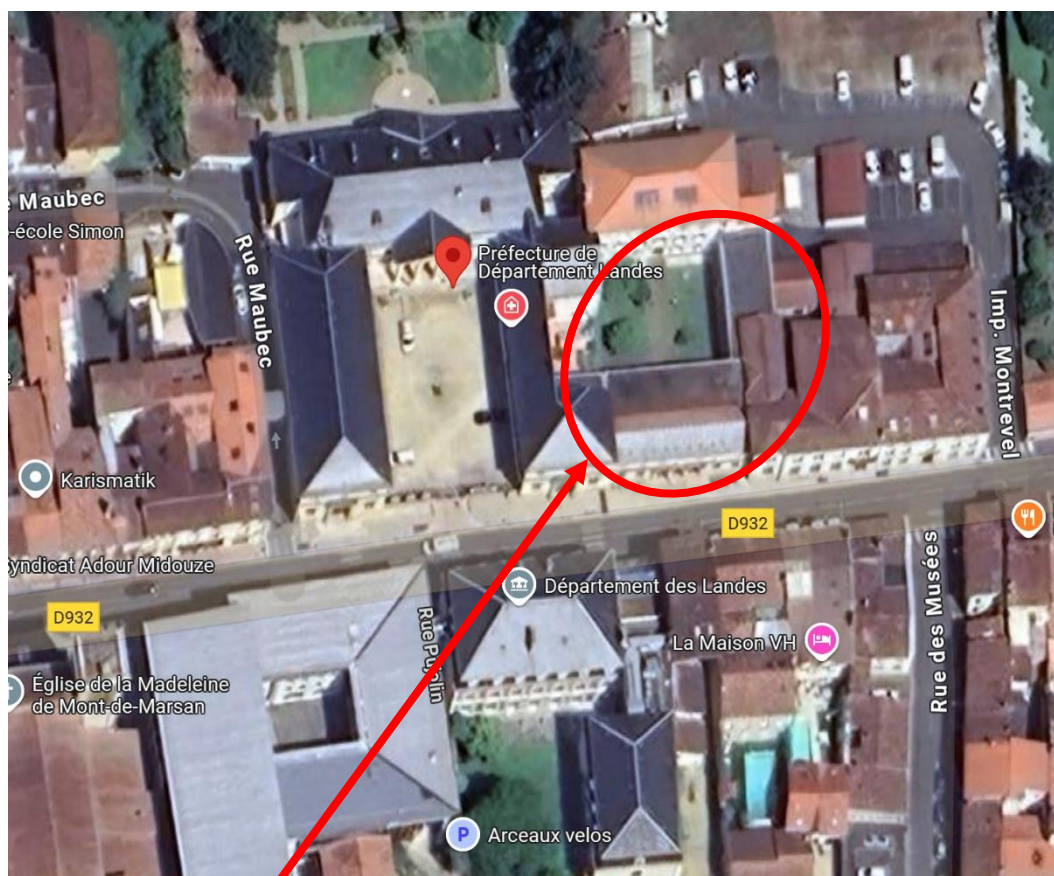

Zone concernée par les travaux (rdc + cours intérieur)

Points d'attention spécifiques de l'opération (liste non exhaustive)	
Environnement externe (circulation et accès, proximité ERP, chantier contigu, ...)	<p>Chantier en centre ville : Bâtiments publics, immeubles, résidences, commerces à proximité</p> <p>Voies de circulations à double sens : prévoir condamnation avec permission de voirie et arrêté de circulation de plusieurs place de parking, en fonction du phasage et des besoins du chantier</p> <p>Accès par voie / rues à fortes circulation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prévoir permission de voiries et arrêté pour occupation du domaine public - Prévoir système d'ouverture / fermeture sur l'intégralité du chantier pour les véhicules / engins de chantier / personnel permettant d'empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans l'enceinte des travaux - Prévoir SRT de chantier adaptée avec permission de voirie et arrêtés de circulation éventuels. A adapter en fonction des besoins et du phasage du chantier
Présence de réseaux aériens et souterrains	<p>MOA DT faite :</p> <p>Lots concernés : DICT et repérage / identification des réseaux à faire</p> <p>Sécurisation et signalisation des points d'accès aux réseaux présents sur site ou à proximité (domaine public) à prévoir</p>
Environnement interne (chantier dans site occupé, présence d'amiante / plomb, emprise réduite, pollution du sol, ...)	<p>Chantier dans bâtiment en exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prévoir séparation chantiers / hors chantier - Prévoir accès séparés - Planification des travaux afin de limiter au maximum les nuisances (bruit, poussières...) - Présence amiante : Voir DAAT fourni dans le DCE <p>Les travaux de désamiantage s'effectueront sans intervention d'autres entreprises / lots. Les travaux suivants ne débuteront qu'une fois l'amiante retiré et évacuée, et après le retour des analyses validant l'absence de risque amiante.</p> <p>Chantier sur site sensible avec accès sécurisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre d'entreprise ayant accès au chantier sera limité et contrôlé - Les entreprises devront respecter les modalités et procédures mises en place concernant les accès - Une vigilance particulière sera appliquée durant la totalité du chantier
Autres :	<p>Les besoins (fonctionnement, événements, urgences....) de la préfecture seront prioritaires sur le chantier, pouvant entraîner un arrêt des travaux. Les entreprises devront en tenir compte et respecter ces exigences.</p>

1.2 Planning prévisionnel T.C.E.

Date prévisible du début des travaux :	2 ^{ième} semestre 2025
Période de préparation :	2 mois
Durée prévisible des travaux :	10 mois
Effectif estimé sur chantier en simultané :	Entre 2 et 15 personnels

1.3 Cadre réglementaire et contractuel de l'opération

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, dispositions transposées dans le code du travail (*Partie Législative et Partie Réglementaire - Titre III - Bâtiment et Génie civil - Articles L.4531-1 et suivants, et articles R4532-1 et suivants*).

Au regard de ces textes :

- **Le Maître d'Ouvrage a classé le chantier en niveau 2.**
- Le Maître d'Ouvrage a désigné un CSPS qui assure la rédaction du PGCSPPS.
- La mission confiée au CSPS par le Maître d'Ouvrage est une mission à temps partiel.

1.4 Désignation des lots

Lots	Désignation	Entreprise désignée	IC	PPSPS
01	DESAMIANPAGE			
02	VRD			
03	GROS-ŒUVRE / DEMOLITION / STRUCTURE			
04	COUVERTURE / BARDAGE / SERRURERIE			
05	MENUISERIES EXTERIEURES / FERMETURES			
06	PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFOND			
07	MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS MODULAIRES			
08	CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / ECS			
09	ELECTRICITE			
10	REVÊTEMENT SOLS CERAMIQUES			
11	REVÊTEMENT SOLS SOUPLES			
12	PEINTURE			

Amiante :

Obligation de réaliser un diagnostic amiante pour les bâtiments construits avant le juillet 1997 :

Numéro d'affaire : 16161111

Référence du rapport : 16161111/S3.1.3.rev2.R

Annule et remplace : 16161111/S3.1.3.rev1 en date du 12/12/2023

Rédigé le : 04/11/2024

Par l'opérateur de repérage : Nicolas FADRIQUE /BUREAU VERITAS

Présence d'amiante. Documents consultables et joints au DCE.

Les travaux de désamiantage s'effectueront sans intervention d'autres entreprises / lots. Les travaux suivants ne débuteront qu'une fois l'amiante retiré et évacuée, et après le retour des analyses validant l'absence de risque amiante.

Plomb :

Obligation de réaliser un diagnostic plomb pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949

Sans objet.

Autre (termites) :

Sans objet.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RDC / Z5 - Bureaux	Revêtement de sol	Nez de marche	nez de marche noir dur compact
RDC / Z6 - Bureaux	Revêtement de sol	Nez de marche	nez de marche noir dur compact
RDC / Z12 - Dégagement	Revêtement de sol	Nez de marche	nez de marche noir dur compact
Extérieur / Façade	Menuiserie extérieure	Joint	joint gris pâteux
Extérieur / Façade	Menuiserie extérieure	Joint	joint gris pâteux
Extérieur / Façade	Menuiserie extérieure	Joint	joint gris souple pâteux
Extérieur / Façade	Menuiserie extérieure	Joint	joint gris souple pâteux
Extérieur / Toiture	Couverture	Plaque ondulée	plaque en fibres ciment grise dure compact cassante

1.5 Sujétions liées à la configuration et aux caractéristiques du site

1.5.1 Réseaux existants aériens ou enterrés

Toute entreprise devant effectuer des travaux listés dans le Décret n° 91-1147 doit effectuer les démarches réglementaires en la matière (travaux de terrassement, opérations de levage, ...)

- Etablissement des DT par la Maitrise d’Ouvrage (validité de 3 mois) –
- Etablissement des DICT par les entreprises (validité 3 mois)
- Tenir compte des préconisations indiquées par les concessionnaires dans le récépissé de retour DICT.

Nota important : La formation AIPR est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2018 pour les activités à proximité des réseaux.

2 Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le Maître d’Œuvre en concertation avec le Coordonnateur

2.1 Base de cantonnement

La base de cantonnement, à charge du lot 3 (Gros-œuvre / Démolition / Structure) devra comporter au minimum :

Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lavabo et 1 douche pour 10 personnes • eau potable froide et chaude • 1 urinoir et 1 w-c pour 20 personnes, avec chasse d’eau • Nettoyage quotidien (code du travail) • Sanitaires Hommes / Femmes séparés
Vestiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Vestiaires Hommes / Femmes séparés • Placards et chaises (ou bancs) en nombre suffisant
Réfectoire	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m² par personne • Equipé d’un four micro-ondes, d’un réfrigérateur, d’un évier avec robinet (eau potable, froide et chaude). • Tables et chaises en nombre suffisant
Salle de réunion (à la demande de la Moe)	<ul style="list-style-type: none"> • Tables et chaises pour 10 à 20 personnes environ et armoire de rangement
Entreprises	<ul style="list-style-type: none"> • Pour stockages

Nota Important: La base de cantonnement des entreprises doit être complète, maintenue propre et opérationnelle pendant toute la durée du chantier, un extincteur doit être présent.

2.2 Projet de Plan d'Installation de Chantier

A proposer à la Maitrise d'œuvre et au CSPS par le lot 1 puis 2 ou avant le démarrage des travaux.

L'entreprise titulaire du lot 3 fournira au Maître d'Œuvre et au CSPS un projet de plan d'installation chantier pour approbation.

Doit apparaître sur le plan :

- Les clôtures de chantier et emprunt du domaine public (si nécessaire)
- Les déviations « piétons » / engins
- Les positions des différents bungalows composant la base de cantonnement si nécessaire
- Les zones de stationnements des véhicules entreprises
- Les zones de stockages, de chargements et de déchargement
- L'implantation des bennes à déchets (carton, plastique, gravats, bois, ferrailles, DIB, DID, DASRI)
- Le positionnement des engins de levage (grue) et rayons de survol, même pour le manuscopique
- L'implantation de la voie de circulation à l'intérieur du chantier
- L'implantation des ateliers et aires de travail spécifiques

2.3 Accès et circulations

2.3.1 Accès

L'accès se fera LE 24-26, rue Victor Hugo. Il appartient à chaque entreprise de prendre toutes dispositions appropriées afin de supprimer les risques qui pourraient résulter de son activité sur l'ensemble du personnel intervenant sur le chantier ou pour les tiers (riverains, visiteurs, ...) => gestion des entrées et sorties du chantier (séparation piétons / engins).

Un plan de circulation spécifique doit être établi.

2.3.2 Personne autorisée à accéder au chantier

Chaque entreprise remet au Maître d'Ouvrage, la liste nominative des salariés travaillant sur le chantier.

Aucune autre personne n'est autorisée à accéder sur le site sans accord préalable du Maître d'Ouvrage et du CSPS.

Le chantier est interdit au public. Il conviendra de s'assurer que l'ensemble des accès au site sera condamné et contrôlé afin de s'en assurer.

Des panneaux chantier interdit au public seront apposés en limite de chantier **par le lot 3.**

RAPPEL 1 :

Le chantier étant sur un site sensible avec accès contrôlé, les entreprises titulaires et sous-traitantes fourniront une liste du personnel avant intervention. Elles respecteront les modalités et les procédures en vigueur de la Préfecture.

RAPPEL 2 :

Obligation de porter les EPIs sur la zone chantier pour l'ensemble des intervenants y compris des encadrants lors des visites, des réunions et à tout moment

2.3.3 Clôtures et portail de chantier

Le chantier devra être clôturé (selon les prescriptions du CCTP) et indépendant avec sa propre entrée, une séparation des locaux sera mise en place, organisé autour du phasage du chantier et des événements de la Préfecture et / ou de la ville.

Toute zone de stockage sur le domaine public fera l'objet d'une demande d'autorisation de la voie publique et sera délimité et balisé afin d'éviter tout risque pour les riverains et autres personnes étrangères au chantier.

Nota important : Le chantier hors heures ouvrables doit être totalement clôturé et portail d'accès fermé. L'entreprise quittant le chantier en dernier devra refermer le portail d'entrée.

2.3.4 Affichage, signalisation et balisage de chantier

L'affichage réglementaire (horaires de travail, liste des SST, ...) sera complété sur le chantier par les informations visuelles :

- Chantier interdit au public (portail et clôture)
- Port du casque obligatoire
- Consignes de sécurité en cas d'accident et d'incendie
- Signalisation temporaire routière (suivant arrêtés)



2.3.5 Circulations horizontales et verticales

Les voies de circulation définies par les entreprises devront apparaître sur le PIC.

Si un risque est identifié sur le chantier, les entrepreneurs devront expliquer dans leurs PPSPS les moyens de protection pour palier à ces risques.

A charge de chaque lot, la mise en place de chemin de circulation sécurisé et conforme à la réglementation en vigueur en plus des chemins de circulation généraux du chantier.

2.3.6 Circulations des engins de chantier

Les engins de chantier et véhicules de transport répondront à la réglementation en vigueur.

2.4 Equipements de protection collective et individuelle

Lorsque l'exécution d'un travail de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatoires de sécurité doivent être prises au préalable.

Tout dispositif enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué (après adaptation des protections collectives le cas échéant).

S'il subsiste un danger, la zone doit être protégée, signalée et son accès interdit.

Dans ce cas, le Coordonnateur de sécurité sera immédiatement prévenu des dispositions prises par l'entreprise.

3 Mesures de coordination prises par le Coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent

3.1 Conditions de manutention des différents matériaux et matériels

3.1.1 Organisation des manutentions

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens adaptés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (définis dans le PPSPS).

Toute opération de levage doit être placée sous la responsabilité d'un **chef de manœuvre formé, habilité et désigné**. Le personnel chargé de l'élingage doit être formé à ce type d'opération. Les engins de levage utilisables sur le chantier devront être identifiables (ex : autocollants apposés sur l'engin de levage).

Un plan de levage ainsi qu'une adéquation levage devront être établis pour les opérations de levage (portée importante, proximité ouvrages sensibles, proximité de réseau électrique aérien, ...).

Dans la mesure du possible, et dans le cas où une grue de chantier sera utilisée, elle devra être collectivisée. Dans ce cas, une convention devra être établie entre l'entrepreneur lot concerné et l'utilisateur ; le nu crochet étant la limite de responsabilité.

3.2 Délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage

Les entrepreneurs titulaires définiront en période préparatoire aux travaux les différentes zones de chargement/déchargement et de stockage (y compris zones de stockage tampon si besoin) utiles à la réalisation des travaux. Ces zones de stockage devront être aménagées et devront être implantées sur une zone suffisamment plane et stabilisée, clôturée (signalisation indiquant chantier interdit au public) et être suffisamment dimensionnées pour permettre le chargement / déchargement / retournement des engins en sécurité. Aucun réseau aérien et enterré ne devra être à proximité des zones de stockage.

La création d'un accès temporaire au domaine public est soumise à autorisation de la part du gestionnaire de la voirie. Les stockages devront prioritairement être effectués de plain-pied de façon à éviter tout risque de chute de hauteur lors des opérations d'élingage. Pas de stockage superposé (empilage) hors rack prévu à cet effet.

Stockages de matières ou substances dangereuses

S'il doit y avoir des produits dangereux stockés sur le chantier, les entreprises doivent le faire de manière conforme à la réglementation (bacs de rétention, ...).

3.3 Utilisation des protections collectives

Il appartient à chaque entrepreneur occasionnant un risque de mettre en œuvre les protections collectives nécessaires préalablement à la réalisation des travaux en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. En cas d'impossibilité de protéger collectivement une zone, l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage ou son représentant et au CSPS un descriptif des mesures de prévention à mettre en œuvre après analyse (commune si besoin). Le démontage ponctuel d'une protection collective ne peut être envisagé qu'après mise en œuvre de mesures de prévention compensatoire. Dans ce cas, le personnel intervenant devra être informé du risque, être équipé de protections individuelles et la zone de travail devra être identifiée, balisée et une signalisation informant du danger devra être mise en place. Les protections collectives devront être remises en place dès la fin de l'intervention.

	A charge de	Entretenu par	Utilisé par	Commentaires
Mise en place des protections collectives générales du chantier, maintenue les unes aux autres	Lot 3	Lot 3	TCE	
Mise en place de protections collectives d'une efficacité au moins équivalente à celles mises en place par le lot 1 ou 2 si enlèvement par une entreprise	TCE	TCE	TCE	
Mise en place des protections collectives inhérentes à ses activités	TCE	TCE	TCE	
Mise en place des garde-corps en terrasses (provisoire ou définitif)	TCE	TCE	SO	
Mise en place des potelets	TCE	TCE	Néant	
Mise en place des garde-corps sur balcon	SO	SO	Néant	

3.4 Les mesures prises pour les installations communes

	A charge de	Entretenu par	Utilisé par	Commentaires
<u>Affichage obligatoire :</u>				
Panneau de chantier comportant le nom de tous les intervenants (y compris sous-traitants) et renseignements réglementaires	Lot 3	Lot 3	Tout Corps d'Etat (TCE)	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
<u>Zone-vie :</u>				
Sanitaires, eau chaude et eau froide potable	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Branchement de l'eau pour les installations sanitaires ainsi que le chantier	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Vestiaires si besoin	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Réfectoire conforme (frigo et micro-ondes au minimum) au code du travail – si besoin	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Salle de réunion	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
<u>Electricité :</u>				
Electricité de la zone vie : Branchement et fourniture de matériel réglementaire	Lot 3 & 9	Lot 3 & 9	TCE	
Vérification électrique de la base vie	Lot 3	Lot 3	TCE	Par organisme agréé

				A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Branchement, fourniture et alimentation du coffret principal	Lot 9	Lot 9	TCE	
Branchement, fourniture et alimentation des coffrets secondaires (1 tous les 20m et par étage)	Lot 9	Lot 9	TCE	
Vérification électrique de l'ensemble des coffrets de chantier	Lot 9	Lot 9	TCE	Par organisme agréé
Eclairage des zones sombres pendant les heures d'ouverture du chantier + base vie + zone de stockage + circulations verticales et horizontales	Lot 9	Lot 9	TCE	
<u>Grue :</u>	SO			
Branchement unique, fourniture et alimentation + vérification coffret grue	Lot 3	Lot 3	TCE	Par organisme agréé
<u>Accès :</u>				
Mise en place des moyens nécessaires pour accéder aux zones de travaux et aux étages (distinction engins/piétons)	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Réalisation des voies d'accès et stabilisé autour du chantier	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Aire de stockage, retournement, parkings	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Aire de lavage des engins si besoin	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Signalisation Routière – Gestion des entrées / sorties de chantier – Arrêtés municipaux d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Nettoyage / Propreté des voiries	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3
Clôture et portail de chantier et maintien pendant toute la durée du chantier	Lot 3	Lot 3	TCE	A charge de l'entreprise ayant le plus de salariés présents sur le chantier au moment du départ du lot 3

3.5 Mesures prises en matière d'interaction sur le site

Les entreprises définiront dans leurs PP SPS les **modes opératoires / mesures / planning** pris pour gérer les risques identifiés dans le **phasage descriptif de leurs interventions selon des modes opératoires** ou fiches méthodes (liste non exhaustive, à compléter en fonction des techniques retenues par les entreprises).

Les indications détaillées ci-dessous sont réalisées avec les *hypothèses de construction et de travail* définies lors de la phase de conception et du CCTP.

3.6 Travaux de Désamiantage - LOT 01

<p>L'entreprise fournira un plan de retrait avec les modes opératoires spécifiques transmis aux organismes compétents conformément à la réglementation en vigueur</p> <p>Les travaux de la zone impactée démarreront après.</p> <p>L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation du désamiantage - L'installation du chantier - L'approvisionnement et stockage des matériaux / matériels - Manutentionner des matériaux / matériels - Assurer la protection contre les chutes de hauteurs et d'objets (personnes et matériels) - La protection contre les TMS - Le stockage et l'évacuation des déchets MCA - La mise en sécurité des abords du chantier 		
<p>L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD selon les déchets (amiante,...)</p>	Lot 1	Lot 1
<p>L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.</p>	Lot 1	Lot 1

3.7 VRD.- LOT 02

<p>L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Le gestion des protections collectives (provisoires et/ou définitives) - Les chutes de hauteur, de plain-pied - Le repérage des réseaux - La gestion des gravats et nettoyage - L'exposition aux bruits et poussières - L'utilisation de la chaux - La mise en sécurité des abords du chantier 		
<p>L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien).</p>		

Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 2	Lot 2
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 2	Lot 2

3.8 Gros Oeuvre / Démolition / Structure.- LOT 03

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Installation base-vie - Manutentionner les matériaux et matériels - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Le gestion des protections collectives (provisoires et/ou définitives) - Les chutes de hauteur, de plain-pied - Le repérage des réseaux - La méthode de déconstruction choisie / la découpe des matériaux - La méthodologie de construction (phasage) - La gestion des gravats et nettoyage - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier - L'utilisation d'outillages portatifs 		
Dans le cas où le présent lot (03) utilisera une grue, cette dernière sera collectivisée et mise à disposition des lots 4 & 5. L'entreprise de LOT 3 fournira la grue conforme à la réglementation en vigueur. Les modalités de prise en charge de celui-ci seront définis lors de la réunion d'inspection commune avant PPSPS. Convention si mise en commun – contrôle journalier avec traçabilité	Lot 3	
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 3	Lot 3
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 3	Lot 3

3.9 Couverture / Bardage / Serrurerie.- LOT 04

<p>L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - L'accès aux zones de travaux et l'assemblage - La circulation et les accès aux postes de travail - Prévenir le risque de chute de personne et de matériel - Le gestion des protections collectives (provisoires et/ou définitives) - Les chutes de hauteur, de plain-pied - Le repérage des réseaux - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier - La méthodologie de construction (phasage) - L'utilisation d'outillages portatifs - La mise en sécurité des abords du chantier 		
<p>L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD</p>	Lot 4	Lot 4
<p>L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.</p>	Lot 4	Lot 4

3.10 Menuiseries extérieures / Fermetures.- LOT 05

<p>L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Le gestion des protections collectives (provisoires et/ou définitives) - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		
<p>L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD</p>	Lot 5	Lot 5
<p>L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les</p>	Lot 5	Lot 5

notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.		
---	--	--

3.11 Plâtrerie / isolation / Faux Plafond.- LOT 06

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La découpe des matériaux (lieux, techniques) - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 6	Lot 6
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 6	Lot 6

3.12 Menuiseries intérieures / Cloisons Modulaires.- LOT 07

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La découpe des matériaux (lieux, techniques) - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 7	Lot 7
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les	Lot 7	Lot 7

notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.		
---	--	--

3.13 CVC / ECS.- LOT 08

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation des CVC, plomberie - Manutentionner les matériaux et matériels - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 8	Lot 8
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 8	Lot 8

3.14 Electricité / SSI / Sureté.- LOT 09

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation de l'électricité - Manutentionner les matériaux et matériels - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - La mise en service de l'installation - Affichage des consignations et déconsignations - L'éclairage horizontal et vertical - Les chutes de hauteur, de plain-pied - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 9	Lot 9

L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 9	Lot 9
---	-------	-------

3.15 Revêtements sols céramiques.- LOT 10

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La découpe des matériaux (lieux, techniques) - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 10	Lot 10
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 10	Lot 10

3.16 Revêtements Sols souples.- LOT 11

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La découpe des matériaux (lieux, techniques) - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits et poussières - La mise en sécurité des abords du chantier 		

L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 11	Lot 11
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 11	Lot 11

3.17 Peinture.- LOT 12

L'entreprise définira au niveau de son PPSPS sous forme de fiche méthode détaillée les mesures envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> - Manutentionner les matériaux et matériels - La méthode de pose - La circulation et les accès aux postes de travail - Le stockage et nettoyage. - La prévention des TMS - Les chutes de hauteur, de plain-pied - L'exposition aux bruits, odeurs - La mise en sécurité des abords du chantier 		
L'entreprise fournira un plan de gestion de ses déchets (nettoyage quotidien). Evacuation en filière spécifique et transmission du BSD	Lot 12	Lot 12
L'entreprise fournira au fur et à mesure de l'avancement du chantier au coordonnateur tous les documents utiles à la constitution du DIUO. Ces documents comportent les notices, plans de récolement et tout autre document nécessaires à la constitution du dossier.	Lot 12	Lot 12

4 Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier

Travaux dans site occupé / de maintenance

- Laisser libre les accès aux organes de commande et aux bâtiments
- Laisser libre et protéger les zones de circulation
- Baliser / clôturer / panneauter de manière claire et lisible
- Planifier les levages hors bâtiment occupé / en service
- Privilégier les rotations ou les travaux dérangeants (bruit, ...) en dehors des horaires du site
- Des réunions préparatoires seront organisées pour planifier les interventions (phasage, consignation, EPC, ...) et le rôle de chaque acteur

- S'il existe, se référer au DIUO.

Interface PGC / PdP

- Des réunions préparatoires seront organisées pour planifier les interventions (zonage, phasage, consignation, modes opératoires, EPC, ...) et le rôle de chaque acteur
- Identifier les limites de chaque décret 92 et 94
- Laisser libre les accès aux organes de commande et aux bâtiments
- Laisser libre et protéger les zones de circulation
- Baliser / clôturer / panneauter de manière claire et lisible.

5 Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisants

Article	Objet	Réalisé	Entretenu	utilisé
1	L'entreprise de Lot 1 assurera : ☞ Le nettoyage quotidien des installations communes. ☞ la fourniture de (savon, essuie-mains, papier toilette) tant que nécessaire	Lot 3	Lot 3	TCE
2	Nettoyage de la salle de réunion	Lot 3	Lot 3	TCE
3	Nettoyage du chantier quotidiennement. Le chantier devra être en permanence parfaitement propre. Tant à l'intérieur que les abords. Chaque entreprise devra effectuer le nettoyage et l'évacuation de ses propres gravats et déchets. Les entreprises ci dessous nommées seront responsables du respect par chaque entreprise de ses obligations en la matière, et devront parfaire ses nettoyages. (Par zone de travail) ☞ Depuis son intervention jusqu'à son départ et l'arrivée du plaquiste. ☞ Depuis le début de son intervention jusqu'à l'arrivée du peintre. ☞ Depuis son intervention jusqu'à la réception des travaux. UNE RECEPTION SERA FAITE AVANT CHANGEMENT D'ENTREPRISE	Lot 3 Lot 6 Lot 12	Lot 3 Lot 6 Lot 12	TCE
4	Nettoyage de la chaussée (route principale) tant que nécessaire	Lot 3 puis 6 puis 12	Lot 3 puis 6 puis 12	TCE

Pendant la période de préparation chaque entrepreneur établira un plan de tri sélectif précisant le type de déchets qu'il produira au cours du chantier et leur destination (décharge, valorisation) Toutes ces informations seront collationnées dans un plan général de tri. Ce plan précisera les types de déchets,

- Classe III Gravats inertes propres (gravats, terre, cailloux) ;
- Classe II Produits banals non valorisables ;
- Classe I Déchets industriels spéciaux (produits industriels toxiques, peinture, solvants, néons, etc...).

Ainsi que la valorisation des déchets industriels banals valorisables : cartons, matériaux ferreux, déchets verts, etc.

Article	Objet	Réalisé	Entretenu	Utilisé
5	Evacuation des gravats : Aucun stockage de gravats, non organisé, ne sera accepté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du chantier	Lot 3	Lot 3	TCE
<p><u>Chaque entreprise</u> mettra à disposition des poubelles à l'intérieur du bâtiment. Ces récipients seront peints de couleurs différentes et la catégorie de déchet qu'il pourra recevoir sera inscrite dessus. Il y aura des récipients disponibles pour chaque catégorie de déchet produit ; les poubelles seront remplacées dès que nécessaire. Ces récipients seront vidés tant que nécessaire, et dans tous les cas, ils doivent être vidés tous les soirs, dans les bennes par chaque entreprise concernée par les déchets. Les entreprises ci dessous nommées seront responsables du respect par chaque entreprise de ses obligations en la matière, et devront s'assurer que ces évacuations sont faites. En cas de carence elles devront assurer l'évacuation. (Par zone de travail)</p>				
	⇒ Pendant toute la durée de son intervention	Lot 3	Lot 3	TCE
	⇒ Pendant toute la durée de son intervention	Lot 6	Lot 6	TCE
	⇒ Jusqu'à la réception des travaux	Lot 12	Lot 12	TCE
<p>TOUTES LES MESURES NECESSAIRES SERONT PRISES POUR EVITER DES DEGAGEMENTS DE POUSSIERS PENDANT LES CHARGEMENTS ET EVACUATIONS DES GRAVATS. LES ENTREPRISES DEVRONT DECRIRE DANS LE PP S.P.S LES MODALITES MISES EN ŒUVRES POUR EVITER LA PROPAGATION DE CES POUSSIERS. (EXEMPLE : GOULOTTES DE VIDAGE ET BENNES BACHEES.)</p>				
	L'entreprise du lot 3 devra évacuer par les moyens de son choix tous les matériaux de démolition. Le tri sélectif sera assuré au fur et à mesure des démolitions. Les bennes et évacuations seront à la charge des entreprises suivantes, pendant la durée du chantier. ⇒ Les déchets inertes de classe 3	Lot 3 puis 6 puis 12	Lot 3 puis 6 puis 12	TCE
	⇒ L'étancheur évacuera ses propres déchets	Lot 4	Lot 4	TCE
	⇒ Le peintre évacuera ses propres déchets et les déchets de Classe 1	Lot 12	Lot 12	TCE

Les Cartons, papier, cartons emballages seront évacués par l'entreprise qui les a amenés. Ceci sans délais et au plus tard le soir.

Dans le cas ou une des entreprises serait défaillante dans le nettoyage ou l'évacuation des déchets, Il serait demandé au Maître d'Ouvrage de faire exécuter ces travaux par une autre

6 Organisation des secours

Les procédures de secours et d'évacuation vis-à-vis des risques suivants devront figurer dans les P.P.S.P.S. des entrepreneurs. Ces consignes en cas d'accident et d'incendie devront être affichées sur le chantier et être expliquées clairement au personnel lors de l'accueil sécurité.

Secouristes Sauveteur du Travail (S.S.T.)

Conformément au Code du Travail, les employeurs veilleront à ce qu'une personne (minimum) par tranche de 20 employés soit secouriste du travail (liste nominative disponible et mise à jour sur le chantier) mais également pour les activités avec travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993 du code du travail).



Trousse de 1ers secours

A charge de chaque lot → la mise en place d'une trousse de 1^{ers} secours dans le bungalow bureau de chantier.

Nota : L'ensemble des entreprises intervenantes devra être muni d'une trousse de 1^{ers} secours.

<http://www.inrs.fr/demarche/organisation-secours/materiel-premiers-secours.html>

Consignes en cas d'accident

Avertir les personnes suivantes après l'appel éventuel des secours :

- Responsables des entreprises
- Responsables du chantier
- CSPS
- Exploitants (responsable du site si chantier dans site occupé)

Article	Objet	Réalisé	Entretenu	utilisé
1	L'entreprise du lot 3 mettra depuis le démarrage du chantier un secouriste ceci jusqu'à la fin de son intervention	Lot 3	Lot 3	TCE
	L'entreprise du lot 3 mettra l'affiche réglementaire pour les appels d'urgence à proximité du téléphone	Lot 3	Lot 3	TCE
2	L'entreprise du lot 6 mettra un secouriste dès son arrivée.	Lot 6	Lot 6	TCE

3	L'entreprise du lot 12 mettra un secouriste dès son arrivée.	Lot 12	Lot 12	TCE
4	L'entreprise qui est responsable de la sécurité (Secouriste) devra : Avoir sur le chantier une trousse de premier secours. Passer les consignes à l'entreprise qui lui succède	Suivant avancement du chantier	Suivant avancement du chantier	TCE

Chaque entrepreneur devra pouvoir justifier sur le chantier de l'aptitude médicale de son personnel, quelque soit son statut et en fonction des travaux réalisés.

Appel des secours extérieurs

Voir annexe

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-dans-l-entreprise/En-cas-d-accident-plastifiee>

7 Collège Interentreprises de Sécurité, Santé et des Conditions de Travail - CISSCT

Sans objet, le chantier étant de niveau 2.

8 Rôles et attributions

8.1 Intervenants

	Adresse	Téléphone	Mail
Maitre d'Ouvrage	Préfecture des Landes M. LAPEYRE Daniel 24-26 rue Victor Hugo 40021 Mont-de-Marsan	05 58 06 59 71	daniel.lapeyre@landes.gouv.fr
Maitre d'Ouvrage Déléguée	S.E.M. 47 M. GAUVILLE Patrice 6 bis Boulevard Scaliger 47000 Agen		p.gauville@sem47.fr
Maitre d'Œuvre	Architectes PERETTO & PERETTO Mme Sandra BANOS 4 Rue de l'Hôtel de Ville 65100 LOURDES	05 62 51 42 46	s.banos@peretto.fr
Coordonnateur SPS	P. CALESTREME CS L.PERLIE Agence des Landes : 553 rue Bernard Palissy 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX	05 59 53 12 95 06 31 66 10 90	contact@calestre-me-cs.com ludovic.perlie@calestre-me-cs.com
Bureau de contrôle			
DREETS	DIRECTE Cité administrative A Bld Tourasse 64000 PAU	05 59 14 80 30	ddetspp@landes.gouv.fr
Caisse Régionale d'assurance Maladie	CARSAT NOUVELLE AQUITAINE Service Prévention 80 Avenue de la JALIERE 33053 BORDEAUX CEDEX	05 56 11 64 35	prevdir@carsat-aquitaine.fr
OPPBTP	OPPBTP NOUVELLE AQUITAINE Immeuble « Les Bureaux du Tasta » Bâtiment C 4.4 – 1 ^{er} Etage 9 Avenue Raymond Manaud 33524 BRUGES CEDEX	05 56 34 03 49	aquitaine@oppbtp.fr
Service Départemental d'Incendie et de Secours	SDIS 40	18	
Météorologie	Prévisions régionales Prévisions départementales	08 36 68 00 00 08 36 68 02 64	

Toute entreprise devant intervenir sur le chantier devra être agréée par le Maître d'Ouvrage.



9 Annexe – Consignes en cas d'accident

En cas d'accident

Appelez le Sauveteur Secouriste du Travail qui, après avoir examiné la victime, vous demandera d'appeler les secours.

**Téléphonez au 18 ou 112
et dites ...**

1 Ici chantier de bâtiment

Préfecture des Landes, 24-26, rue Victor Hugo, à Mont de Marsan (40000)

2 Précisez la nature de l'accident...

Exemple : éboulement, asphyxie, chute, ..., et la position du blessé (exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille, ...), ..., et s'il y a nécessité de dégagement.

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste

Exemple : premiers soins, bouche à bouche, ...

5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours.

6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

Une liste à jour mentionnant leurs noms doit être affichée sur le chantier. Les Sauveteurs Secouristes du Travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou sur leur tenue de travail.
