


Restauration de l'aile sur rue, de la cour d'honneur, des cours anglaises, du perron et de la terrasse du jardin · HÔTEL DE CASSINI


		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	22	Babylone - HÔTEL CASSINI	410 jours	Lun 05/16/26	Lun 16/08/27
2		OS de DEMARRAGE des TRAVAUX	1 jour	Lun 05/16/26	Lun 05/16/26
3		PREPARATION DU CHANTIER	40 jours	Lun 05/16/26	Lun 02/03/26
4		ETUDES EXE	60 jours	Mar 06/01/26	Lun 30/03/26
5		Installation de chantier	142 jours	Lun 02/02/26	Lun 24/08/26
6		Constat huisserie	1 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26
7		Mise en place des clôtures de chantiers et protections	5 jours	Lun 03/02/26	Lun 09/02/26
8		Branchement ELEC/EAU	1 jour	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26
9		Montage des échafaudages + parapluie	10 jours	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26
10		Sapine d'approvisionnement compris treuil	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26
11		Réception des échafaudages	1 jour	Mar 10/03/26	Lun 09/03/26
12		Location des échafaudages (6 mois)	126 jours	Mar 24/02/26	Lun 24/08/26
13		Dépôt des échafaudages	10 jours	Mar 11/08/26	Lun 24/08/26
14		Travaux	389 jours	Mar 03/02/26	Lun 16/08/27
15		PHASE 0 : Réseaux /Ravalement/Toiture	10 jours	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26
16		LOT 9 - VRD/AMENAGEMENT	10 jours	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26
17		Réalisation de tranchées pour réseau de chauffage	1 jour	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26
18		PHASE 1 : CLOS COUVRE AILE SUR RUE	131 jours	Mar 03/02/26	Lun 10/08/26
19		Lot 1 - INSTALLATION DE CHANTIER/GROS ŒUVRE/ÉCHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE	70 jours	Mar 01/04/26	Mer 10/07/26
20		Traitement, nettoyage des façades	20 jours	Mar 01/04/26	Mer 29/04/26
21		Dépôt de pierre	10 jours	Jeu 30/04/26	Ven 15/05/26
22		Reprise structurelle des murs de soutènement sur l'axe Est	8 jours	Lun 05/05/26	Mer 29/04/26
23		Pose de pierre	10 jours	Ven 08/05/26	Lun 22/05/26
24		Travaux de finition sur les façades yc patine d'harmonisation	20 jours	Lun 25/05/26	Lun 19/06/26
25		Réfection d'enduits plâtre et chaux	15 jours	Lun 22/06/26	Lun 10/07/26
26		Travaux de finition extérieures au niveau des menuiseries	15 jours	Mar 26/05/26	Lun 15/06/26
27		Lot 2 - CHARPENTE BOIS/COUVERTURE	75 jours	Mer 11/03/26	Mer 26/06/26
28		Dévoilement provisoire des descentes EP sur rue et toit	3 jours	Mer 27/03/26	Mer 31/03/26
29		Nettoyage et traitement yulophane	10 jours	Mer 01/04/26	Mer 15/04/26
30		Restauration des charpentes	15 jours	Jeu 16/04/26	Jeu 07/05/26
31		Isolation sous combles	7 jours	Lun 04/05/26	Lun 12/05/26
32		Découverteure/Dépôt	15 jours	Mer 11/03/26	Mar 31/03/26
33		Dépôt souche de cheminée sous procédure amiante (avec plan de retrait)	10 jours	Mer 18/03/26	Lun 31/03/26
34		Réfection des couvertures en zinc	15 jours	Lun 25/05/26	Mer 12/06/26
35		Récouvrement en plomb (mains courantes balustrades,bandeaux)	7 jours	Mer 13/05/26	Mer 22/05/26
36		Réfection des chéneaux,descentes EP,boîtes à eaux	15 jours	Mer 15/06/26	Mer 26/06/26
37		Réfection des couvertures et de la corniches en plomb	10 jours	Lun 15/06/26	Lun 26/06/26
38		Lot 3 - MENUISERIES EXTERIEURES	84 jours	Mar 03/02/26	Mer 03/06/26
39		Relèves et plans d'exécution	20 jours	Mar 03/02/26	Mer 02/03/26
40		Commandes des menuiseries	60 jours	Mar 03/03/26	Jeu 28/05/26
41		Livraison des premières menuiseries	1 jour	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26
42		Dépôt des anciennes menuiseries	12 jours	Lun 18/05/26	Lun 02/06/26
43		Pose de nouvelles menuiseries neuves sur rue	5 jours	Mar 19/05/26	Lun 25/05/26
44		Pose de nouvelles menuiseries neuves sur cour	7 jours	Mar 26/05/26	Mer 03/06/26
45		Lot 4 - SERRURERIE / METALLERIE	24 jours	Jeu 30/04/26	Mer 29/06/26
46		Dépôt /Restauration grilles de défense	15 jours	Jeu 30/04/26	Jeu 22/05/26
47		Repose des grilles de défense	10 jours	Mar 02/06/26	Mar 15/06/26
48		Restauration et pose des lanternes existantes	5 jours	Mar 16/06/26	Lun 22/06/26
49		Restauration et pose des grilles de soupiraux	5 jours	Mar 23/06/26	Mer 29/06/26
50		Lot 6 - REVETEMENT DE SOLS ET MURAUX / PEINTURE	20 jours	Mar 26/05/26	Lun 22/06/26
51		Peinture sur menuiseries neuves	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26
52		Peinture des parties métalliques	10 jours	Mer 09/06/26	Lun 22/06/26
53		Réception phase 1	0 jour	Lun 13/07/26	Lun 13/07/26
54		Lévé des réserves	20 jours	Lun 13/07/26	Lun 10/08/26
55		PHASE 1.1: AILE OUEST INTERIEURE	62 jours	Mar 12/05/26	Lun 10/08/26
56		Consignation des réseaux électriques et plomberies	0 jour	Mar 12/05/26	Mer 12/05/26
57		Lot 1 - INSTALLATION DE CHANTIER/GROS ŒUVRE/ÉCHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE	15 jours	Mer 13/05/26	Mer 03/06/26
58		Dépôt cloisons et faux plafonds	5 jours	Mer 13/05/26	Mer 20/05/26
59		Dépôt des ouvrages de menuiseries intérieures	3 jours	Lun 18/05/26	Mer 20/05/26
60		Dépôt de revêtement de sol PVC dans local chauffeurs sous procédure amiante (avec plan de retrait)	10 jours	Jeu 2	Jeu 2
61		Dépôt des sols	3 jours	Mar 21/05/26	Mer 25/05/26
62		Curage des éléments techniques	2 jours	Mar 26/05/26	Mer 27/05/26
63		Lot 4 - SERRURERIE / METALLERIE	10 jours	Mar 28/05/26	Lun 10/06/26
64		Pose des châssis BRG au droit des baies coté rue	10 jours	Mar 28/05/26	Lun 10/06/26
65		Lot 5 - MENUISERIES INTERIEURES/CLOISONS / DOUBLAGES/FAUX PLAFONDS	39 jours	Jeu 11/06/26	Mer 05/08/26
66		Pose doublages - cloisons	10 jours	Jeu 11/06/26	Mer 11/06/26
67		Pose faux plafonds	3 jours	Jeu 11/06/26	Mer 14/06/26
68		Pose des blocs portes et placards	2 jours	Lun 25/06/26	Lun 29/06/26
69		Pose kitchenette	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 04/08/26
70		Pose des meubles (banque d'accueil, banquette,meuble ba,plaque en chêne)	3 jours	Lun 03/08/26	Mer 05/08/26



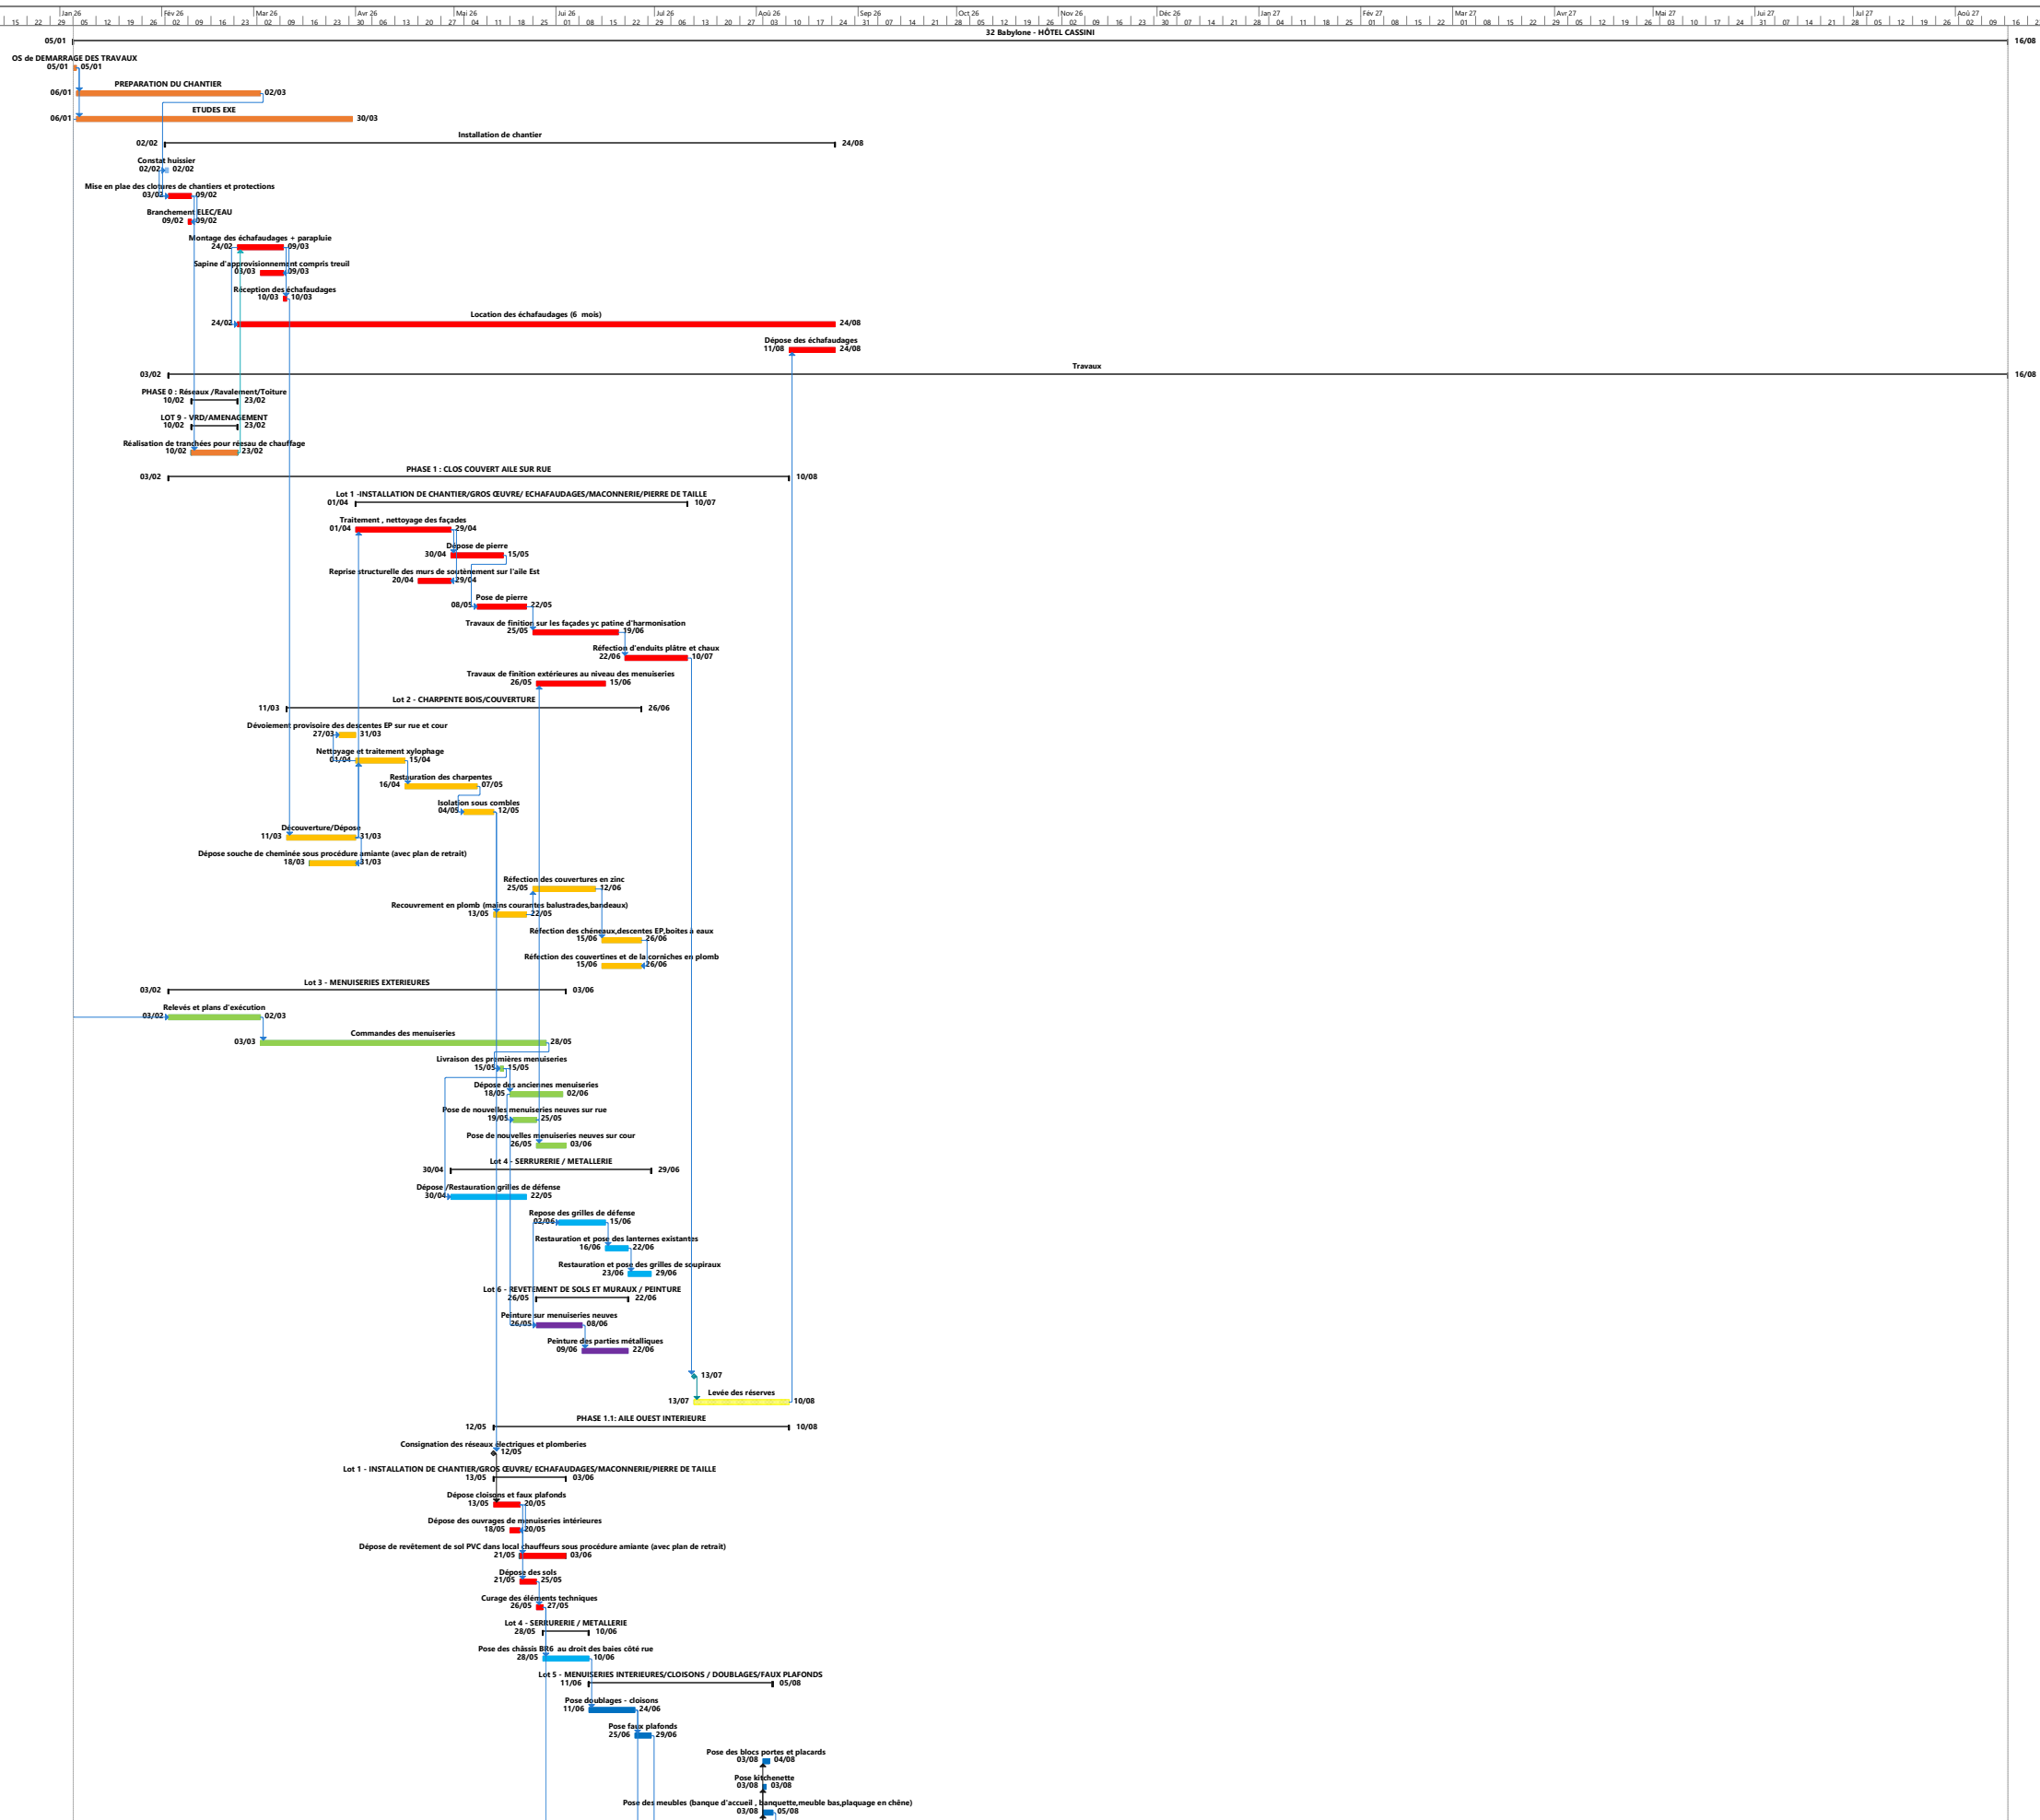

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
71	Lot 09 - CFO/CFA	46 jours	Jeu 28/05/26	Ven 31/07/26
72	Tirage de nouveaux réseaux élec	3 jours	Jeu 28/05/26	Lun 01/06/26
73	Modification des tableaux électriques existants	10 jours	Mar 02/06/26	Lun 15/06/26
74	Pose des appareillages élec	2 jours	Jeu 30/07/26	Ven 31/07/26
75	Lot 08 CVC - PLOMBERIE	31 jours	Jeu 18/06/26	Ven 31/07/26
76	Pose de nouveaux réseaux CVC	3 jours	Jeu 18/06/26	Lun 22/06/26
77	Pose de nouveaux réseaux alimentation et évacuation d'eau	3 jours	Mar 23/06/26	Jeu 25/06/26
78	Pose appareillage CVC	1 jour	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
79	Pose appareillage plomberie	1 jour	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
80	Lot 6 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX / PEINTURE	28 jours	Mar 30/06/26	Ven 07/08/26
81	Pose du terrazzo	10 jours	Mar 30/06/26	Lun 13/07/26
82	Pose carrelage - falence	8 jours	Mer 15/07/26	Ven 24/07/26
83	Peinture sur cloisons et doublage	5 jours	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
84	Pose signalétique	1 jour	Jeu 06/08/26	Jeu 06/08/26
85	Nettoyage	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26
86	Réception phase 1.1	1 jour	Lun 10/08/26	Lun 10/08/26
87	Déménagement gendarmes	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26
88	PHASE 1.2: AILE EST INTERIEURE	50 jours	Ven 07/08/26	Ven 16/10/26
89	Consignation des réseaux électriques et plomberies	10 jours	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26
90	Lot 1 - INSTALLATION DE CHANTIER/GROS ŒUVRE/ ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE	10 jours	Lun 10/08/26	Ven 22/08/26
91	Ouverture pour accès au local technique dans le local rangement	1 jour	Lun 10/08/26	Lun 10/08/26
92	Dépose cloisons et faux plafonds	5 jours	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26
93	Dépose des ouvrages de menuiseries intérieures	2 jours	Jeu 13/08/26	Ven 14/08/26
94	Dépose des sols	3 jours	Lun 17/08/26	Mer 19/08/26
95	Curage des éléments techniques	2 jours	Jeu 20/08/26	Ven 21/08/26
96	Lot 5 - MENUISERIES INTERIEURES/CLOISONS / DOUBLAGES/FAUX PLAFONDS	30 jours	Jeu 20/08/26	Mar 13/10/26
97	Pose doublages - cloisons	10 jours	Jeu 20/08/26	Mer 02/09/26
98	Pose faux plafonds	3 jours	Jeu 03/09/26	Lun 07/09/26
99	Pose des blocs portes et placards	2 jours	Ven 09/10/26	Lun 12/10/26
100	Pose kitchenette	1 jour	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
101	Pose du mobilier	3 jours	Ven 09/10/26	Mar 13/10/26
102	Lot 09 - CFO/CFA	29 jours	Lun 31/08/26	Jeu 08/10/26
103	Tirage de nouveaux réseaux élec	3 jours	Lun 31/08/26	Jeu 03/09/26
104	Modification des tableaux électriques existants	19 jours	Jeu 03/09/26	Mar 29/09/26
105	Pose des appareillages élec	2 jours	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26
106	Lot 08 CVC - PLOMBERIE	29 jours	Lun 31/08/26	Jeu 08/10/26
107	Pose de nouveaux réseaux CVC	3 jours	Lun 31/08/26	Jeu 03/09/26
108	Pose et raccordement de nouveaux réseaux alimentation et évacuation d'eau	3 jours	Lun 31/08/26	Jeu 03/09/26
109	Pose appareillage CVC	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
110	Pose appareillage plomberie	1 jour	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
111	Lot 6 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX - PEINTURE	28 jours	Mar 08/09/26	Jeu 15/10/26
112	Pose du terrazzo	10 jours	Mar 08/09/26	Lun 22/09/26
113	Pose carrelage - falence	8 jours	Mar 22/09/26	Jeu 01/10/26
114	Peinture sur cloisons et doublages	5 jours	Ven 02/10/26	Jeu 08/10/26
115	Pose signalétique	1 jour	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26
116	Nettoyage	1 jour	Jeu 15/10/26	Jeu 15/10/26
117	Réception phase 1.2	1 jour	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
118	PHASE 2: COUR ANGLAISES SUR JARDIN	63 jours	Jeu 02/07/26	Ven 29/09/26
119	Lot 1 - INSTALLATION DE CHANTIER/GROS ŒUVRE/ ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE	58 jours	Ven 03/07/26	Mer 23/09/26
120	Dépose des gardes-corps métalliques et couverture en ciment	4 jours	Ven 03/07/26	Mer 08/07/26
121	Recoupe de la tête du mur existant	3 jours	Jeu 09/07/26	Lun 13/07/26
122	Terrassement taluté en déblais/remblais aux abords des murs de soutènement	3 jours	Mer 22/07/26	Ven 24/07/26
123	Purge et Création d'une longrine	5 jours	Lun 27/07/26	Ven 30/07/26
124	Création de drainage dans le mur existant	2 jours	Jeu 23/07/26	Ven 24/07/26
125	Purge de la peinture étanche et réalisation d'un enduit sur les murs de soutènement	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
126	Réfection de l'ensemble des pieds de murs	3 jours	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
127	Restauration des marches en pierre	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
128	Restauration des balustrades	7 jours	Lun 03/08/26	Mar 11/08/26
129	LOT 2 - COUVERTURE BOIS/CHARPENTE	5 jours	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
130	Reprise descente EP par des descentes en fonte	5 jours	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
131	Lot 3 - MENUISERIES EXTERIEURES	60 jours	Jeu 02/07/26	Jeu 24/09/26
132	Relèvés et plans d'exécution	15 jours	Jeu 02/07/26	Ven 23/07/26
133	Commande + livraison des menuiseries neuves	40 jours	Ven 17/07/26	Ven 11/09/26
134	Dépose des menuiseries existantes	7 jours	Ven 11/09/26	Lun 22/09/26
135	Pose des menuiseries neuve	7 jours	Lun 14/09/26	Mar 22/09/26
136	Révision des menuiseries existantes	5 jours	Ven 18/09/26	Jeu 24/09/26
137	Lot 4 - SERRURERIE/METALLERIE	28 jours	Ven 03/07/26	Mer 12/08/26
138	Fabrication des nouveaux gardes de corps	20 jours	Ven 03/07/26	Lun 03/08/26
139	Pose des gardes de corps	3 jours	Lun 03/08/26	Mer 05/08/26
140	Révision des gardes de corps des escaliers	5 jours	Jeu 06/08/26	Mer 12/08/26

Restauration de l'aile sur rue, de la cour d'honneur, des cours anglaises, du perron et de la terrasse du jardin .HÔTEL DE CASSINI

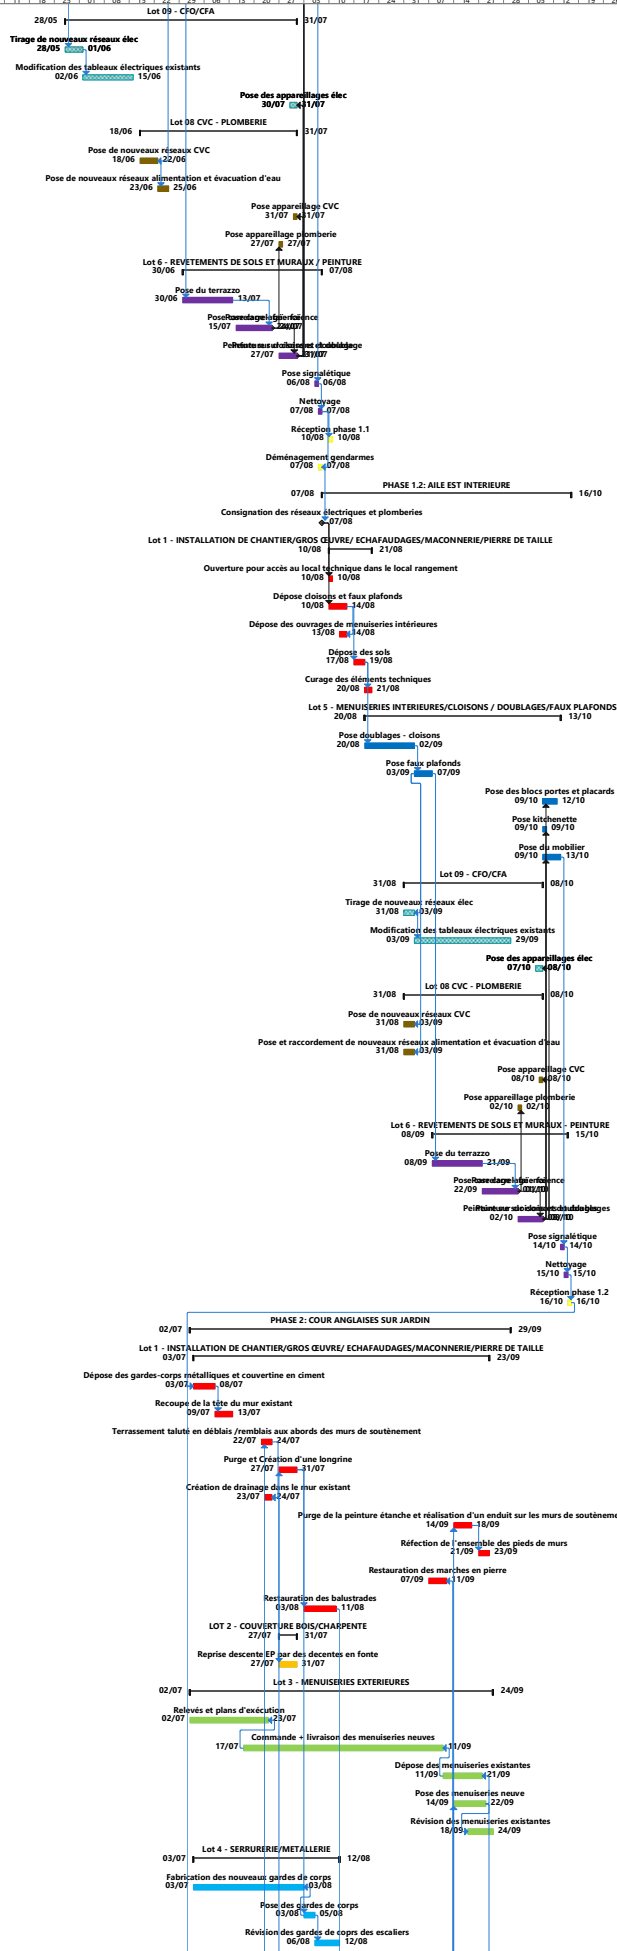

Restauration de l'aile sur rue, de la cour d'honneur, des cours anglaises, du perron et de la terrasse du jardin · HÔTEL DE CASSINI

<

