



# BATIMENT PASREL

ZAC de Corbeville – Saclay

PAris – Saclay, foRmation, rEcherche, innovation et hôpital


CEA PARIS SACLAY


PLANNING PRÉVISIONNEL

APS rev 01  
Avril 2025

ceaparis saclay						IDOM						PLATEAU DE SACLAY (91) PROJET PASREL BATIMENT PASREL						MP METHODES & PILOTAGE																		
PLANNING PREVISIONNEL - PHASE APS																																				
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Critic	Noms ressources	est 1, 2024	Semestre 2, 2024	Semestre 1, 2025	Semestre 2, 2025	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Sem																		
							F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
1	PROJET PASREL					Non																														
2	PHASE OPERATIONNELLE					Non																														
3	Notification du marché Maitrise d'oeuvre	0 jour	Mer 18/12/24	Mer 18/12/24	Non																															
4	Remise ESQ révisée au CEA pour validation	0 mois	Ven 20/12/24	Ven 20/12/24	Non																															
5	Validation CEA	0 jour	Ven 17/01/25	Ven 17/01/25	Non																															
6	Réunion d'enclenchement	0 jour	Mar 21/01/25	Mar 21/01/25	Non																															
7	Dossier de dispense d'études d'impact					Non																														
8	APS	75 jours	Lun 20/01/25	Mar 06/05/25	Oui																															
9	Remise au CEA - 10 semaines	50 jours	Lun 20/01/25	Ven 28/03/25	Oui																															
10	Examen des documents par le CEA - 2 semaines	10 jours	Lun 31/03/25	Ven 11/04/25	Oui																															
11	Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines	10 jours	Lun 14/04/25	Lun 28/04/25	Oui																															
12	Délai de validation par le CEA - 1 semaine	5 jours	Mar 29/04/25	Mar 06/05/25	Oui																															
13	APD	110 jours	Mer 07/05/25	Lun 13/10/25	Oui																															
14	PGCSPS	0 jour	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25	Non																															
15	Remise au CEA - 12 semaines	60 jours	Mer 07/05/25	Ven 01/08/25	Oui																															
16	Examen des document par le CEA - 6 semaines	30 jours	Lun 04/08/25	Lun 15/09/25	Oui																															
17	Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines	10 jours	Mar 16/09/25	Lun 29/09/25	Oui																															
18	Délai de validation par le CEA - 1 semaine	10 jours	Mar 30/09/25	Lun 13/10/25	Oui																															
19	Dossier CLS n°1	0 jour	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25	Non																															
20	Permis de Construire	166 jours	Mar 14/10/25	Ven 12/06/26	Non																															
21	Dossier PC	1 semaine	Mar 14/10/25	Lun 20/10/25	Non																															
22	Dépôt du PC	1 jour	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25	Non																															
23	Instruction du PC	6 mois	Mer 22/10/25	Lun 13/04/26	Non																															
24	Recours des tiers	2 mois	Mar 14/04/26	Ven 12/06/26	Non																															
25	ICPE	200 jours	Mar 14/10/25	Ven 31/07/26	Non																															
26	Validation ICPE	10 mois	Mar 14/10/25	Ven 31/07/26	Non																															
27	PRO	70 jours	Mar 14/10/25	Jeu 22/01/26	Oui																															
28	Notice d'organisation de chantier (NOC), planning, plan d'installation de chantier	0 jour	Mar 09/12/25	Mar 09/12/25	Non																															
29	Remise au CEA - 8 semaines	8 semaine	Mar 14/10/25	Mar 09/12/25	Oui																															
30	Examen des document par le CEA - 3 semaines	3 semaine	Mer 10/12/25	Mer 31/12/25	Oui																															
31	Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines	2 semaine	Ven 02/01/26	Jeu 15/01/26	Oui																															
32	Délai de validation par le CEA - 1 semaines	1 semaine	Ven 16/01/26	Jeu 22/01/26	Oui																															
33	DCE	55 jours	Ven 23/01/26	Ven 10/04/26	Oui																															
34	Protocoles des essais et réception	0 jour	Jeu 19/02/26	Jeu 19/02/26	Non																									</						

ceaparis saclay						IDOM						PLATEAU DE SACLAY (91) PROJET PASREL BATIMENT PASREL						MP METHODES & PILOTAGE					
PLANNING PREVISIONNEL - PHASE APS																							
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Critic	Noms ressources	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024	Semestre 1, 2025	Semestre 2, 2025	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Sem					
35	Remise au CEA - 4 semaines	4 semaines	Ven 23/01/26	Jeu 19/02/26	Oui																		
36	Examen du document par le CEA - 4 semaines	4 semaines	Ven 20/02/26	Jeu 19/03/26	Oui																		
37	Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines	2 semaines	Ven 20/03/26	Jeu 02/04/26	Oui																		
38	Délai de validation par le CEA - 1 semaine	1 semaine	Ven 03/04/26	Ven 10/04/26	Oui																		
39	ACT	138 jours	Mer 25/03/26	Lun 12/10/26	Oui																		
40	Acte de Vente de la parcelle	0 jour	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26	Non																		
41	CLS n°2	0 jour	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26	Non																		
42	Consultation totale avec notification - 6 mois	126 jours	Lun 13/04/26	Lun 12/10/26	Oui																		
43	Consultation des entreprises	8 semaines	Lun 13/04/26	Jeu 11/06/26	Oui																		
44	Dépouillement des offres	6 semaines	Ven 12/06/26	24/07/26	Oui																		
45	Mise au point des marché	3 semaines	Lun 27/07/26	Ven 14/08/26	Oui																		
46	CCM	8 semaines	Lun 17/08/26	Ven 09/10/26	Oui																		
47	Ordre de service	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26	Oui																		
48	EITUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE	0 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26	Oui																		
49	Etudes	312 jours	Lun 12/10/26	Lun 03/01/28	Non																		
50	Lots GO et validation	160 jours	Lun 12/10/26	Lun 31/05/27	Non																		
51	Calculs, plans, documents	8 mois	Lun 12/10/26	Lun 31/05/27	Non																		
52	Fiches produits	3 mois	Lun 19/10/26	Mer 13/01/27	Non																		
53	Lots architecturaux	300 jours	Lun 12/10/26	Jeu 16/12/27	Non																		
54	Plans	15 mois	Lun 12/10/26	Jeu 16/12/27	Non																		
55	Synthèse	14 mois	Lun 09/11/26	Jeu 16/12/27	Non																		
56	Fiches produits	6 mois	Lun 19/10/26	Jeu 08/04/27	Non																		
57	Lots Façades et prototypes	312 jours	Lun 12/10/26	Lun 03/01/28	Non																		
58	Fiches produits/validation	2 semaines	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26	Non																		
59	Plans/calculs et validations	3 mois	Lun 26/10/26	Mer 20/01/27	Non																		
60	Synthèse	121 jours	Lun 26/10/26	Ven 16/04/27	Non																		
61	Fabrication du prototype et validation	2 mois	Mar 22/12/26	Mer 17/02/27	Non																		
62	Pose sur site pour validation	2 semaines	Jeu 18/02/27	Mer 03/03/27	Non																		
63	Fabrication	8 mois	Jeu 04/03/27	Mar 19/10/27	Non																		
64	Pose sur site	7 mois	Jeu 17/06/27	Lun 03/01/28	Non																		
65	Lot étanchéité	100 jours	Lun 09/11/26	Jeu 01/04/27	Non																		
66	Plans, carnet de détails	5 mois	Lun 09/11/26	Jeu 01/04/27	Non																		
67	Fiches produits	2 mois	Lun 09/11/26	Mer 06/01/27	Non																		
68	Lots techniques	220 jours	Lun 12/10/26	Mar 24/08/27	Non																		

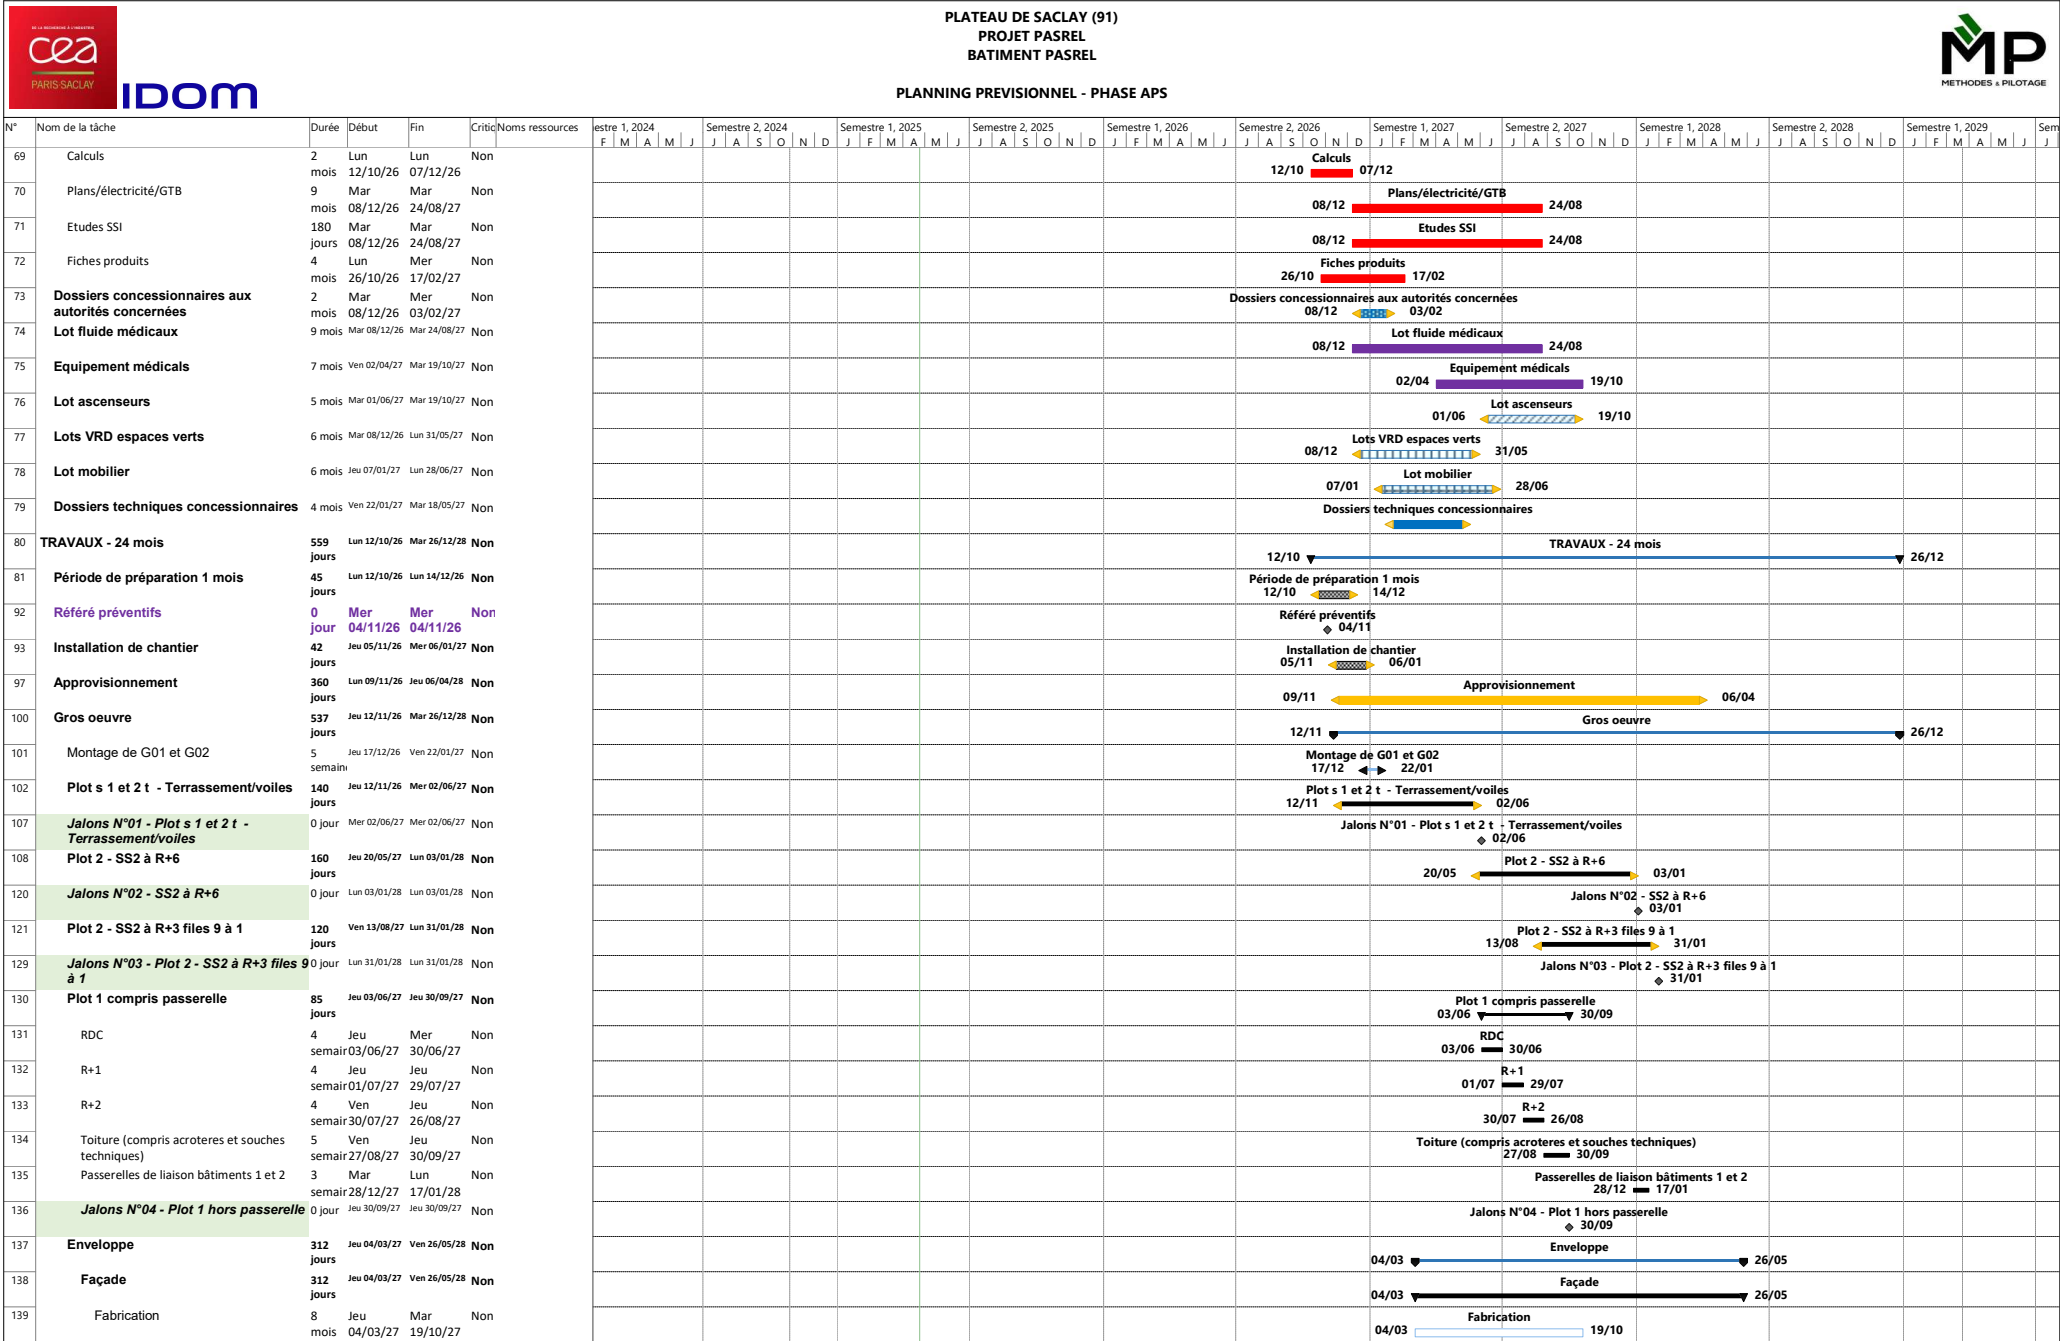

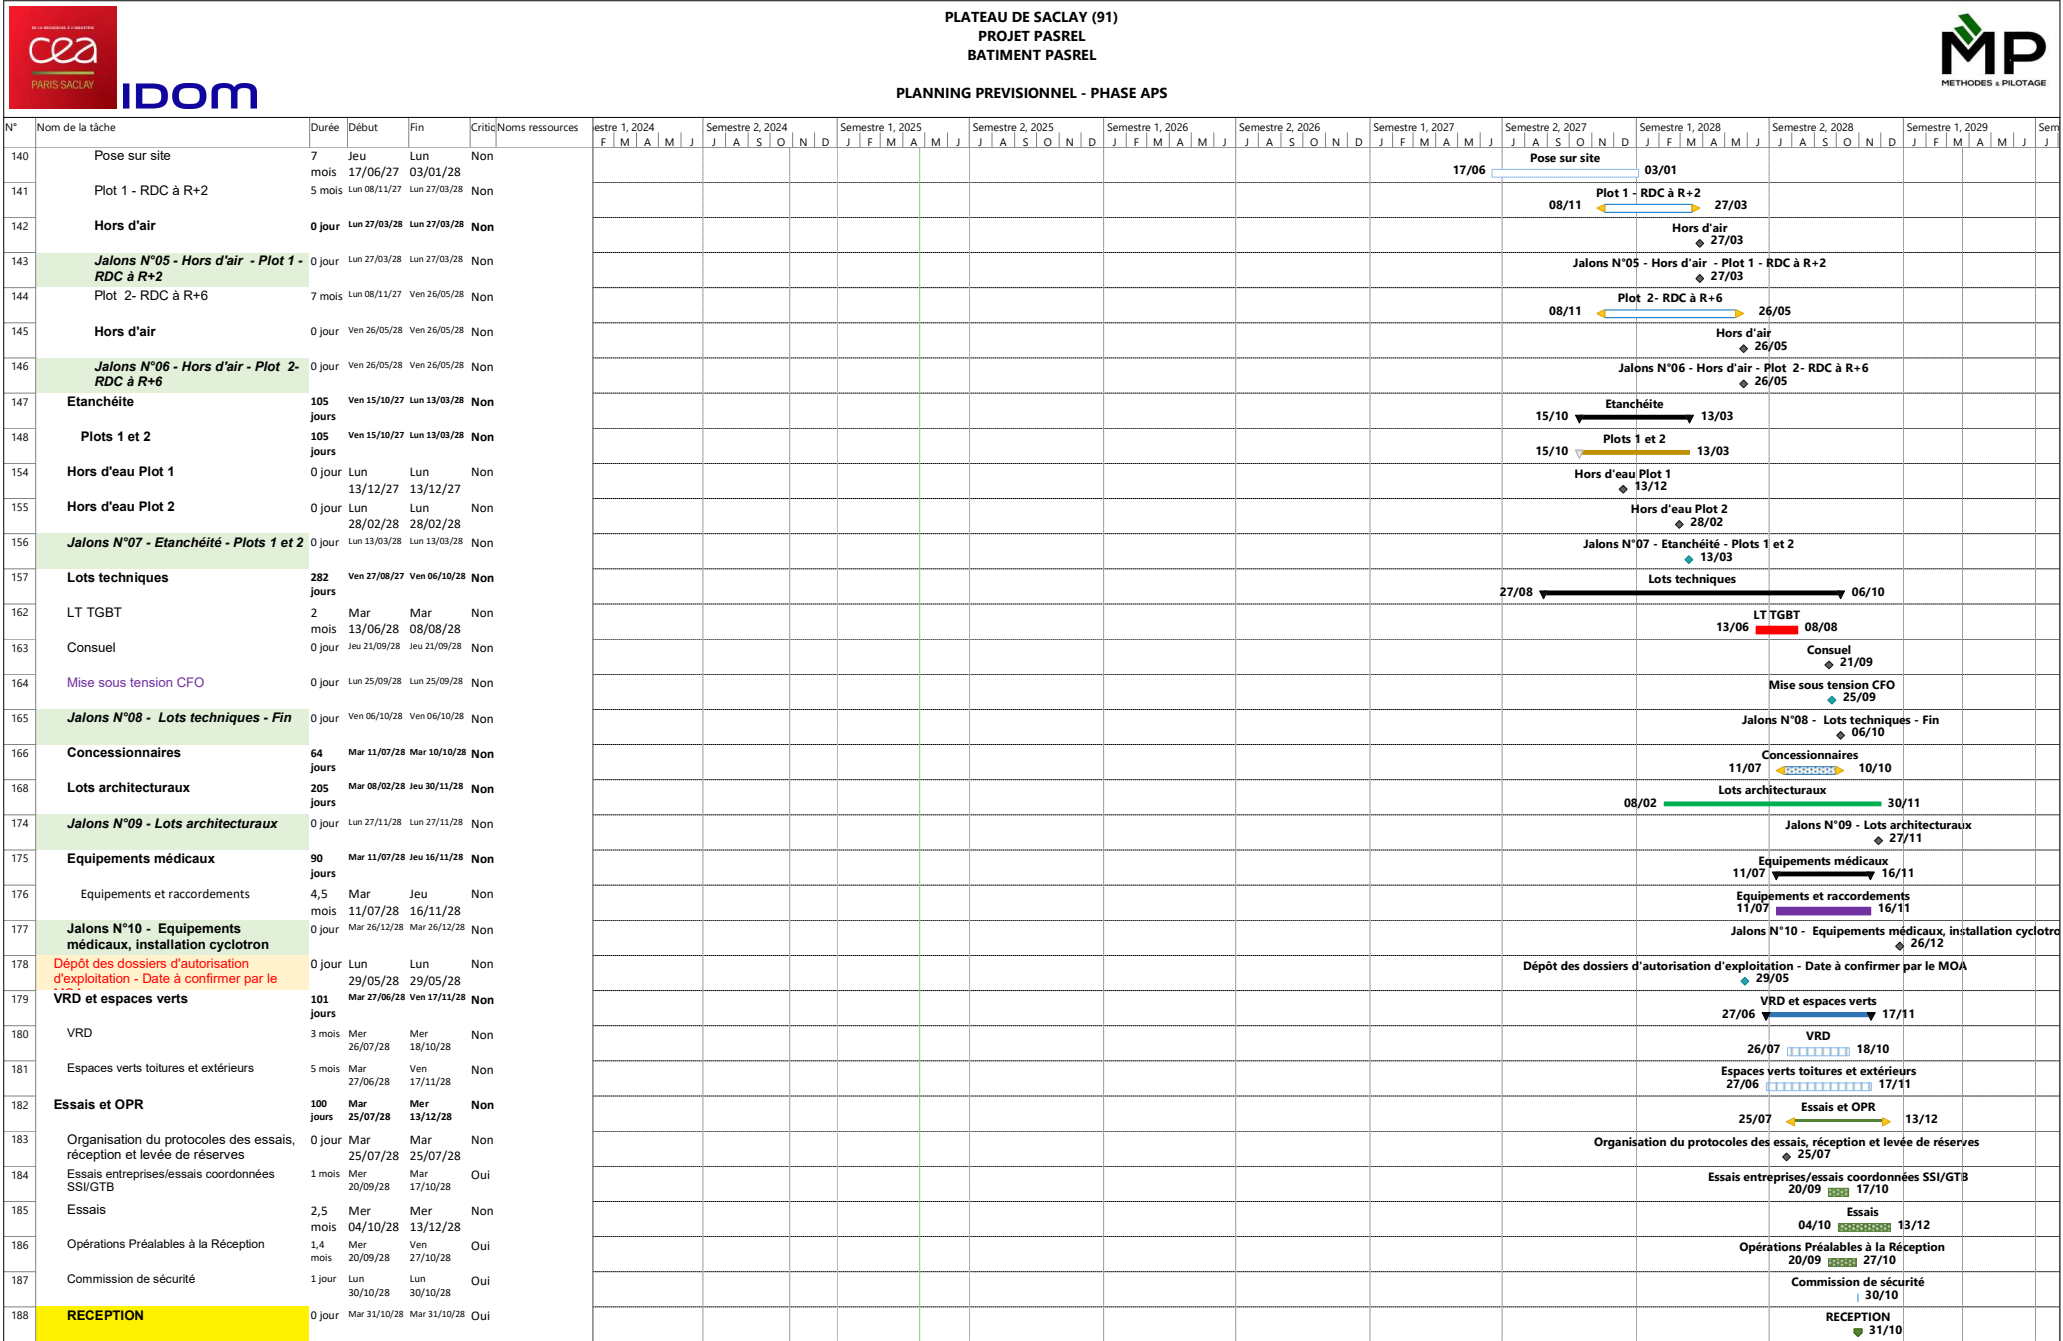

## PLANNING PREVISIONNEL - PHASE APS

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Critique	Noms ressources
189	Garantie de Parfait Accrèvement +12 mois	0 jour	Mar 31/10/28	Mar 31/10/28	Non	
190	DOE - DIUO - RFCT	30 jours	Mar 31/10/28	Mar 12/12/28	Non	
191	Examen du document par le MOE	4 semaines	Mer 31/10/28	Mar 28/11/28	Non	
192	Prise en compte par le Titulaire	2 semaines	Mer 29/11/28	Mar 12/12/28	Non	
193	Délai de validation par le CEA du DOE	1 semaine	Mer 29/11/28	Mar 05/12/28	Non	
194	PHASE DE CLOTURE	111 jours	Lun 16/10/28	Jeu 22/03/29	Oui	
195	Levée des réserves	4 mois	Mar 31/10/28	Jeu 22/02/29	Oui	
196	Cyclotron et Gros équipements démenagés	111 jours	Lun 16/10/28	Jeu 22/03/29	Oui	
197	Commande et fabrication du cyclotron (à confirmer par le fournisseur lors de la phase Exécution)	1 jour			Non	
198	Mise en place du cyclotron	4 semaines	Mer 18/10/28	Mer 15/11/28	Non	
199	Installation des équipements et réseaux cyclotron/enceintes	2,5 mois	Lun 16/10/28	Mar 26/12/28	Non	
200	Mise en service bâtiment	0 mois	Jeu 22/02/29	Jeu 22/02/29	Non	
201	Déménagement/process	2 mois	Ven 23/02/29	Ven 20/04/29	Oui	
202	Qualifications process - 2 mois	3 mois	Ven 26/01/29	Ven 20/04/29	Oui	
203	CLS n°3	0 jour	Jeu 19/04/29	Jeu 19/04/29	Non	
204	Mise en service installation	0 jour	Ven 20/04/29	Ven 20/04/29	Oui	
205	EXPLOITATION	0 jour	Ven 20/04/29	Ven 20/04/29	Oui	
