




Réhabilitation du Bâtiment Stendhal - Saint Martin d'Hères
Planning DCE Bâtiment G PROVISOIRE -
16 Mai 2025



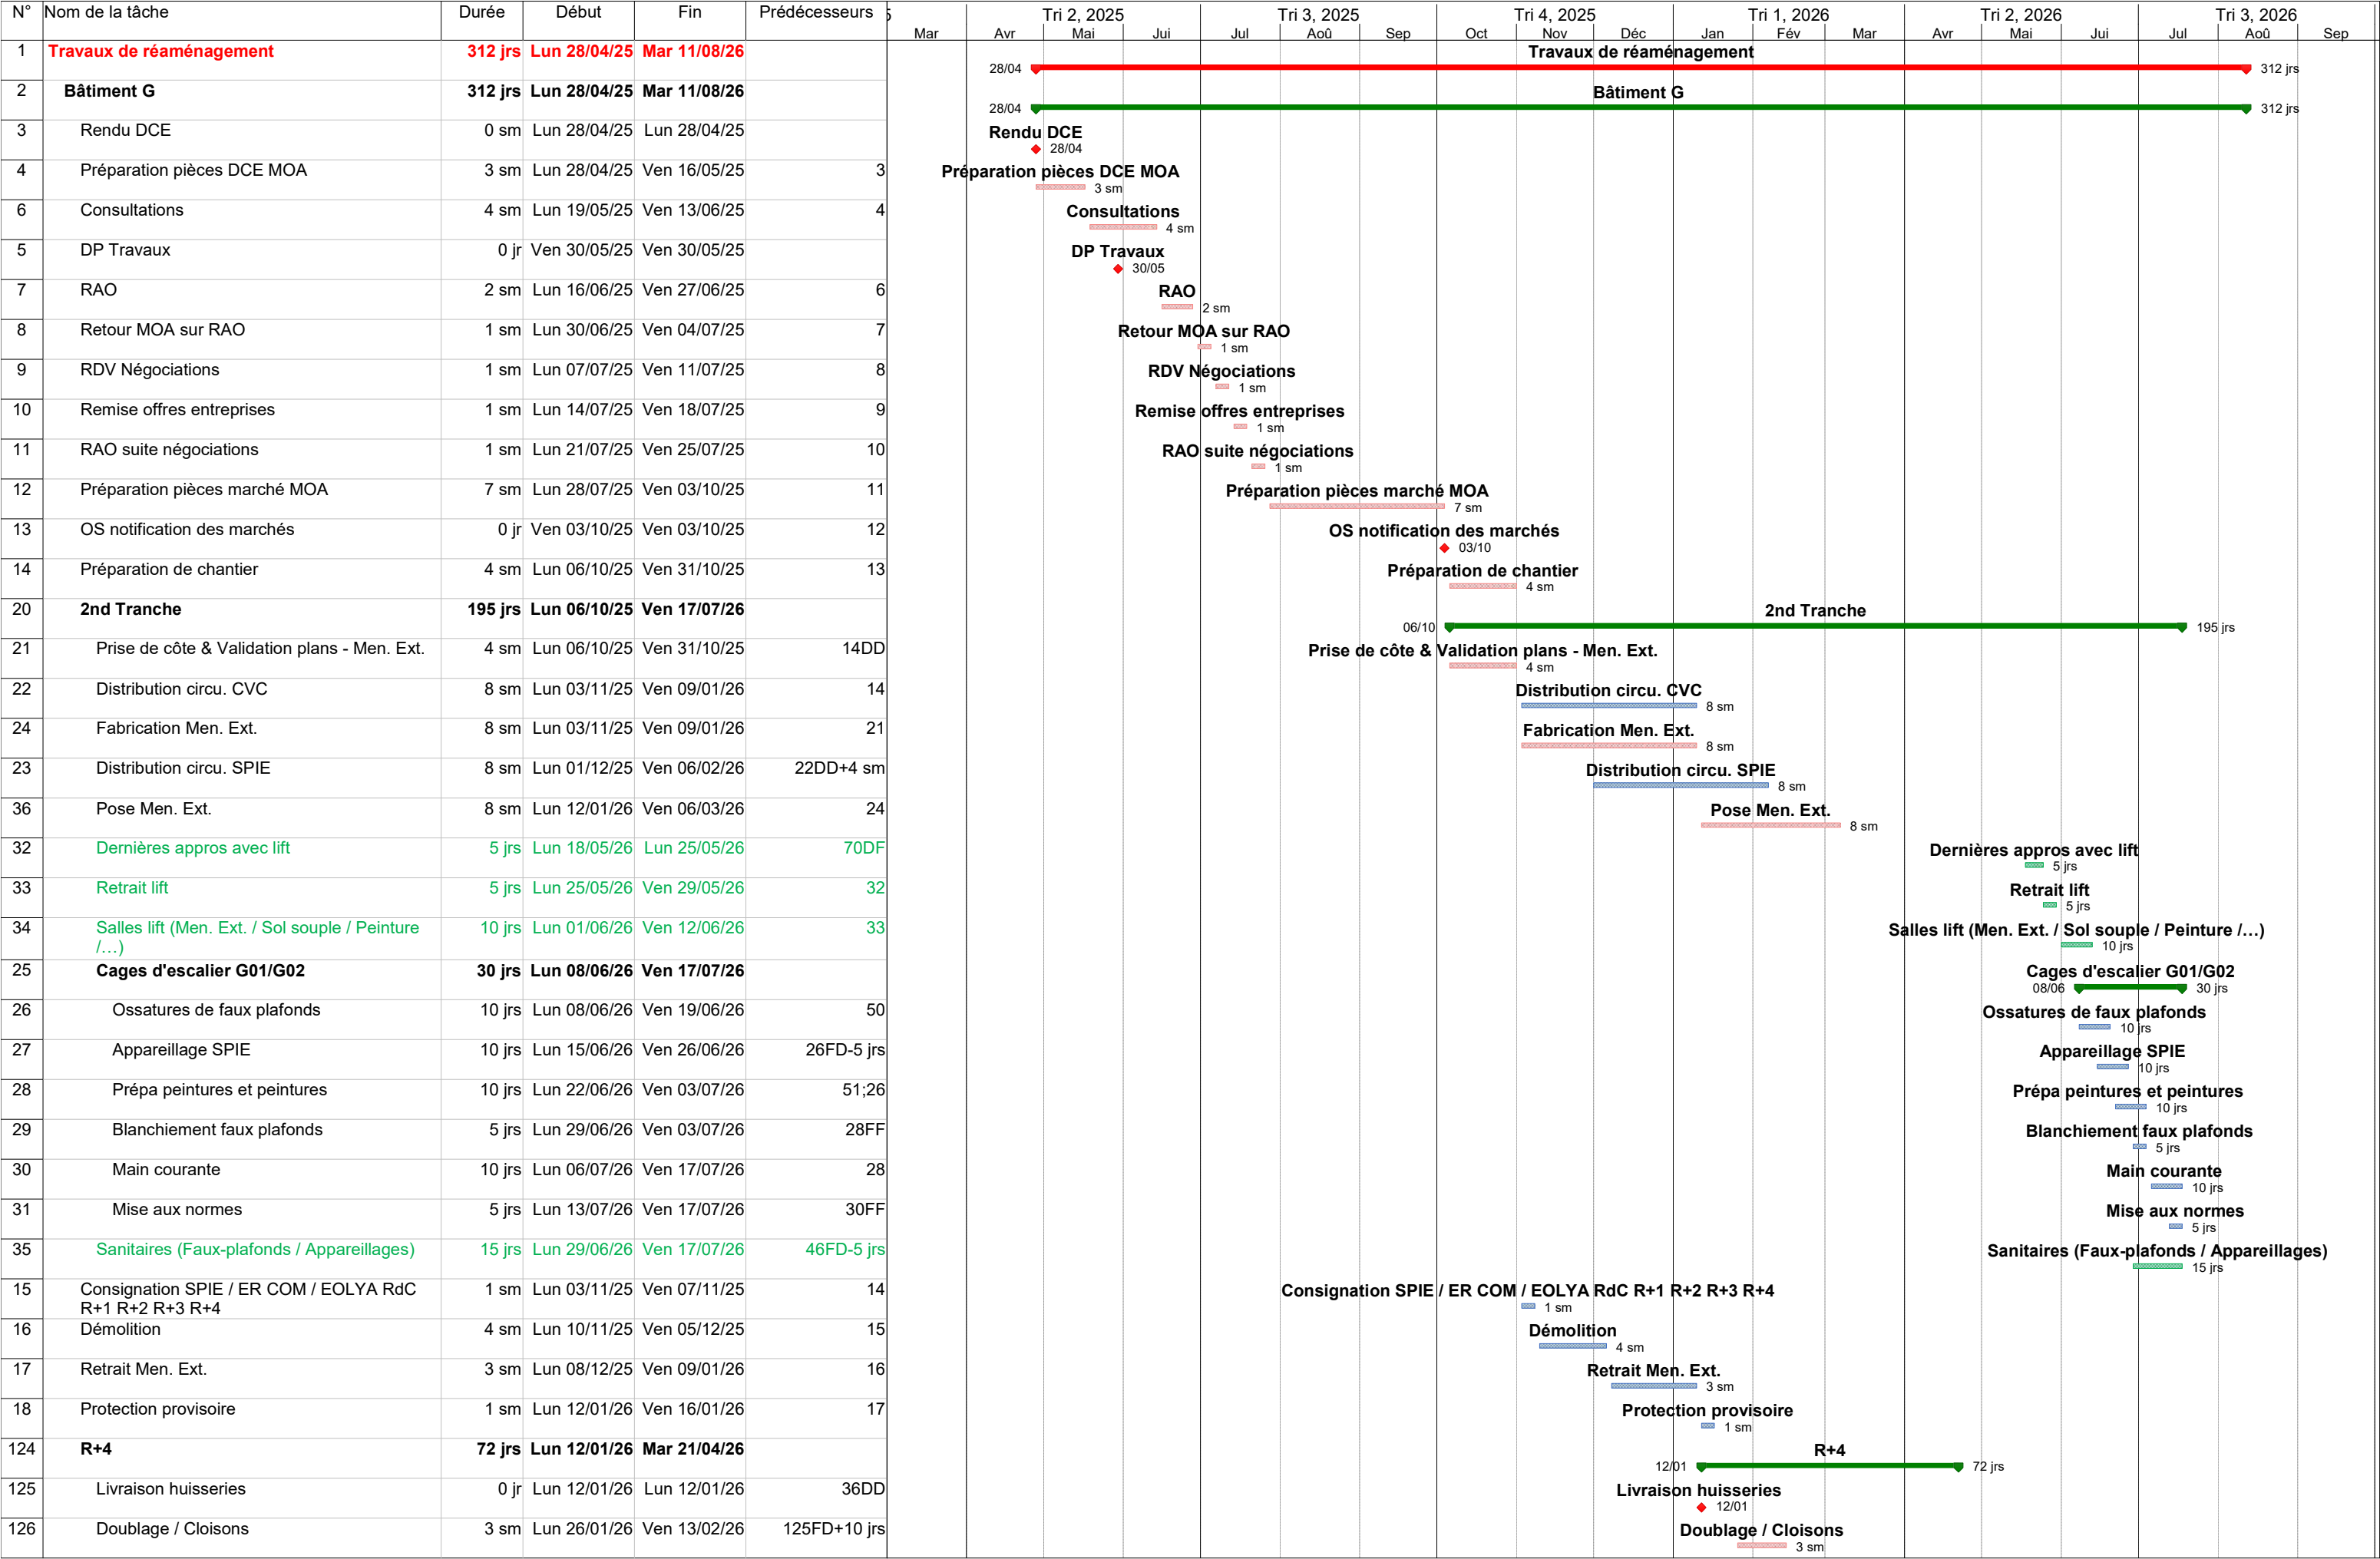

Réhabilitation du Bâtiment Stendhal - Saint Martin d'Hères
Planning DCE Bâtiment G PROVISOIRE -
16 Mai 2025

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Mar	Avr	Tri 2, 2025	Tri 3, 2025	Tri 4, 2025	Tri 1, 2026	Tri 2, 2026	Tri 3, 2026
131	Pose des bâtis supports	5 jrs	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	126FF-10 jrs						Pose des bâtis supports 5 jrs		
127	Distribution SPIE	10 jrs	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	126DD+5 jrs						Distribution SPIE 10 jrs		
128	Distribution EOLYA	10 jrs	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	127DD						Distribution EOLYA 10 jrs		
129	Distribution ER COM	10 jrs	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	127DD						Distribution ER COM 10 jrs		
132	Habillage bâtis supports	5 jrs	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26	131						Habillage bâtis supports 5 jrs		
133	Réception de supports CK / LAYE / SEBB	0 jr	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26	132						Réception de supports CK / LAYE / SEBB 06/02		
134	Chapes	5 jrs	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26	132						Chapes 5 jrs		
137	Prépa peintures	10 jrs	Lun 09/02/26	Ven 20/02/26	126FD-5 jrs						Prépa peintures 10 jrs		
130	Ossatures de faux plafonds	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	127						Ossatures de faux plafonds 10 jrs		
135	Plinthes / Cimaises	5 jrs	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26	126						Plinthes / Cimaises 5 jrs		
138	Peintures	5 jrs	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	137						Peintures 5 jrs		
139	Appareillage SPIE	10 jrs	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	138FD-5 jrs						Appareillage SPIE 10 jrs		
140	Appareillage ER COM	10 jrs	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	139DD						Appareillage ER COM 10 jrs		
141	Appareillage / Estrade GUILLON	10 jrs	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	139DD						Appareillage / Estrade GUILLON 10 jrs		
143	Sol souple	5 jrs	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	139						Sol souple 5 jrs		
136	Carrelage / Faïence	5 jrs	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	134FD+4 sm						Carrelage / Faïence 5 jrs		
144	Blanchiment faux plafonds	5 jrs	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	143						Blanchiment faux plafonds 5 jrs		
142	Appareillage EOLYA	5 jrs	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	136						Appareillage EOLYA 5 jrs		
145	Nettoyage	2 jrs	Lun 23/03/26	Mar 24/03/26	144						Nettoyage 2 jrs		
146	Pré-OPR Bâtiment G R+4	4 sm	Mer 25/03/26	Mar 21/04/26	145						Pré-OPR Bâtiment G R+4 4 sm		
101	R+3	77 jrs	Lun 02/02/26	Mar 19/05/26							R+3 02/02 77 jrs		
102	Livraison huisseries	0 jr	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26	103DD-10 jrs						Livraison huisseries 02/02		
103	Doublage / Cloisons	4 sm	Lun 16/02/26	Ven 13/03/26	126						Doublage / Cloisons 4 sm		
104	Distribution SPIE	15 jrs	Lun 23/02/26	Ven 13/03/26	103DD+5 jrs						Distribution SPIE 15 jrs		
109	Distribution EOLYA	15 jrs	Lun 23/02/26	Ven 13/03/26	104DD						Distribution EOLYA 15 jrs		
110	Distribution ER COM	15 jrs	Lun 23/02/26	Ven 13/03/26	104DD						Distribution ER COM 15 jrs		
111	Pose des bâtis supports	5 jrs	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	103FF-10 jrs						Pose des bâtis supports 5 jrs		
105	Habillage bâtis supports	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	111						Habillage bâtis supports 5 jrs		
112	Chapes	5 jrs	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	105						Chapes 5 jrs		
115	Prépa peintures	5 jrs	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	138;103FD-5 jrs						Prépa peintures 5 jrs		
106	Plinthes / Cimaises	5 jrs	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	103						Plinthes / Cimaises 5 jrs		
107	Ossatures de faux plafonds	10 jrs	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	104						Ossatures de faux plafonds 10 jrs		
116	Peintures	10 jrs	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	115						Peintures 10 jrs		
108	Réception de supports CK / LAYE / SEBB	0 jr	Mer 18/03/26	Mer 18/03/26	103FD+3 jrs						Réception de supports CK / LAYE / SEBB 18/03		
118	Appareillage SPIE	10 jrs	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	116FD-5 jrs						Appareillage SPIE 10 jrs		
119	Appareillage ER COM	10 jrs	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	118DD						Appareillage ER COM 10 jrs		
120	Appareillage GUILLON	5 jrs	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	118FF						Appareillage GUILLON 5 jrs		
114	Sol souple	5 jrs	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26	118						Sol souple 5 jrs		

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Mar	Avr	Tri 2, 2025	Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2025	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Tri 4, 2025	Jan	Tri 1, 2026	Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2026	Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2026	Aoû	Sep
113	Carrelage / Faïence	5 jrs	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26	112FD+4 sm;136																									
122	Blanchiment faux plafonds	5 jrs	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26	114																									
117	Nettoyage	2 jrs	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26	122																									
121	Appareillage EOLYA	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	113																									
123	Pré-OPR Bâtiment G R+3	4 sm	Mer 22/04/26	Mar 19/05/26	117																									
78	R+2	77 jrs	Lun 02/03/26	Mar 16/06/26																										
79	Livraison huisseries	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	80DD-10 jrs																									
80	Doublage / Cloisons	4 sm	Lun 16/03/26	Ven 10/04/26	103																									
81	Distribution SPIE	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	80DD+5 jrs																									
82	Distribution EOLYA	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	81DD																									
83	Distribution ER COM	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	81DD																									
84	Pose des bâtis supports	5 jrs	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	80FF-10 jrs																									
85	Habillage bâtis supports	5 jrs	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	84																									
89	Chapes	5 jrs	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26	85																									
92	Prépa peintures	5 jrs	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26	80FD-5 jrs;116																									
86	Plinthes / Cimaises	5 jrs	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26	80																									
87	Ossatures de faux plafonds	10 jrs	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	81																									
93	Peintures	10 jrs	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	92																									
88	Réception de supports CK / LAYE / SEBB	0 jr	Mer 15/04/26	Mer 15/04/26	80FD+3 jrs																									
94	Appareillage SPIE	10 jrs	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26	93FD-5 jrs																									
95	Appareillage ER COM	10 jrs	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26	94DD																									
96	Appareillage GUILLON	5 jrs	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26	94FF																									
91	Sol souple	5 jrs	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26	94																									
90	Carrelage / Faïence	5 jrs	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	89FD+4 sm;113																									
98	Blanchiment faux plafonds	5 jrs	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	91																									
97	Appareillage EOLYA	5 jrs	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	90																									
99	Nettoyage	2 jrs	Lun 18/05/26	Mar 19/05/26	98																									
100	Pré-OPR Bâtiment G R+2	4 sm	Mer 20/05/26	Mar 16/06/26	99																									
59	R+1	72 jrs	Lun 30/03/26	Mar 07/07/26																										
60	Livraison huisseries	0 jr	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26	61DD-10 jrs																									
61	Doublage / Cloisons	3 sm	Lun 13/04/26	Ven 01/05/26	80																									
62	Distribution SPIE	10 jrs	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26	61DD+5 jrs																									
64	Distribution EOLYA	10 jrs	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26	62DD																									
65	Distribution ER COM	10 jrs	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26	62DD																									
67	Prépa peintures	10 jrs	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26	61FD-5 jrs;93																									



Réhabilitation du Bâtiment Stendhal - Saint Martin d'Hères
Planning DCE Bâtiment G PROVISoire -
16 Mai 2025

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Mar	Avr	Tri 2, 2025	Tri 3, 2025	Tri 4, 2025	Tri 1, 2026	Tri 2, 2026	Tri 3, 2026
69	Peintures	5 jrs	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	67								
74	Appareillage SPIE	10 jrs	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	69FD-5 jrs								
75	Appareillage ER COM	10 jrs	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	74DD								
77	Appareillage EOLYA	5 jrs	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	74DD								
76	Appareillage GUILLON	5 jrs	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	74FF								
70	Sol souple	5 jrs	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26	74								
71	Blanchiement faux plafonds	5 jrs	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	70								
72	Nettoyage	2 jrs	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26	71								
73	Pré-OPR Bâtiment G R+1	4 sm	Mer 10/06/26	Mar 07/07/26	72								
37	RDC	55 jrs	Lun 20/04/26	Ven 03/07/26									
38	Livraison huisseries	0 jr	Lun 20/04/26	Lun 20/04/26	39DD-10 jrs								
39	Doublage / Cloisons	3 sm	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26	61								
49	Pose des bâtis support	5 jrs	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26	39FF-10 jrs								
40	Distribution SPIE	10 jrs	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	39DD+5 jrs								
41	Habillage bâtis supports	5 jrs	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	49								
43	Distribution EOLYA	10 jrs	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	40DD								
44	Distribution ER COM	10 jrs	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	40DD								
47	Prépa peintures	10 jrs	Lun 18/05/26	Ven 29/05/26	39FD-5 jrs;69								
45	Chapes	5 jrs	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26	39								
48	Plinthes	5 jrs	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26	39								
50	Ossatures de faux plafonds	10 jrs	Lun 25/05/26	Ven 05/06/26	40								
42	Réception de supports CK / LAYE / SEBB	0 jr	Mer 27/05/26	Mer 27/05/26	39FD+3 jrs								
51	Peintures	5 jrs	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	47								
52	Appareillage SPIE	10 jrs	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	51FD-5 jrs								
53	Appareillage ER COM	10 jrs	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	52DD								
54	Appareillage GUILLON	5 jrs	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	52DD								
55	Appareillage EOLYA	5 jrs	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26	54								
56	Sol souple	5 jrs	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	52								
57	Blanchiement faux plafonds	5 jrs	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26	56								
46	Carrelage / Faïence	5 jrs	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26	45FD+4 sm;90								
58	Nettoyage	2 jrs	Lun 29/06/26	Mar 30/06/26	57								
19	OPR 2nd Tranche	2 sm	Mer 01/07/26	Mar 14/07/26	100;123;146;58;72FF								
148	Nettoyage Réception	5 jrs	Mer 08/07/26	Mar 14/07/26	19FF								
147	Commission de sécurité	0 jr	Mar 14/07/26	Mar 14/07/26	19								
149	Réception (sous-réserve commission)	4 sm	Mer 15/07/26	Mar 11/08/26	148								
150	Déménagement	2 sm	Mer 29/07/26	Mar 11/08/26	149FF								
