


Page 1



Réhabilitation et Extension SUPMICROTECH - BESANCON																														
PLANNING TRAVAUX - PHASE PRO																														
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Année 26												Année 27													
					Sep 25	Oct 25	Nov 25	Déc 25	Jan 26	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27
43	Emménagement Salle A11	2 sm	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26																										
44	Zone C - Réfection salles A6	40 jours	Lun 30/03/26	Ven 22/05/26																										
45	Dépose - Curage	1 sm	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26																										
46	Pose cloison	1 sm	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26																										
47	Pose réseaux Fluides et Electricité	2 sm	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26																										
48	Pose plafonds	3 sm	Lun 20/04/26	Ven 08/05/26																										
49	Pose des équipements fluides	2 sm	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26																										
50	Pose des équipements Electricité	2 sm	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26																										
51	Pose du sol	2 sm	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26																										
52	Peinture et finitions	3 sm	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26																										
53	Réception et mise à disposition de la zone	0 sm	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26																										
54	Zone D - Réalisation de la tour	60 jours	Lun 08/06/26	Ven 28/08/26																										
55	Dépose - Curage	1 sm	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26																										
56	Renforcement plancher	1 sm	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26																										
57	Pose structure principale bois	2 sm	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26																										
58	Pose plancher bois CLT	1 sm	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26																										
59	Finitions structure bois	1 sm	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26																										
60	Pose cloisons, menuiseries et façades	2 sm	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26																										
61	Pose réseaux Fluides et Electricité	2 sm	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26																										
62	Pose plafonds	3 sm	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26																										
63	Pose des équipements fluides	2 sm	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26																										
64	Pose des équipements Electricité	2 sm	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26																										
65	Pose du sol	2 sm	Lun 03/08/26	Ven 14/08/26																										
66	Finitions	2 sm	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26																										
67	Réception et mise à disposition de la zone	0 sm	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26																										
68	TRAVAUX - PHASE 2	180 jours	Lun 18/01/27	Ven 24/09/27																										
69	Déménagement des salles informatiques dans	1 mois	Lun 18/01/27	Ven 12/02/27																										
70	Zone E - Réfection salles A6	40 jours	Lun 15/02/27	Ven 09/04/27																										
71	Dépose - Curage	1 sm	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27																										
72	Pose cloisons	1 sm	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27																										
73	Pose réseaux Fluides et Electricité	2 sm	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27																										
74	Pose plafonds	3 sm	Lun 08/03/27	Ven 26/03/27																										
75	Pose des équipements fluides	2 sm	Lun 15/03/27	Ven 26/03/27																										
76	Pose des équipements Electricité	2 sm	Lun 15/03/27	Ven 26/03/27																										
77	Pose du sol	2 sm	Lun 29/03/27	Ven 09/04/27																										
78	Peinture et finitions	3 sm	Lun 22/03/27	Ven 09/04/27																										
79	Réception et mise à disposition de la zone	0 sm	Ven 09/04/27	Ven 09/04/27																										
80	Zone F - Réfection des salles A2 et A3	60 jours	Lun 15/02/27	Ven 07/05/27																										
81	Dépose - Curage	1 sm	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27																										
82	Pose cloisons et menuiseries	2 sm	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27																										
83	Pose réseaux Fluides et Electricité	4 sm	Lun 22/02/27	Ven 19/03/27																										
84	Pose plafonds	3 sm	Lun 22/03/27	Ven 09/04/27																										

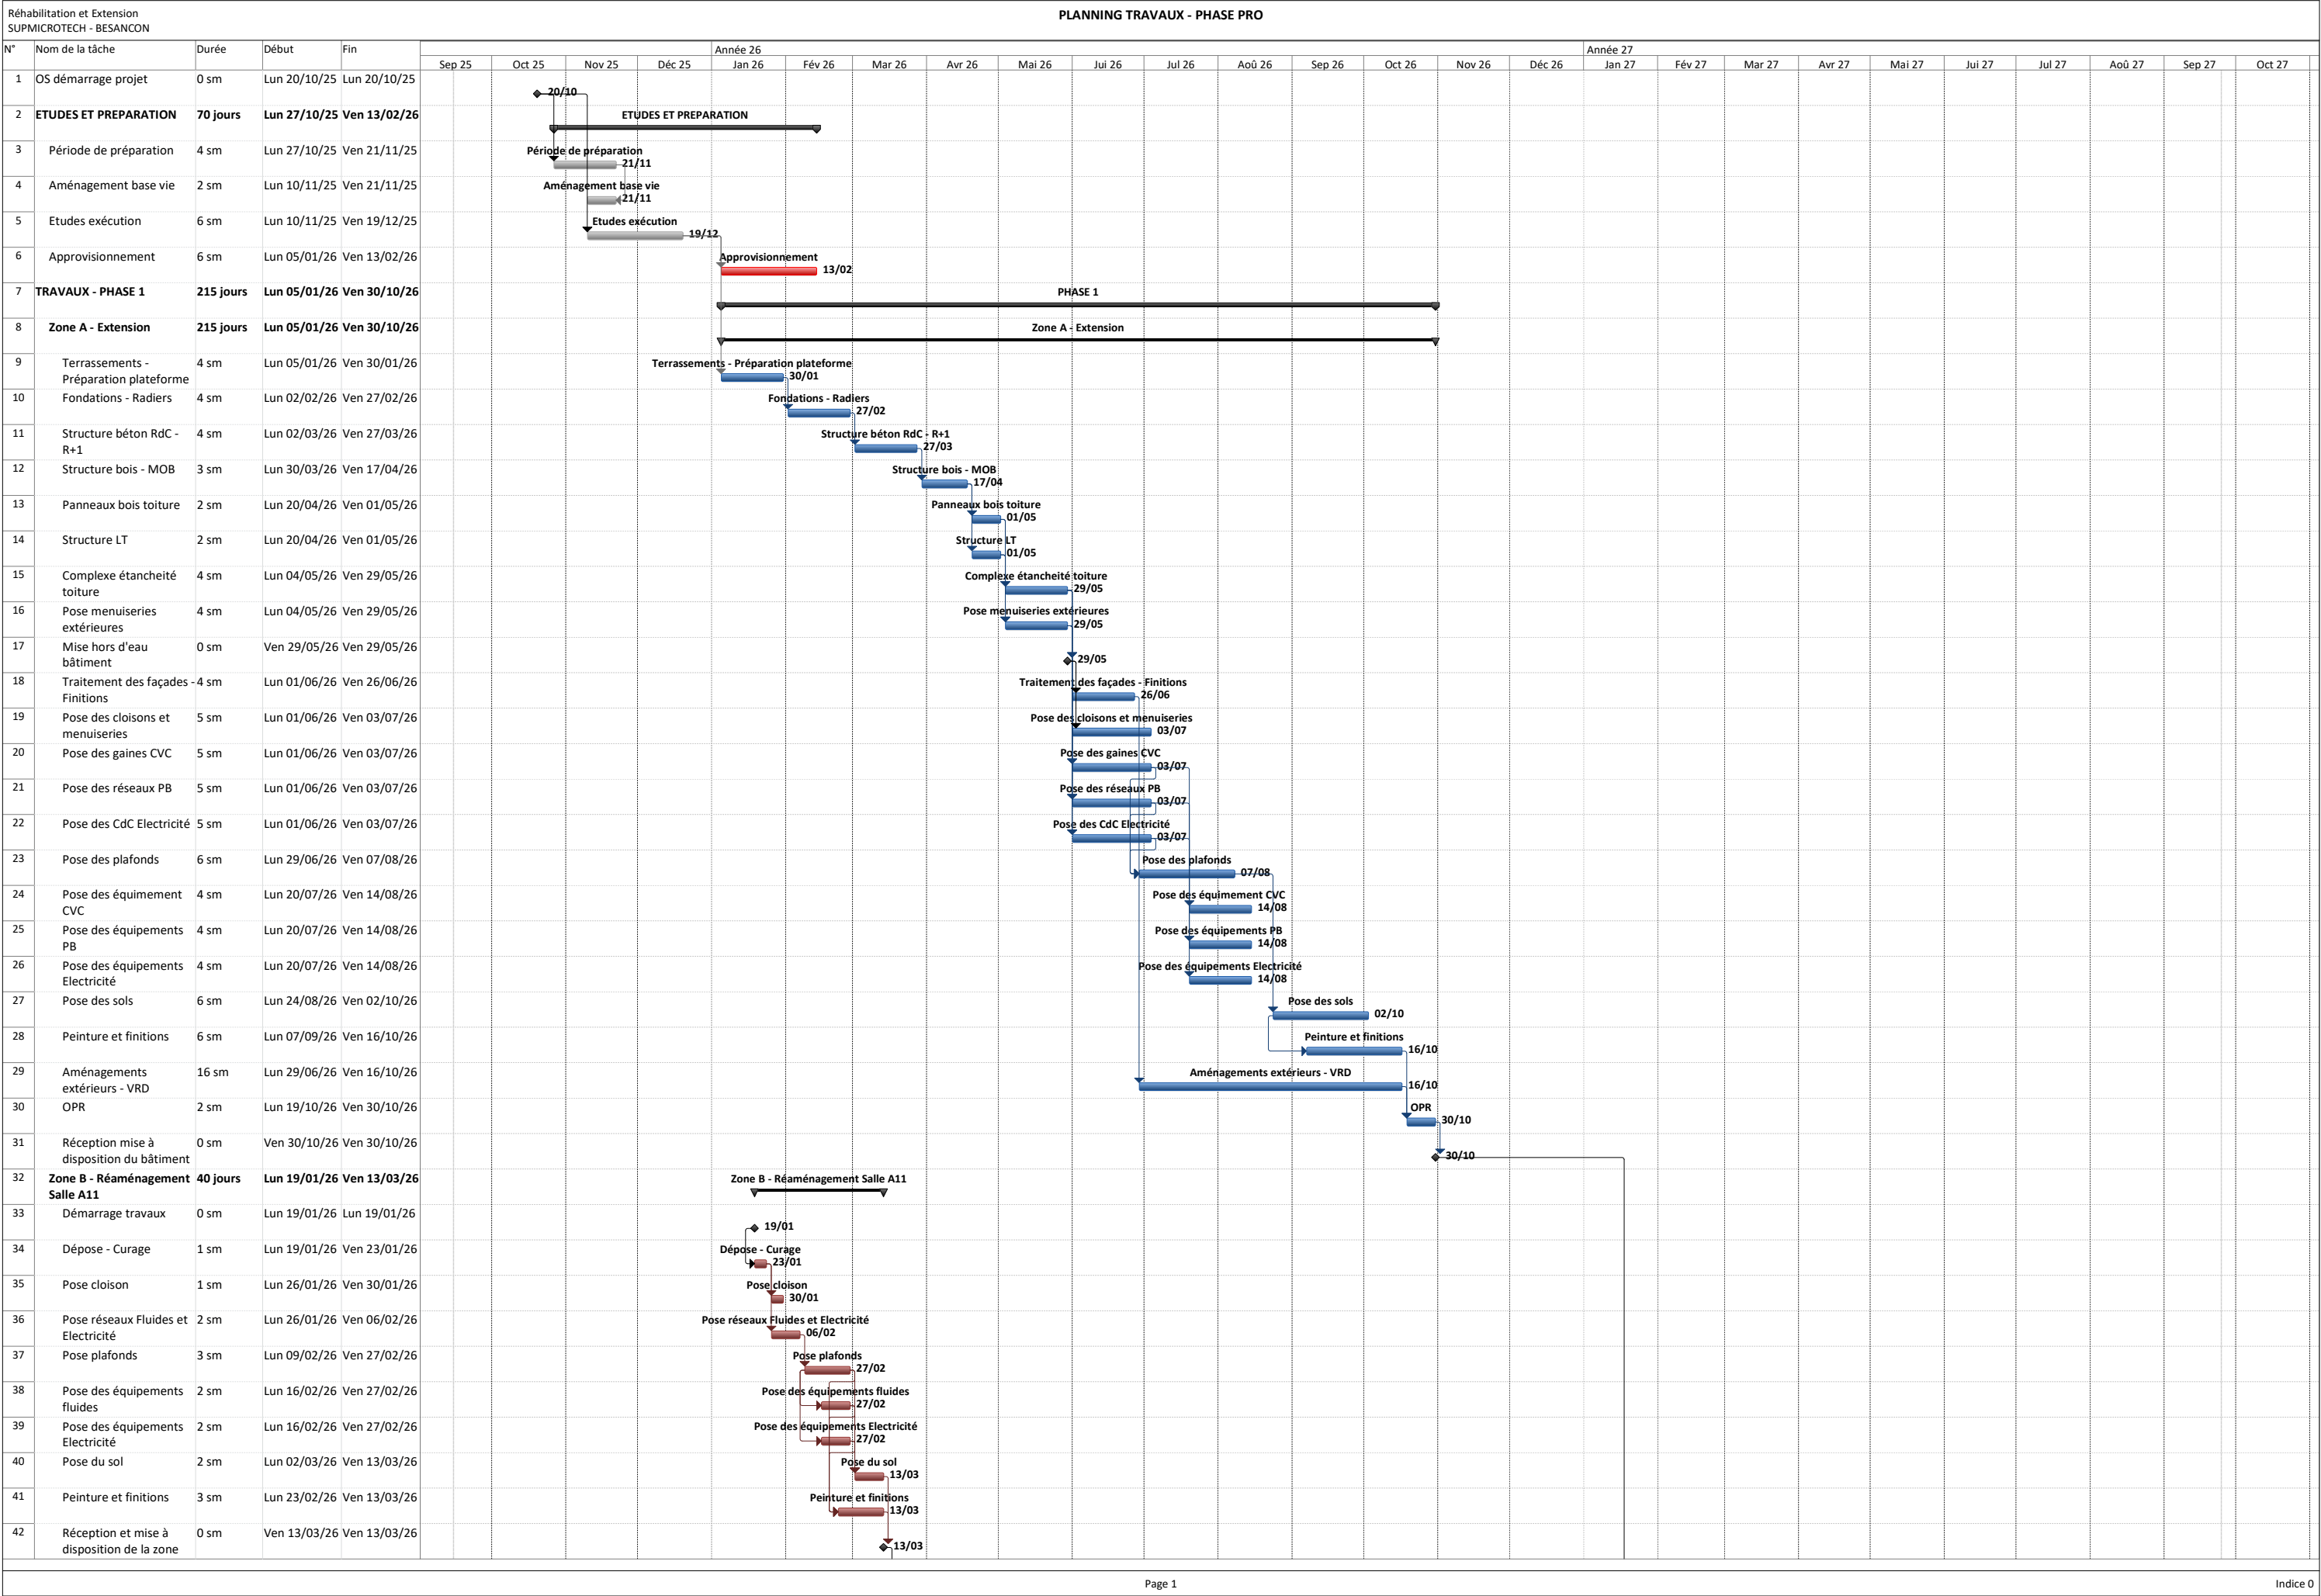
