



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
pour l'administration**

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

(En application des articles L1111-1, L2123-1, L2125-1 et R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande publique)

COSI : 465619 - Projet n° 2025-USID04-002

Objet :

OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Bâtiment 0004 (HM5)

Adaptation et mise aux normes des locaux de la méthode de ressuage

**RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT REALISATION DE
TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**

(réalisé par la société **BUREAU VERITAS** en juin 2025)

ANNEXE N°4 AU CCTP

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26596735/S2/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 19/06/2025**Référence au programme de travaux :**
RESSUAGE OCHEY 54 réalisé le 20/03/2025 par

DONNEUR D'ORDRE

Matthieu PERROT
1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2


SITE D'INTERVENTION

540405001T - BASE AERIENNE133 - GEPBP 40334 - OCHEY
54170 THUILLEY AUX GROSEILLES**Bat 004****Date(s) d'intervention(s) :**
Le 20/05/2025 ; Le 03/06/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Olivier JEANSON	Responsable opérationnel	Certification N° B2C 0763	Olivier JEANSON
			

Le présent rapport comporte 35 pages, dont 24 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	11
7. ANNEXES	12
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	12
7.2. Photos prélèvements	13
7.3. Photos sondages	16
7.4. Attestation d'assurance	17
7.5. Certificat de compétence	19
7.6. Croquis de repérage	20
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	25

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
ouverture dans la cloison entre local 056 et 070 pour création de porte dépose de la porte dans local 057 remise en peinture des porte du sas percement au sol dans le local 055

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	Peintures décoratives
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

LOCAL 055 070 057 SAS LOCAL 056

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
1	BAT 004 -> 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris
1	BAT 004 -> 057	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris
1	BAT 004 -> 070	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 540405001T - BASE AERIENNE133 - GEP
BP 40334 - OCHEY
54170 THUILLEY AUX GROSEILLES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
540405001T - BASE AERIENNE133 - GEP	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Matthieu PERROT	Donneur d'ordre	/	1 BOULEVARD ARCHIMEDE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	/
Didier RONSALDER	Accompagnateur	/	/	+33 3 83 87 19 18

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 20/05/2025
Le 03/06/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Fiche technique / RESSUAGE	/	20/03/2025	OCHEY 54	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 004 -> SAS	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Vert	5	/	S2	AN	/	Non
BAT 004 -> 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P6* P	/	AN	/	Oui
BAT 004 -> 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P16 P	/	AN	/	Oui
BAT 004 -> 055	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Vert	5	P10* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 055	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Vert	5	P11 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 057	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	2	/	S3	AN	/	Non
BAT 004 -> 057	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	/	S4	AN	/	Non
BAT 004 -> 057	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	6	/	S5	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 004 -> 057	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Beige, Bleu	7	P12* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 057	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	Idem P 6	/	AN	/	Oui
BAT 004 -> 070	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	6	P9* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 070	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	2	P7* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 070	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P8* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 070	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	/	S1	AN	/	Oui
BAT 004 -> 056	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	4	P5* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P1* N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P17 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	2	P2 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P3 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P4 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Beige, Bleu	7	P13 N	/	AN	/	Non
BAT 004 -> 056	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Beige	8	P14* N	/	AN	/	Non

BAT 004 -> 056	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Beige	8	P15 N	/	AN	/	Non
----------------	-------------------------	-----------------------	---	-------	---	----------	---	----	---	-----

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	30 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT 004	/
BAT 004 -> SAS	/
BAT 004 -> 055	/
BAT 004 -> 057	/
BAT 004 -> 070	/
BAT 004 -> 056	/

7.2. Photos prélèvements


P6	ZPSO 1
BAT 004 -> 055	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P16	ZPSO 1
BAT 004 -> 055	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P10	ZPSO 5
BAT 004 -> 055	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P11	ZPSO 5
BAT 004 -> 055	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P12	ZPSO 7
BAT 004 -> 057	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

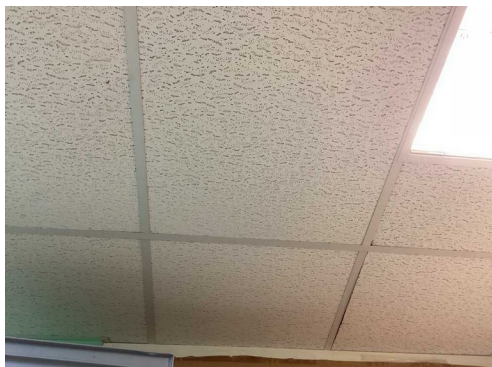P9	ZPSO 6
BAT 004 -> 070	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P7	ZPSO 2
BAT 004 -> 070	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P8	ZPSO 3
BAT 004 -> 070	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 4
BAT 004 -> 056	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P1	ZPSO 9
BAT 004 -> 056	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P17	ZPSO 9
BAT 004 -> 056	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P2	ZPSO 2
BAT 004 -> 056	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P3	ZPSO 3
BAT 004 -> 056	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 3
BAT 004 -> 056	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 7
BAT 004 -> 056	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P14	ZPSO 8
BAT 004 -> 056	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P15	ZPSO 8
BAT 004 -> 056	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


7.3. Photos sondages

S2	ZPSO 5
BAT 004 -> SAS	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S3	ZPSO 2
BAT 004 -> 057	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

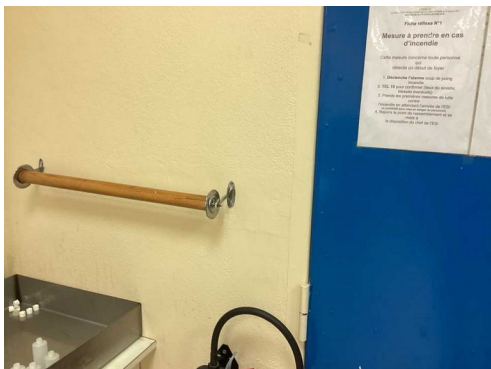S4	ZPSO 3
BAT 004 -> 057	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S5	ZPSO 6
BAT 004 -> 057	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S1	ZPSO 1
BAT 004 -> 070	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michélet Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES

Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0763

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :
Olivier JEANSON
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).	
Obtenu le : 28/06/2019	Valable jusqu'au : 27/06/2024*
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.	

Fait à STRASBOURG, le 17 mai 2024

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER




*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com


7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	54040500IT - BASE AERIENNEI33 - GEP BP 40334 - OCHEY 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	
Localisation BAT 004	Date visite	Le 20/05/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	26596735/S2/I
	Planche	1 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

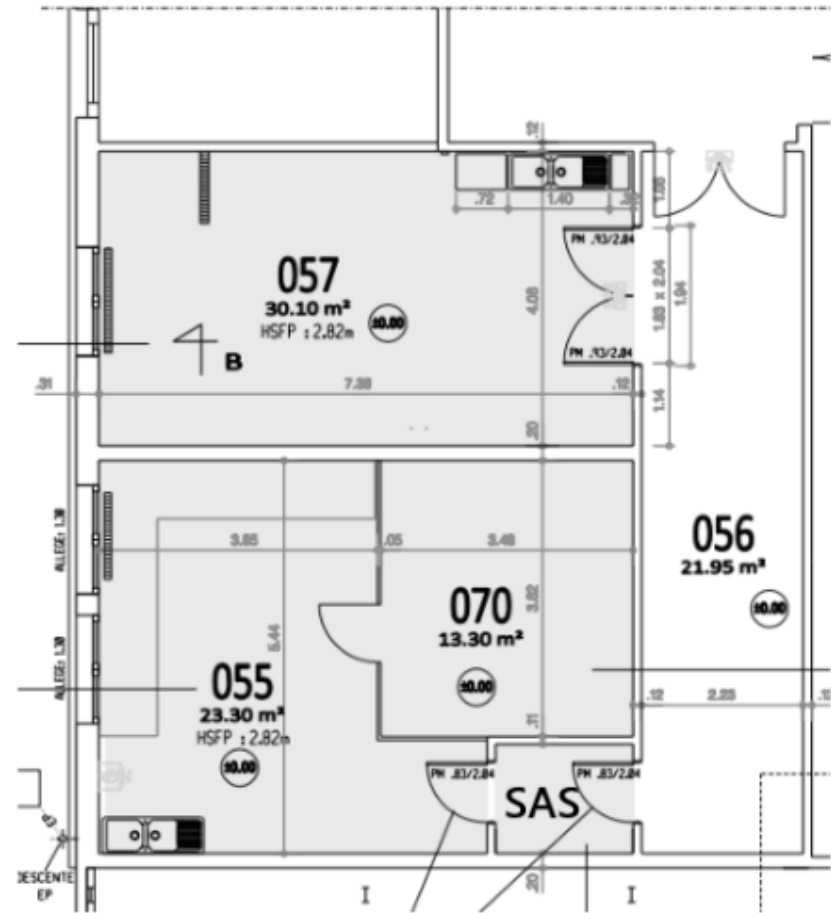

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	54040500IT - BASE AERIENNEI33 - GEP BP 40334 - OCHEY 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	
Localisation BAT 004	Date visite	Le 20/05/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	26596735/s2/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ▼▼▼▼▼ Colles de carrelage		

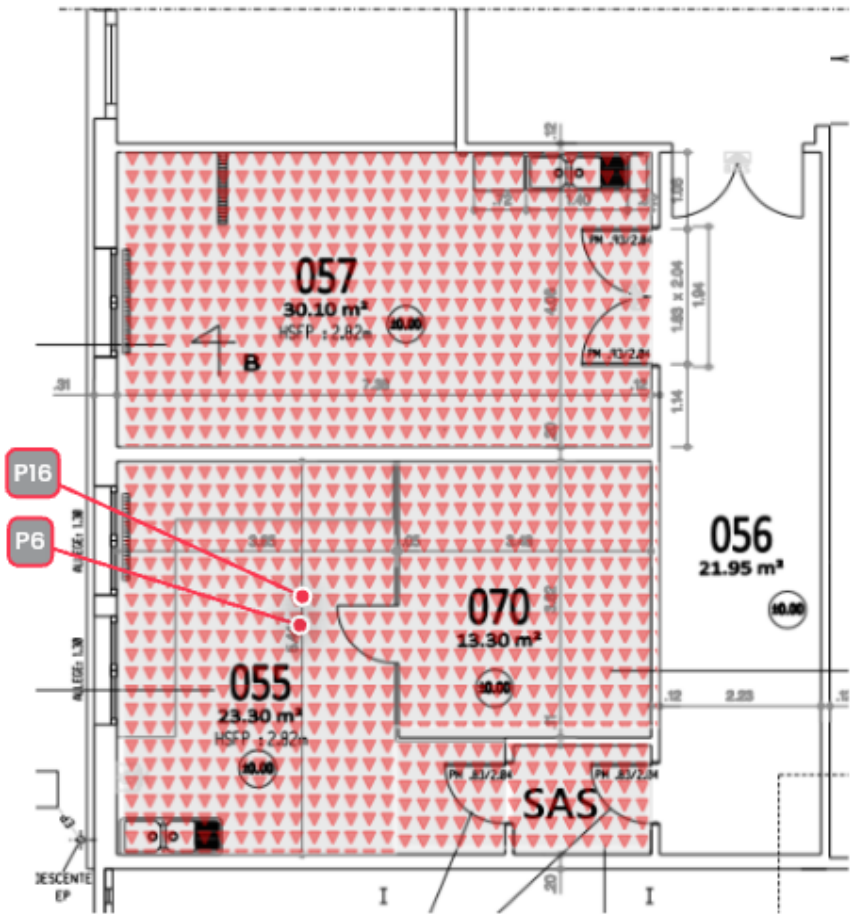

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	54040500IT - BASE AERIENNEI33 - GEP BP 40334 - OCHEY 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	
Localisation BAT 004	Date visite	Le 20/05/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	26596735/S2/I
	Planche	3 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		


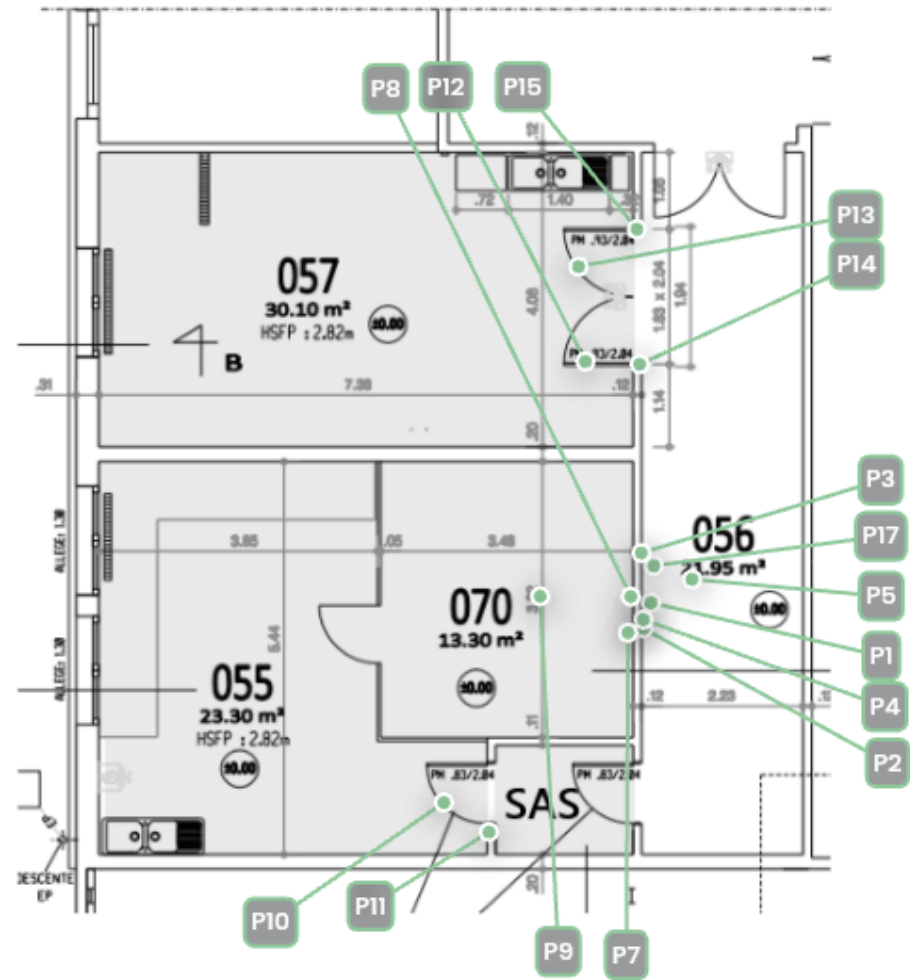


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	54040500IT - BASE AERIENNEI33 - GEP BP 40334 - OCHEY 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	
Localisation BAT 004	Date visite	Le 20/05/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	26596735/s2/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

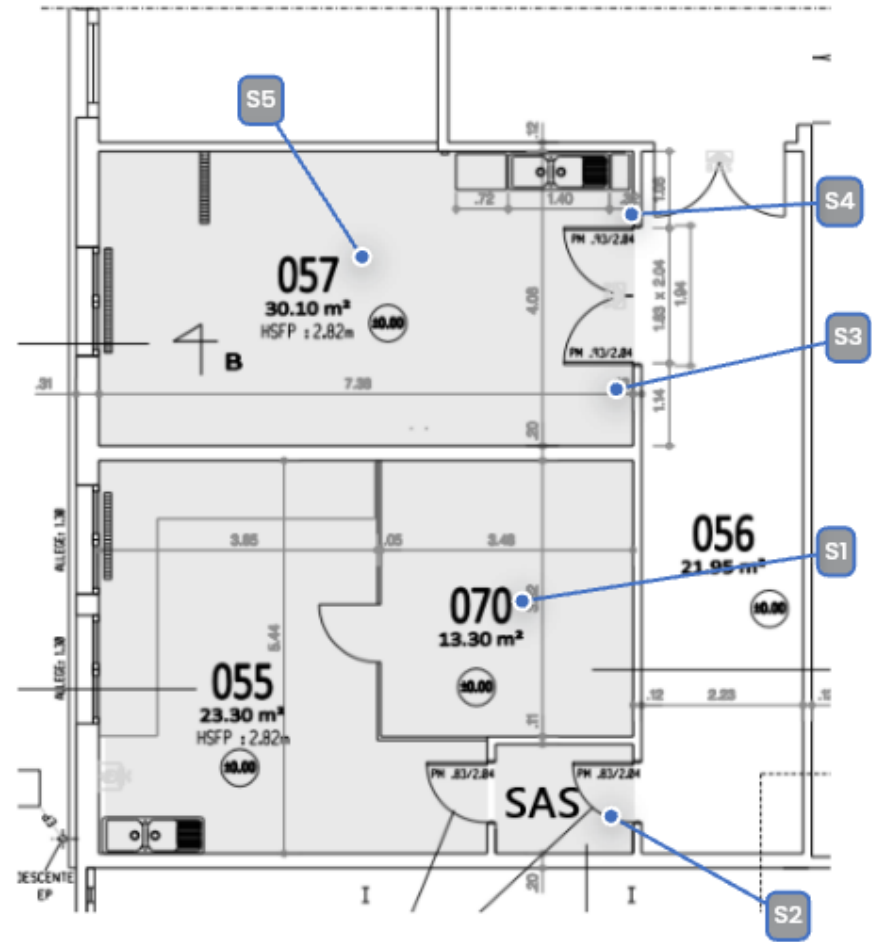

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-052797-01

Numéro de dossier : 25A017188

Référence de dossier : 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A017188-001 - Référence *BV3MV2135 Réf. Prel : P1 BAT 004 - 056/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-002 - Référence *BV3MV2136 Réf. Prel : P2 BAT 004 - 056/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-003 - Référence *BV3MV2137 Réf. Prel : P3 BAT 004 - 056/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-004 - Référence *BV3MV2138 Réf. Prel : P4 BAT 004 - 056/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-005 - Référence *BV3MV2139 Réf. Prel : P5 BAT 004 - 056/Faux plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-006 - Référence *BV3MV2140 Réf. Prel : P6 BAT 004 - 055/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-007 - Référence *BV3MV2141 Réf. Prel : P7 BAT 004 - 070/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A017188-008 - Référence *BV3MV2142 Réf. Prel : P8 BAT 004 - 070/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-009 - Référence *BV3MV2143 Réf. Prel : P9 BAT 004 - 070/Faux plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-010 - Référence *BV3MV2144 Réf. Prel : P10 BAT 004 - 055/Menuiseries intérieures - (Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-011 - Référence *BV3MV2145 Réf. Prel : P11 BAT 004 - 055/Menuiseries intérieures - (Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-012 - Référence *BV3MV2146 Réf. Prel : P12 BAT 004 - 057/Menuiseries intérieures - (Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-013 - Référence *BV3MV2147 Réf. Prel : P13 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-014 - Référence *BV3MV2148 Réf. Prel : P14 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A017188-015 - Référence *BV3MV2149 Réf. Prel : P15 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030586-01 Date d'émission de rapport : 26/05/2025 3:15 Page 1/5
Référence laboratoire N° : 25RI036733 Référence de suivi du dossier N° : 25A017188
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025 Date de réception : 21/05/2025
Date d'analyse : 22/05/2025
Référence dossier Client: 25A017188 - 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25A017188-001 - BV3MV2135 Réf. Prel : P1 BAT 004 - 056/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A017188-002 - BV3MV2136 Réf. Prel : P2 BAT 004 - 056/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A017188-003 - BV3MV2137 Réf. Prel : P3 BAT 004 - 056/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris)	MET /ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030586-01 Référence laboratoire N° : 25RI036733 Reçu au laboratoire le : 22/05/2025 Date d'analyse : 22/05/2025 Référence dossier Client:25A017188 - 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1	Date d'émission de rapport : 26/05/2025 3:15 Référence de suivi du dossier N° : 25A017188 Date de réception :21/05/2025
---	---

Page2/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A017188-004 - BV3MV2138 Réf. Prel : P4 BAT 004 - 056/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A017188-005 - BV3MV2139 Réf. Prel : P5 BAT 004 - 056/Faux plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	25A017188-006 - BV3MV2140 Réf. Prel : P6 BAT 004 - 055/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	25A017188-007 - BV3MV2141 Réf. Prel : P7 BAT 004 - 070/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030586-01 Référence laboratoire N° : 25RI036733 Reçu au laboratoire le : 22/05/2025 Date d'analyse : 22/05/2025 Référence dossier Client:25A017188 - 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1	Date d'émission de rapport : 26/05/2025 3:15 Référence de suivi du dossier N° : 25A017188 Date de réception :21/05/2025
---	---

Page3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25A017188-008 - BV3MV2142 Réf. Prel : P8 BAT 004 - 070/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A017188-009 - BV3MV2143 Réf. Prel : P9 BAT 004 - 070/Faux plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A017188-010 - BV3MV2144 Réf. Prel : P10 BAT 004 - 055/Menuiseries intérieures - (Vert)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A017188-011 - BV3MV2145 Réf. Prel : P11 BAT 004 - 055/Menuiseries intérieures - (Vert)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25A017188-012 - BV3MV2146 Réf. Prel : P12 BAT 004 - 057/Menuiseries intérieures - (Beige, Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030586-01	Date d'émission de rapport : 26/05/2025 3:15	Page 4/5
Référence laboratoire N° : 25RI036733	Référence de suivi du dossier N° : 25A017188	
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025	Date de réception : 21/05/2025	
Date d'analyse : 22/05/2025		
Référence dossier Client: 25A017188 - 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25A017188-013 - BV3MV2147 Réf. Prel : P13 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige, Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A017188-014 - BV3MV2148 Réf. Prel : P14 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A017188-015 - BV3MV2149 Réf. Prel : P15 BAT 004 - 056/Menuiseries intérieures - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030586-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 3:15

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 25RI036733

Référence de suivi du dossier N° : 25A017188

Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Date de réception : 21/05/2025

Date d'analyse : 22/05/2025

Référence dossier Client: 25A017188 - 1510797887/26596735/S2/1/1_26596735/2/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 1er juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajoutée dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Olivia Wróbel

Chef d'équipe suppléant

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-066108-01

Numéro de dossier : 25A018952

Référence de dossier : 1510797887/26596735/S2/1/2_26596735/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A018952-001 - Référence *BV3MV2270 Réf. Prel : P16 BAT 004 - 055/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A018952-002 - Référence *BV3MV2271 Réf. Prel : P17 BAT 004 - 056/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-040147-01 Date d'émission de rapport : 07/06/2025 0:17 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 25RB018465 Référence de suivi du dossier N° : 25A018952
Reçu au laboratoire le : 05/06/2025 Date de réception : 04/06/2025
Date d'analyse : 05/06/2025
Référence dossier Client: 25A018952 - 1510797887/26596735/S2/1/2_26596735/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	25A018952-001 - BV3MV2270 Réf. Prel : P16 BAT 004 - 055/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP /S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (3)	25A018952-002 - BV3MV2271 Réf. Prel : P17 BAT 004 - 056/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-040147-01

Référence laboratoire N° : 25RB018465

Reçu au laboratoire le : 05/06/2025

Date d'analyse : 05/06/2025

Référence dossier Client:25A018952 - 1510797887/26596735/S2/1/2_26596735/2/1

Date d'émission de rapport : 07/06/2025 0:17

Référence de suivi du dossier N° : 25A018952

Date de réception : 04/06/2025

Page 2/2

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Sef serviciu CRO 007
