


AMPHITHEATRES M1 ET P1

PHASE DCE

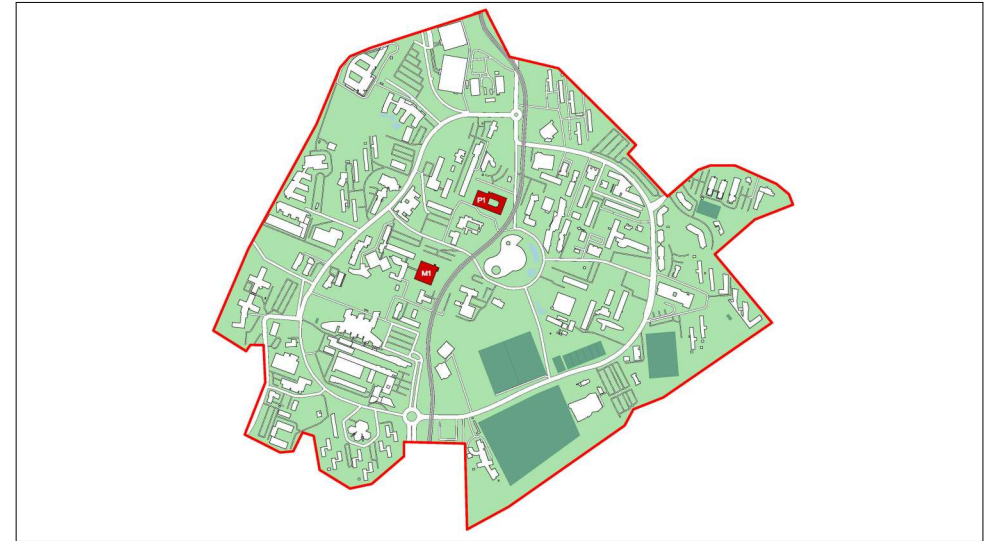

UNIVERSITE DE LILLE	MAITRISE D'OUVRAGE	42 rue Paul Duez 59000 LILLE	Tel : 07 89 40 69 16
CARTA - REICHEN ET ROBERT ASS.	ARCHITECTES URBANISTES	17 rue Brezin 75014 PARIS	Tel : 01 53 90 12 35
PROJEX	BET TCE - DESAMIANTAGE - ECO	30 place Salvador Allende 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tel : 03 20 47 03 01
DIAGOBAT	BET ACOUSTIQUE - REEMPLOI	30 place Salvador Allende 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tel : 03 20 47 03 01
APAVE	BUREAU DE CONTROLE - SPS	340 av. de la Mame - CS 43013 59703 Marcq en Baroeul Cedex	Tel : 06 73 97 75 55

PLANNING TRAVAUX DETAILLE M1 - PHASE 1

EMETTEUR	CODE AFFAIRE	ECHELLE	FORMAT	INDICE	DATE	N° DE PLAN	PHASE
IMPERIUM	25011MP1		A3	A	17/10/2025	E402	PRO/DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027	
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1	PLANNING ENVELOPPE DES TRAVAUX BATIMENTS M1	354 jrs	Lun 12/05/25	Mar 01/12/26		PLANNING ENVELOPPE DES TRAVAUX BATIMENTS M1								
2	PHASE ETUDES	180 jrs	Lun 12/05/25	Lun 02/03/26		PHASE ETUDES								
3	DIAG / ESQ	22 jrs	Lun 12/05/25	Ven 13/06/25		DIAG / ESQ 12/05 — 13/06								
4	AVP	29 jrs	Lun 16/06/25	Ven 25/07/25		AVP 16/06 — 25/07								
5	PRO / DCE	40 jrs	Lun 25/08/25	Ven 17/10/25			PRO / DCE 25/08 — 17/10							
6	DP	0 jr	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25			6 - 23/10 ♦ DP							
7	Validation de PRO / DCE	2 sem.	Lun 20/10/25	Lun 03/11/25			Validation de PRO / DCE 20/10 — 03/11							
8	AO lots DESIAMANTAGE & CURAGE	47 jrs	Ven 25/07/25	Lun 20/10/25		AO lots DESIAMANTAGE & CURAGE 25/07 — 20/10								
9	AO lots REAMENAGEMENTS	39 jrs	Mer 12/11/25	Lun 19/01/26			AO lots REAMENAGEMENTS 12/11 — 19/01							
10	Analyse des offres	17 jrs	Mar 20/01/26	Mer 11/02/26			Analyse des offres 20/01 — 11/02							
11	CAO	0 jr	Mer 11/02/26	Mer 11/02/26			11 - 11/02 ♦ CAO							
12	Délai de standstill	14 jrs	Mer 11/02/26	Lun 02/03/26			Délai de standstill 11/02 — 02/03							
13	Notification des marchés	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26			13 - 02/03 ♦ Notification des marchés							
14	JALONS ADMINISTRATIFS	215 jrs	Lun 05/01/26	Mar 01/12/26					JALONS ADMINISTRATIFS					
15	BAT M1 : FERMETURE COMPLETE DU BATIMENT	215 jrs	Lun 05/01/26	Mar 01/12/26				05/01	BAT M1 : FERMETURE COMPLETE DU BATIMENT				01/12	
16	TRAVAUX	215 jrs	Lun 05/01/26	Mar 01/12/26					TRAVAUX					

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027	
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
17	INSTALLATION DE CHANTIER	2 sem.	Lun 05/01/26	Lun 19/01/26					INSTALLATION DE CHANTIER 05/01 — 19/01					
18	PHASE DE PREPARATION	10 sem.	Lun 05/01/26	Mer 18/03/26					PHASE DE PREPARATION 05/01 — 18/03					
19	BATIMENT M1	215 jrs	Lun 05/01/26	Mar 01/12/26					BATIMENT M1					
20	LOT 00 : Désamiantage - curage	12 sem.	Lun 05/01/26	Jeu 02/04/26					LOT 00 : Désamiantage - curage 05/01 — 02/04					
21	Lot 01: gros œuvre	4 sem.	Jeu 02/04/26	Mar 05/05/26					Lot 01: gros œuvre 02/04 — 05/05					
22	Lot 02: Menuiseries extérieures	26,43 jrs	Mar 05/05/26	Lun 15/06/26					Lot 02: Menuiseries extérieures					
23	Dépose chassis & portes	3 sem.	Mar 05/05/26	Lun 01/06/26					Dépose chassis & portes 05/05 — 01/06					
24	Déplacement d'allège vitrée avec grille de ventilation	2 sem.	Lun 01/06/26	Lun 15/06/26					Déplacement d'allège vitrée avec grille de ventilation 01/06 — 15/06					
25	Lot 02: Serrurerie – Rénovation d'une œuvre murale artistique	103,86 jrs	Mar 05/05/26	Ven 23/10/26					Lot 02: Serrurerie – Rénovation d'une œuvre murale artistique					
26	Escalier métallique de secours	3 sem.	Mar 05/05/26	Lun 01/06/26					Escalier métallique de secours 05/05 — 01/06					
27	Grilles de ventilation	2 sem.	Jeu 23/07/26	Jeu 06/08/26					Grilles de ventilation 23/07 — 06/08					
28	RESTAURATION ET REPOSE D'UNE ŒUVRE MURALE ARTISTIQUE	4 sem.	Jeu 24/09/26	Ven 23/10/26					RESTAURATION ET REPOSE D'UNE ŒUVRE MURALE ARTISTIQUE 24/09 — 23/10					
29	Lot 03: Doublages - Plâtrerie – isolation – faux plafonds	10 sem.	Lun 01/06/26	Ven 04/09/26					Lot 03: Doublages - Plâtrerie – isolation – faux plafonds 01/06 — 04/09					
30	Lot 04: Menuiseries intérieures – signalétique	10 sem.	Mar 30/06/26	Lun 05/10/26					Lot 04: Menuiseries intérieures – signalétique 30/06 — 05/10					
31	Lot 05: Rénovation du mobilier d'amphithéâtre	6 sem.	Ven 11/09/26	Mar 27/10/26					Lot 05: Rénovation du mobilier d'amphithéâtre 11/09 — 27/10					
32	Lot 06: Revêtements de sols – peinture – nettoyage	8 sem.	Jeu 23/07/26	Ven 30/10/26					Lot 06: Revêtements de sols – peinture – nettoyage 23/07 — 30/10					

PLANNING DES TRAVAUX DU BATIMENT M1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027	
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
33	Lot 07: Electricité	119,14 jrs	Mar 05/05/26	Lun 16/11/26							Lot 07: Electricité			
34	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	2 sem.	Mar 05/05/26	Ven 22/05/26						TRAVAUX PRÉPARATOIRES 05/05 — 22/05				
35	Cfo	108,57 jrs	Ven 22/05/26	Lun 16/11/26							Cfo			
36	Distribution principales et secondaire	6 sem.	Ven 22/05/26	Mar 07/07/26						Distribution principales et secondaire 22/05 — 07/07				
37	Tableaux divisionnaires	4 sem.	Mar 07/07/26	Jeu 06/08/26						Tableaux divisionnaires 07/07 — 06/08				
38	Appareillage	4 sem.	Ven 11/09/26	Lun 16/11/26							Appareillage 11/09 — 16/11			
39	Cfa	74 jrs	Ven 22/05/26	Lun 28/09/26							Cfa			
40	CHEMINS DE CÂBLES - GOULOTTES - FOURREAUX	6 sem.	Ven 22/05/26	Mar 07/07/26						CHEMINS DE CÂBLES - GOULOTTES - FOURREAUX 22/05 — 07/07				
41	SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE EA2A et EA1	3 sem.	Mar 07/07/26	Jeu 30/07/26						SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE EA2A et EA1 07/07 — 30/07				
42	PRÉCÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE (6A - 10 GBT/S)	3 sem.	Jeu 30/07/26	Ven 11/09/26						PRÉCÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE (6A - 10 GBT/S) 30/07 — 11/09				
43	ALARME TECHNIQUE	2 sem.	Ven 11/09/26	Lun 28/09/26							ALARME TECHNIQUE 11/09 — 28/09			
44	Lot 08: Chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage	16 sem.	Ven 22/05/26	Mar 27/10/26						Lot 08: Chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage 22/05 — 27/10				
45	AOR_BAT M1	21,29 jrs	Ven 30/10/26	Mar 01/12/26							AOR_BAT M1			
46	OPR - OPL (BAT M1)	4 sem.	Ven 30/10/26	Mar 01/12/26							OPR - OPL (BAT M1) 30/10 — 01/12			
47	COMMISSION DE SECURITE (M1)	0 jr	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26							47 - 24/11 ♦ COMMISSION DE SECURITE (M1)			
48	RECEPTION PARTIELLE PHASE 1 - BAT M1	0 jr	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26							RECEPTION PARTIELLE PHASE 1 - BAT M1 ♦ 01/12			

IND 0
FAIT PAR IMPERIUM LE 27/10/2025
