


# AMPHITHEATRES M1 ET P1

## PHASE DCE

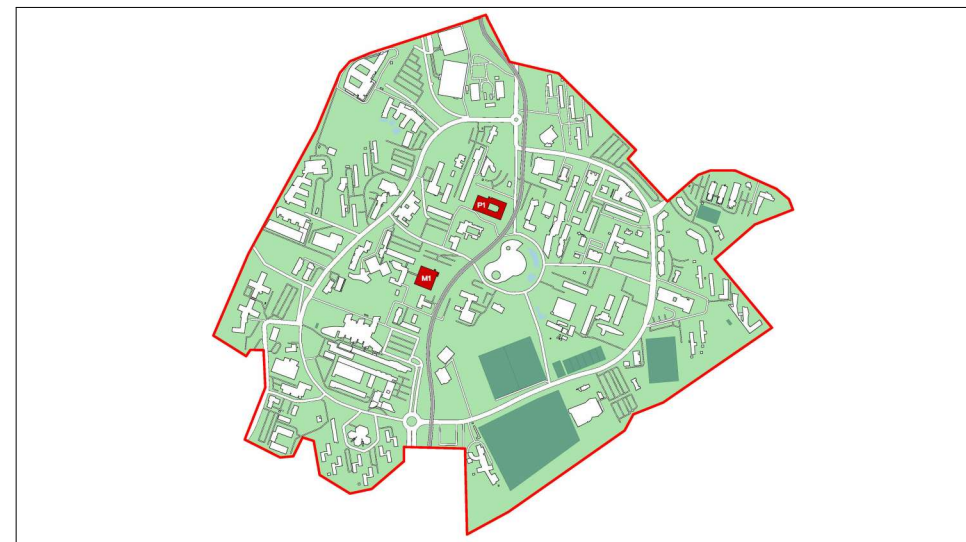

UNIVERSITE DE LILLE	MAITRISE D'OUVRAGE	42 rue Paul Duez 59000 LILLE	Tel : 07 89 40 69 16
CARTA - REICHEN ET ROBERT ASS.	ARCHITECTES URBANISTES	17 rue Brezin 75014 PARIS	Tel : 01 53 90 12 35
PROJEX	BET TCE - DESAMIANTAGE - ECO	30 place Salvador Allende 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tel : 03 20 47 03 01
DIAGOBAT	BET ACOUSTIQUE - REEMPLOI	30 place Salvador Allende 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tel : 03 20 47 03 01
APAVE	BUREAU DE CONTROLE - SPS	340 av. de la Mame - CS 43013 59703 Marcq en Baroeul Cedex	Tel : 06 73 97 75 55

## PLANNING TRAVAUX DETAILLE P1 - PHASE 2 -

EMETTEUR	CODE AFFAIRE	ECHELLE	FORMAT	INDICE	DATE	N° DE PLAN	PHASE
IMPERIUM	25011MP1		A3	A	17/10/2025	E403	PRO/DCE

# PLANNING DES TRAVAUX DU BATIMENT P1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027				2028		
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
1	PLANNING ENVELOPPE DES TRAVAUX du BATIMENT P1	569 jrs	Lun 12/05/25	Mar 09/11/27															
2	PHASE ETUDES	180 jrs	Lun 12/05/25	Lun 02/03/26															
3	DIAG / ESQ	22 jrs	Lun 12/05/25	Ven 13/06/25															
4	AVP	29 jrs	Lun 16/06/25	Ven 25/07/25															
5	PRO / DCE	40 jrs	Lun 25/08/25	Ven 17/10/25															
6	DP	0 jr	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25															
7	Validation de PRO / DCE	2 sem.	Lun 20/10/25	Lun 03/11/25															
8	AO lots DESIAMANTAGE & CURAGE	47 jrs	Ven 25/07/25	Lun 20/10/25															
9	AO lots REAMENAGEMENTS	39 jrs	Mer 12/11/25	Lun 19/01/26															
10	Analyse des offres	17 jrs	Mar 20/01/26	Mer 11/02/26															
11	CAO	0 jr	Mer 11/02/26	Mer 11/02/26															
12	Délai de standstill	14 jrs	Mer 11/02/26	Lun 02/03/26															
13	Notification des marchés	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26															
14	JALONS ADMINISTRATIFS	347 jrs	Lun 04/05/26	Mar 09/11/27															
15	BAT P1 : FERMETURE COMPLETE DU BATIMENT	89 jrs	Lun 04/05/26	Mer 30/09/26															
16	BAT P1 : FERMETURE AMPHIS P1	347 jrs	Lun 04/05/26	Mar 09/11/27															
17	BAT P1 : FERMETURE HALL RDC P1	89 jrs	Lun 04/05/26	Mer 30/09/26															

PLANNING  
DES TRAVAUX DU BATIMENT P1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027				2028		
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
18	BAT P1 : FERMETURE HALL R+2 P1	91 jrs	Lun 03/05/27	Jeu 30/09/27															
19	BAT P1 : FERMETURE ESCALIERS /SALLE 13 RDC /Circulations	68 jrs	Lun 07/06/27	Jeu 30/09/27															
20	TRAVAUX	429,43 jrs	Lun 05/01/26	Mar 09/11/27															
21	INSTALLATION DE CHANTIER	2 sem.	Lun 05/01/26	Lun 19/01/26															
22	PHASE DE PREPARATION	10 sem.	Lun 05/01/26	Mer 18/03/26															
23	BATIMENT P1	346,43 jrs	Lun 04/05/26	Mar 09/11/27															
24	AMPHIS	182,57 jrs	Lun 04/05/26	Mer 24/02/27															
25	LOT 00 : Désamiantage - curage	10 sem.	Lun 04/05/26	Mar 21/07/26															
26	Lot 01: gros œuvre	3 sem.	Mar 21/07/26	Mer 02/09/26															
27	Lot 03: Plâtrerie – isolation – faux plafonds	8 sem.	Mer 02/09/26	Ven 30/10/26															
28	Lot 04: Menuiseries intérieures – signalétique	8 sem.	Jeu 01/10/26	Mer 02/12/26															
29	Lot 06: Revêtements de sols – peinture – nettoyage	8 sem.	Ven 23/10/26	Mer 06/01/27															
30	Lot 05: Rénovation du mobilier d’amphithéâtre	8 sem.	Mar 24/11/26	Ven 05/02/27															
31	Lot 07: Electricité	113,86 jrs	Mer 02/09/26	Mer 24/02/27															
32	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	2 sem.	Mer 02/09/26	Jeu 17/09/26															
33	Cfo	103,29 jrs	Jeu 17/09/26	Mer 24/02/27															
34	Distribution principales et secondaire	6 sem.	Jeu 17/09/26	Ven 30/10/26															

# PLANNING DES TRAVAUX DU BATIMENT P1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025				2026				2027				2028		
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
35	Tableaux divisionnaires	4 sem.	Lun 02/11/26	Mer 02/12/26									Tableaux divisionnaires 02/11 — 02/12						
36	Appareillage	6 sem.	Mar 24/11/26	Mer 24/02/27									Appareillage 24/11 — 24/02						
37	Cfa	58,14 jrs	Jeu 17/09/26	Mer 09/12/26									Cfa ▽						
38	CHEMINS DE CÂBLES - GOULOTTES - FOURREAUX	6 sem.	Jeu 17/09/26	Ven 30/10/26									CHEMINS DE CÂBLES - GOULOTTES - FOURREAUX 17/09 — 30/10						
39	SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE EA2A et EA1	3 sem.	Lun 02/11/26	Mar 24/11/26									SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE EA2A et EA1 02/11 — 24/11						
40	ALARME TECHNIQUE	2 sem.	Mar 24/11/26	Mer 09/12/26									ALARME TECHNIQUE 24/11 — 09/12						
41	Lot 08: Chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage	16 sem.	Mer 05/08/26	Lun 22/02/27									Lot 08: Chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage 05/08 — 22/02						
42	HALLS	320 jrs	Lun 04/05/26	Jeu 30/09/27									HALLS ↔						
43	LOT 00 : Désamiantage - curage	2 sem.	Lun 04/05/26	Mer 20/05/26									LOT 00 : Désamiantage - curage 04/05 — 20/05						
44	RDC Travaux CET & CEA	78 jrs	Mer 20/05/26	Mer 30/09/26									RDC Travaux CET & CEA 20/05 — 30/09						
45	R+2 Travaux CET & CEA	91 jrs	Lun 03/05/27	Jeu 30/09/27									R+2 Travaux CET & CEA 03/05 — 30/09						
46	LOT 03 : PLAFOND CF ESCALIERS /SALLE 13 RDC /Circulations	68 jrs	Lun 07/06/27	Jeu 30/09/27									LOT 03 : PLAFOND CF ESCALIERS /SALLE 13 RDC /Circulations 07/06 — 30/09						
47	LOT 02 : ESCALIER (accès chantier)	4 sem.	Mar 21/07/26	Mer 09/09/26									LOT 02 : ESCALIER (accès chantier) 21/07 — 09/09						
48	AOP_BAT P1	26,43 jrs	Ven 01/10/27	Mar 09/11/27									AOP_BAT P1 ▽						
49	OPR - OPL (BAT P1)	4 sem.	Ven 01/10/27	Mar 02/11/27									OPR - OPL (BAT P1) 01/10 — 02/11						
50	COMMISSION DE SECURITE (P1)	0 jr	Mar 02/11/27	Mar 02/11/27									50 - 02/11 ♦ COMMISSION DE SECURITE (P1)						
51	RECEPTION PARTIELLE PHASE 2 - BAT P1	0 jr	Mar 09/11/27	Mar 09/11/27									RECEPTION PARTIELLE PHASE 2 - BAT P1 ♦ 09/11						

IND 0  
FAIT PAR IMPERIUM LE 27/10/2025
