

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Clinique Tivoli

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	82643-167693 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DE JURY
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER DE JURY
Adresse de l'immeuble	Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 METZ
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	14/11/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	17/02/2025
Date d'émission du rapport de repérage	24/02/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	N°Commande 25000277

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
8, rue Pierre-Simon de Laplace  
57070 METZ  
Tél. : 33 (0)3 72 72 96 12  
metz@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00189

Opérateur de repérage :

**MALO Premtim**  
Apave Diagnostics  
Le 24/02/2025

## Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante**

### Commentaires :

Mise en service de l'ascenseur en 2005. La cabine et les éléments constituant celui-ci ne sont pas soumis à la réglementation amiante. Les points impactant ont été pris en compte dans le repérage.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	7
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>7</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	8
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>19</b>
<b>ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>	<b>23</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>24</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>27</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **82643-167693**

Référence du donneur d'ordre : **Clinique Tivoli**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER DE JURY**

Adresse du propriétaire : **57245 JURY LES METZ CEDEX 03 Route d'Ars-Laquenexy 57245 JURY**

Représenté par : **M. Toussaint**

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER DE JURY**

Accompagnateur : **M. Toussaint**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MALO Premtim**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4414**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ**

N° de Siret : **48333631900189**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Clinique Tivoli**

Adresse complète : **24 rue de Tivoli - 57070 METZ**

Référence Cadastre : **PY - 0012**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Clinique Tivoli**

Etage : **Multi**

Escalier : **SO**

Porte : **SO**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : **NC**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Remplacement de l'ascenseur. Intervention sur la cabine de l'ascenseur, les portes palières, les parties communes, la machinerie, la trémie.

### 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
Colle des solins en fibre ciment	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gainés et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
17/02/2025	DAAT remplacement ascenseur "clinique tivoli"

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet



#### 4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
EPSM METZ JURY	Programme de travaux	N°Commande 25000277	01/01/2025	Remplacement ascenseur "Clinique Tivoli"

#### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

#### 5 Résultats détaillés du repérage

##### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

###### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local technique - machinerie ascenseur	RDJ
Dégagement n°1	RDJ
Dégagement n°2	RDC
Dégagement n°3	R+1
Dégagement n°4	R+2
Cabine d'ascenseur	RDC à R+2
Cage d'ascenseur	RDC à R+2

###### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

###### ➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

##### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Local technique - machinerie ascenseur	RDJ	Machinerie - Ascenseur hydraulique (année 2005)	Métal - Peinture	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plancher bas	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		Non	
Dégagement n°1	RDJ	Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	

Rapport n° : 82643-167693 A / Référence du donneur d'ordre : Clinique Tivoli

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Dégagement n°2	RDC	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Dégagement n°3	R+1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Dégagement n°4	R+2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Cabine d'ascenseur	0	Mur	Bois; acier inoxydable	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	
		Plafond	acier inoxydable	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	
		Plancher	acier inoxydable - Revêtement souple	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	
		Portes palières	Acier inoxydable	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	
Cage d'ascenseur	0	Mur	Béton + enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Plafond	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		Non	
		Plancher	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		Non	
		Eléments d'ascenseur - gaines, câbles ...	Métal	Marquage du matériau (Mise en service de l'ascenseur en 2005)		Non	

#### Commentaires :

Mise en service de l'ascenseur en 2005. La cabine et les éléments constituant celui-ci ne sont pas soumis à la réglementation amiante. Les points impactant ont été pris en compte dans le repérage.

### 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.





En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Machinerie		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Local technique - machinerie ascenseur - Machinerie - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Plancher bas		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Local technique - machinerie ascenseur - Plancher bas - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Béton brut
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Mur		
Emplacement : 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cabine d'ascenseur - Mur - A
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Bois; acier inoxydable
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Plafond		
Emplacement : 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cabine d'ascenseur - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> acier inoxydable
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cabine d'ascenseur - Plancher - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> acier inoxydable - Revêtement souple
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Portes palières		
Emplacement : 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cabine d'ascenseur - Portes palières - A
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Acier inoxydable
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY	Numéro de dossier 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	Pièce ou local – Composant 0 - Cage d'ascenseur - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Béton brut
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY	Numéro de dossier 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	Pièce ou local – Composant 0 - Cage d'ascenseur - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Béton brut
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Eléments d'ascenseur		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cage d'ascenseur - Eléments d'ascenseur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Métal
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
<div>Emplacement : </div>			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY		<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim		<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Local technique - machinerie ascenseur - Mur - Murs	
<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025		<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit / Peinture		1/3	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P002			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Dégagement n°1 - Plancher bas - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025	<b>Partie de composant</b> Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Colle et ragréage / Revêtement semi-rigide		1/3	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Dégagement n°1 - Murs - Mur	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit / Peinture		1/3	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> 0 - Cage d'ascenseur - Mur - A	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025	<b>Partie de composant</b> Béton + enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Béton + enduit / Peinture		2/3	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Dégagement n°4 - Plancher bas - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025	<b>Partie de composant</b> Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Colle et ragréage / Revêtement semi-rigide		3/3	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE JURY	<b>Numéro de dossier</b> 82643-167693 Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 MOSELLE	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Dégagement n°4 - Murs - Mur	
<b>Nom de l'opérateur</b> MALO Premtim	<b>Date de prélèvement</b> 17/02/2025	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit / Peinture		3/3	


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE : Plans / Croquis




Titre : Croquis N°1_Plan Incendie	N° planche : 1/3	N° dossier : 82643-167693	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY	Version : 0	Adresse : Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 METZ	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 24/02/2025		
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation : Clinique Tivoli	Lieu / Zone : RDJ
Commentaire :			

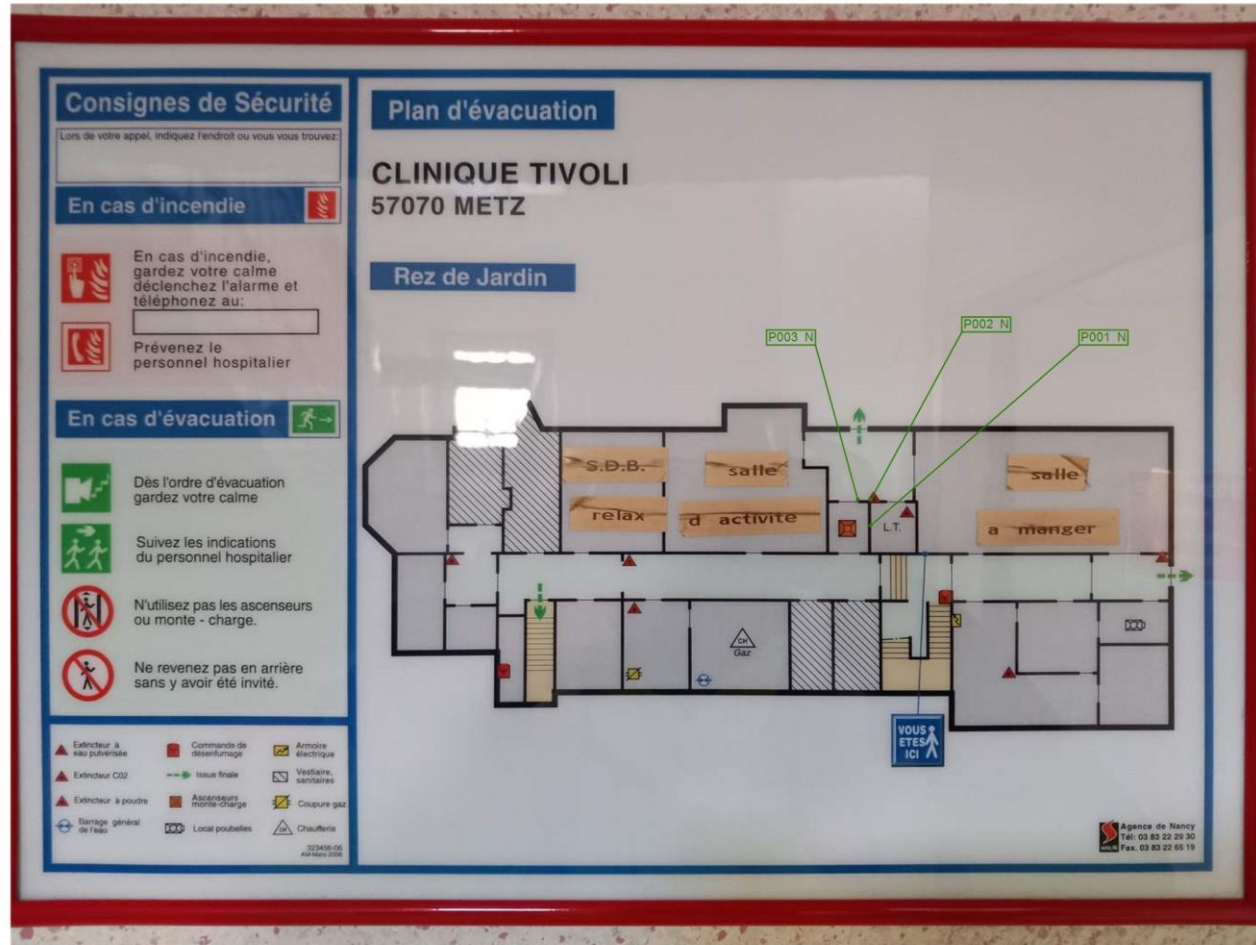






Titre : Croquis N°2_Niveaux	N° planche : 2/3	N° dossier : 82643-167693	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY	Version : 0	Adresse : Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 METZ	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 24/02/2025		
Origine du plan : Fourni par le client			
Commentaire :		Localisation : Clinique Tivoli	Lieu / Zone : R+1 - R+2

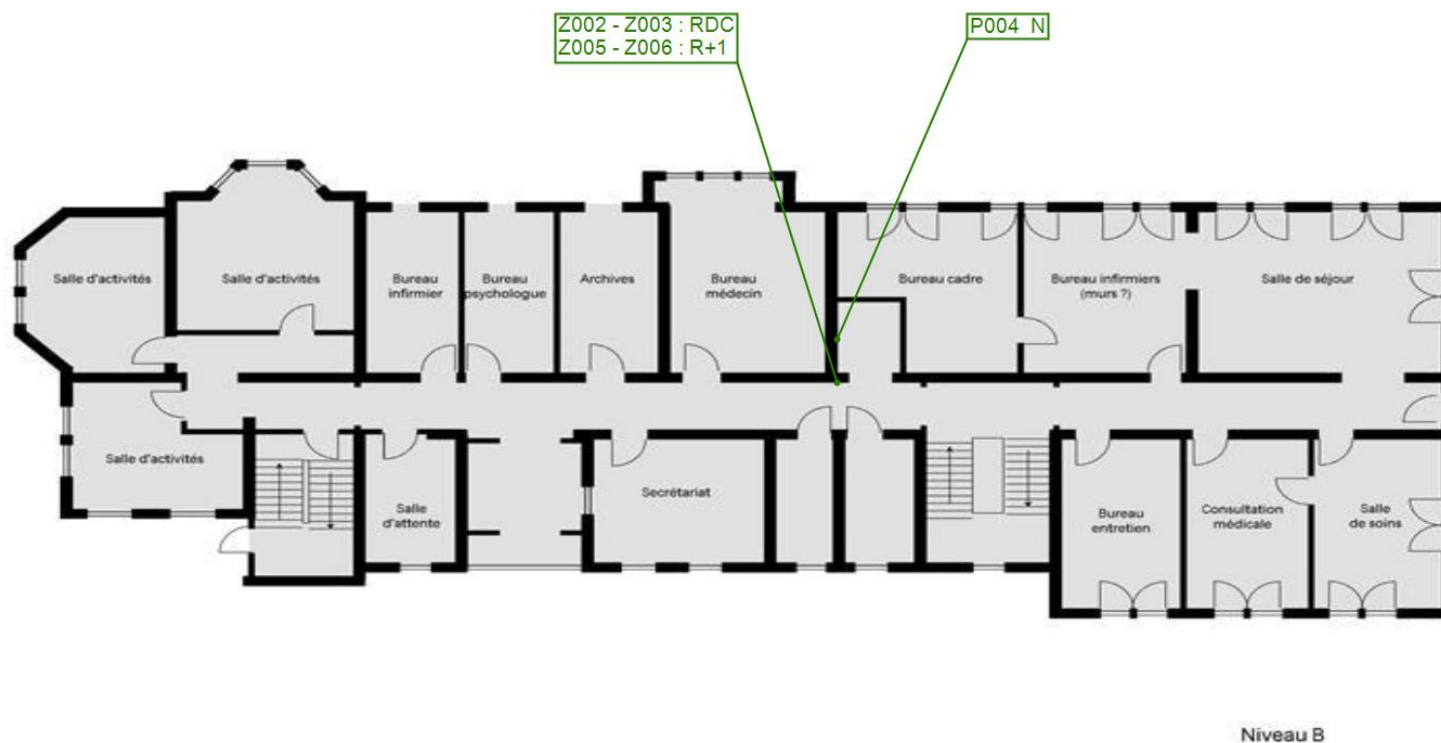



Titre : Croquis N°3_Dernier étage	N° planche : 3/3	N° dossier : 82643-167693	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY	Version : 0	Adresse : Clinique Tivoli 24 rue de Tivoli 57070 METZ	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 24/02/2025		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Clinique Tivoli	Lieu / Zone : R+2

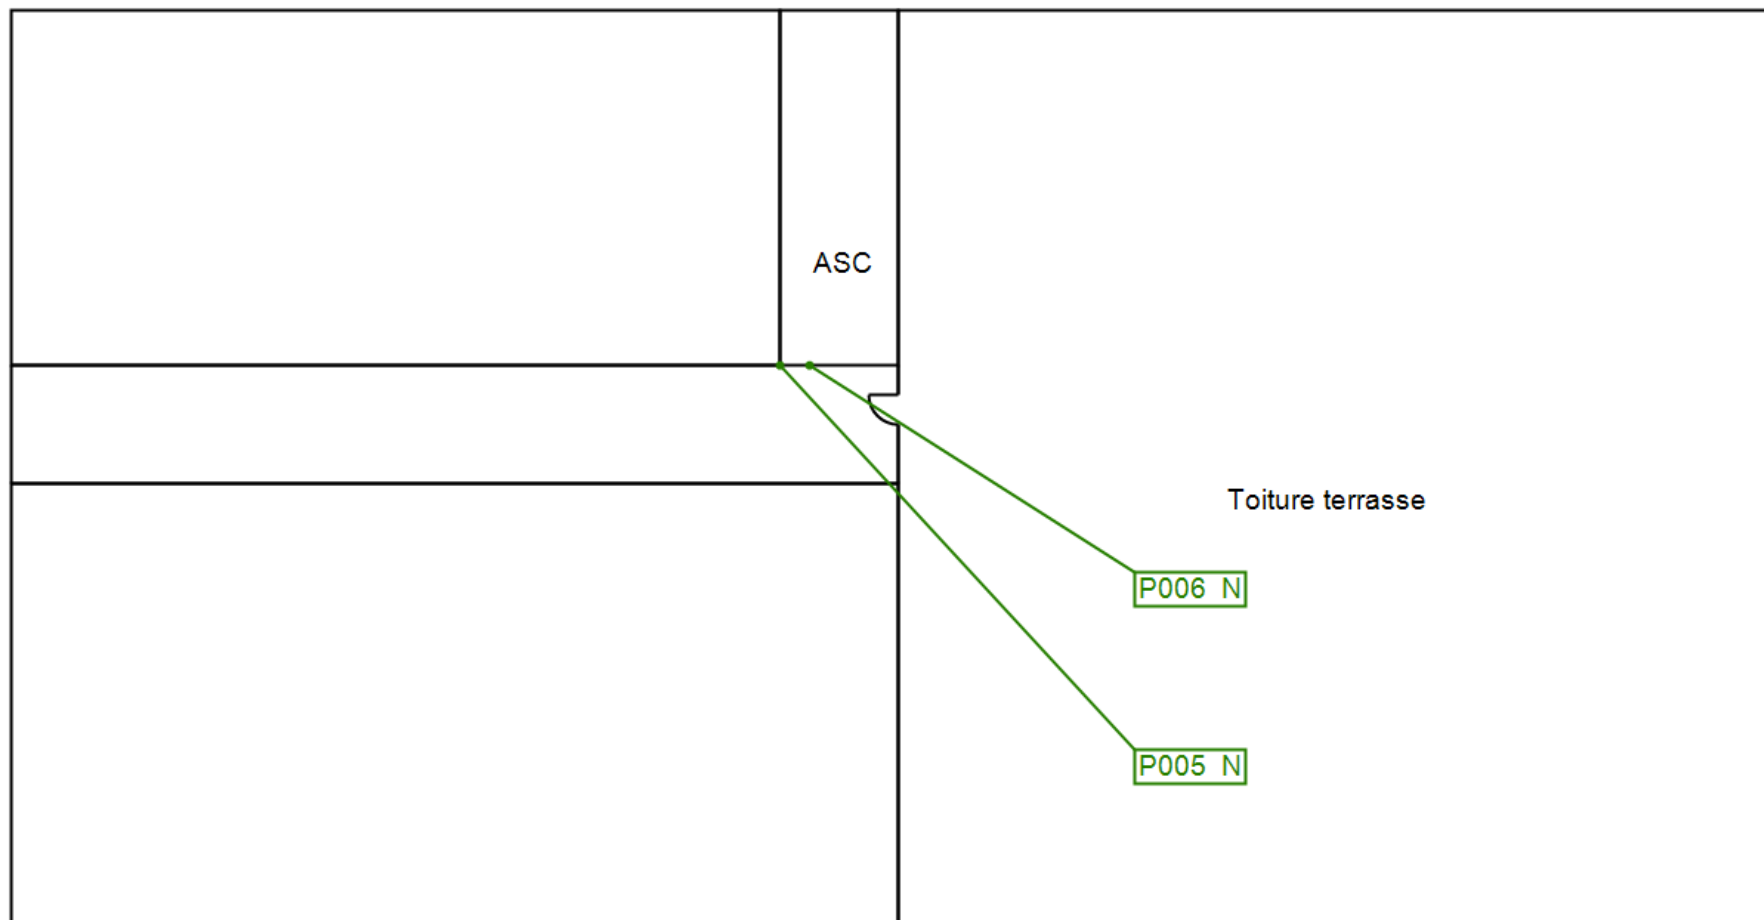

### ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

#### Z001 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique - machinerie ascenseur	RDJ	Mur	Enduit - Peinture		P001	Non	

#### Z002 : Plancher bas Colle et ragréage Revêtement semi-rigide (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement n°1	RDJ	Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide		P002	Non	
Dégagement n°2	RDC	Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide			Non	

#### Z003 : Murs Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement n°1	RDJ	Murs	Enduit - Peinture		P003	Non	
Dégagement n°2	RDC	Murs	Enduit - Peinture			Non	

#### Z004 : Mur Béton + enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cage d'ascenseur	0	Mur	Béton + enduit - Peinture		P004	Non	

#### Z005 : Plancher bas Colle et ragréage Revêtement semi-rigide (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement n°3	R+1	Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide			Non	
Dégagement n°4	R+2	Plancher bas	Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide		P005	Non	

#### Z006 : Murs Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement n°3	R+1	Murs	Enduit - Peinture			Non	
Dégagement n°4	R+2	Murs	Enduit - Peinture		P006	Non	

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3376193.0



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000  
57070 METZ  
Tel : 03.87.35.83.50  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2012 EN DATE DU 20/02/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - METZ 8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175 57075 METZ CEDEX 3	Réf. Commande ITGA : IT0325-2012 Réf. Commande Client : 82643-167693--2882--4630--1159-155836625
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/02/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ Réf échantillon client : P001 - Enduit - Peinture - RDJ - Local technique - machinerie ascenseur - Murs - Mur		Réf échantillon ITGA : IT032502-5667 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (2)
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ Réf échantillon client : P002 - Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide - RDJ - Dégagement n°1 - Sol - Plancher bas		Réf échantillon ITGA : IT032502-5668 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/2

Rapport n° : 82643-167693 A / Référence du donneur d'ordre : Clinique Tivoli

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

24/28



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2012 EN DATE DU 20/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ		Réf échantillon ITGA : IT032502-5669	
Réf échantillon client : P003 - Enduit - Peinture - RDJ - Dégagement n°1 - Mur - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (2)
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ		Réf échantillon ITGA : IT032502-5670	
Réf échantillon client : P004 - Béton + enduit - Peinture - 0 - Cage d'ascenseur - A - Mur		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
▀ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ		Réf échantillon ITGA : IT032502-5671	
Réf échantillon client : P005 - Colle et ragréage - Revêtement semi-rigide - R+2 - Dégagement n°4 - Sol - Plancher bas		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▀ Revêtement souple gris	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
▀ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DE JURY + Clinique Tivoli - Clinique Tivoli - 24 rue de Tivoli - 57070 - METZ		Réf échantillon ITGA : IT032502-5672	
Réf échantillon client : P006 - Enduit - Peinture - R+2 - Dégagement n°4 - Mur - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Mattéo DAL DEGAN** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/2

## ANNEXE : Certificat de compétence



# Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4414 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur MALO Premtim**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/06/2024 - Date d'expiration : 02/06/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/06/2024 - Date d'expiration : 02/06/2031
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 27/11/2023 - Date d'expiration : 26/11/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 27/11/2023 - Date d'expiration : 26/11/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 08/06/2022 - Date d'expiration : 07/06/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 08/06/2022 - Date d'expiration : 07/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/07/2022 - Date d'expiration : 26/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19



## ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64  
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

## Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

## Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

## APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

## Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

## A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

## Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

**Fin du rapport**
