


NANTES
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL

RESTAURATION DU MASSIF OCCIDENTAL

PROJET

Novembre 2024

PLANNING

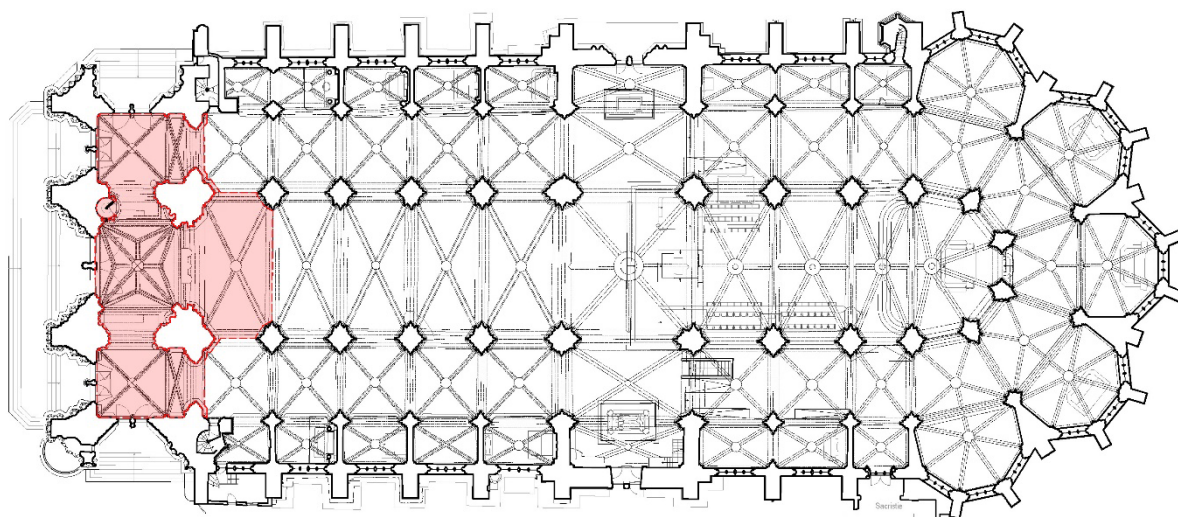

Maître d'ouvrage : **DRAC DES PAYS DE LA LOIRE**

1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 NANTES Cedex - Tél.0102.40.14.23.00

Maître d'œuvre : **Pascal PRUNET - Architecte en chef des Monuments Historiques :**

66 rue des Binelles - 92310 SÈVRES - Tél. 01.46.26.75.62

Cathédrale de Nantes - RESTAURATION MASSIF OCCIDENTAL

PRO - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
Tranche ferme n° 1	Préparation de chantier	Narthex des tours nord et sud, façade ouest, voutes hautes du Massif Occidental																																			
		Phase 1 : Travaux du narthex des tours nord et sud								Phase 2 : Travaux de la façade ouest (+ option portail central) et des voutes hautes, compris arc et clefs du massif *																											
																						Narthex central, tribune d'orgue et façades latérales nord et sud du Massif Occidental Clef et vitraux de la 1ère travée de la nef															
									Travaux de la phase 1 à terminer pour la réouverture de la cathédrale du 28/09/2025										Pré-réception des travaux														Réception des travaux				
LOT 1. Echafaudages																																			TCE		
Extérieur	Relevés, EXE			Montage													Démontage →										Montage 1e travée nef		Démontage →								
Intérieur	Relevés, EXE		Montage			Adaptation Phase 2 →											Démontage partiel→										Montage 1e travée nef		Démontage →								
LOT 02. Maçonnerie - Pierre de taille																																		DES			
Installations et protections de chantier	PIC + PPSPS			← GrutageAdaptation Phase 2 →																											Dégrutage →						
Travaux préalables	Relevés, scans 3D, étalements, méthodologie, études EXE																																				
Façade occidentale						Démontage											Remontage																				
Parements verticaux extérieurs													Elévation occidentale + option portail central																								
Parements verticaux intérieurs						Narthex N/S																Façades latérales nord et sud, balustrade et escalier de la tribune - Fenestration baies 231 et 232															
Sols				Narthex N/S														Tribune, narthex central										Tribune, narthex central									
Voûtes								Dépose ponctuelles, reprises														Tribune															
Arcs et clefs				Cintrage des arcs					Dépose-repose progressives, clefs CLL et CLK														Clef CLI														
LOT 03. Vitraux																																			LEVÉE		
Baies 237 et 137 (Elévation occidentale)	Relevés, EXE					Dépose en conservation										Pose panneaux translucides →																					
Baies 231 et 232 (Elévations nord et sud)	Relevés, EXE																										Dépose				Repose						
LOT 04. Ferronnerie - Menuiseries																																					
Extérieur	Relevés, EXE						Tirants, porte accès combles																														
Intérieur	Relevés, EXE						Portails latéraux narthex, SAS, chaînages															Portail central du narthex, escalier tribune															
LOT 05. Restauration sculpture	Relevés, EXE										Clefs CLL et CLK, chapiteaux + option portail central													Soubassement, chapiteaux narthex, clef CLI													
LOT 06. Restauration peinture	Relevés, EXE																	Amorces nervures et clefs			CLL et CLK												Amorces nervures				
LOT 07. Couverture - Zinguerie	Relevés, EXE															Chéneaux, protections, système ant-volatiles																Bavettes baies N/S					

Travaux prioritaires devant être achevés pour la réouverture de l'édifice au public (28/09/2025)

* Travaux concomitants à l'harmonisation de l'orgue de chœur, à prévoir en horaires décalés pendant 3 mois (+ 1 mois optionnel)
