

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

Rapport N° : 22710608/S1/3/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 06/09/2024

### Référence au programme de travaux :

N°BUREAU VERITAS EXPLOITATION : DEVIS EN  
ATTENTE DE VALIDATION - SITE ANSAM DIAGNOSTIC  
AMIANTE AVANT TRAVAUX - QR XXX QR 26212387 / DO  
34172192 réalisé le 07/06/2024 par ECOLE  
ARCHITECTURE

## DONNEUR D'ORDRE

**ERIC BOUSQUET**

179 RUE DE L ESPEROU  
34093 MONTPELLIER CEDEX 5

## SITE D'INTERVENTION

**AM - ENSAM**


179 rue de l Espérou  
34000 MONTPELLIER

**AILE NUMERIQUE**

## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Janick MARTIN	Chargé d'affaires	9643051	Janick MARTIN
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

# SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périimètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>6</b>
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	7
2.3. Remarque(s) complémentaire(s)	7
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>8</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>8</b>
4.1. Références réglementaires	8
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>9</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>10</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
<b>7. ANNEXES</b>	<b>15</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	15
7.2. Photos prélèvements	16
7.3. Attestation d'assurance	19
7.4. Certificat de compétence	21
7.5. Croquis de repérage	22
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	25

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
remaniement des cloisonnements, la pose de revêtements de sol, peinture des locaux, travaux courant fort et faible, ventilation et climatisation du local serveur (réservations béton faites), équipement et connexion des baies de brassage, équipement des salles

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>03 - Parois verticales intérieures</b>	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
<b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
<b>05 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
<b>06 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Aile numérique ENSAM

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> STOCK REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> SALLE DES CONSEILS	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
5	AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rose, Gris
5	AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Noir
4	AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron
4	AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron

## 2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

Le revêtement de sol type liege marron est présent en sous face des revêtements récent.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : AM - ENSAM  
179 rue de l'Espérou  
34000 MONTPELLIER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
AM - ENSAM	Enseignement supérieur / Recherche	ERP 3è et 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

#### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
ERIC BOUSQUET	Donneur d'ordre	/	179 RUE DE L ESPEROU 34093 MONTPELLIER CEDEX 5	0467918943

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.



## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 29/08/2024

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet détaillé / BUREAU VERITAS EXPLOITATION : DEVIS EN ATTENTE DE VALIDATION - SITE ANSAM DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - QR XXX QR 26212387 / DO 34172192	ECOLE ARCHITECTURE	07/06/2024	BUREAU VERITAS EXPLOITATION : DEVIS EN ATTENTE DE VALIDATION - SITE ANSAM DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - QR XXX QR 26212387 / DO 34172192	/
Plans / 20240516 ENSAM AILE NUMERIQUE-EDL.pdf	/	05/07/2024	20240516 ENSAM AILE NUMERIQUE-EDL.pdf	/
Avant projet détaillé / 20240516 ENSAM AILE NUMERIQUE-P 2.2 const.pdf	/	05/07/2024	20240516 ENSAM AILE NUMERIQUE-P 2.2 const.pdf	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
 xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
 Sxx = Sondage n°xx  
 xx\* = élément témoin de la ZPSO  
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
 AN = Analyse  
 DC = Document consulté  
 MA = Marquage  
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P2* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	P5* P	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige, Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	7	P11* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	7	P12 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> STOCK REPROGRAPHIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> STOCK REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> STOCK REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	P16 P	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	1	P6 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige, Blanc	1	P6 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	8	P13* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	8	P14 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	6	Idem P 9	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SALLE DES CONSEILS	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> SALLE DES CONSEILS	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> SALLE DES CONSEILS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	6	P9* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P15 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rose, Gris	5	P7* N	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Noir	5	P7* N	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rose, Gris	5	P8 P	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Noir	5	P8 P	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	6	P10 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	3	P4 N	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Caoutchouc	Marron	4	Idem P 5	/	AN	/	Oui

## 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
4	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	317 m <sup>2</sup>
5	Revêtements de sol	Dalles de sol	12.82 m <sup>2</sup>
5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	12.82 m <sup>2</sup>


## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
AILE NUMERIQUE	/
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	/
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	/
AILE NUMERIQUE -> STOCK REPROGRAPHIE	/
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	/
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	/
AILE NUMERIQUE -> SALLE DES CONSEILS	/
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	/
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 2	/
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	/
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	/

## 7.2. Photos prélèvements

P2	ZPSO 2
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 4
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs	

P1	ZPSO 1
AILE NUMERIQUE -> REPROGRAPHIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture	


P11	ZPSO 7
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P12	ZPSO 7
AILE NUMERIQUE -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P16	ZPSO 4
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs	



P6	ZPSO 1
AILE NUMERIQUE -> ATELIER D'IMPRESSION	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture	

P13	ZPSO 8
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

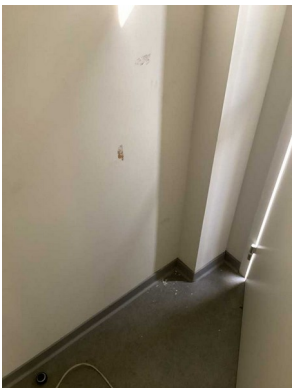
P14	ZPSO 8
AILE NUMERIQUE -> SERVICE INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 6
AILE NUMERIQUE -> BIS STOCK INFORMATIQUE	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	


P15	ZPSO 2
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 5
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles non bitumineuses	

P8	ZPSO 5
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles non bitumineuses	

P3	ZPSO 3
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P10	ZPSO 6
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P4	ZPSO 3
AILE NUMERIQUE -> LOCAL 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

### 7.3. Attestation d'assurance



Europe

#### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

##### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

##### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne



Europe

- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
  - Millièmes de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 50009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne



## 7.4. Certificat de compétence



### Certificat

Attribué à  
**Janick MARTIN**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

#### DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
<b>Gaz</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/01/2024	24/01/2031
<b>Électricité</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/01/2024	24/01/2031
<b>DPE avec mention</b>	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	03/12/2023	02/12/2030
<b>DPE sans mention</b>	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	03/12/2023	02/12/2030
<b>Termites metropole</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/10/2020	04/10/2027
<b>Amiante avec mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/10/2020	04/10/2027
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/10/2020	04/10/2027

Date : 10/07/2024  
 Numéro du certificat : **9643051**

*Samuel DUPRIEU - Président*




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.  
 Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>  
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie



## 7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AM - ENSAM 179 rue de l'Espérou 34000 MONTPELLIER	
AILE NUMERIQUE	Date visite	Le 29/08/2024
	Auteur	Janick MARTIN
	N° dossier	22710608/S1/3
	Planche	1 / 2
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

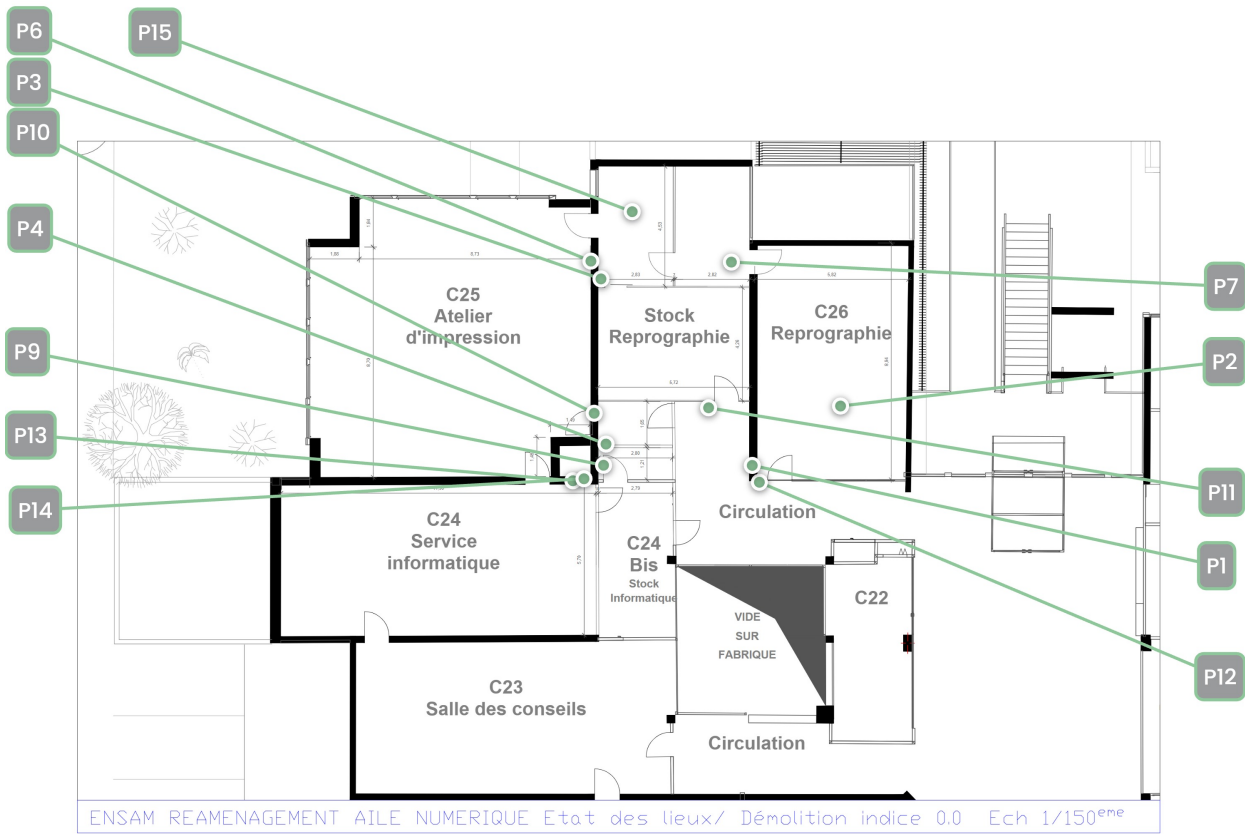

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage






Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AM - ENSAM 179 rue de l'Espérou 34000 MONTPELLIER	
AILE NUMERIQUE	Date visite	Le 29/08/2024
	Auteur	Janick MARTIN
	N° dossier	22710608/S1/3
	Planche	2 / 2
	Indice	1
	Vue utilisée : Prélèvement positif	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
	Revêtements de sols sportifs
	Dalles de sol (Liste B)

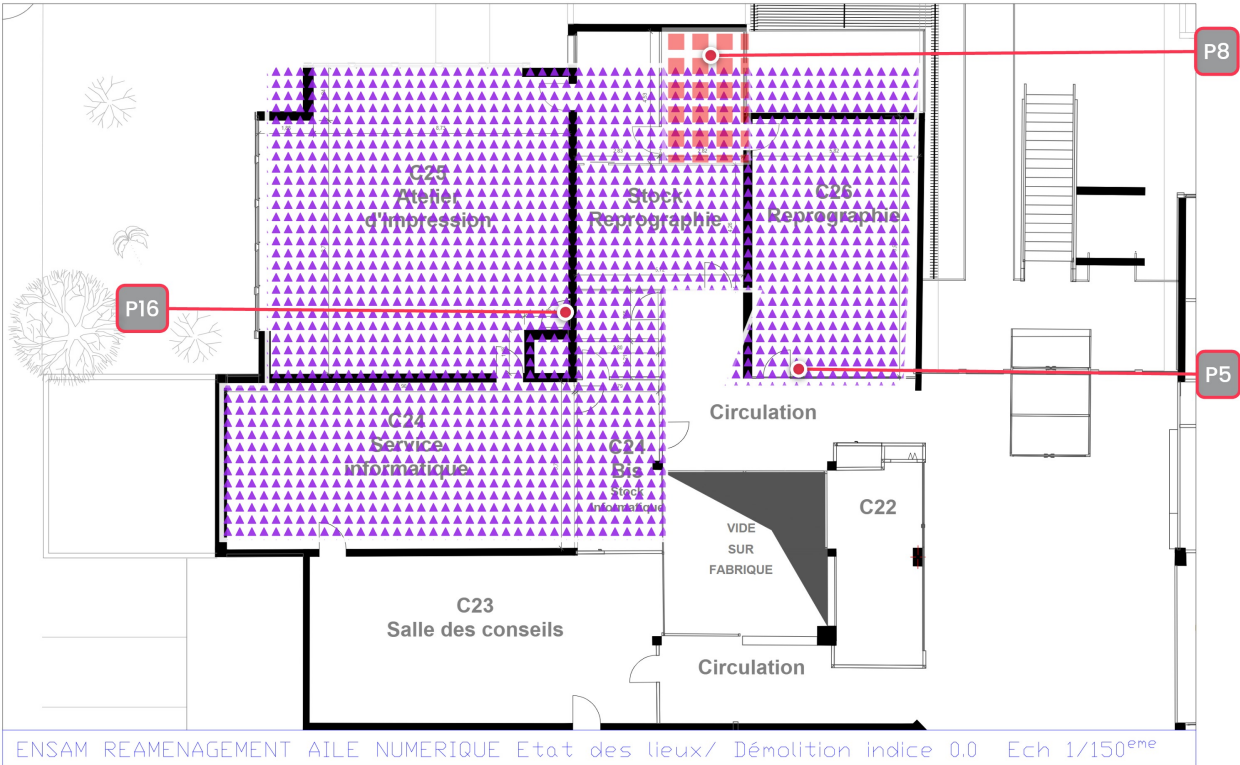

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---



## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**

**Janick MARTIN**

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-046316-01

Date d'émission de rapport : 05/09/2024 12:14

Page1/5

Dossier N° : 24KE023495

Date de réception : 03/09/2024

Date d'analyse : 03/09/2024

Référence dossier Client:1510797387/22710608/S1/3/1\_22710608/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS24000001211 Réf. Prel : P1 AILE NUMERIQUE - REPROGRAPHIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (poudreux) (gris)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS24000001212 Réf. Prel : P2 AILE NUMERIQUE - REPROGRAPHIE/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS24000001213 Réf. Prel : P3 AILE NUMERIQUE - LOCAL 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / R2CD	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS24000001214 Réf. Prel : P4 AILE NUMERIQUE - LOCAL 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-046316-01      Date d'émission de rapport : 05/09/2024 12:14      Page 2/5  
 Dossier N° : 24KE023495      Date de réception : 03/09/2024      Date d'analyse : 03/09/2024  
 Référence dossier Client: 1510797387/22710608/S1/3/1\_22710608/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS2400000121 15 Réf. Prel : P5 AILE NUMERIQUE - REPROGRAPHIE/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Marron)	Matériau (gris) ; matériau souple (marron) + (beige)	<b>MET</b> * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b> *
006	EUROFINS2400000121 16 Réf. Prel : P6 AILE NUMERIQUE - ATELIER D'IMPRESSION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / A8JN	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	EUROFINS2400000121 17 Réf. Prel : P7 AILE NUMERIQUE - LOCAL 1/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	<b>MET</b> * / G4VG	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (2) (3)	EUROFINS2400000121 18 Réf. Prel : P8 AILE NUMERIQUE - LOCAL 1/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> * / G4VG	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b> *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-046316-01      Date d'émission de rapport : 05/09/2024 12:14      Page 3/5  
 Dossier N° : 24KE023495      Date de réception : 03/09/2024      Date d'analyse : 03/09/2024  
 Référence dossier Client:1510797387/22710608/S1/3/1\_22710608/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	EUROFINS2400000121 29 Réf. Prel : P9 AILE NUMERIQUE - BIS STOCK INFORMATIQUE/Revêtements de sol - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	<b>MET</b> * / A8JN	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	EUROFINS2400000121 28 Réf. Prel : P10 AILE NUMERIQUE - LOCAL 2/Revêtements de sol - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS2400000121 19 Réf. Prel : P11 AILE NUMERIQUE - CIRCULATION 1/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / A8JN	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	EUROFINS2400000121 20 Réf. Prel : P12 AILE NUMERIQUE - CIRCULATION 1/Revêtements de sol	Matériau dur (marron)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-046316-01      Date d'émission de rapport : 05/09/2024 12:14      Page 4/5  
 Dossier N° : 24KE023495      Date de réception : 03/09/2024      Date d'analyse : 03/09/2024  
 Référence dossier Client: 1510797387/22710608/S1/3/1\_22710608/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	EUROFINS2400000126 26 Réf. Prel : P13 AILE NUMERIQUE - SERVICE INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> * / A8JN	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS2400000127 27 Réf. Prel : P14 AILE NUMERIQUE - SERVICE INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / A8JN	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS2400000121 21 Réf. Prel : P15 AILE NUMERIQUE - LOCAL 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	EUROFINS2400000122 22 Réf. Prel : P16 AILE NUMERIQUE - ATELIER D'IMPRESSION/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Marron)	Matériau (gris) ; matériau souple (marron) + (beige)	<b>MET</b> * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (3) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### **Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-046316-01

Date d'émission de rapport : 05/09/2024 12:14

Page5/5

Dossier N° : 24KE023495

Date de réception : 03/09/2024

Date d'analyse : 03/09/2024

Référence dossier Client:1510797387/22710608/S1/3/1\_22710608/3/4

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux  
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

