



APAVE  
AGENCE DE NANCY  
3 rue de l'Euron  
54320 MAXÉVILLE  
N° SIRET : 90386907100626


DONNEUR D'ORDRE  
Conseil d'état Conseil d'état  
1 place du Palais Royal  
75100 PARIS CEDEX  
CONTACT : Monsieur LACREUSE



## RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



<b>Révision 1</b> Numéro d'offre : <b>2497695.2</b> Numéro de contrat : <b>C24172343</b> Numéro de rapport (n° de tâche) : <b>T241593316</b> Date : <b>19/11/2024</b>	Lieu d'intervention :  <b>Cour d'appel administrative de Nancy</b>  <b>6 rue du Haut-Bourgeois 54000 NANCY</b>  Destinataire rapport : <b>Conseil d'état Conseil d'état</b>	Date d'intervention : Les <b>05/11/2024 et 21/11/2024</b>  Intervenant : <b>Monsieur Benjamin DE SOUSA</b>  Signature : 
---	--	--

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
*Nombre de pages total du document : 17 pages*

**RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**
**A OBJECTIF DE LA PRESTATION**

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

**B ADRESSE DU BIEN**

6 rue du Haut-Bourgeois  
54000 NANCY

**C PROPRIETAIRE**

Conseil d'état Conseil d'état  
1 place du Palais Royal  
75100 PARIS CEDEX

**DONNEUR D'ORDRE**

Conseil d'état Conseil d'état  
1 place du Palais Royal  
75100 PARIS CEDEX

Accompagnateur : M. Lacreuse

**D EXECUTION DE LA MISSION**

Rapport N°: T241593316

Date d'intervention : 05/11/2024

Date du rapport : 19/11/2024

**E PROGRAMME DE TRAVAUX**

- Reprise accès public : rampe PMR et accès bâtiment ;
- Ouverture baie pour création accès public ;
- Mise en accessibilité et séparation flux intérieur Aile Est ;
- Décaissement pour mise à niveau plancher accès public ;
- Implantation espaces publics (ouverture murs existants) ;
- Rotation 180°C salle d'audience ;
- Accessibilité accès personnel Aile Est ;
- Mise en place de chariot élévateur au sein du porche ;
- Ouverture sol en pierre vestibule et mise en place d'une rampe PMR vers salle d'audience ;
- Remplacement des menuiseries de la salle d'audience.

**F CONCLUSION**

**Nous avons recensé des revêtements et/ou des matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite.**

Le code du travail ne fixe pas de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Toutes les mesures ou résultats d'analyse > 0 sont donc référencés dans le rapport.

**Note informative :**

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm<sup>2</sup> pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm<sup>2</sup> est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G	VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	
<p>Signature</p> 	<p><b>Nom de l'opérateur : DE SOUSA Benjamin</b>  <b>AGENCE DE NANCY 3 rue de l'Euron 54320 MAXÉVILLE</b></p> <p>Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD          Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE          92727 NANTERRE CEDEX          N° de police : Contrat n° 10800807204          Date d'expiration : 31/12/2024</p>	

## SOMMAIRE

### PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION .....	2
PROPRIETAIRE .....	2
DONNEUR D'ORDRE .....	2
EXECUTION DE LA MISSION .....	2
PROGRAMME DE TRAVAUX .....	2
CONCLUSION .....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	3

### REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ..... 5

### RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION ..... 5

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X .....	5
ETALONNAGE DE L'APPAREIL .....	5
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....	5
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....	5
BIEN OBJET DE LA MISSION .....	5
PERIMETRE DE REPERAGE .....	6
COMMENTAIRES MISSION .....	6

### LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB..... 6

### METHODOLOGIE EMPLOYEE..... 11

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X .....	11
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....	12

### CROQUIS ..... 13

### ATTESTATION D'ASSURANCE..... 16

## 1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.  
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.  
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.  
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).  
 Norme NF X46-035 juin 2021

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : Niton	Nature du radionucléide : Cadmium 109
Modèle de l'appareil : <b>XLPS</b>	Date du dernier chargement de la source : 27/05/2024
N° de série : 93690	Activité de la source à cette date : 850 MBq

### 2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,31 mg/cm <sup>2</sup>
N° NIST de l'étalon : SRM2575	Incertitude : 0,02
Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,71 mg/cm <sup>2</sup>
N° NIST de l'étalon : SRM2574	Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm <sup>2</sup> )	Marge	Date	Observation
1	1	0,05	05/11/2024	Etalonnage de début de diagnostic
62	1	0,05	05/11/2024	Etalonnage de fin de diagnostic
63	1	0,05	21/11/2024	Etalonnage de début de diagnostic
108	1	0,05	21/11/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

### 2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1  
 N° accréditation : 1-1751

### 2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée  
 Usage : Tertiaire

### 2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment	Etage : /
Bâtiment : Cour d'appel administrative de Nancy	N° Lot : /

## 2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

### Liste des locaux visités :

Etage	Local
R-1	Salle de stockage
RDC	Salle d'audience
RDC	Salle des délibérés
RDC	Bureau adjoints techniques
RDC	Bureau greffe et agents de greffe
RDC	Accueil
RDC	Salle d'attente - Local avocat
RDC	Salle de visio-audience

### Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

## 2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

## 3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

### Local : Salle de stockage (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
60	Murs	Porte (accès à l'escalier) Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
61					MD	0	0,05		
	Murs	Revêtement de murs	Placoplâtre	Peinture				Postérieur à 1949	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					2		1		

### Local : Salle d'audience (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
2	Murs	Ensemble des fenêtres Habillage des jambages et allèges	Bois	Peinture	C	12,7	0,05		
3					MD	14	0,05		
4					MG	18,2	0,05		
5	Murs	Ensemble des fenêtres	Bois	Peinture	C	0	0,05		
6					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
7		Ouvrant et Dormant			MG	0	0,05		
16	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	2,7	0,05		
17					MD	8	0,05		
18					MG	5,9	0,05		
8	Murs	Porte 1 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
9					MD	0	0,05		
10	Murs	Porte 1 Ouvrant	Bois	Peinture	C	2,6	0,05		
11					MD	2,4	0,05		
14	Murs	Porte-fenêtre Dormant	Bois	Peinture	C	4,6	0,05		
15					MD	5,1	0,05		
12	Murs	Porte-fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
13					MD	0	0,05		
19	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
20					MD	0	0,05		
21					MG	0	0,05		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					8			0	

## Local : Salle des délibérés (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
22	Murs	Ensemble des fenêtres Habillage des jambages et allèges	Bois	Peinture	C	27	0,05		
23					MD	29	0,05		
24	Murs	Ensemble des fenêtres Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
25					MD	0	0,05		
34	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	3,2	0,05		
35					MD	2,1	0,05		
26	Murs	Portes 1 - 2 - 3 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
27					MD	0	0,05		
28					MG	0	0,05		
29	Murs	Portes 1 - 2 - 3 Ouvrant	Bois	Peinture	C	2,6	0,05		
30					MD	3,7	0,05		
31					MG	4,4	0,05		
32	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
33					MD	0	0,05		
					Total			Non mesurées	

Nombre d'unités de repérage	6	0
-----------------------------	---	---

## Local : Bureau adjoints techniques (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
36	Murs	Fenêtre Habillage des jambages et allèges	Bois	Peinture	C	11,5	0,05		
37					MD	15,4	0,05		
38	Murs	Fenêtre Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
39					MD	0	0,05		
40	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,05		
41					MD	0	0,05		
42	Murs	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
43					MD	0	0,05		
44	Murs	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	7,6	0,05		
45					MD	8,3	0,05		
46	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
47					MD	0	0,05		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			0	

## Local : Bureau greffe et agents de greffe (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
51	Murs	Fenêtres Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
52					MD	0	0,05		
53					MG	0	0,05		
48	Murs	Fenêtres Ouvrant	Bois	Peinture	C	7	0,05		
49					MD	8,8	0,05		
50					MG	7	0,05		
54	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,05		
55					MD	0	0,05		
56	Murs	Porte Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
57					MD	0	0,05		
58	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
59					MD	0	0,05		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					5			0	



## Local : Accueil (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
64	Murs	Ensemble des fenêtres Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
65					MD	0	0,05		
66					MG	0	0,05		
67	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,05		
68					MD	0	0,05		
69					MG	0	0,05		
70	Murs	Porte 1 - 2 et 3 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
71					MD	0	0,05		
72					MG	0	0,05		
73	Murs	Porte 1 - 2 et 3 Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
74					MD	0	0,05		
75					MG	0	0,05		
76	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
77					MD	0	0,05		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					5			0	

## Local : Salle d'attente - Local avocat (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
92	Murs	Ensemble des fenêtres Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
93					MD	0	0,05		
94					MG	0	0,05		
95	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	8,5	0,05		
96					MD	9,2	0,05		
97					MG	9,3	0,05		
98	Murs	Porte 1 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
99					MD	0	0,05		
100	Murs	Porte 1 Ouvrant	Bois	Peinture	C	4,4	0,05		
101					MD	4	0,05		
104	Murs	Porte 2 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
105					MD	0	0,05		
106	Murs	Porte 2 Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
107					MD	0	0,05		
102	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
103					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Toutes zones	Espace avocat	Verre - Bois - Tissu	Brut				Elément récent sans plomb (2015)	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		1		

## Local : Salle de visio-audience (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
78	Murs	Ensemble des fenêtres Ouvrant et Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
79					MD	0	0,05		
80					MG	0	0,05		
81	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,05		
82					MD	0	0,05		
83					MG	0	0,05		
84	Murs	Porte 1 Dormant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
85					MD	0	0,05		
86					MG	0	0,05		
87	Murs	Porte 1 Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	0,05		
88					MD	0	0,05		
89					MG	0	0,05		
90	Murs	Revêtement de murs	Plâtre	Toile de verre peinte	C	0	0,05		
91					MD	0	0,05		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					5			0	

## Liste des prélèvements :

Sans objet

## 4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

### Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

### Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


### Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

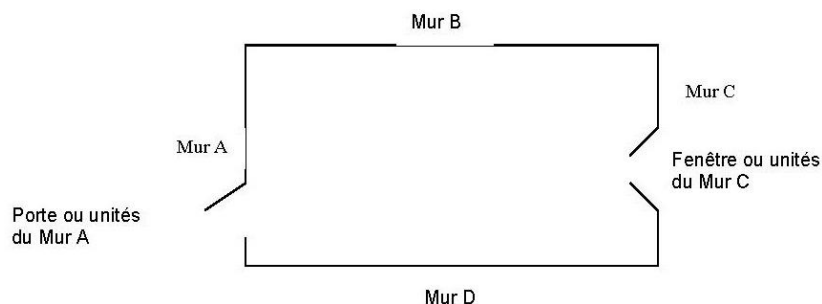

**Seules les surfaces directement accessibles sont testées.**

### Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

## 4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante :  $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$ .

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et

l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds, le niveau de 0,3mg/cm<sup>2</sup> étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

#### 4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

## CROQUIS

### PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : C24172343 Cour d'appel

Adresse de l'immeuble : 6 rue du Haut-Bourgeois  
54000 NANCY

N° planche : 1/3 Version : 0 Type : Croquis

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Bâtiment – Niveau : Aile EST

#### Légende :

- Mesure positive
- ⊖ Mesure positive sur les plinthes

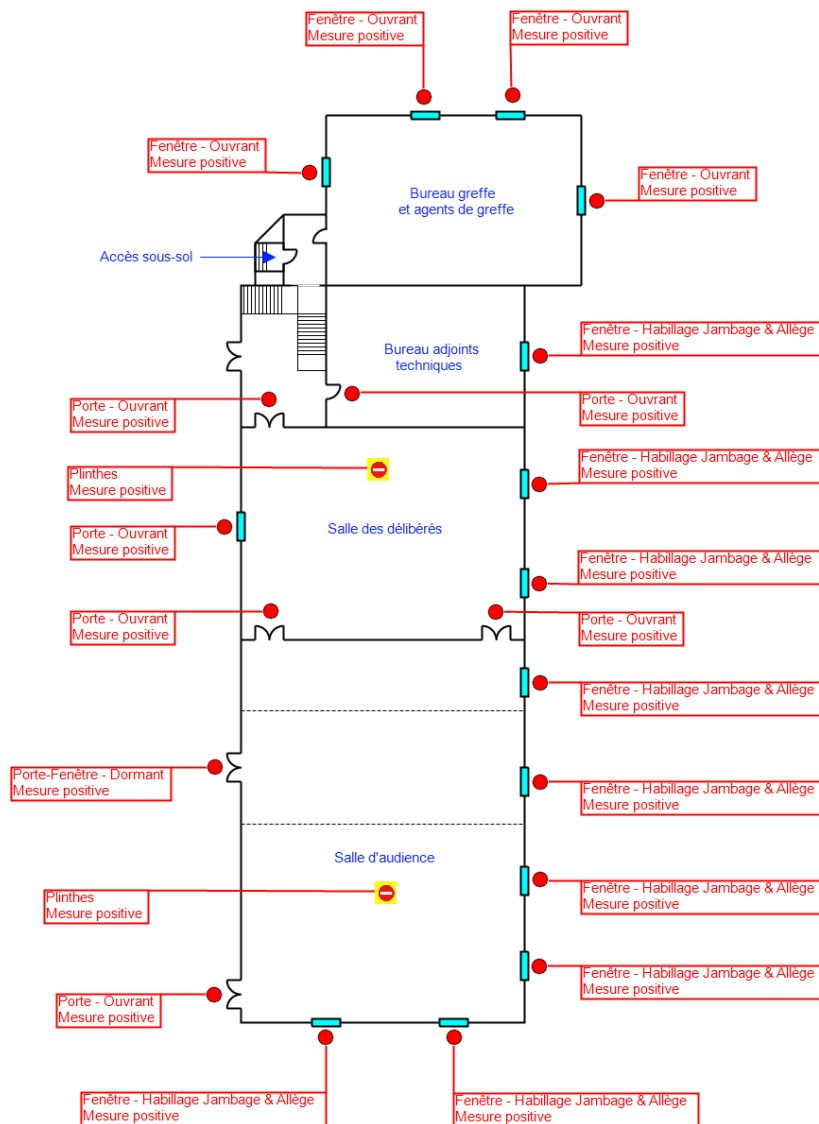


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C24172343 Cour d'appel			Adresse de l'immeuble :	6 rue du Haut-Bourgeois 54000 NANCY
N° planche :	2/3	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Salle de stockage


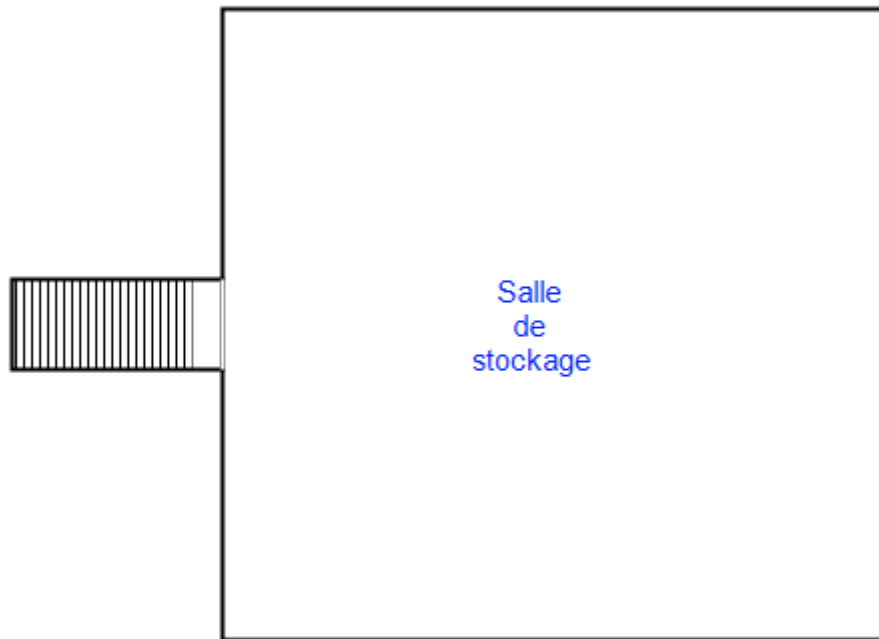


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C24172343 Cour d'appel			Adresse de l'immeuble :	6 rue du Haut-Bourgeois 54000 NANCY
N° planche :	3/3	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Aile OUEST

Légende :

- Mesure positive
- Mesure positive sur les plinthes

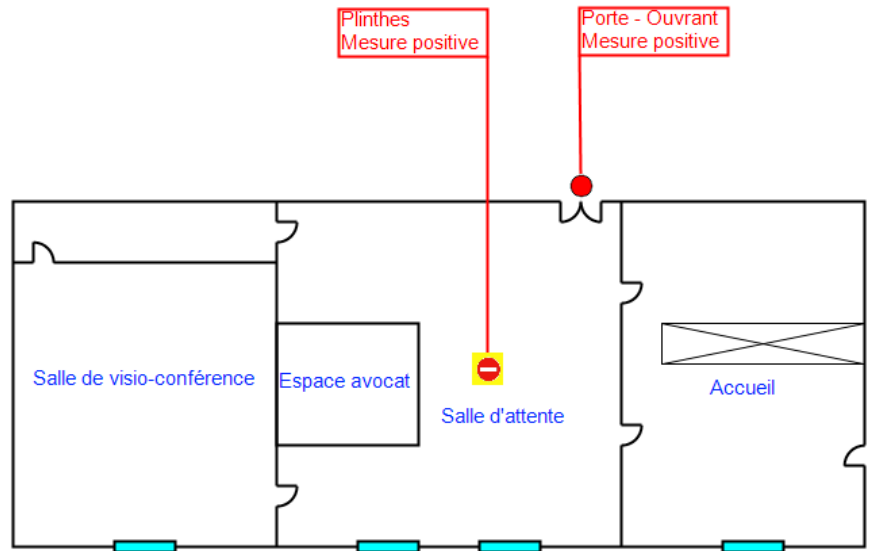

**ATTESTATION D'ASSURANCE**Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**

COURTIER

**VERLINGUE  
(Agence d'Ilizach)  
12 Rue de Kerogan CS 44012  
29335 QUIMPER CEDEX**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

**ATTESTATION**Vos références :

AXA France IARD, atteste que :

**Contrat n° 10800807204**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES  
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

**Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

**A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).**

**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**





Contrat : 10800807204

## TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société  
**Mathieu GODART**  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

2
