




O650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26



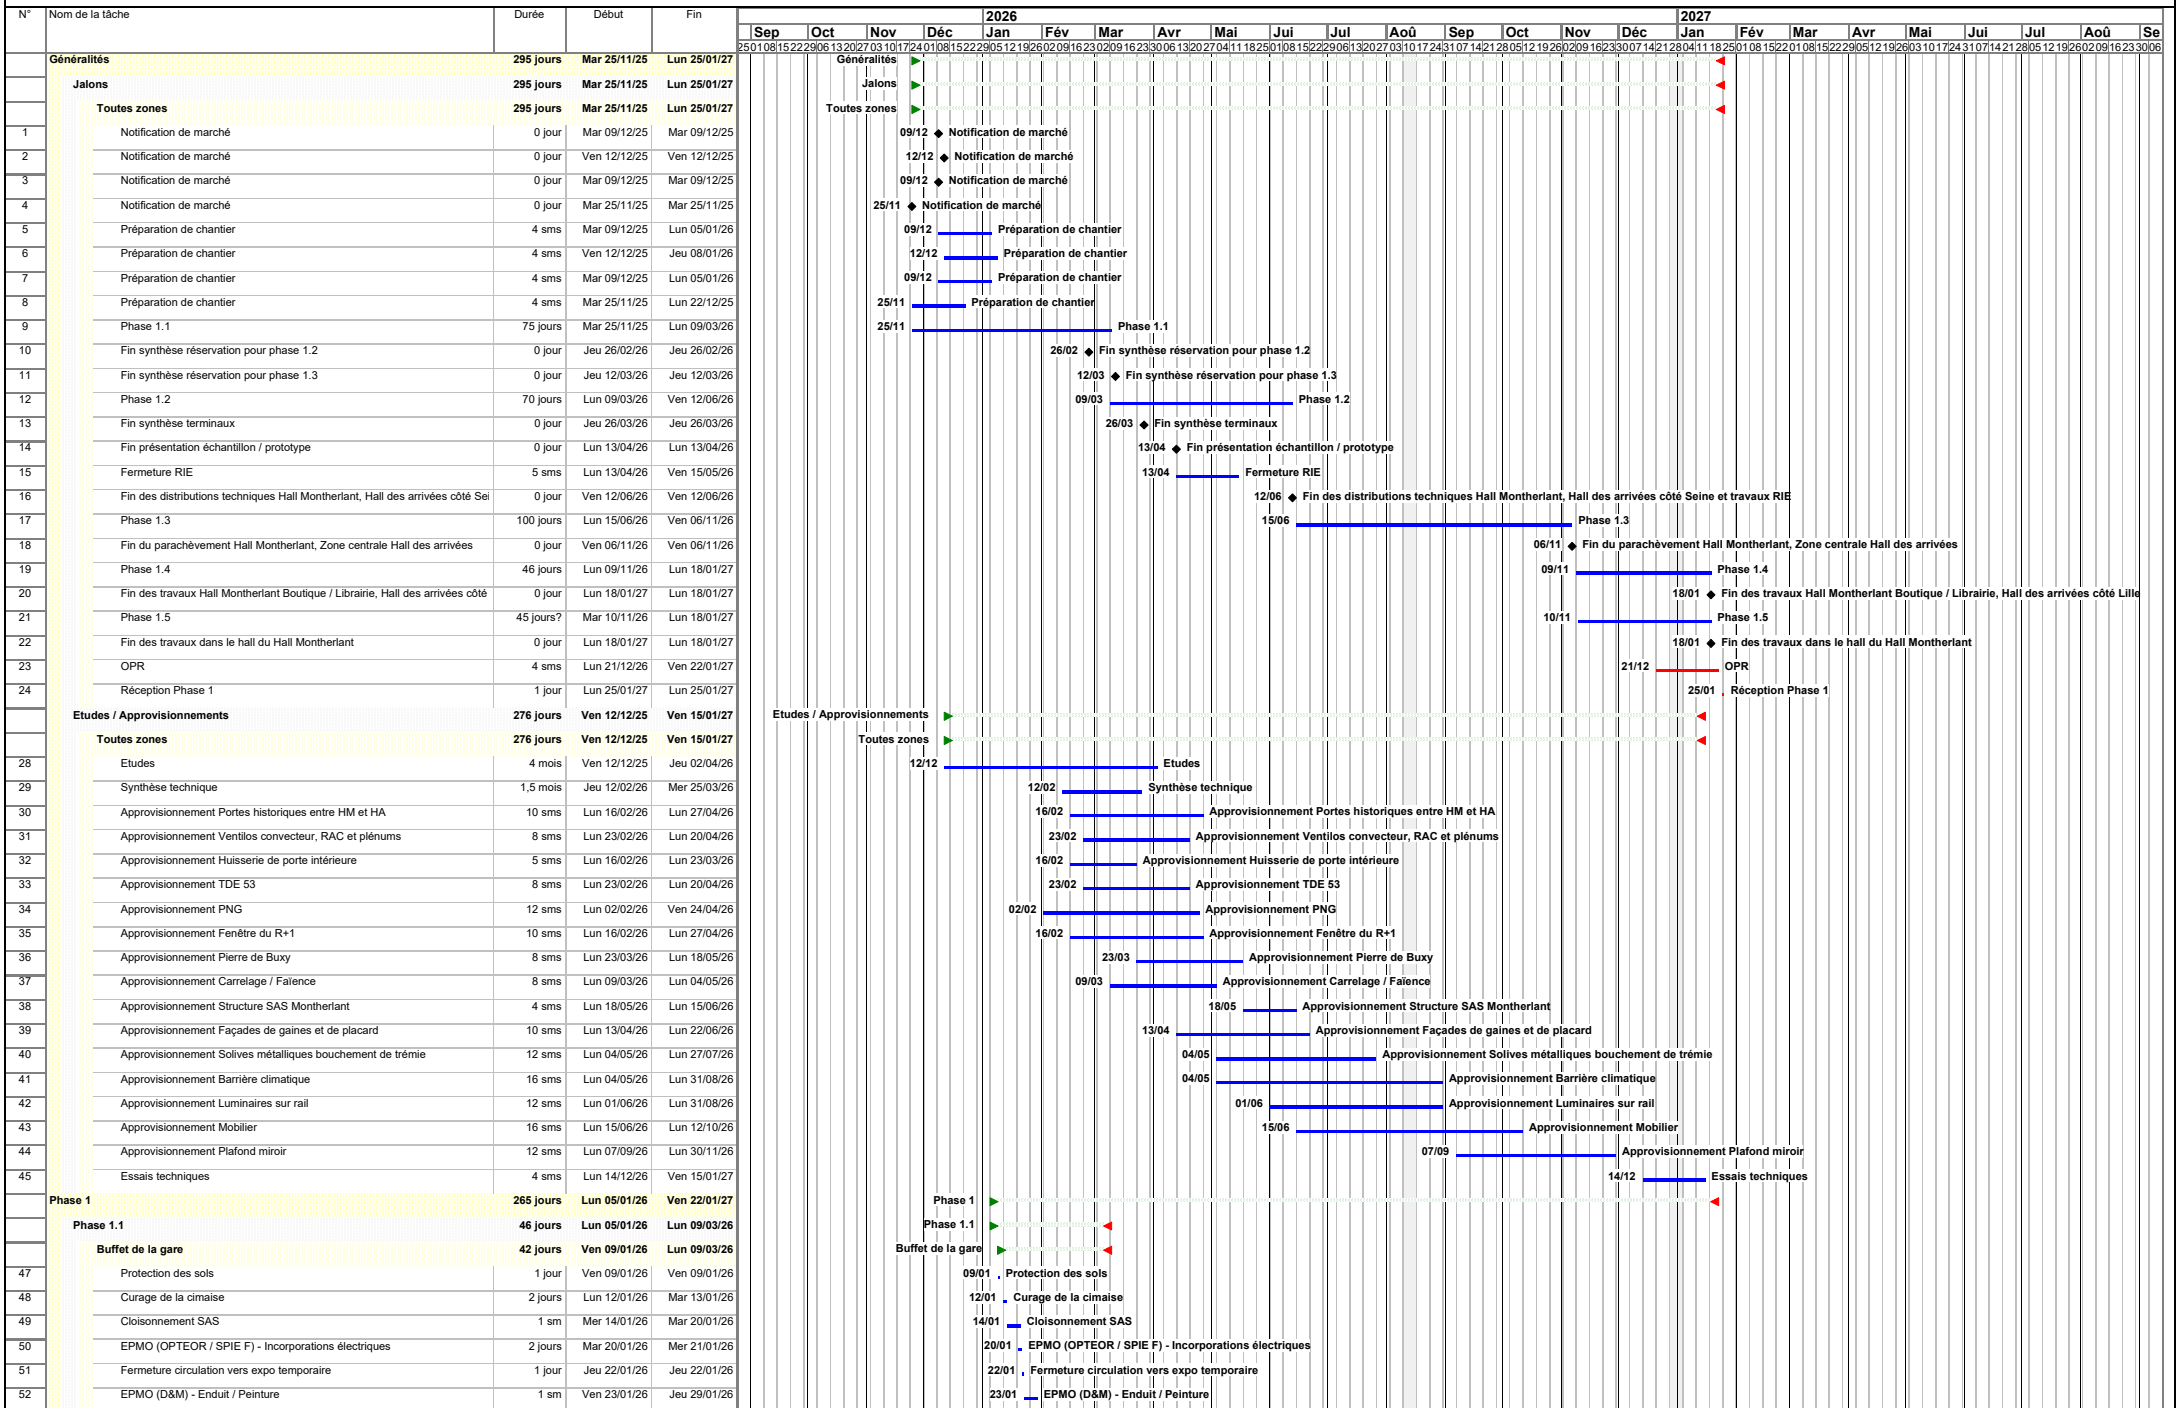

O650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Se
53	EPMO (SPIE F) - Pose des goulottes	2 jours	Ven 30/01/26	Lun 02/02/26																									
54	EPMO (OPTTEOR) - Pose des terminaux RJ	2 jours	Lun 02/02/26	Mar 03/02/26																									
55	EPMO (AC CVC) - Pose du rideau d'air chaud	2 jours	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26																									
56	Pose du bloc-porte P01	1 jour	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26																									
57	EPMO (D&M) - Mise en peinture des portes	2 jours	Mar 10/02/26	Mer 11/02/26																									
58	Pose des serrures	1 jour	Jeu 12/02/26	Jeu 12/02/26																									
59	EPMO (OPTTEOR - SPIE F) - Dépose UGCIS	0,5 jour	Mer 18/02/26	Mer 18/02/26																									
60	Dépose PDR 1001 et pose de la porte extérieure provisoire yc serrure de s	2 jours	Mer 18/02/26	Jeu 19/02/26																									
61	EPMO (OPTTEOR - SPIE F) - Pose UGCIS	0,5 jour	Jeu 19/02/26	Jeu 19/02/26																									
62	Repli des protections de sol compris nettoyage	1 jour	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26																									
63	RMN - Distribution électrique CFO / CFA	1 sm	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26																									
64	RMN - Distribution et raccordement sur armoire	7 jours	Jeu 12/02/26	Ven 20/02/26																									
65	RMN - Installation baie informatique	3 jours	Mar 10/02/26	Jeu 12/02/26																									
66	RMN - Recette informatique	2 jours	Lun 23/02/26	Mar 24/02/26																									
67	RMN - Pose estrade, postes caisse et rangement	3 jours	Lun 09/02/26	Mer 11/02/26																									
68	RMN - Pose ensemble poste de gestion et portillon coulissant, cloisonnette	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26																									
69	RMN - Pose portillon battant, cloisonnette caisse	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26																									
70	RMN - Habillage acoustique paroi arrière caisse	2 jours	Lun 02/03/26	Mar 03/03/26																									
71	RMN - Installation test matériel encaissement	2 jours	Mer 04/03/26	Jeu 05/03/26																									
72	RMN - Cloisonnement du local back office	3 jours	Mer 11/02/26	Ven 13/02/26																									
73	RMN - Pose revêtement de sol moquette local back office	2 jours	Lun 16/02/26	Mar 17/02/26																									
74	RMN - Appareillages PC local back office	2 jours	Mer 18/02/26	Jeu 19/02/26																									
75	RMN - Pose des luminaires et raccordement local back office	2 jours	Lun 23/02/26	Mar 24/02/26																									
76	RMN - Pose absorbants acoustique local back office	3 jours	Lun 02/03/26	Mer 04/03/26																									
77	RMN - Cloisonnement local réserve approche	2 jours	Mer 18/02/26	Jeu 19/02/26																									
78	RMN - Appareillage PC ménage local réserve approche	1 jour	Jeu 19/02/26	Jeu 19/02/26																									
79	RMN - Pose et réglage éclairage sur rails local réserve approche	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26																									
80	RMN - Pose meuble bibliothèque librairie jeunesse	6 jours	Jeu 19/02/26	Jeu 26/02/26																									
81	RMN - Pose imposte filante librairie jeunesse	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26																									
82	RMN - Appareillage PC ménage librairie jeunesse	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																									
83	RMN - Pose poste de gestion librairie jeunesse	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																									
84	RMN - Raccordement bandeaux leds et PC imposte librairie jeunesse	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26																									
85	RMN - Pose multi-lames et imposte filante Mural image / papeterie	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26																									
86	RMN - Pose des postes de gestion Mural image / papeterie	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																									
87	RMN - Pose placards et linéaires de plinthes Mural image / papeterie	1 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26																									
88	RMN - Appareillage PC et raccordement bandeaux leds	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																									
89	RMN - Pose meubles affiche image / papeterie	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26																									
90	RMN - Pose éclairage sur rails	4 jours	Lun 23/02/26	Jeu 26/02/26																									
91	RMN - Réglage final éclairage sur rails	2 jours	Jeu 05/03/26	Ven 06/03/26																									
92	RMN - Pose comptoir bijoux et mobilier attente caisse centraux	1 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26																									
93	RMN - Pose réhausse de tables produits mobiliers centraux	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26																									
94	RMN - Installation mobiliers centraux réemplois OGL	3 jours	Jeu 26/02/26	Lun 02/03/26																									
95	RMN - Déménagement mobiliers lib-boutique ORSAY	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26																									
96	RMN - Finalisation installation mobiliers Librairie / boutique	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26																									
97	RMN - Emménagement utilisateurs	6 jours	Lun 02/03/26	Lun 09/03/26																									
	Salle 24	42 jours	Lun 05/01/26	Mar 03/03/26																									
100	EPMO (OPTTEOR - SPIE F) - Fin des approches de câbles en attente	0 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26																									
101	EPMO (SES) - Condamnation escalier de secours 14 et ascenseur 7 + prot	1 sm	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26																									
102	EPMO (SES) - Affichage pictogramme en limite de chantier	1 jour	Lun 12/01/26	Lun 12/01/26																									
103	Palissade d'isolement	1 jour	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26																									
104	EPMO (D&M) - Mise en peinture palissade d'isolement	1 jour	Mar 20/01/26	Mar 20/01/26																									
105	EPMO (SES) - Adaptation cheminement et issue de secours	1 sm	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26																									
106	Protection des sols et coffrage des tableaux	4 jours	Mar 20/01/26	Ven 23/01/26																									
107	Cloisonnement SAS et vestiaire (hors imposte sur comptoir)	1 sm	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26																									
108	EPMO (SPIE F) - Incorporations électriques dans cloisons et cimaises)	2 jours	Mer 28/01/26	Jeu 29/01/26																									
109	EPMO (D&M) - Mise en peinture face intérieure vestiaire et cimaise	2 jours	Ven 30/01/26	Lun 02/02/26																									



O650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Se
110	EPMO (50 LUX) - Modification des équipements d'éclairage sur vestiaire	1 sm	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	25/01/08	15/22	29/06	13/20	27/03	10/17	24/01	08/15	22/29	05/12	19/26	02/09	16/23	30/06	13/20	27/04	11/18	25/01	08/15	22/29	05/12	19/26	02/09	16/23	30/06
111	EPMO (D&M) - Enduit / Peinture cloisons et plafond SAS	1 sm	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26						26/01	—	EPMO (50 LUX) - Modification des équipements d'éclairage sur vestiaire																	
112	EPMO (Ateliers) - Installation des aménagements intérieurs au vestiaire yc	2 sms	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26						02/02	—	EPMO (D&M) - Enduit / Peinture cloisons et plafond SAS																	
113	EPMO (SPIE F) - Pose des goulottes	2 jours	Lun 09/02/26	Mar 10/02/26						02/02	—	EPMO (Ateliers) - Installation des aménagements intérieurs au vestiaire yc porte, comptoir et postes de contrôle																	
114	EPMO (OPTEOR) - Pose des terminaux RJ	2 jours	Mar 10/02/26	Mer 11/02/26						09/02	—	EPMO (SPIE F) - Pose des goulottes																	
115	EPMO (AC CVC) - Pose du rideau d'air chaud	2 jours	Mer 11/02/26	Jeu 12/02/26						10/02	—	EPMO (OPTEOR) - Pose des terminaux RJ																	
116	Pose des blocs-portes P03 et P04	2 jours	Lun 09/02/26	Mar 10/02/26						11/02	—	EPMO (AC CVC) - Pose du rideau d'air chaud																	
117	Pose de la trappe	1 jour	Mar 10/02/26	Mar 10/02/26						09/02	—	Pose des blocs-portes P03 et P04																	
118	Pose imposte sur comptoir	2 jours	Mer 11/02/26	Jeu 12/02/26						10/02	—	Pose de la trappe																	
119	EPMO (OPTEOR) - Dépose UGCIS	0,5 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26						11/02	—	Pose imposte sur comptoir																	
120	Dépose PDR 1020 et pose de la porte extérieure provisoire yc équipements	2 jours	Lun 16/02/26	Mar 17/02/26						16/02	—	EPMO (OPTEOR) - Dépose UGCIS																	
121	EPMO (D&M) - Finition peinture	2 jours	Mer 18/02/26	Jeu 19/02/26						16/02	—	Dépose PDR 1020 et pose de la porte extérieure provisoire yc équipements																	
122	Pose des serrures	1 jour	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26						18/02	—	EPMO (D&M) - Finition peinture																	
123	EPMO (OPTEOR) - Pose UGCIS	0,5 jour	Mar 17/02/26	Mar 17/02/26						20/02	—	Pose des serrures																	
124	Repli des protections de sol et palissade d'isolement compris nettoyage	1 jour	Mer 18/02/26	Mer 18/02/26						17/02	—	EPMO (OPTEOR) - Pose UGCIS																	
125	EPMO (SPIE F) - Installation portiques / bagages X	1 sm	Jeu 19/02/26	Mer 25/02/26						18/02	—	Repli des protections de sol et palissade d'isolement compris nettoyage																	
126	EPMO (DNUM) - Mise en service	3 jours	Jeu 26/02/26	Lun 02/03/26						19/02	—	EPMO (SPIE F) - Installation portiques / bagages X																	
127	EPMO (OPTEOR) - Paramétrage le jour de l'ouverture - présence demandée	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26						26/02	—	EPMO (DNUM) - Mise en service																	
	Hall Montherlant - Librairie / Boutique / Pompier	31 jours	Ven 23/01/26	Ven 06/03/26						03/03	—	EPMO (OPTEOR) - Paramétrage le jour de l'ouverture - présence demandée																	
129	Installation électrique de chantier	1 jour	Ven 23/01/26	Ven 23/01/26						23/01	—	Installation électrique de chantier																	
130	Curage des cloisons / doublages / faux-plafonds / sols	2 sms	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26						26/01	—	Curage des cloisons / doublages / faux-plafonds / sols																	
131	Reconnaissance des réseaux électriques	1 sm	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26						02/02	—	Reconnaissance des réseaux électriques																	
132	Dépose TDE 98	1 jour	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26						09/02	—	Dépose TDE 98																	
133	Dépose des chapes	1 sm	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26						09/02	—	Dépose des chapes																	
134	Curage des réseaux électriques	1 sm	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26						16/02	—	Curage des réseaux électriques																	
135	Reconnaissance des réseaux CVC / plomberie	1 sm	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26						02/02	—	Reconnaissance des réseaux CVC / plomberie																	
136	Dépose du bac à graisse et équipements techniques	1 sm	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26						09/02	—	Dépose du bac à graisse et équipements techniques																	
137	Curage des réseaux CVC / Plomberie	1 sm	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26						16/02	—	Curage des réseaux CVC / Plomberie																	
138	Démolition plancher cis bac à graisse	1 sm	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26						16/02	—	Démolition plancher cis bac à graisse																	
139	Linteau / jambage et ouvertures de baies	2 sms	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26						23/02	—	Linteau / jambage et ouvertures de baies																	
	Phase 1.2	70 jours	Lun 09/03/26	Ven 12/06/26							Phase 1.2																		
	Hall Montherlant - Librairie / Boutique / Pompier	65 jours	Lun 16/03/26	Ven 12/06/26								Hall Montherlant - Librairie / Boutique / Pompier																	
198	Ouvrures trémies, chevêtres et percements pour les lots techniques	2 sms	Lun 16/03/26	Lun 30/03/26								16/03	—	Ouvrures trémies, chevêtres et percements pour les lots techniques															
199	Dévolement de réseaux jusqu'au SS2	4 sms	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26								30/03	—	Dévolement de réseaux jusqu'au SS2															
200	Dépose du monte-plat et bouchement trémie	2 sms	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26								13/04	—	Dépose du monte-plat et bouchement trémie															
201	Doublages / cloisons 1ère peau	2 sms	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26								16/03	—	Doublages / cloisons 1ère peau															
202	Distribution aéraulique et calorifuge	3 sms	Lun 30/03/26	Ven 17/04/26								30/03	—	Distribution aéraulique et calorifuge															
203	Distribution chauffage et calorifuge	3 sms	Lun 20/04/26	Ven 08/05/26								20/04	—	Distribution chauffage et calorifuge															
204	Dépose des portes PDR 1005 / PDR 1007 / PDR 1008 et mise en place de	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26								27/04	—	Dépose des portes PDR 1005 / PDR 1007 / PDR 1008 et mise en place de protection															
205	Pose de chemins de câble	2 sms	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26								04/05	—	Pose de chemins de câble															
206	Distribution CFO/CFA	4 sms	Lun 18/05/26	Ven 12/06/26								18/05	—	Distribution CFO/CFA															
	Hall Montherlant - Bureaux / Sanitaires / Circulation RDC	65 jours	Lun 09/03/26	Ven 05/06/26									Phase 1.2																
141	Curage des cloisons / doublages / faux-plafonds / sols	1 sm	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26								09/03	—	Curage des cloisons / doublages / faux-plafonds / sols															
142	Curage des réseaux électriques	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26								16/03	—	Curage des réseaux électriques															
143	Curage des réseaux CVC / Plomberie	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26								16/03	—	Curage des réseaux CVC / Plomberie															
144	Linteau / jambage et ouverture de baie	1 sm	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26								16/03	—	Linteau / jambage et ouverture de baie															
145	Dépose des menuiseries PDR1039 / PDR1036 / PDR1040 / PDR1023 / PN	7 jours	Mer 18/03/26	Jeu 26/03/26								18/03	—	Dépose des menuiseries PDR1039 / PDR1036 / PDR1040 / PDR1023 / PNR1002 / A1005 / PNR1003															
146	Doublages / Cloisons 1ère peau y compris huisseries de portes	1 sm	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26								23/03	—	Doublages / Cloisons 1ère peau y compris huisseries de portes															
147	Réalisation de la tranchée	1 sm	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26								30/03	—	Réalisation de la tranchée															
148	Pose des chemins de câbles	1 sm	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26								30/03	—	Pose des chemins de câbles															
149	Distribution de câbles CFO / CFA yc en cloison et tranchée	2 sms	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26								06/04	—	Distribution de câbles CFO / CFA yc en cloison et tranchée															
150	Adaptation plomberie, châssis incorporés et CVC	1 sm	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26								30/03	—	Adaptation plomberie, châssis incorporés et CVC															
151	Distribution aéraulique et calorifuge	2 sms	Lun 30/03/26	Ven 10/04/26								30/03	—	Distribution aéraulique et calorifuge															
152	Distribution chauffage, condensat et calorifuge	2 sms	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26								06/04	—	Distribution chauffage, condensat et calorifuge															
153	Point d'arrêt fermeture tranchée, cloisonnement	0 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26								17/04	◆	Point d'arrêt fermeture tranchée, cloisonnement															
154	Rebouchage de la tranchée et fermeture des cloisons / doublages	1 sm	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26								20/04	—	Rebouchage de la tranchée et fermeture des cloisons / doublages															



0650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Se
155	Pose du ventilo convecteur, plénums et raccordement	1 sm	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26														20/04											
156	Chapes et création des pentes	2 jours	Lun 27/04/26	Mar 28/04/26														27/04											
157	Point d'arrêt fermeture plafond	0 jour	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26														24/04											
158	Fermeture des plafonds	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26														27/04											
159	Pose TDE 53 et raccordement	2 sms	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26														20/04											
160	Pose des menuiseries PNR1002 / A1005 / PNR1003	2 sms	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26														27/04											
161	Carrelage / Faïence	1 sm	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26														04/05											
162	Enduit	5 jours	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26														11/05											
163	Pose des menuiseries PDR1039 / PDR1036 / PDR1040 / PDR1023	3 sms	Lun 11/05/26	Ven 29/05/26														11/05											
164	Pose pierre de Buxy et plinthes	1 sm	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26														18/05											
165	Pose des portes et équipements	2 jours	Lun 25/05/26	Mar 26/05/26														25/05											
166	Peinture	1 sm	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26														25/05											
167	Appareillage électrique	2 jours	Lun 01/06/26	Mar 02/06/26														01/06											
168	Appareillage plomberie et CVC	2 jours	Lun 01/06/26	Mar 02/06/26														01/06											
169	Essais électrique et mise en service	3 jours	Mer 03/06/26	Ven 05/06/26														03/06											
170	Essais CVC/ Plomberie et mise en service	3 jours	Mer 03/06/26	Ven 05/06/26														03/06											
	Hall Montherlant - RIE R+1	44 jours	Lun 13/04/26	Jeu 11/06/26																									
173	Consignation des réseaux	0 jour	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26														13/04											
174	EPMO - Désamiantage sanitaire	2 sms	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26														13/04											
175	Curage plafond circulation	1 jour	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26														13/04											
176	Distribution de câbles	2 sms	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26														13/04											
177	Pose des portes circulation, imposte et reprise de plafond	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26														27/04											
178	Remplacement des fenêtres	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26														27/04											
179	Isolément et protection	1 jour	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26														27/04											
180	Dépose des équipements CVC plomberie	1 jour	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26														28/04											
181	Curage des cloisons / doublages / faux-plafonds / sols	3 jours	Mer 29/04/26	Ven 01/05/26														29/04											
182	Linéau / jambage, ouvertures et agrandissement de baies	1 sm	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26														04/05											
183	Cloisons 1ère peau y compris huisseries de portes et moulures côté escalie	2 jours	Lun 11/05/26	Mar 12/05/26														11/05											
184	Incorporation technique en cloison et distribution électrique plafond	2 jours	Mer 13/05/26	Jeu 14/05/26														13/05											
185	Adaptation plomberie, châssis incorporés et CVC	3 jours	Ven 15/05/26	Mar 19/05/26														15/05											
186	Point d'arrêt fermeture cloison et plafond	0 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26														19/05											
187	Fermeture des cloisons et plafond	2 jours	Mer 20/05/26	Jeu 21/05/26														20/05											
188	Chape	1 jour	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26														22/05											
189	Carrelage / Faïence	2 jours	Lun 25/05/26	Mar 26/05/26														25/05											
190	Enduit / Peinture	3 jours	Mer 27/05/26	Ven 29/05/26														27/05											
191	Pose des portes et équipements	1 jour	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26														01/06											
192	Appareillage électrique	2 jours	Mar 02/06/26	Mer 03/06/26														02/06											
193	Appareillage plomberie	2 jours	Mar 02/06/26	Mer 03/06/26														02/06											
194	Essais et mise en service	2 jours	Jeu 04/06/26	Ven 05/06/26														04/06											
195	Essais, désinfection et mise en service	1 sm	Jeu 04/06/26	Mer 10/06/26														04/06											
196	Nettoyage et repli de l'isolement de chantier	1 jour	Jeu 11/06/26	Jeu 11/06/26														11/06											
	Hall des arrivées - Côte Seine	66 jours	Lun 09/03/26	Lun 08/06/26																									
209	Palissade et installation de chantier	1 sm	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26														09/03											
210	Curage mobilier	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26														16/03											
211	Dépose des murs en corian et barrière climatique	3 jours	Mer 18/03/26	Ven 20/03/26														18/03											
212	Dépose des sols	1 sm	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26														23/03											
213	Pose des chemins de câble R+1	1 sm	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26														30/03											
214	Tranchée pour passage de réseau	1 sm	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26														06/04											
215	Distribution de câbles CFO/CFA en tranchée	2 sms	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26														13/04											
216	Création local technique	2 sms	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26														13/04											
217	Incorporation électrique	1 sm	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26														13/04											
218	Point d'arrêt bouchement de sol	0 jour	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26														24/04											
219	Rebouchage de la tranchée électrique, caleutrement et recharge des sols	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26														27/04											
220	Reprise plafond acoustique	1 sm	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26														04/05											
221	Travaux de peinture	1 sm	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26														04/05											
222	Appareillage électrique	1 sm	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26														11/05											



O650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Se
223	Pose pierre de Buxy	2 sms	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26																									
224	Sol coulé Terrazo et finition pierre de Buxy	2 sms	Lun 25/05/26	Ven 05/06/26																									
225	Installation du PNG	1 jour	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26																									
226	Nettoyage de la zone	1 jour	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26																									
	Phase 1.3	105 jours	Lun 08/06/26	Ven 06/11/26																									
	Hall Montherlant - Librairie / Boutique / Pompier	105 jours	Lun 08/06/26	Ven 06/11/26																									
229	Fin de l'étanchéité et dalle de protection parvis zone A	0 jour	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26																									
230	Pose des portes PDR 1005 / PDR 1007 / PDR 1008	6 jours	Lun 08/06/26	Lun 15/06/26																									
231	Pose des SAS	2 sms	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26																									
232	Pose des fenêtres C1001 / C1002 / C 1003 / C1003	8 jours	Mer 17/06/26	Ven 26/06/26																									
233	Encoffrement Staff des poteaux	2 sms	Lun 15/06/26	Lun 29/06/26																									
234	Pose des tableaux divisionnaires CFO, RAC et baie informatique	1 sm	Lun 15/06/26	Lun 22/06/26																									
235	Pose des façades de gaines et de placard	1 sm	Lun 22/06/26	Lun 29/06/26																									
236	Réalisation des jouées et finition plâtrerie	2 sms	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26																									
237	Pose des ventilos-convecteur, extracteur d'air et raccordement (yc dans le i	2 sms	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26																									
238	Pose des rideaux d'air chaud et raccordement	2 sms	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26																									
239	Pose des plénums de ventilation et raccordement	2 sms	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26																									
240	Raccordement électrique, pose du réseau de condensat et reprise de flocage	2 sms	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26																									
241	Pose des supportages des terminaux électriques	1 sm	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26																									
242	Point d'arrêt fermeture plâtrerie	0 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26																									
243	Fermeture des ouvrages de plâtrerie	2 sms	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26																									
244	Raccordement des tableaux électriques et baie informatique	4 sms	Lun 31/08/26	Ven 25/09/26																									
245	Réalisation des chapes et création des pentes	2 sms	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26																									
246	Pose des portes et châssis vitrés A et B, 1002 et 1003	8 jours	Lun 14/09/26	Mer 23/09/26																									
247	Carrelage / Faïence	1 sm	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26																									
248	Enduit préparation de support	2 sms	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26																									
249	Pose de la pierre de Buxy	2 sms	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26																									
250	Pose des portes et plinthes	1 sm	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26																									
251	Sol coulé Terrazo et finition pierre	1 sm	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26																									
252	Mise en peinture	2 sms	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26																									
	Hall des arrivées - Centrale	105 jours	Lun 08/06/26	Ven 06/11/26																									
258	Modification de l'installation de chantier	1 sm	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26																									
259	Curage mobilier	2 jours	Lun 15/06/26	Mar 16/06/26																									
260	Dépose des murs en corian et barrière climatique	3 jours	Mer 17/06/26	Ven 19/06/26																									
261	Dépose de la barrière climatique	1 sm	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26																									
262	Dépose des sols	1 sm	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26																									
263	Tranchée pour passage de réseau	2 sms	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26																									
264	Distribution de câbles CFO/CFA	2 sms	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26																									
265	Point d'arrêt bouchement de sol	0 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26																									
266	Rebouchage de la tranchée électrique, calfeutrement et recharge des sols	1 sm	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26																									
267	Création local technique	2 sms	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26																									
268	Incorporation électrique	1 sm	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26																									
269	Distribution de gaine et RIA dans les locaux techniques	2 sms	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26																									
270	Dépose faux-plafond sanitaire SS1	2 jours	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26																									
271	Dévoiemnt de réseau SS1	1,5 sms	Mer 17/06/26	Lun 29/06/26																									
272	Chevêtre et perçement pour passage de réseaux	1 sm	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26																									
273	Distribution de gaine et RIA SS1	2 sms	Lun 06/07/26	Ven 17/07/26																									
274	Distribution et pose du RIA dans le Hall yc essais	2 sms	Lun 03/08/26	Ven 21/08/26																									
275	Refermeture des plafonds sanitaire SS1	1 sm	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26																									
276	Distribution de câble CFO/CFA et appareillage en plafond	3 sms	Lun 24/08/26	Ven 11/09/26																									
277	Pose de la plateforme	2 sms	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26																									
278	Dépose des escaliers	2 sms	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26																									
279	Complément plateforme	1 sm	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26																									
280	Dépose des dalles en verre et garde-corps vitrés	1 sm	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26																									
281	Renforcement de poutre et solives métalliques	1 sm	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26																									
282	Coffrage et ferrailage dalle	1 sm	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26																									



O650 MUSEE D'ORSAY - REFONTE DE L'ACCUEIL
Planning détaillé d'exécution des travaux ind C

Ven 13/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Se
283	Réalisation du plancher	1 sm	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26																									
284	Peinture intumescente	1 sm	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26																									
285	Distribution de câbles SS1 et pose de luminaires sur rail	1 sm	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26																									
286	Réalisation du plafond acoustique SS1	2 sms	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26																									
287	Dépose de la plateforme et repli de l'installation de chantier SS1	1 sm	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26																									
288	Pose plénum de ventilation	1 sm	Lun 24/08/26	Lun 31/08/26																									
289	Pose de la barrière climatique yc côté Seine	2 sms	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26																									
290	Enduit / Peinture	1 sm	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26																									
291	Pose pierre de Buxy	2 sms	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26																									
292	Sol coulé Terrazo et finition pierre de Buxy	2 sms	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26																									
293	Pose du mobilier	2 sms	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26																									
294	Pose des buses de ventilation	1 sm	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26																									
295	Appareillage et luminaire yc raccordement dans le mobilier caisse	1 sm	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26																									
296	Installation des PNG et raccordement	2 sms	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26																									
297	Nettoyage de la zone	1 sm	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26																									
	Phase 1.4	50 jours	Lun 09/11/26	Ven 22/01/27																									
	Hall Montherlant - Librairie / Boutique / Pompier	50 jours	Lun 09/11/26	Ven 22/01/27																									
305	Pose des appareillages électriques et mise en œuvre des rails luminaires yc	3 sms	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26																									
306	Pose des coffres de VCO	1 sm	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26																									
307	Pose des grilles de ventilation	1 sm	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26																									
308	Essais électriques et mise en service	3 sms	Lun 30/11/26	Ven 18/12/26																									
309	Essais CVC / plomberie et mise en service	3 sms	Lun 30/11/26	Ven 18/12/26																									
310	Pose du plafond miroir	2 sms	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26																									
311	Pose du mobilier	3 sms	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27																									
312	MOA - Emménagement	2 sms	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27																									
	Hall des arrivées - Côté Lille	46 jours	Lun 09/11/26	Lun 18/01/27																									
315	Modification de l'installation de chantier	1 sm	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26																									
316	Curage restant et dépose barrière climatique et des sols	1 sm	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26																									
317	Dépose des portes historiques PGV 1010 / A 1009	1 sm	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26																									
318	Tranchée pour passage de réseau	1 sm	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26																									
319	Linteau, jambage et ouverture de baie	1 sm	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26																									
320	Distribution de câbles CFO/CFA en tranchée	1 sm	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26																									
321	Création des bureaux	1 sm	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26																									
322	Incorporation électrique	1 sm	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26																									
323	Point d'arrêt bouchement de sol	0 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26																									
324	Rebouchage de la tranchée électrique, calfeutrement et recharge des sols	1 sm	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26																									
325	Pose de la barrière climatique côté Lille	1 sm	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26																									
326	Travaux de peinture	1 sm	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26																									
327	Appareillage électrique	1 sm	Lun 21/12/26	Ven 25/12/26																									
328	Pose pierre de Buxy	1 sm	Lun 21/12/26	Ven 25/12/26																									
329	Pose des portes historiques PGV 1010 / A 1009	6 jours	Lun 04/01/27	Lun 11/01/27																									
330	Sol coulé Terrazo et finition pierre de Buxy	1 sm	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27																									
331	Installation du PNG	1 jour	Lun 18/01/27	Lun 18/01/27																									
332	Nettoyage de la zone et repli de l'installation de chantier	1 jour	Lun 18/01/27	Lun 18/01/27																									
	Phase 1.5	45 jours	Mar 10/11/26	Lun 18/01/27																									
	Hall Montherlant - Hall	45 jours	Mar 10/11/26	Lun 18/01/27																									
335	Dépose des sols	1 sm	Mar 10/11/26	Mar 17/11/26																									
336	Dépose du SAS	1 sm	Mar 17/11/26	Mar 24/11/26																									
337	Pose PDR 1003	1 sm	Mar 24/11/26	Mar 01/12/26																									
338	Repose du SAS	2 sms	Mar 01/12/26	Mar 15/12/26																									
339	Distribution et appareillage électrique SAS	1 sm	Mar 15/12/26	Mar 22/12/26																									
340	Pose des revêtement de sol	3 sms	Mar 22/12/26	Lun 18/01/27																									
