












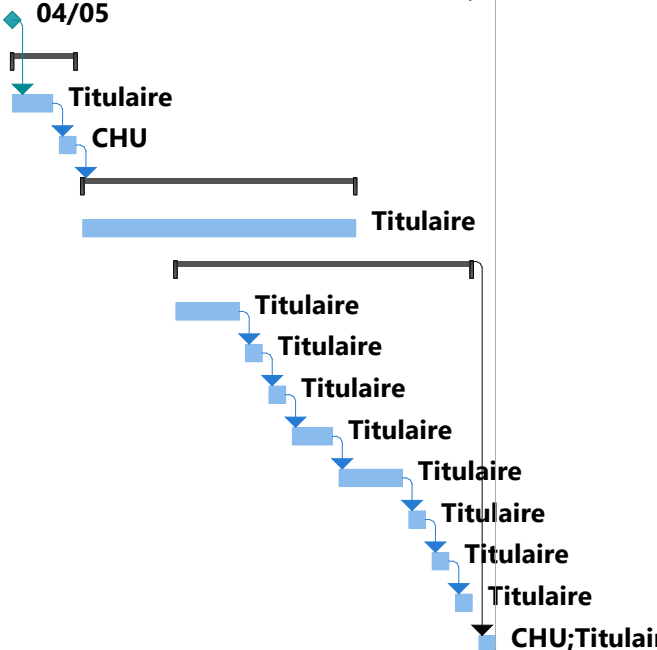














N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préc	Noms ressources	Tri 4, 2025												Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026		
									Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	
1			Notification	0 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26																													
2			Etude	15 jours	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26																													
3			BE	2 sm	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26	1	Titulaire																											
4			Visa plans	1 sm	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	3	CHU																											
5			Fabrication	60 jours	Lun 25/05/26	Ven 14/08/26	4																												
6			Fabrication	12 sm	Lun 25/05/26	Ven 14/08/26		Titulaire																											
7			Pose	65 jours	Lun 22/06/26	Ven 18/09/26																													
8		 	RDC Facade A - 38 Chassis	3 sm	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26		Titulaire																											
9			RDC Facade B - 6 Chassis	1 sm	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26	8	Titulaire																											
10			RDC Facade C - 12 Chassis	1 sm	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26	9	Titulaire																											
11			RDC Facade D - 17 Chassis	2 sm	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26	10	Titulaire																											
12			R+1 Facade A - 42 Chassis	3 sm	Lun 10/08/26	Ven 28/08/26	11	Titulaire																											
13			R+1 Facade B - 6 Chassis	1 sm	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26	12	Titulaire																											
14			R+1 Facade C - 12 Chassis	1 sm	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26	13	Titulaire																											
15			R+1 Facade D - 3 Chassis	1 sm	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26	14	Titulaire																											
16			Reception	1 sm	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26	7	CHU;Titulaire																											




Projet : Planning DCE 1
Date : Mer 25/02/26


Tâche

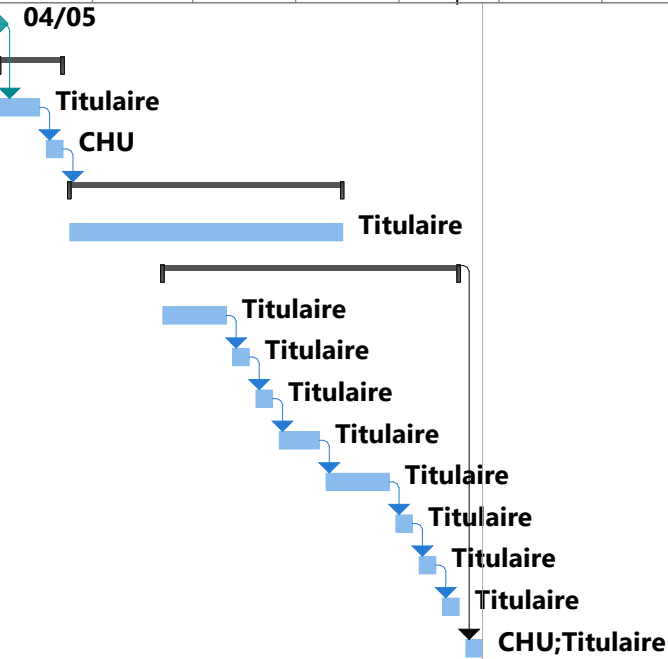
Fractionnement


Jalon


Récapitulative


 Récapitulatif du projet


 Tâche inactive


 Jalon inactif


 Récapitulatif inactif


 Tâche manuelle


 Durée uniquement


 Report récapitulatif manuel


 Récapitulatif manuel


 Début uniquement


 Fin uniquement

 Tâches externes

 Jalons externes

 Échéance

 Avancement

 Progression manuelle

