

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON

Référence client : Bâtiment 210

Désignation : Bâtiment 210

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu


Accompagnateur : Sans objet (0800 400 100)

Date de repérage : 19/01/2026

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 22/01/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/01/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment 210 - Vol 1

Bâtiment 210 - Vol 2

Bâtiment 210 - Vol 3

Bâtiment 210 - Vol 4

Bâtiment 210 - Vol 5 (Façade)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Aménagement des locaux.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment 210	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	
Revêtement de mur	Bâtiment 210	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3	
Revêtement de sol	Bâtiment 210	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	
Façades	Bâtiment 210	Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 (Façade)	
Plafond et faux-plafonds	Bâtiment 210	Vol 4	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 4	Murs	Isolation	P5	Réalisation d'un prélèvement	Colle d'isolant ITI sur mur en agglos	002EX 12803 1 n°5 - 1	P5	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Murs	Isolation	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Colle d'isolant ITI sur mur en agglos	002EX 12803 1 n°5 - 1	P5	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de mastic vitrier
Bâtiment 210	Vol 4	Menuiseries	Joint de structure	S13	Réalisation d'un sondage		S13 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de joint de structure

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 5 (Façade)	Murs	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment	002EX12803 1 n°6 - 1	P6	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX12803 1 n°3 - 1	P3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX12803 1 n°3 - 1	P3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX12803 1 n°3 - 1	P3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX12803 1 n°3 - 1	P3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX 12803 1 n°3 - 1	P3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI)	002EX 12803 1 n°4 - 1	P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI)	002EX 12803 1 n°4 - 1	P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI)	002EX 12803 1 n°4 - 1	P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3 - Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI)	002EX 12803 1 n°4 - 1	P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14	Réalisation d'un sondage		S14 - 1				Négatif sur marquage 2013

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage + colle grise	002EX 12803 1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage + colle grise	002EX 12803 1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage + colle grise	002EX 12803 1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage + colle grise	002EX 12803 1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3 - Vol 1 - Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage + colle grise	002EX 12803 1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2 - S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment 210	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse




GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment 210	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2 - S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plinthe + colle beige	002EX 12803 1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment 210	Bâtiment 210 - Plan de repérage - Actions menées


Légende



Localisation dun prélèvement
négatif



Localisation dun sondage négatif

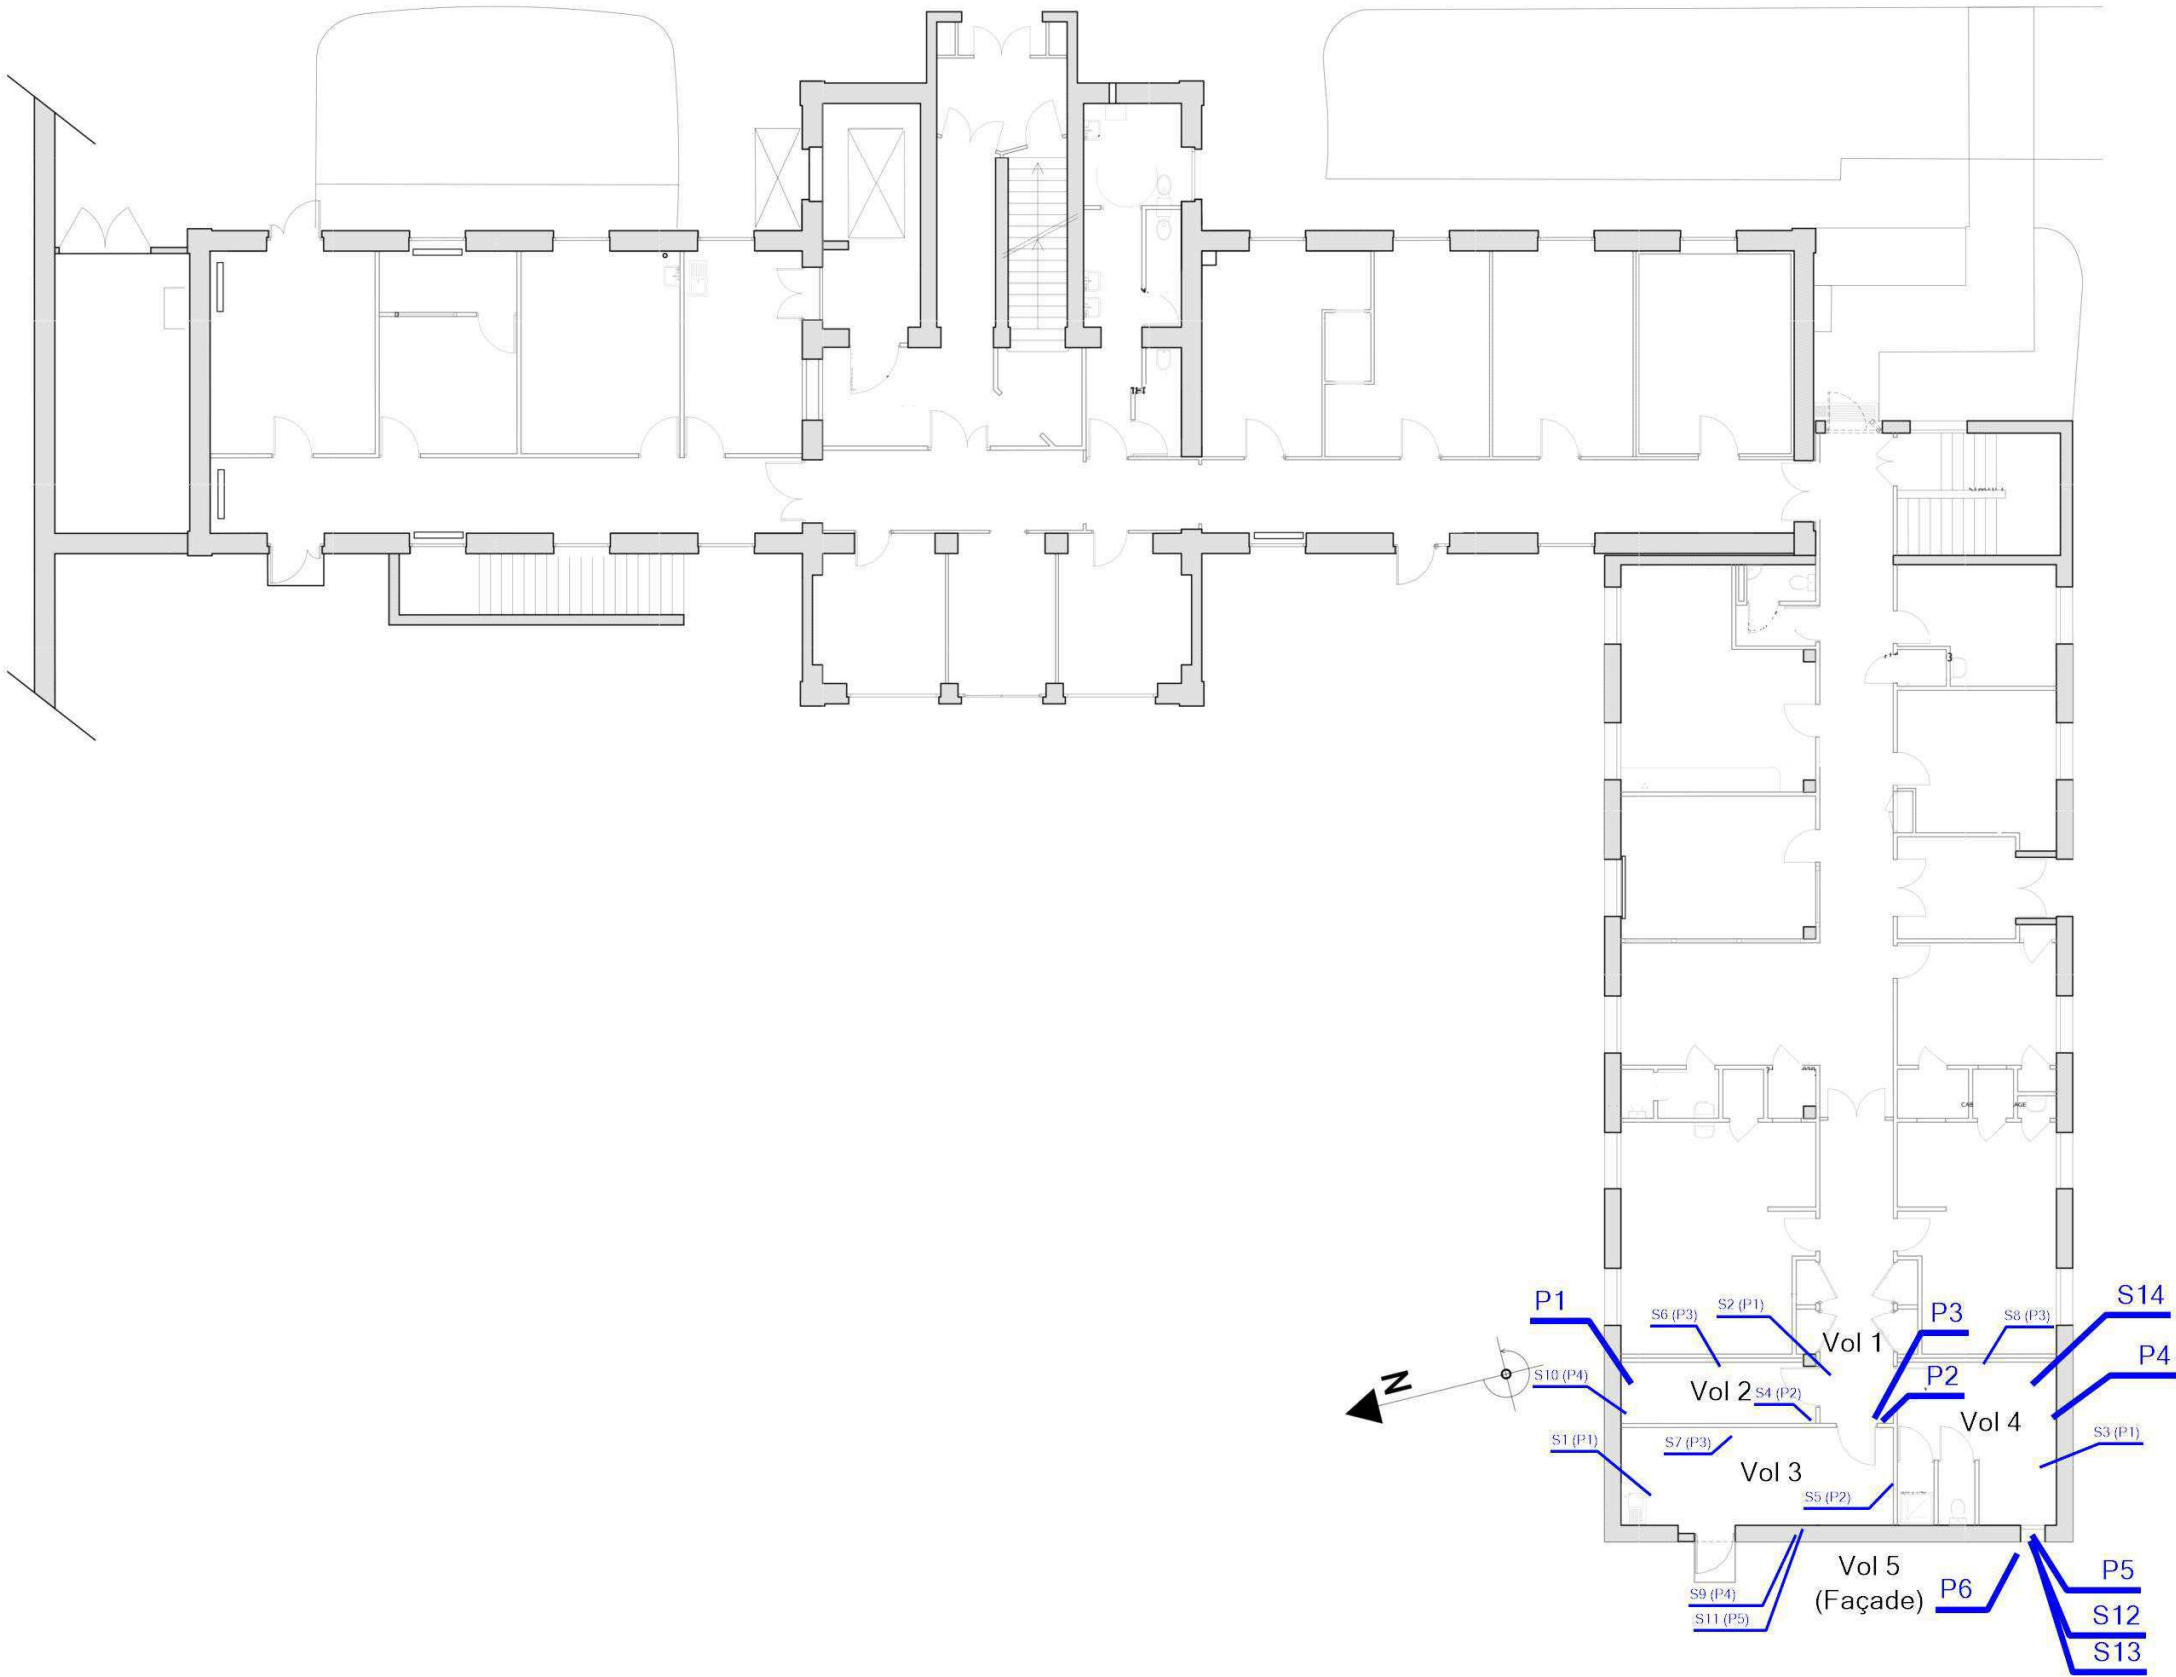

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX128031 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment 210 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX128031 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment 210 - Vol 1	Prélèvement négatif
002EX128031 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment 210 - Vol 1	Prélèvement négatif
002EX128031 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment 210 - Vol 4	Prélèvement négatif
002EX128031 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment 210 - Vol 4	Prélèvement négatif
002EX128031 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment 210 - Vol 5 (Façade)	Prélèvement négatif
S12 - 1 (S12)	Bâtiment 210 - Vol 4	Absence : pas d'amiante par nature
S13 - 1 (S13)	Bâtiment 210 - Vol 4	Absence : pas d'amiante par nature
S14 - 1 (S14)	Bâtiment 210 - Vol 4	Absence sur marquage du matériau



002EX128031 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment 210 - Vol 2



002EX128031 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment 210 - Vol 1



002EX128031 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment 210 - Vol 1



002EX128031 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment 210 - Vol 4



002EX128031 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment 210 - Vol 4



002EX128031 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment 210 - Vol 5
(Façade)



S12 - 1 (S12) - Bâtiment 210 - Vol 4



S13 - 1 (S13) - Bâtiment 210 - Vol 4



S14 - 1 (S14) - Bâtiment 210 - Vol 4

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise	Bâtiment 210 - Vol 2	
P2 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe + colle beige	Bâtiment 210 - Vol 1	
P2 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Gris - Plinthe + colle beige	Bâtiment 210 - Vol 1	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	Bâtiment 210 - Vol 1	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI)	Bâtiment 210 - Vol 4	
P5	Façades	Murs	Mortier - Dur - Beige - Colle d'isolant ITI sur mur en agglos	Bâtiment 210 - Vol 4	
P6	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris - Enduit ciment	Bâtiment 210 - Vol 5 (Façade)	



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER		COORDONNÉES DESTINATAIRE	
Référence	C032026100012	AC Environnement	
Adresse	Commande : 002EX128031 Affaire : Bâtiment 210 95 Boulevard Pinel 69500 BRON	64, rue Clément Ader	
		42153 RIORGES	

Limonest, le 22/01/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100012
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX128031_001

Référence labo	69PM00762998	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	DYG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100012
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX128031_002

Référence labo	69PM00762999	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Carrelage Dur Noir		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	1	DYG	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Joint Dur Blanc	-	-	-	1	1	DYG	Non détecté ●
	4	Peinture Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Peinture Effritable Jaune

Référence échantillon : 002EX128031_003

Référence labo	69PM00763000	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	1	DYG	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Référence échantillon : 002EX128031_004

Référence labo	69PM00763001	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (ITI) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	1	DYG	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100012

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX128031_005

Référence labo	69PM00763002	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Isolation		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Colle d'isolant ITI sur mur en agglos		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Beige	- - -	Acétone	1	1	DYG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX128031_006

Référence labo	69PM00763003	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	22/01/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment 210 - Vol 5 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	DYG	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC032026100012

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 7/7

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe
Lucile Falenta



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100012
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 50
F : +33 (0) 1 44 05 56 50



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Toits Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30855 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entemzov, Dr. Dirk Hönig, David Hahn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Postemak, Dr. Florent Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 50
F : +33 (0) 1 44 05 56 50



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Rétractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30855 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entemzov, Dr. Dirk Hönig, David Hahn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Postemak, Dr. Florent Strasser

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

(Signature)



AC ENVIRONNEMENT
Sagep SAS - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. au capital 1 000 000 € - SIRET 44135591400298 - Publications financières: 001355914 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 44 77 44 92 44
01 44 77 44 92 44
01 44 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI4978 Version 009



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICERT, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/09/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/site-des-certifies>
Valable à partir du 26/09/2024.

(Signature)



ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (s) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (s) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 16/09/2024.

Etienne Lamy
