




PRÉFET DES PYRÉNÉES - ATLANTIQUES

Cité Administrative de Pau




Travaux de réaménagements


PLANNING

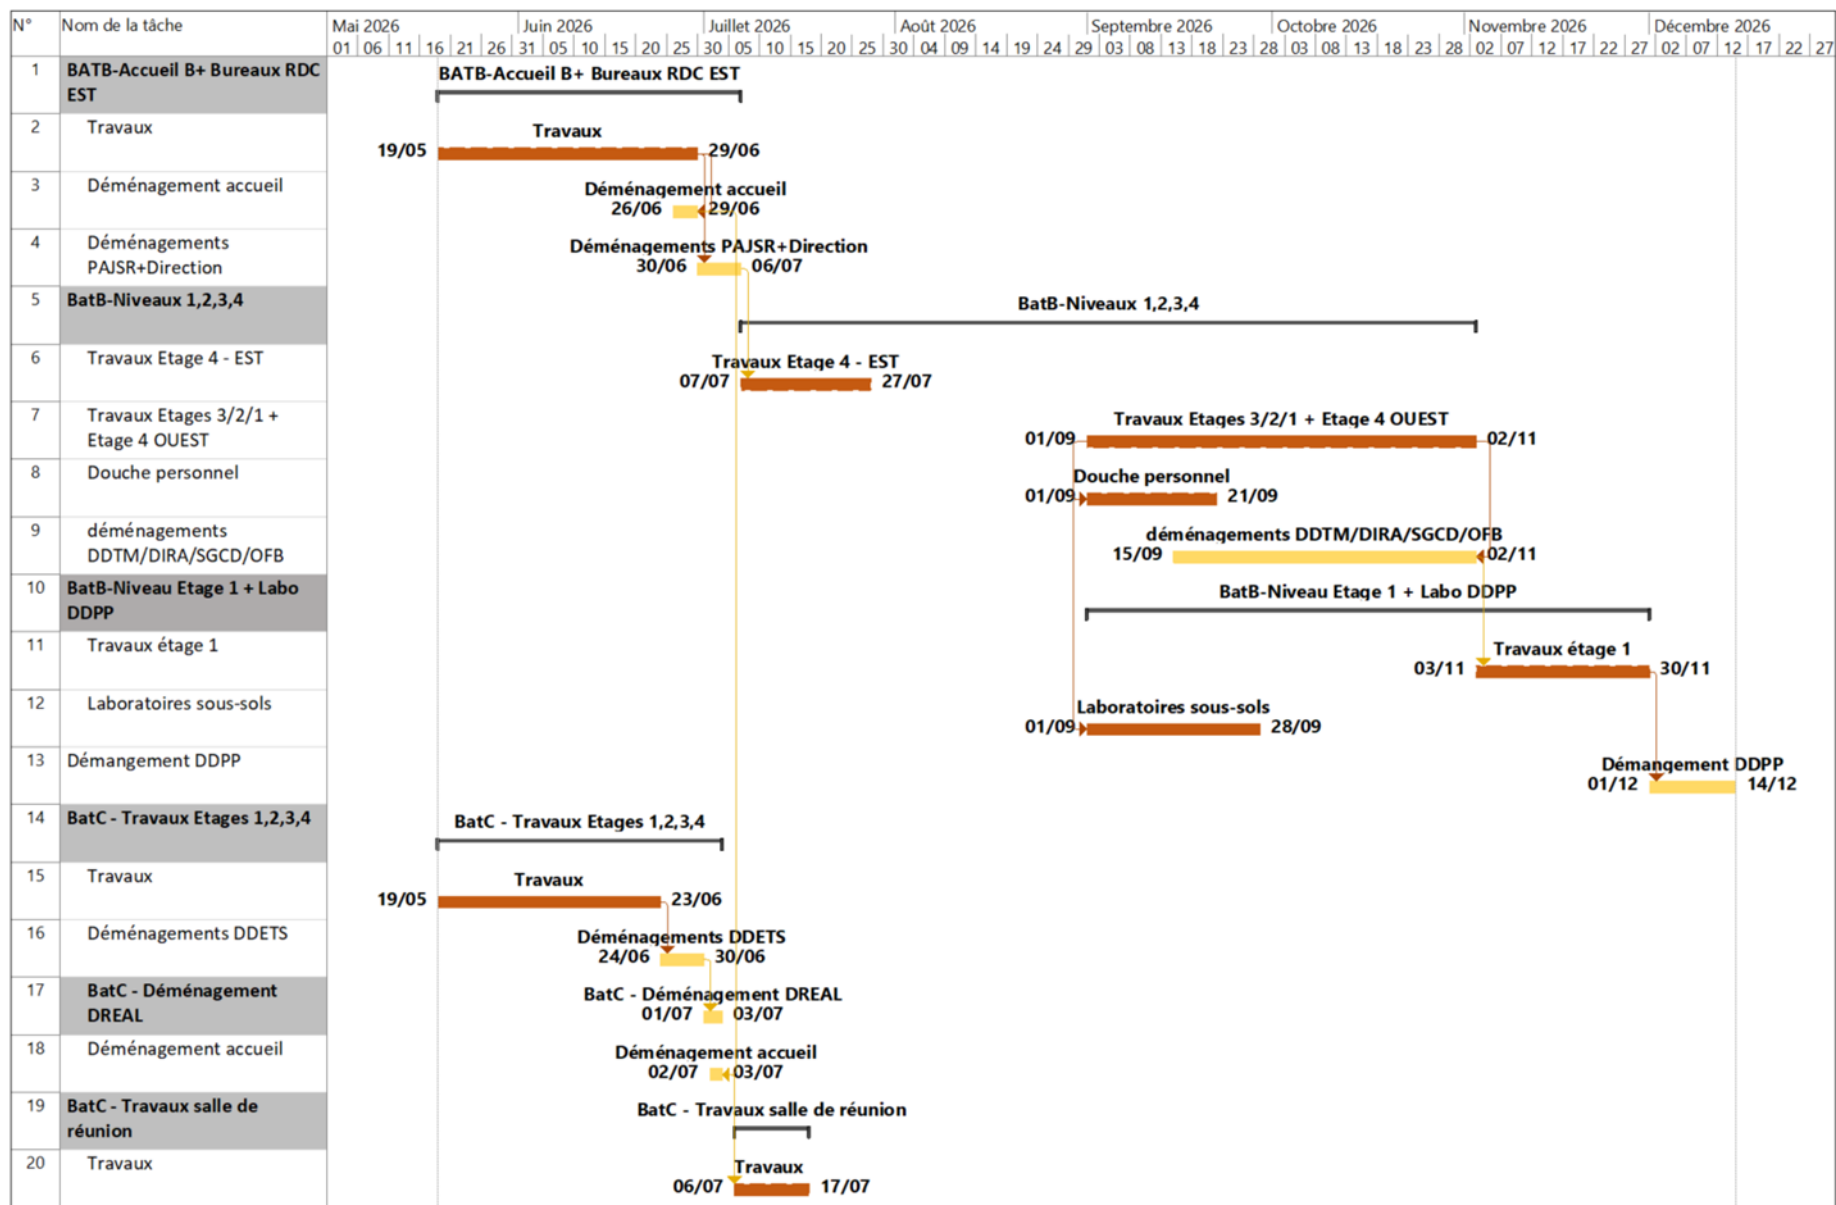


MAI-JUIN 2026 – tranche Ferme

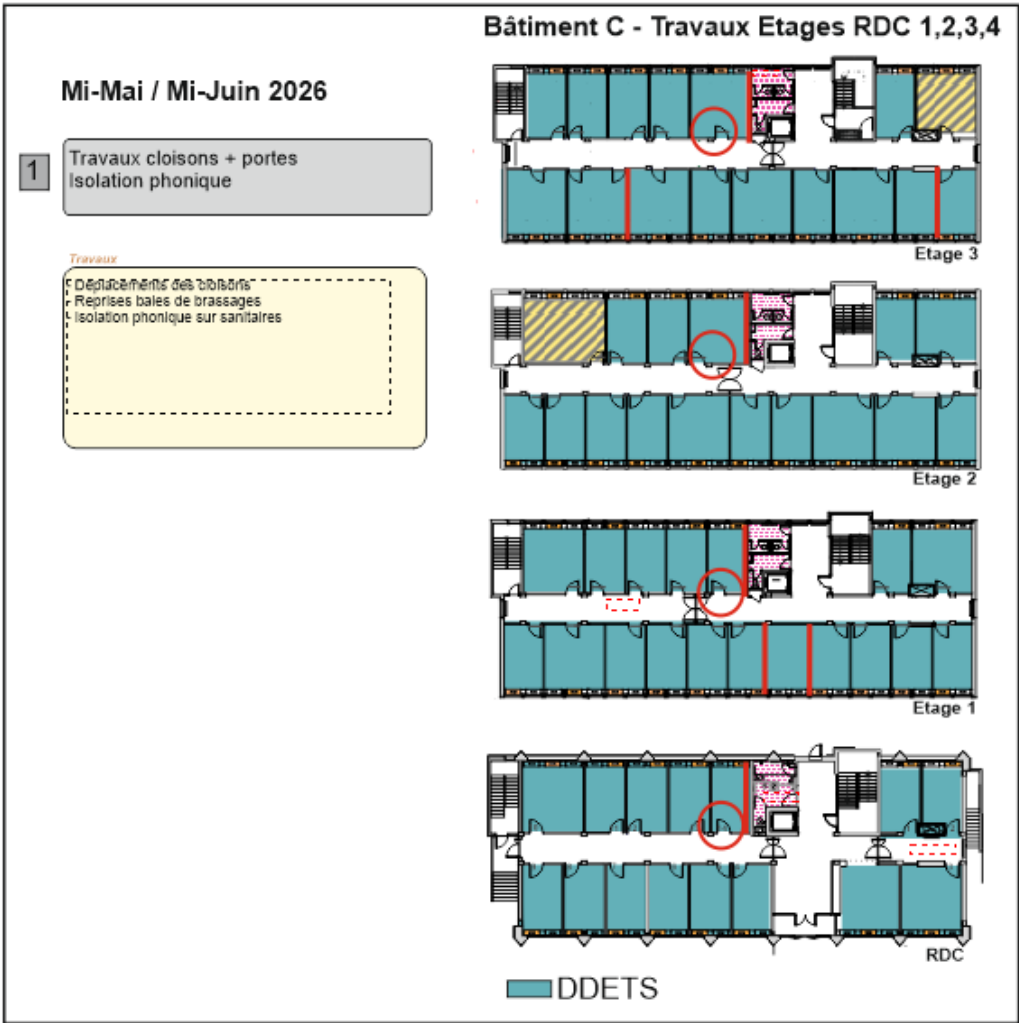

MAI-JUIN 2026

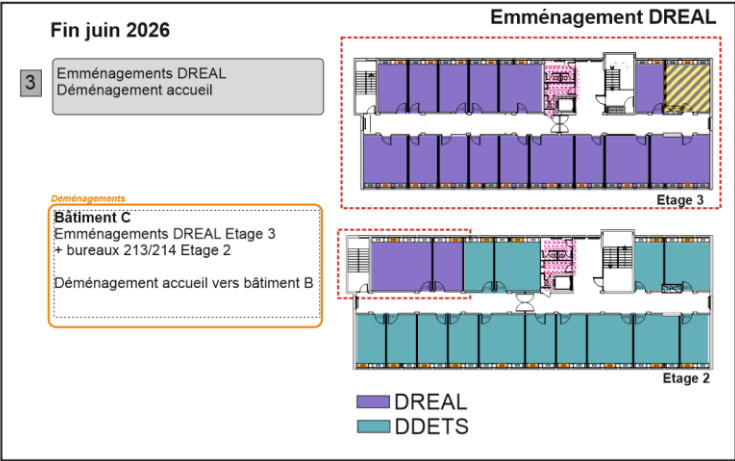

JUILLET 2026 – tranche Ferme

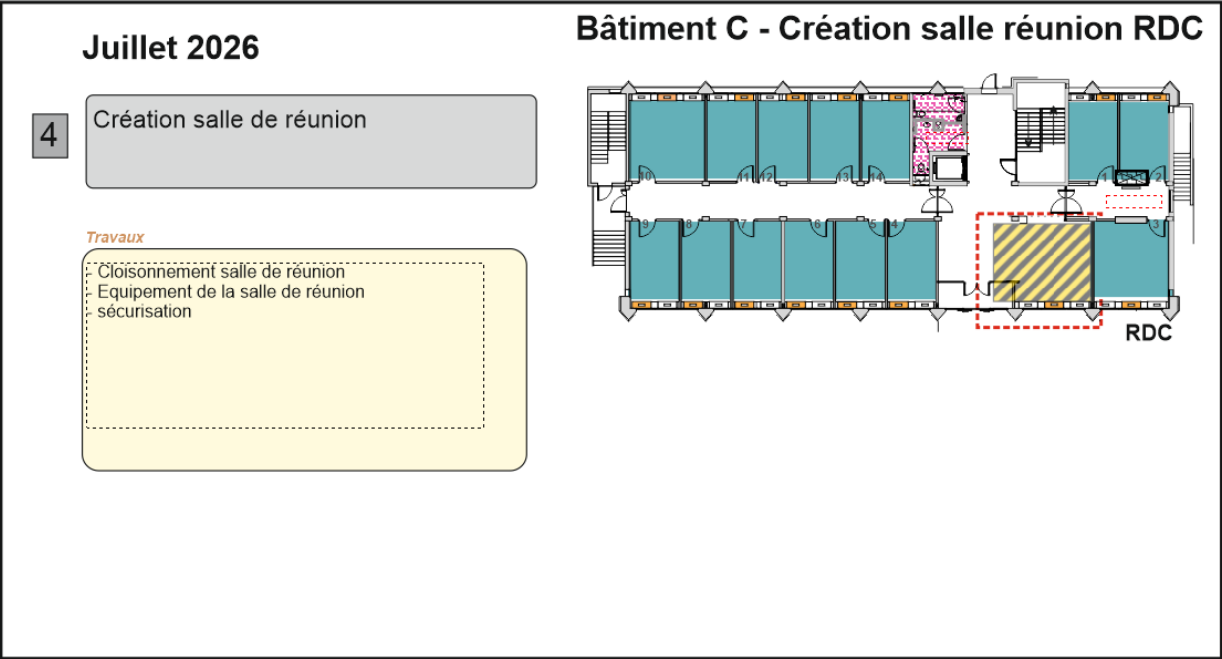

Juin 2026

1

Réaménagement de
la zone accueil
+ bureaux zone OUEST

Travaux

Bâtiment B


- Réaménagement banque accueil
- Reprise cloisonnement Zone OUEST
- Rafraîchissement Zone OUEST
- Reprise phonique centrale VMC
- Aménagement box salle Barétous
- Création d'une salle réunion
- Ouverture local convivialité sur hall

Déménagements

Bâtiment B

Emménagement accueil au Bâtiment B fin juin 2026/début juillet


Accueil B + Bureaux RDC OUEST

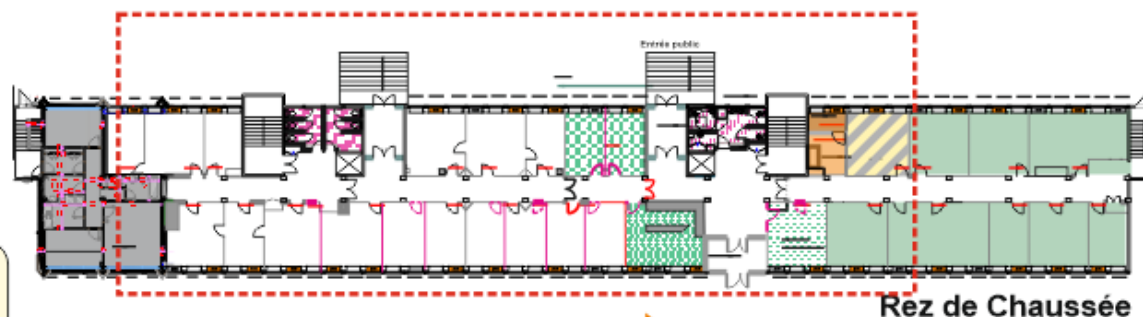

Travaux

Bâtiment C

Récupération de la
banque d'accueil
fin juin/début juillet

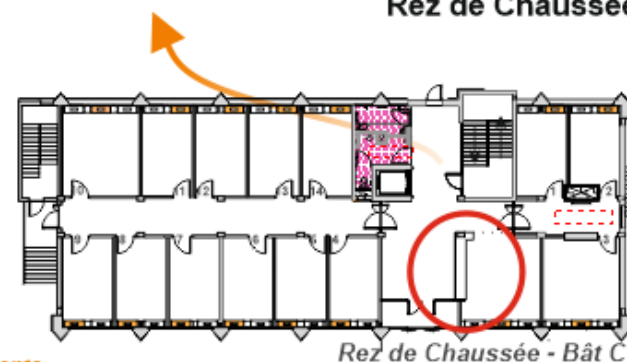

Déménagements

Bâtiment C

Déménagement accueil du Bâtiment C vers B fin juin 2026/début juillet

Juillet / Août 2026

2

Déménagement Direction
PAJSR +
travaux Et4 OUEST

Travaux

Travaux cloisons Etage 4 EST

Déménagements

Bâtiment B

Déménagement au RDC de la direction + PAJSR

Bâtiment B - Déménagements Direction + PAJSR



Etage 4



Rez de Chaussée

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2026 – Tranche Optionnelle 3

Septembre - Octobre 2026

Bâtiment B - Déménagements niveaux 1,2,3,4

3

Déplacement cloisons
+ Déménagements

Travaux

- Déplacements cloisons étages
- Portes
- Douche personnel au sous-sol


Déménagements

Bâtiment B

- DDTM / Agriculture (RDC+ET1)--> Etage 4
- DDTM / Eau (ET1) --> Etage 4
- DDTM / Environnement (ET4) --> Etage 3
- DDTM / SCT --> déplacement sur étage
- DDTM / Urba --> déplacement sur étage
- DDTM / Hab/Cons --> déplacement sur étage
- DIRA (ET1)--> Etage 2
- OFB (ET2) --> modifications sur étage
- SGCD (ET2) --> modifications sur étage
-



DDTM - Agriculture ← Etage 1 + RDC
DDTM - SCT ← Etage 4
DDTM - Eau ← Etage 1



DDTM - Environnement ← Etage 4
DDTM - Urbanisme ← Etage 3
DDTM - Habitat - Construction ← Etage 3



DIRA ← Etage 1
SGCD ← Etage 2
OFB ← Etage 2

NOVEMBRE 2026 – Tranche Optionnelle 3 + Tranche Optionnelle 4 + Tranche Optionnelle 5

Novembre 2026

Bâtiment B - Travaux étages 1 + locaux Sous-sol

4

Travaux Etage 1
Locaux DDPP Sous-sol


Travaux

Etage 1 :

- Déplacements cloisons
- caissons Ventilo-convecteurs
- Ensembles peintures, sols, electricité.

Sous-sol :

- Aménagements locaux sous-sol DDPP



Etage 1
